

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Č. VPI/MJ/2024/00177**

mezi

CETIN a.s.

a

Statutární město Brno

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená [REDACTED] [REDACTED] supervizorem, VFS Morava jih, na základě pověření ev.č.

PŘ/4808/2024

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

ID DS: qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna, podpisem smlouvy

pověřen: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

ID DS: a7kbrm

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Město Brno; Stránice; Veverí spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 11.3.2023 vydané pod čj. 72234/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Brno - Rekonstrukce části ul. Údolní**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí č. 277 vydaného Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz, Brno“ č.j. MCBS/2020/0123013/ADAM ze dne 12.08.2020, pravomocné dne 18.09.2020, prodlouženo Rozhodnutím o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, č.j.: MCBS/2022/0178622/ADAM, vydané dne 20.10.2022, pravomocné 25.11.2022 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to v části (i) práv k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN (SO 451 Sdělovací kabely, CETIN) za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny a vztahují se pouze k objektu SO 451 Sdělovací kabely, CETIN). Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí vč. Rozhodnutí o jeho prodloužení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) a zálohovou platbu dle odst. 6.1 písm. (b) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **2.722.029,- Kč** (slovy: dva miliony sedm set dvacet dva tisíc dvacet devět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
 Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

- vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit následovně:

- (a) úhradou nákladů na vyhotovení CTN Překládky ve výši **16.152,- Kč** (slovy: šestnáct tisíc jedno sto padesát dva korun českých) na základě faktury; fakturu vystaví společnost CETIN do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy;
- (b) zálohovou platbou ve výši **1.300.000,- Kč** (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých) (dále jen „**Záloha**“); výzva k úhradě Zálohy bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů ode dne, kdy je společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva;
- (c) úhradou doplatku na základě faktury na celkovou výši nákladů Překládky; fakturu vystaví společnost CETIN do třiceti (30) dnů ode dne dokončení Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. Faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy; v případě, že výsledkem vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30)

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

kalendářních dní od vystavení vyúčtování podle písmene (c) tohoto odstavce 6.1 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Faktury či výzva k úhradě Zálohy budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.4 Jakoukoliv fakturu či výzvu k úhradě Zálohy vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury či výzvy k úhradě Zálohy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na účet společnosti CETIN určený na fakturu či ve výzvě k úhradě Zálohy.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením faktury či výzvy k úhradě Zálohy, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy
e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista koordinace výstavby sítě
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: vedoucí Odboru investičního, Magistrát města Brna
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED] 161

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: investiční manažer dopravních staveb
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. Ochrana osobních údajů

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

znění pozdějších předpisů;

- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
 Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

12.14 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2).

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí č. 277 vydané Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz, Brno“ č.j. MCBS/2020/0123013/ADAM ze dne 12.8.2020, pravomocné dne 18.9.2020, prodlouženo Rozhodnutím o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, č.j. MCBS/2022/0178622/ADAM

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města na schůzi č. R9/119 dne 19. února 2025.

CETIN:

Stavebník:

V Brně

V Brně

CETIN a.s.

supervizor, Výstavba fixní sítě Morava jih
 na základě pověření

Statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec, MBA
 vedoucí Odboru investičního
 Magistrát města Brna

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00177
Číslo smlouvy Stavebníka: 5625171565 (ORG 2681)

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

Obsah


1	Identifikační údaje	2
2	Popis objektu, technické řešení	3
2.1	Přehledná situace	3
2.2	Zdůvodnění objektu.....	4
2.3	Související stavby (zajištěna koordinace)	4
2.4	Podklady pro zpracování dokumentace	4
2.5	Použité normy a předpisy	4
2.6	Technické a funkční řešení	5
2.6.1	Stávající stav	5
2.6.2	Navrhovaný stav	5
2.7	Zemní práce.....	6
2.8	Měření, zkoušky	6
3	Další požadavky na výstavbu	6
3.1	Oznamovací povinnost.....	6
3.2	Stávající inženýrské sítě.....	6
3.3	Požadavky na energie.....	8
3.4	Dočasný zábor	8
3.5	Geodetické zaměření skutečného provedení	8
3.6	Zřízení služebnosti	8
3.7	Bezpečnost práce	8
4	Dopady na životní prostředí, vliv na vody, odpady	8
5	Řešení z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	8

1 Identifikační údaje

Stavba:	VPIC BRNO -REKONSTRUKCE ČÁSTI UL. ÚDOLNÍ
Katastrální území (ČR):	Město Brno [610003], Veveří [610372], Stránice (610330)
Místo stavby:	Brno – ul.Údolní
Kraj (ČR):	Jihomoravský
Druh stavby:	Rekonstrukce
Stupeň dokumentace:	CATN
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno IČ: 449 92 785
Zodpovědný projektant:	Ing. [REDACTED] [REDACTED] IBC – Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 757 18 600 Autorizovaný inženýr, člen ČKAIT č.a. 1006156
Majetkový správce zařízení:	CETIN a. s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň IČ: 040 84 063

2 Popis objektu, technické řešení

2.1 Přehledná situace

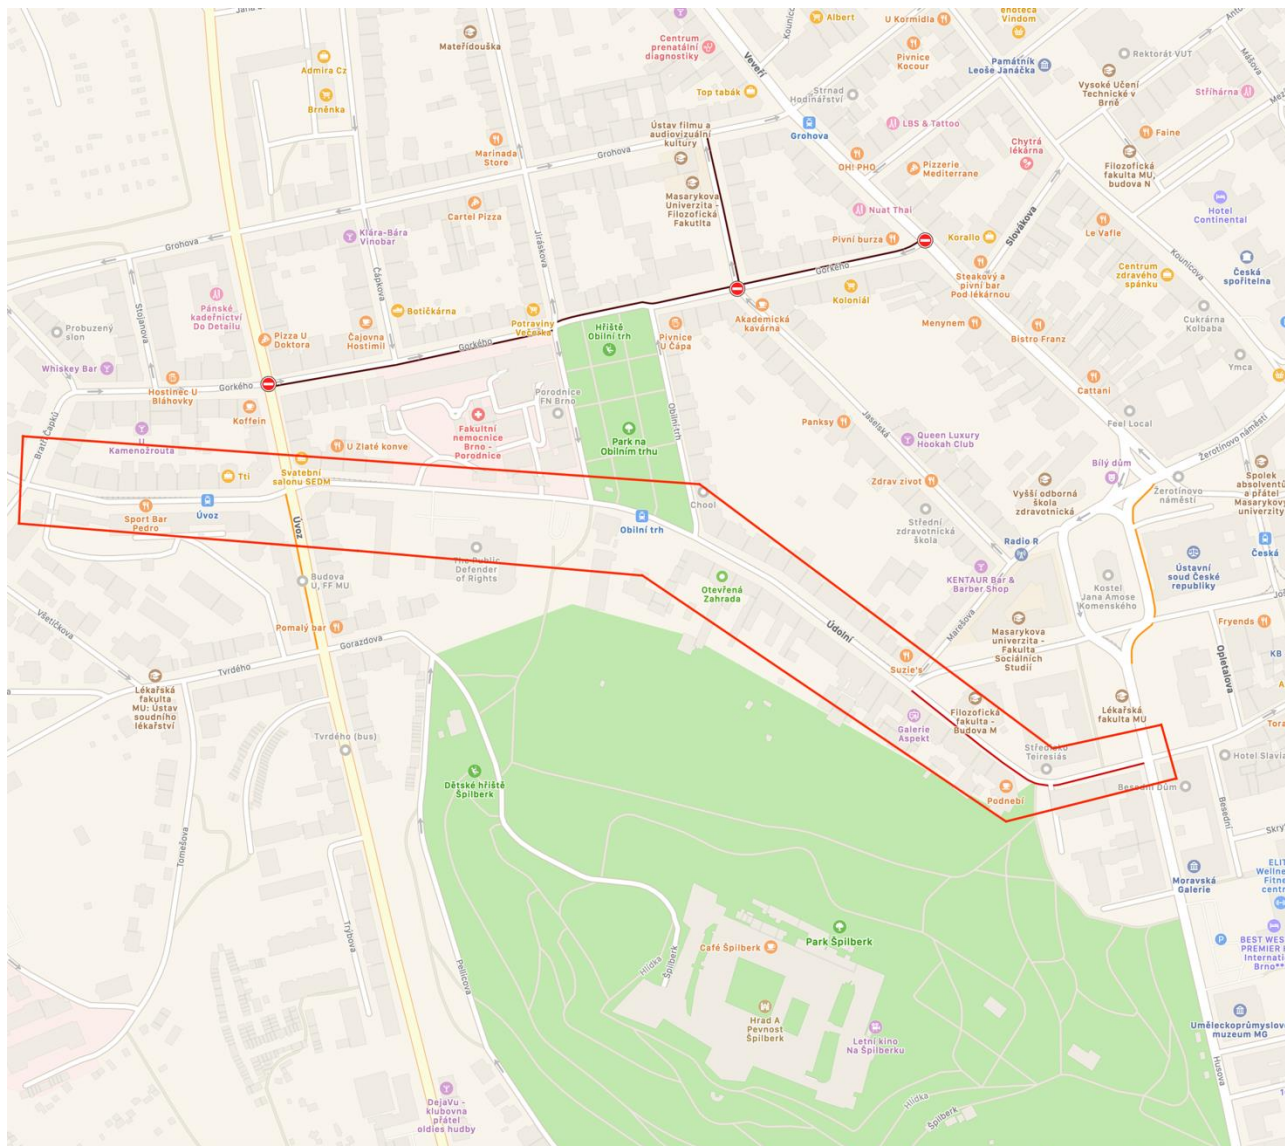

2.2 Zdůvodnění objektu

Předmětem projektové dokumentace je zpracování výchozího návrhu přeložek sdělovacích vedení společnosti CETIN a.s. (dále jen CETIN).

Ke střetu dojde s metalickou i optickou sítí a prázdnými optotrulkami HDPEØ40mm. Ke střetu dojde se zemními kabely. S nadzemními kabely ke střetu nedochází.

Přeložení zařízení sítě elektronických komunikací (SEK) zajistí její vlastník, společnost CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Součástí stavebního objektu jsou přeložky v různých místech střetu stavby v nezbytně nutném rozsahu vyvolaným výše uvedenou investiční akcí.

Neprovozované sítě v řešeném území nebudou překládány, budou odpojeny a demontovány z řešeného území.

2.3 Související stavby (zajištěna koordinace)

Nejsou.

2.4 Podklady pro zpracování dokumentace

- aktuální koordinační situace stavby, kterou zpracoval generální projektant
- dokumentace stávajících inženýrských sítí
- konzultace s majetkovým správcem
- koordinace s ostatními projekčními specialisty
- terénní průzkum projektanta

2.5 Použité normy a předpisy

Projektová dokumentace odpovídá následujícím předpisům a normám:

ČSN 33 40 00	Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu
ČSN 33 40 10	Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu
ČSN 34 20 40 ed.2	Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
ČSN 33 20 00	Elektrické instalace nízkého napětí – všechny související části
ČSN 73 60 05, vč. změn	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 60 06	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
ČSN 73 61 10	Projektování místních komunikací
ČSN 73 61 33	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 72 10 06	Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Zákon č.127/2005 Sb.	o elektronických komunikacích.
Zákon č.183/2006 Sb.	o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
TPP 2001, díl 1-4	Výstavba přístupových sítí - metalické kabely
TA 7	Stavba dálkových sdělovacích kabelů
TM000003-..	Předpisy pro údržbu a montáž optických kabelů a trubek
Předpis TSM 2096 pro geodetické zaměření telekomunikačních kabelů - vydal CETIN	
PD je zpracována dle vyhl.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.	

2.6 Technické a funkční řešení

2.6.1 Stávající stav

Kabely jsou uloženy v chodníku s krytím 0.4m (místní kabely), 0.5m (optické kabely, souběh místních a optických kabelů), volně v terénu s krytím 0.6m (místní kabely), 1.0m (optické kabely, souběh místních a optických kabelů) v pískovém loži a jsou kryty výstražnou fólií a mechanickou ochranou, pod komunikací jsou kabely uloženy v chráničkách PVCØ110mm v hloubce 0.9m (místní kabely), 1.2m (optické kabely, souběh místních a optických kabelů).

2.6.2 Navrhovaný stav

Objekt řeší přeložku místních sdělovacích kabelů v několika místech střetu s navrhovanou stavbou.

Úsek 1

K prvnímu střetu dojde v prostoru před křižovatkou ulic Údolní a Úvoz u č.o.38. Na stávajících kabelech bude nutno prodloužit stávající kabelový prostup v dl.3m z důvodu rozšíření komunikace a změně jejího prostorového uspořádání. Jedná se o místní kabely TCEPKPFLE 200XN0.4, 50XN0.4, 50XN0.4, 100XN0.4, 150XN0.4, 200XN0.4. V souběhu ještě vede stávající trasa kabelů, které jsou mimo provoz. Tyto kabely nebudou překládány ani zabezpečovány. Prodloužení prostupu bude provedeno dělenou chráničkou SYSPROØ200/160mm.

Úsek 2

K druhému střetu dojde na pravé straně ul.Údolní mezi č.o.29 – č.o.11. Kabely jsou ve střetu z důvodu plánované výsadby. Přeložka bude provedena v délce 184m novými kabely. V trase se nachází prázdné optotrubky i místní kabely. Jedná se o dvě trubky HDPEØ40mm barvy oranžová se dvěma bílými pruhy a HDPEØ40mm barvy černá se dvěma bílými pruhy. Místní kabely jsou typu TCEPKPFLE 300XN0.4, 300XN0.4, 200XN0.4, 100XN0.4, 100XN0.4, 50XN0.4, 15XN0.4 a odbočné kabely typu TCEPKPFLE 15XN0.4 a 25XN0.4.

Na začátku a na konci přeložky bude provedeno přepojení kabelů pomocí zemních smršťovacích spojek. Optotrubky budou naspojovány spojkami PLASSON SPP40.

Úsek 3

Ke třetímu střetu dojde na pravé straně ul.Údolní mezi č.o.7 – č.o.5. Kabely jsou ve střetu z důvodu plánované výsadby. Přeložka bude provedena v délce 28m novými kabely. V trase se nachází prázdné optotrubky i místní kabely. Jedná se o dvě trubky HDPEØ40mm barvy oranžová se dvěma bílými pruhy a HDPEØ40mm barvy černá se dvěma bílými pruhy. Místní kabely jsou typu TCEPKPFLE 300XN0.4, 400XN0.4, 15XN0.4 a 25XN0.4 a odbočné kabely typu TCEPKPFLE 10XN0.4.

Na začátku a na konci přeložky bude provedeno přepojení kabelů pomocí zemních smršťovacích spojek. Optotrubky budou naspojovány spojkami PLASSON SPP40.

Úsek 4

Ke čtvrtému střetu dojde na levé straně ul.Údolní u č.o.13. Kabely jsou ve střetu z důvodu rozšíření komunikace a změně jejího prostorového uspořádání. Přeložka bude provedena v délce 33m novými kabely. V trase se nachází místní kabely staré kabelizace. V době realizace bude ověřena funkčnost kabelů a případně již nebudou překládány. Jedná se o dva kabely typu TCKOPV 180x0.6. Kabely budou nahrazeny kabely typu TCEPKPFLE.

Na začátku a na konci přeložky bude provedeno přepojení kabelů pomocí zemních smršťovacích spojek.

Úsek 5

K pátému střetu dojde v prostoru křižovatky ulic Údolní a Komenského náměstí. Na stávajících kabelech bude nutno prodloužit stávající kabelový prostup v dl.2m z důvodu rozšíření komunikace a změně jejího prostorového uspořádání. Jedná se o místní kabely TCKOPV 200XN0.6 a dva kabely typu TCKOPV 180x0.6. V souběhu ještě vede stávající trasa kabelů, které jsou mimo provoz. Tyto kabely nebudou překládány ani zabezpečovány. Prodloužení prostupu bude provedeno dělenou chráničkou SYSPROØ200/160mm.

Obecné:

Veškeré spojky budou zaměřeny geodeticky, dokumentace bude opravena dle výše zmíněné směrnice, bude provedena oprava stávající knihy plánů v tištěné podobě - 2 paré. Při zemních pracích budou před záhozem přizváni pracovníci CETIN ke kontrole. Pro přeložku bude použit materiál dle standardů používaných v síti CETIN. Měření na OK, kalibrace HDPE, bude provedeno dle nové metodiky TM 000003. Při montážních pracích bude nutno požádat o povolení prací PEW 45 dní předem.

Původní kabely a trubky budou ponechány v zemi, pokud při výkopu jiného SO bude třeba kabely a trubky demontovat, budou ekologicky zlikvidovány.

Na výše uvedené stavbě je nutno před zahájením výkopových prací provést vytyčení stávajících inženýrských sítí. Výkopy je nutno provádět ručně a obezřetně, před jejich započítáním je nutné mít vyjádření vlastníků sítí, které se v dané lokalitě nachází, rovněž tak je nutné územní rozhodnutí na realizaci výkopových prací. Odkrytá podzemní vedení je nutné řádně zajistit proti jejich poškození. Uložení kabelů bude provedeno dle vzorových příčných řezů.

2.7 Zemní práce

Veškeré výkopové práce v blízkosti zařízení CETIN musí být prováděny ručně.

Kabely budou položeny do výkopu s krytím min.0,4m v chodníku, min.0,6m ve volném terénu a 0,9m pod komunikací. V případě optických kabelů a souběhu místních kabelů s optickými platí krytí v chodníku min.0,5m, ve volném terénu min.1,0m a pod komunikací min.1,2m. Pod vjezdy budou kabely uloženy v chráničkách PEØ110mm. V chodníku a ve volném terénu budou kabely uloženy do pískového lože celkové tl.15cm, podkladní vrstva bude tl.5cm a zásyp bude 5 cm. Trasa bude kryta plastovou krycí deskou š.25cm. Uvedené min. krytí se vztahuje k budoucímu povrchu, proto je nutno si před zahájením přeložky nechat u generálního zhotovitele vytyčit budoucí niveletu povrchu.

Trasa bude kryta výstražnou fólií š. 33cm barvy oranžové. Přesah výstražné fólie musí být min. 30mm od krajních kabelů. Zához se provede vhodnou zeminou se zhutněním na min.95%PS. Vzdálenost ostatních sítí musí odpovídat ČSN 736005. Trasa musí vést v min. vzdálenosti 1,5m od výsadby. Přebytečná zemina bude odvezena na veřejnou zemní skládku – deponii.

2.8 Měření, zkoušky

Na metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné a střídavé měření před přeložkou a po přeložce v souladu s TPP 2001 a TM 000003 CETIN.

Po ukončení montáže trubek bude provedena zkouška průchodnosti (kalibrace). Kalibrace bude provedena pístem délky 150 - 200 mm a průměrem 28 mm.

Na zkoušku průchodnosti naváže zkouška tlakutěsnosti, která bude provedena přetlakem vzduchu 50 - 100 kPa. Maximální povolený pokles přetlaku při zkoušce po dobu 1 hodiny je 1%.

3 Další požadavky na výstavbu

V předstihu musí být provedeno vybourání stávajících povrchů a příprava území. Přeložka bude probíhat souběžně s ostatními souvisejícími objekty. Do doby zprovoznění nového zařízení musí zůstat v provozu stávající zařízení.

Závěrečné sadové úpravy a celková úprava území je předmětem jiného SO.

3.1 Oznamovací povinnost

Zhotovitel má povinnost 45 dní před zahájením stavby oznámit majetkovému správci plánované provedení stavby.

3.2 Stávající inženýrské sítě

Stávající inženýrské sítě jsou v projektu převzaty a zakresleny z podkladů předaných generálním projektantem na základě zjištění a zakreslu poloh dle údajů jejich správců.

Před začátkem provádění zemních prací je nutno zajistit jejich vytyčení správcem a viditelné označení po celou dobu výstavby objektu.

Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jeho ochrannými pásmy seznámeni a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí.

V případě, že v rámci staveniště bude nutno přes kynetu přejíždět stavební technikou, musí zhotovitel provést překrytí trasy pro mechanickou ochranu (panel, plech apod.).

Pro vzájemný styk inženýrských sítí bezvýhradně platí ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

Vytyčení nově položených sítí doposud ve správě zhotovitele se zajistí u hlavního zhotovitele stavby při předání staveniště.

Ochranná pásma /dle zákona 458/2000 Sb a 274/2001 Sb:

- nadzemní vedení elektroenergetická

vedení VN 1 - 35 kV

pro vodiče bez izolace

7 m od krajního vodiče na obě strany

pro vodiče s izolací základní

2 m od krajního vodiče na obě strany

pro závěsná kabelová vedení

1 m od krajního vodiče na obě strany

u závěs. kabelového vedení 110 kV

2 m od krajního vodiče na obě strany

u zařízení vlastní telekomunikační sítě

1 m od krajního vodiče na obě strany

vedení NN

se nechrání

- podzemní vedení plynárenská – pásma bezpečnostní

VTL plynovod nad 250 mm

40 m od osy potrubí na obě strany

VTL plynovod do 250 mm

20 m od osy potrubí na obě strany

VTL.plynovod do 100 mm

15 m od osy potrubí na obě strany

- podzemní vedení plynárenská – pásma ochranná

STL a NTL plynovod

1 m od osy potrubí na obě strany

ostatní vedení

4 m od osy potrubí na obě strany

- produktovod /dle nařízení vlády 29 z roku 1959

ochranné pásmo (pásmo bezpečnostní)

300 m na každou stranu

zabezpečovací pásmo (ochranné)

5 m na každou stranu

- podzemní vedení trubní ostatní

vodovod a kanalizace do 500 mm

1,5 m od líce potrubí na obě strany

vodovod a kanalizace nad 500 mm

2,5 m od líce potrubí na obě strany

- kabelové vedení

podzemního komunikačního vedení

0,5 m po stranách krajního vedení

silnoproud (do 110 kV)

1 m od krajního kabelu na obě strany

- jiné dopravní systémy

ochranné pásmo dráhy

60 m od krajní koleje na obě strany

Křižované komunikace (v souladu se zákonem 13/97 Sb.):

silnice I.třídy

50 m od osy komunikace na obě strany

silnice II.a III.třídy

15 m od osy komunikace na obě strany

místní komunikace II.třídy

15 m od osy komunikace na obě strany

Projektant upozorňuje, že poloha všech inženýrských sítí je pouze informativní a před zahájením stavebních prací je nutné požádat jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení s následným řádným označením jejich průběhu v terénu během výstavby. Současně je třeba dbát všech bezpečnostních předpisů a podmínek vyjádření jednotlivých správců.

3.3 Požadavky na energie

Nejsou.

3.4 Dočasný zábor

Dočasný zábor pozemku pro objekt je řešen souhrnně pro celou stavbu, vytyčené hranice předá investor (resp. hlavní zhotovitel přímému zhotoviteli prací). Na staveništi nebude skladován žádný materiál.

3.5 Geodetické zaměření skutečného provedení

Po skončení přeložky se v otevřené kynetě provede geodetické zaměření celého průběhu trasy v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

Geodetické zaměření skut. provedení včetně opravené realizační dokumentace (DSPS) se předá správci po dokončení objektu. Dokumentace bude provedena dle směrnic a předpisů majetkového správce.

3.6 Zřízení služebnosti

Po provedení stavby bude provedeno zřízení služebnosti pro novou inženýrskou síť ve prospěch vlastníka zařízení do katastru nemovitostí vč. zpracování geometrických plánů.

3.7 Bezpečnost práce

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb.

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace).

Při provádění prací na úpravě kabelů musí být dodržena ustanovení provozního řádu, bezpečnostních norem a předpisů, zejména ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN EN 50 110-1, ČSN EN 50 110-2, ČSN 343085 a dalších navazujících předpisů o provádění stavebních a montážních prací. Zejména je nutno dodržet ČSN řady 33 2000.

4 Dopady na životní prostředí, vliv na vody, odpady

Provedení prací nemá negativní vliv na životní prostředí. Sdělovací ani napájecí síť není zdrojem nebezpečného záření ani jiných škodlivých vlivů. Nemá vliv na podzemní ani povrchové vody. Odpady vzniklé při pokládce kabelů a chrániček je nutné zneškodnit ve smyslu Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. Zbytky materiálu budou nabídnuty k druhotnému zpracování, zneškodnění odpadů zajistí zhotovitel.


5 Řešení z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Během výstavby bude na ploše staveniště zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem dle platných předpisů pro bezpečnost při provádění stavebních prací.


Řešení finálních ploch a prvků pro pohyb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je předmětem objektů řady SO 100.

11. srpna 2024
Vypracoval: Ing. [] []

1 : 250

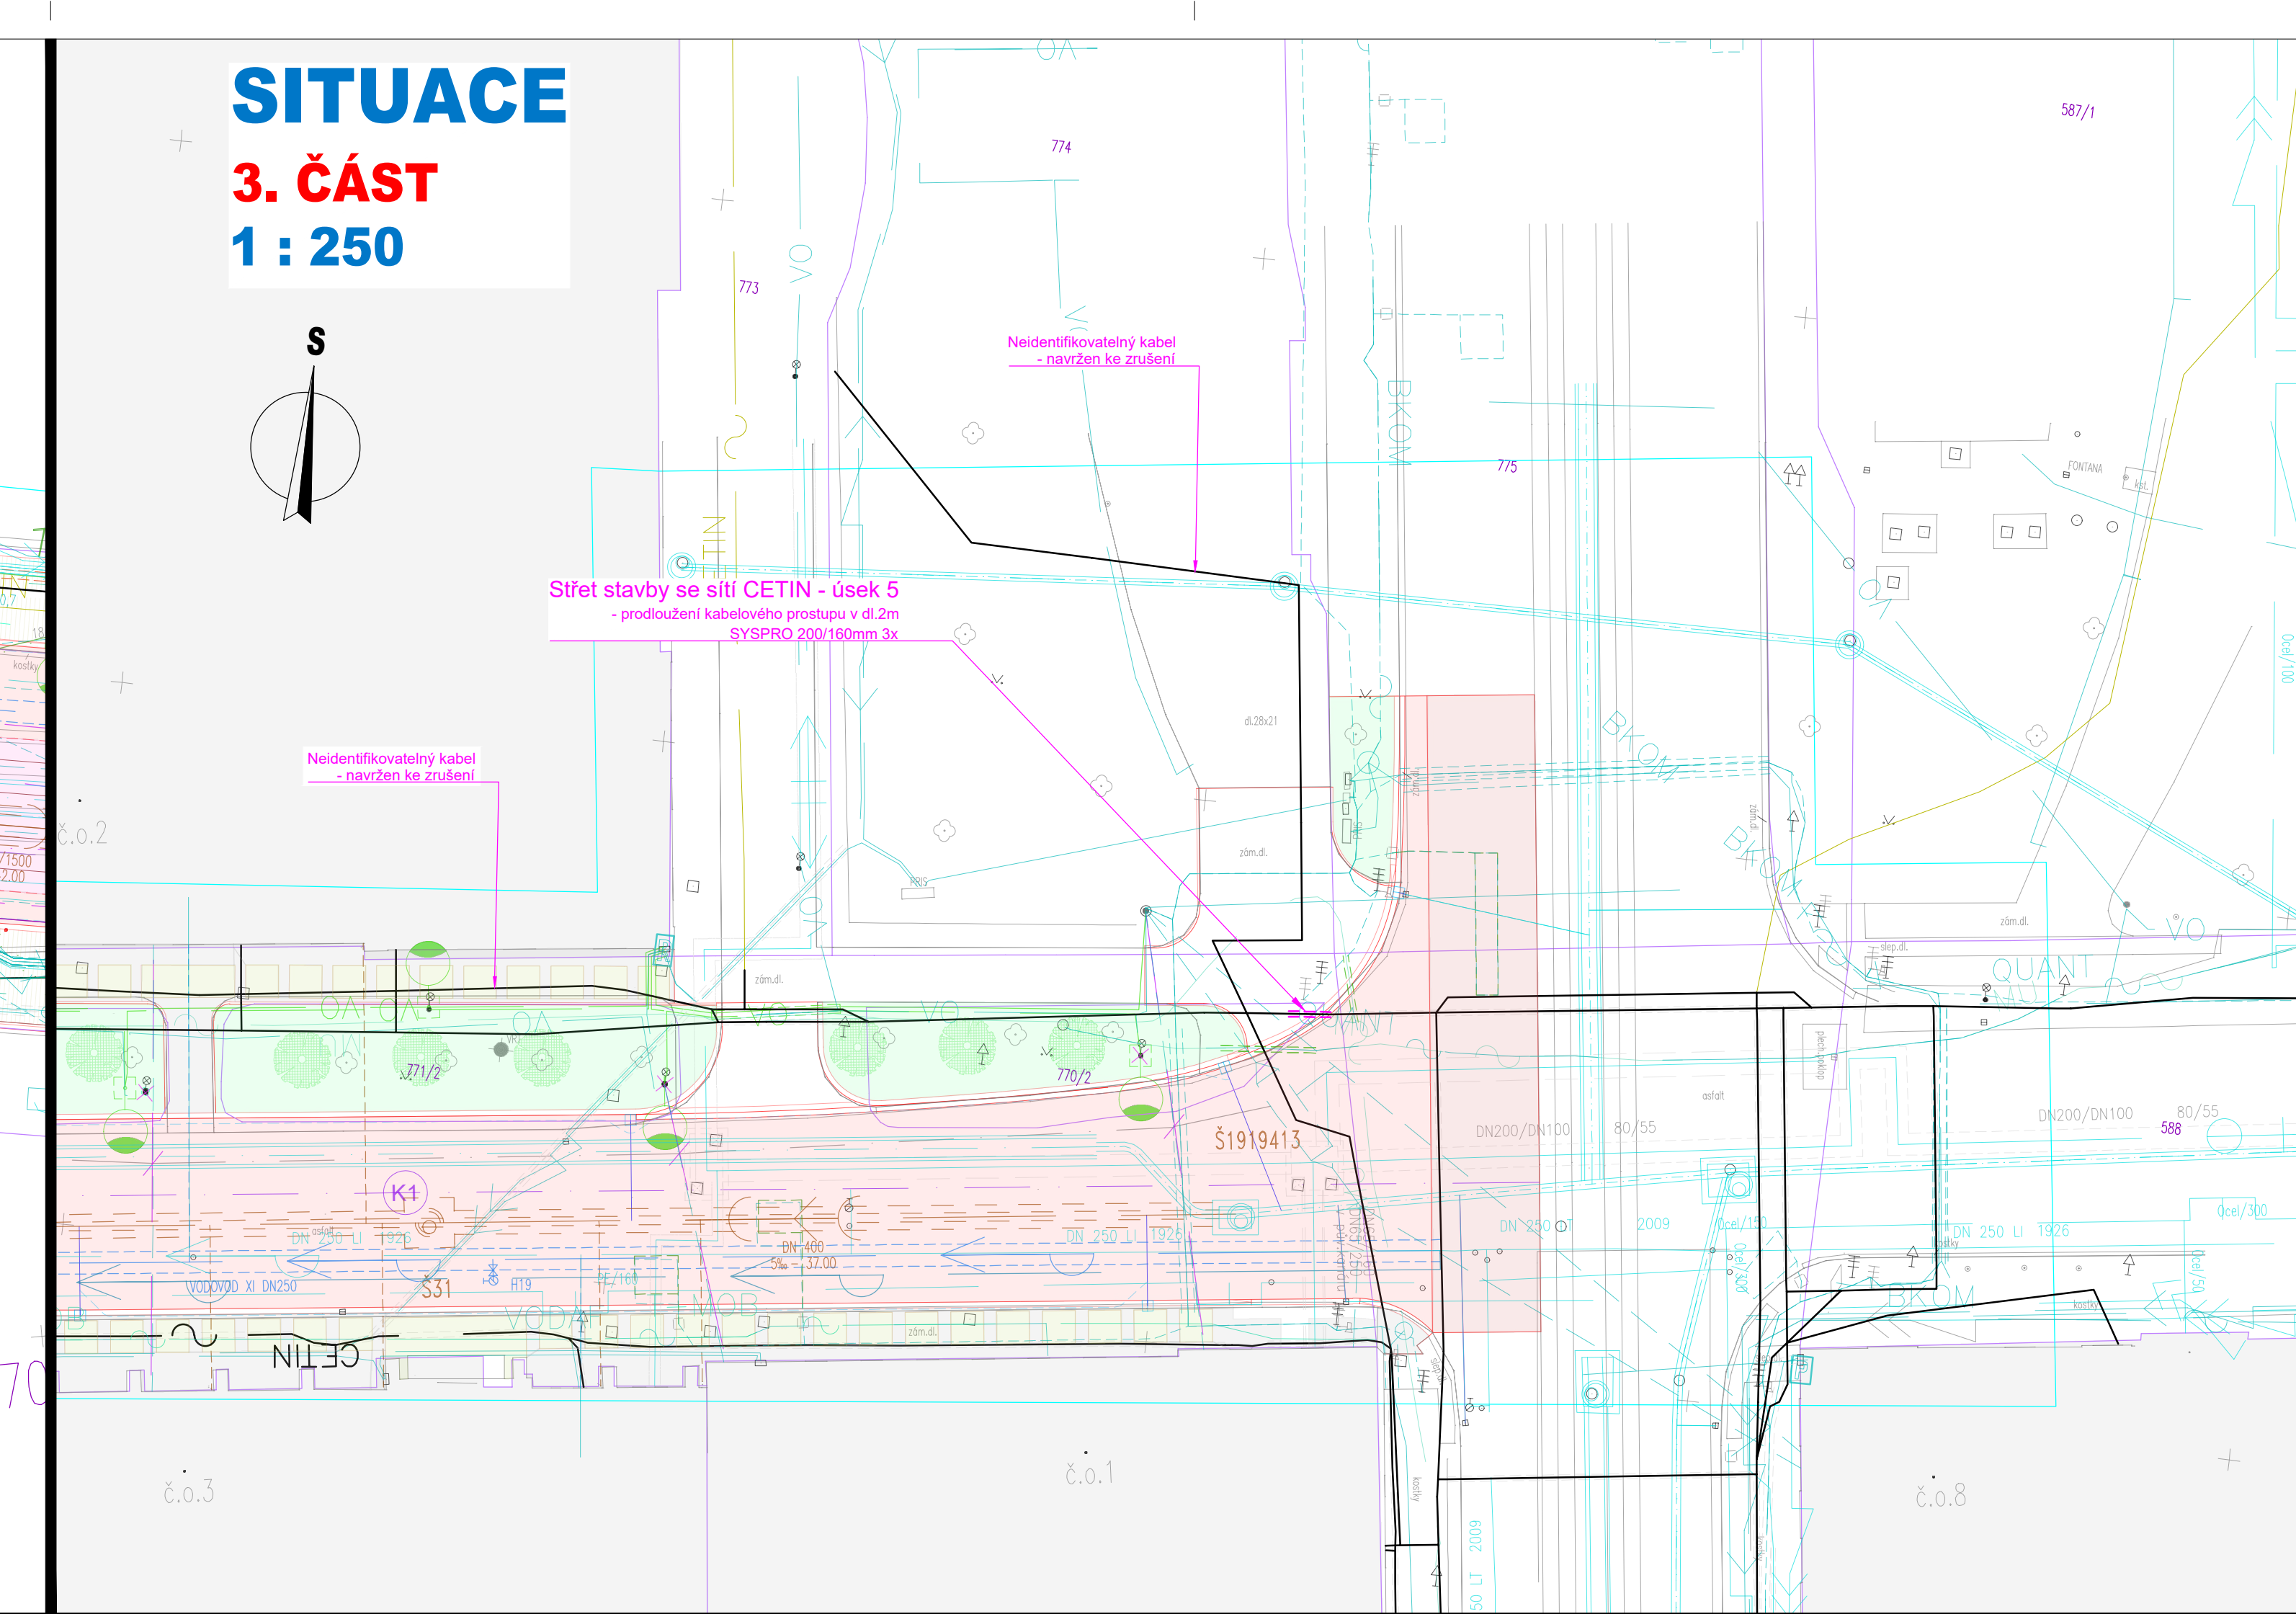

1 : 250

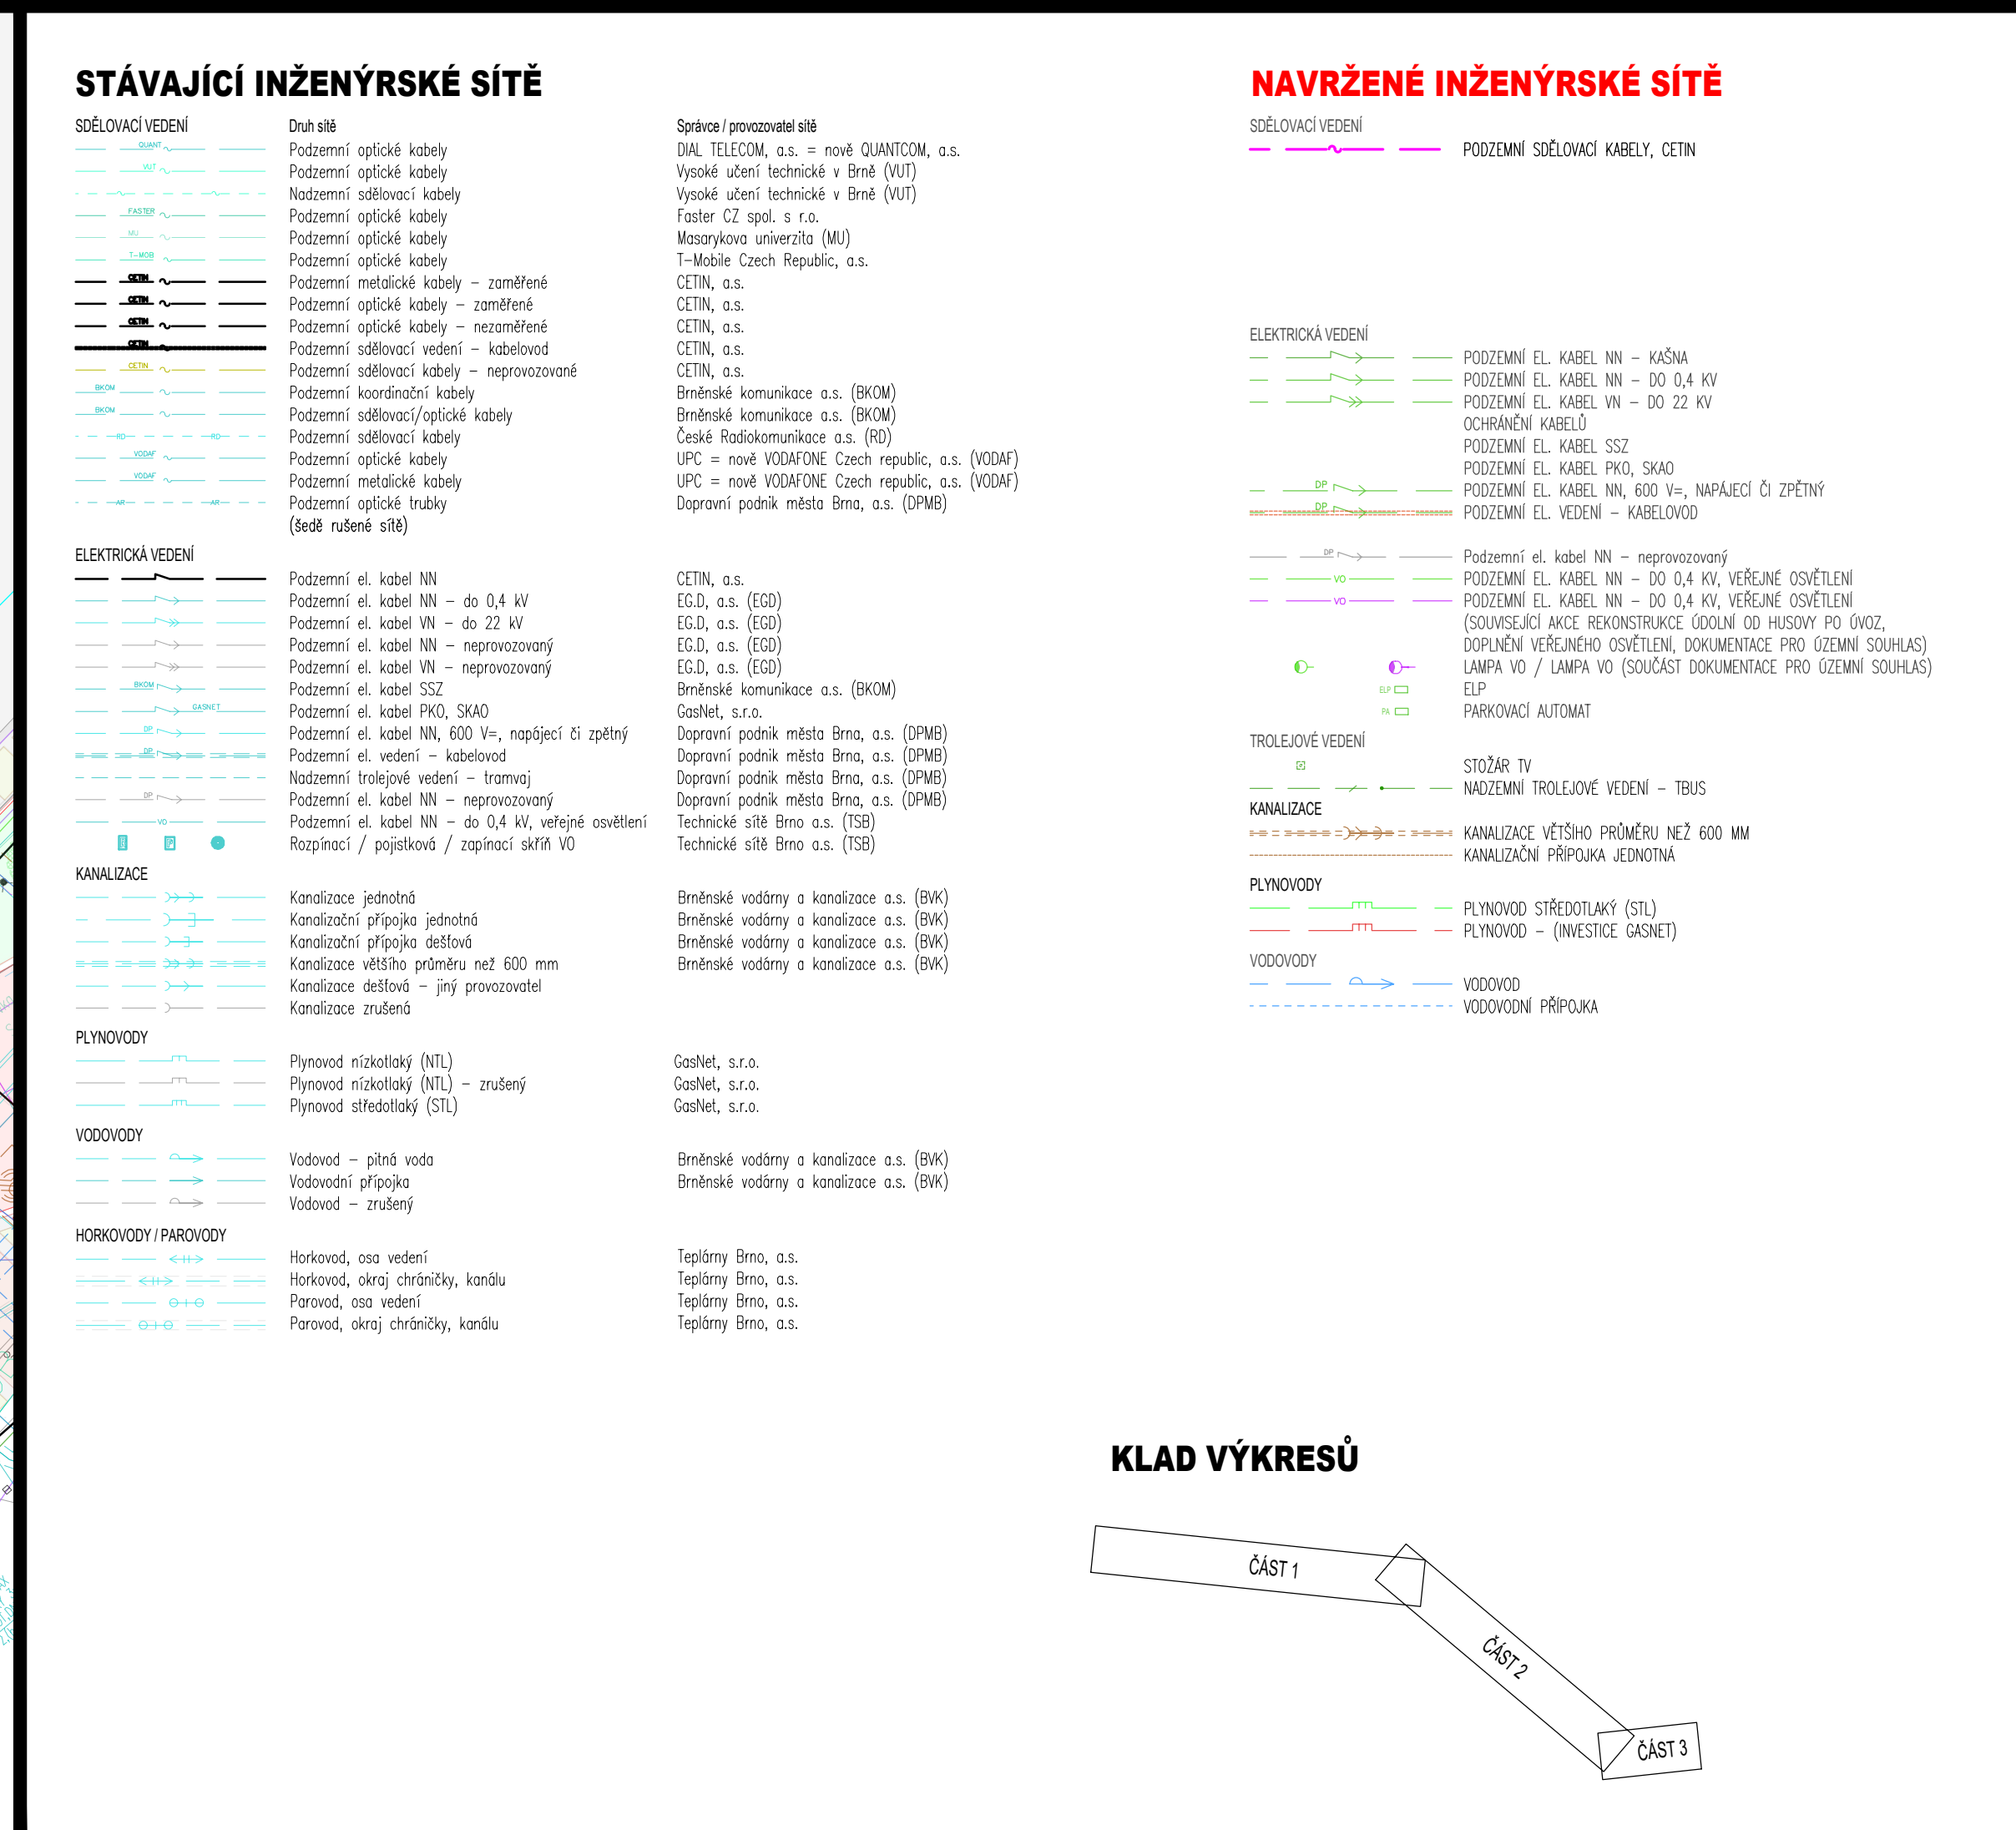

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM B

B | R | N | O |

ZODP. PROJEKTANT	ING. ODRDĚL TICHÝ	 odrděl tichý, ing. s.r.o. IČO: 25220820 www.odrdel-tichy.cz	
VYPRACOVATEL	ING. ODRDĚL TICHÝ		
KONTROLNÍK	ING. ODRDĚL TICHÝ		
KRAJ: JIHOVMORAVSKÝ	KAT. (OZ): MĚSTO BRNO (010303), VÍDEŇSKÝ ÚJEZD (010302), STŘANICE (010301)		
ACETIVITA	VPIC Brno - Rekonstrukce části ul. Údolní		
ČÍSLO PŘÍKAZU		DATUM FORMÁT STUPEŇ PD ČÍSLO ZÁKAZNÍ MĚŘITNO	JEDNA 18.04 CATN 8229540011 1 250
ČÍSLO PŘÍKAZU		ČÍSLO PRÁCE	ČÍSLO PŘÍKAZU 02.1

SO 451 SDĚLOVACÍ KABELY, CETIN


OBJEDNATEL	Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno B R N O 
------------	--

ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ TICHÝ	ondřej tichý, ing. projektová činnost ve výstavbě projektování elektrických zařízení www.projekcetichy.cz		
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ TICHÝ			
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ TICHÝ			
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	KAT. ÚZ.: MĚSTO BRNO [610003], VEVEŘÍ [610372], STRÁNICE (610330)		DATUM	08/2024
AKCE/STAVBA VPIC Brno -Rekonstrukce části ul. Údolní			FORMÁT	6 A4
			STUPEŇ PD	CATN
			ČÍSLO ZAKÁZKY	69356/24/0011
			MĚŘÍTKO	1 : 20
ČÁST PD/PŘÍLOHA VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD/PŘÍLOHY 03

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ MÍSTNÍCH KABELŮ V CHODNÍKU


REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ OD HUSOVY PO ÚVOZ

M 1:20

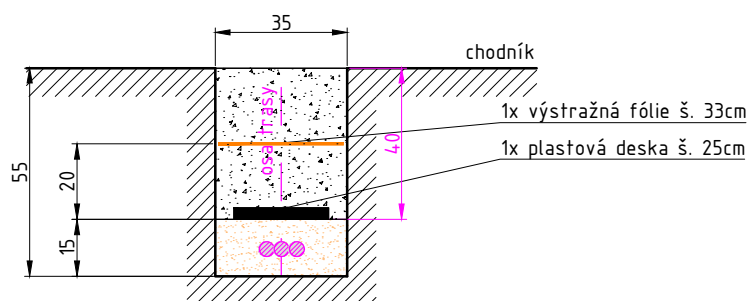

MÍSTNÍ SDĚLOVACÍ KABELY

LEGENDA:



ZEMINA TŘ.1 (dle ČSN 73 61 33).
ZBYTKOVÝ JÍL SE PO POLOŽENÍ
INŽ. SÍTÍ ULOŽÍ NA SKLÁDKU.
+ KONSTRUKCE CHODNÍKU



PÍSKOVÉ LOŽE.




OKOLNÍ ZEMINA.

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ OPTICKÝCH KABELŮ V CHODNÍKU


REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ OD HUSOVY PO ÚVOZ

M 1:20

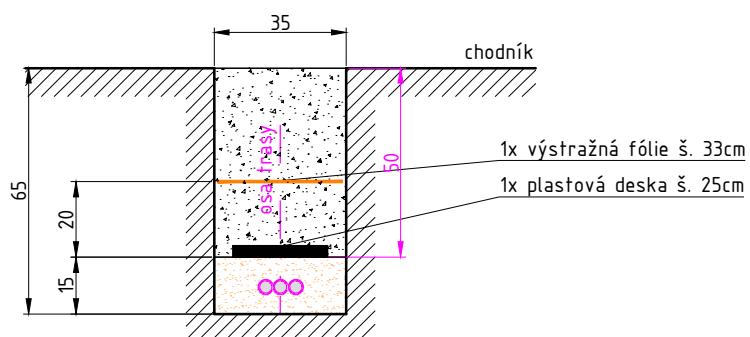

OPTOTRUBKY (PŘÍPADNĚ SOUBĚH S M KABEL Y)

LEGENDA:



ZEMINA TŘ.1 (dle ČSN 73 61 33).
ZBYTKOVÝ JÍL SE PO POLOŽENÍ
INŽ. SÍTÍ ULOŽÍ NA SKLÁDKU.
+ KONSTRUKCE CHODNÍKU



PÍSKOVÉ LOŽE.




OKOLNÍ ZEMINA.

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ MÍSTNÍCH KABELŮ VE VOLNÉM TERÉNU


REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ OD HUSOVY PO ÚVOZ

M 1:20

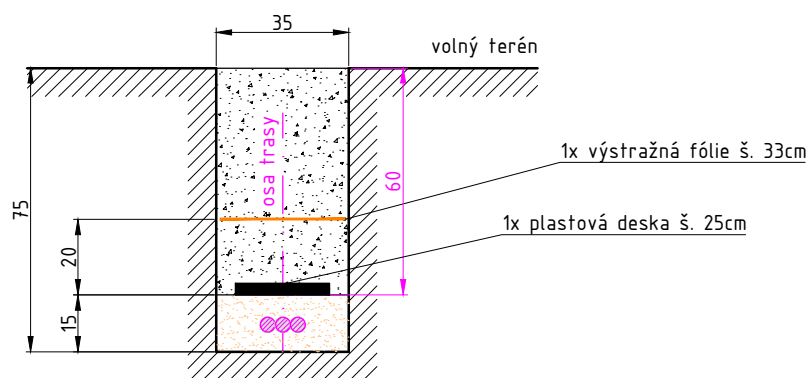

MÍSTNÍ SDĚLOVACÍ KABELY

LEGENDA:



ZEMINA TŘ.1 (dle ČSN 73 61 33).
ZBYTKOVÝ JÍL SE PO POLOŽENÍ
INŽ. SÍTÍ ULOŽÍ NA SKLÁDKU.



PÍSKOVÉ LOŽE.




OKOLNÍ ZEMINA.


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ OPTICKÝCH KABELŮ VE VOLNÉM TERÉNU

REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ OD HUSOVY PO ÚVOZ

M 1:20

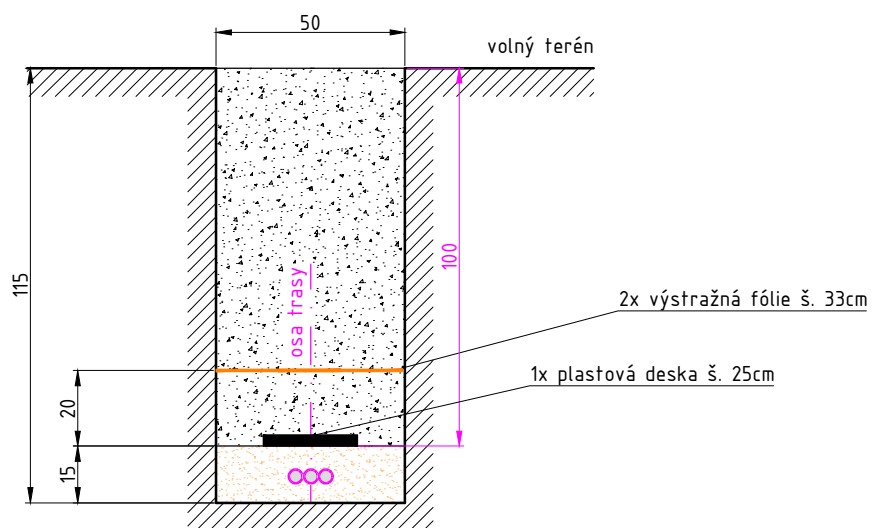

LEGENDA:



ZEMINA TŘ.1 (dle ČSN 73 61 33).
ZBYTKOVÝ JÍL SE PO POLOŽENÍ
INŽ. SÍTÍ ULOŽÍ NA SKLÁDKU.



PÍSKOVÉ LOŽE.




OKOLNÍ ZEMINA.

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ POD KOMUNIKACÍ


REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ OD HUSOVY PO ÚVOZ

M 1:20

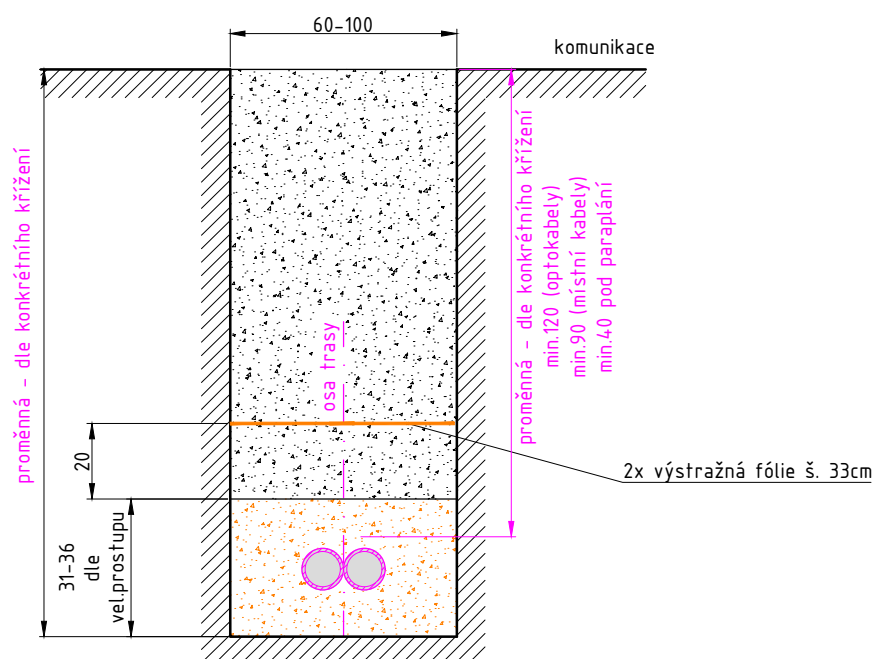


PEØ110-160
počet dle konkrétního křížení
PEØ110-160

LEGENDA:



ZEMINA TŘ.1 (dle ČSN 73 61 33).
ZBYTKOVÝ JÍL SE PO POLOŽENÍ
INŽ. SÍTÍ ULOŽÍ NA SKLÁDKU.





PROSÁTÁ ZEMINA.





OKOLNÍ ZEMINA.


1 - 250

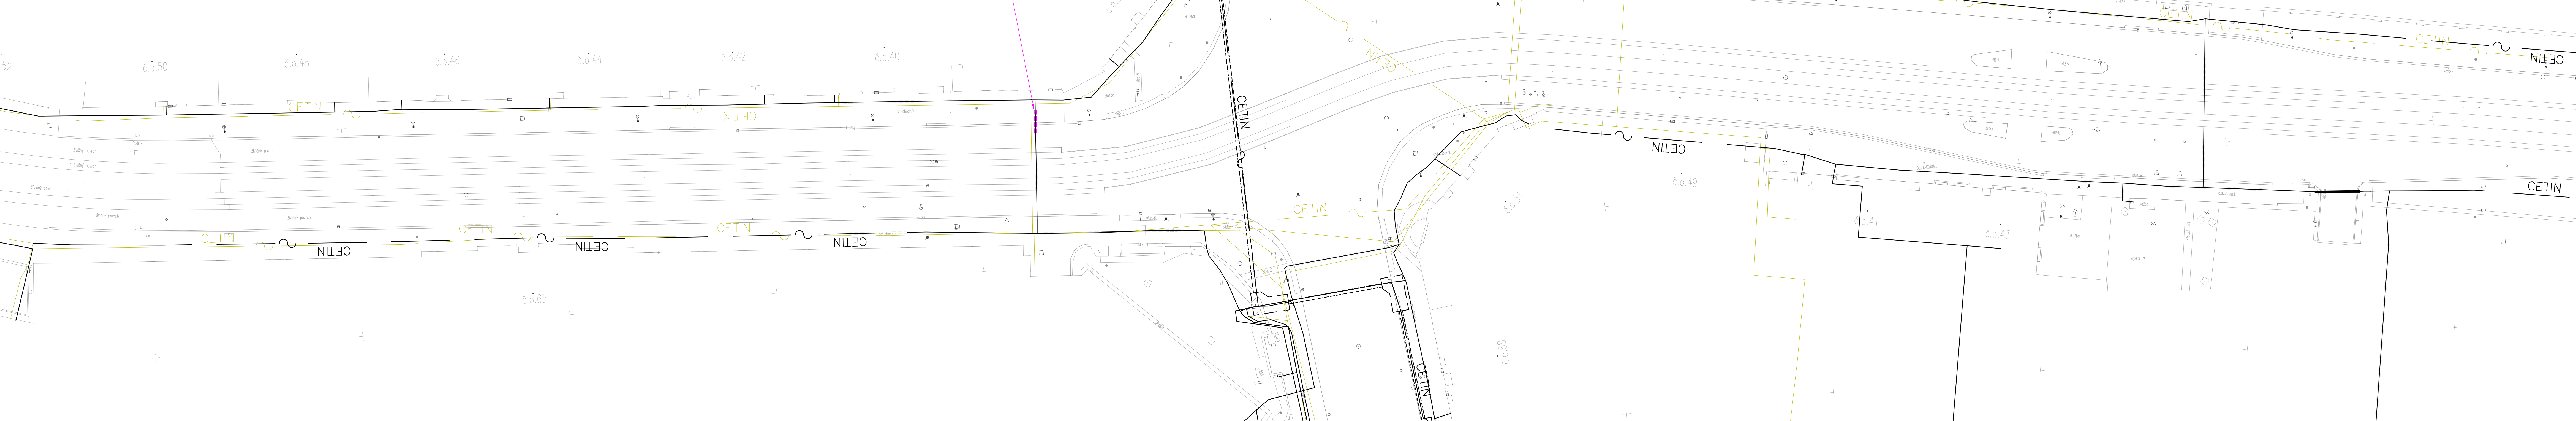

1 - 250

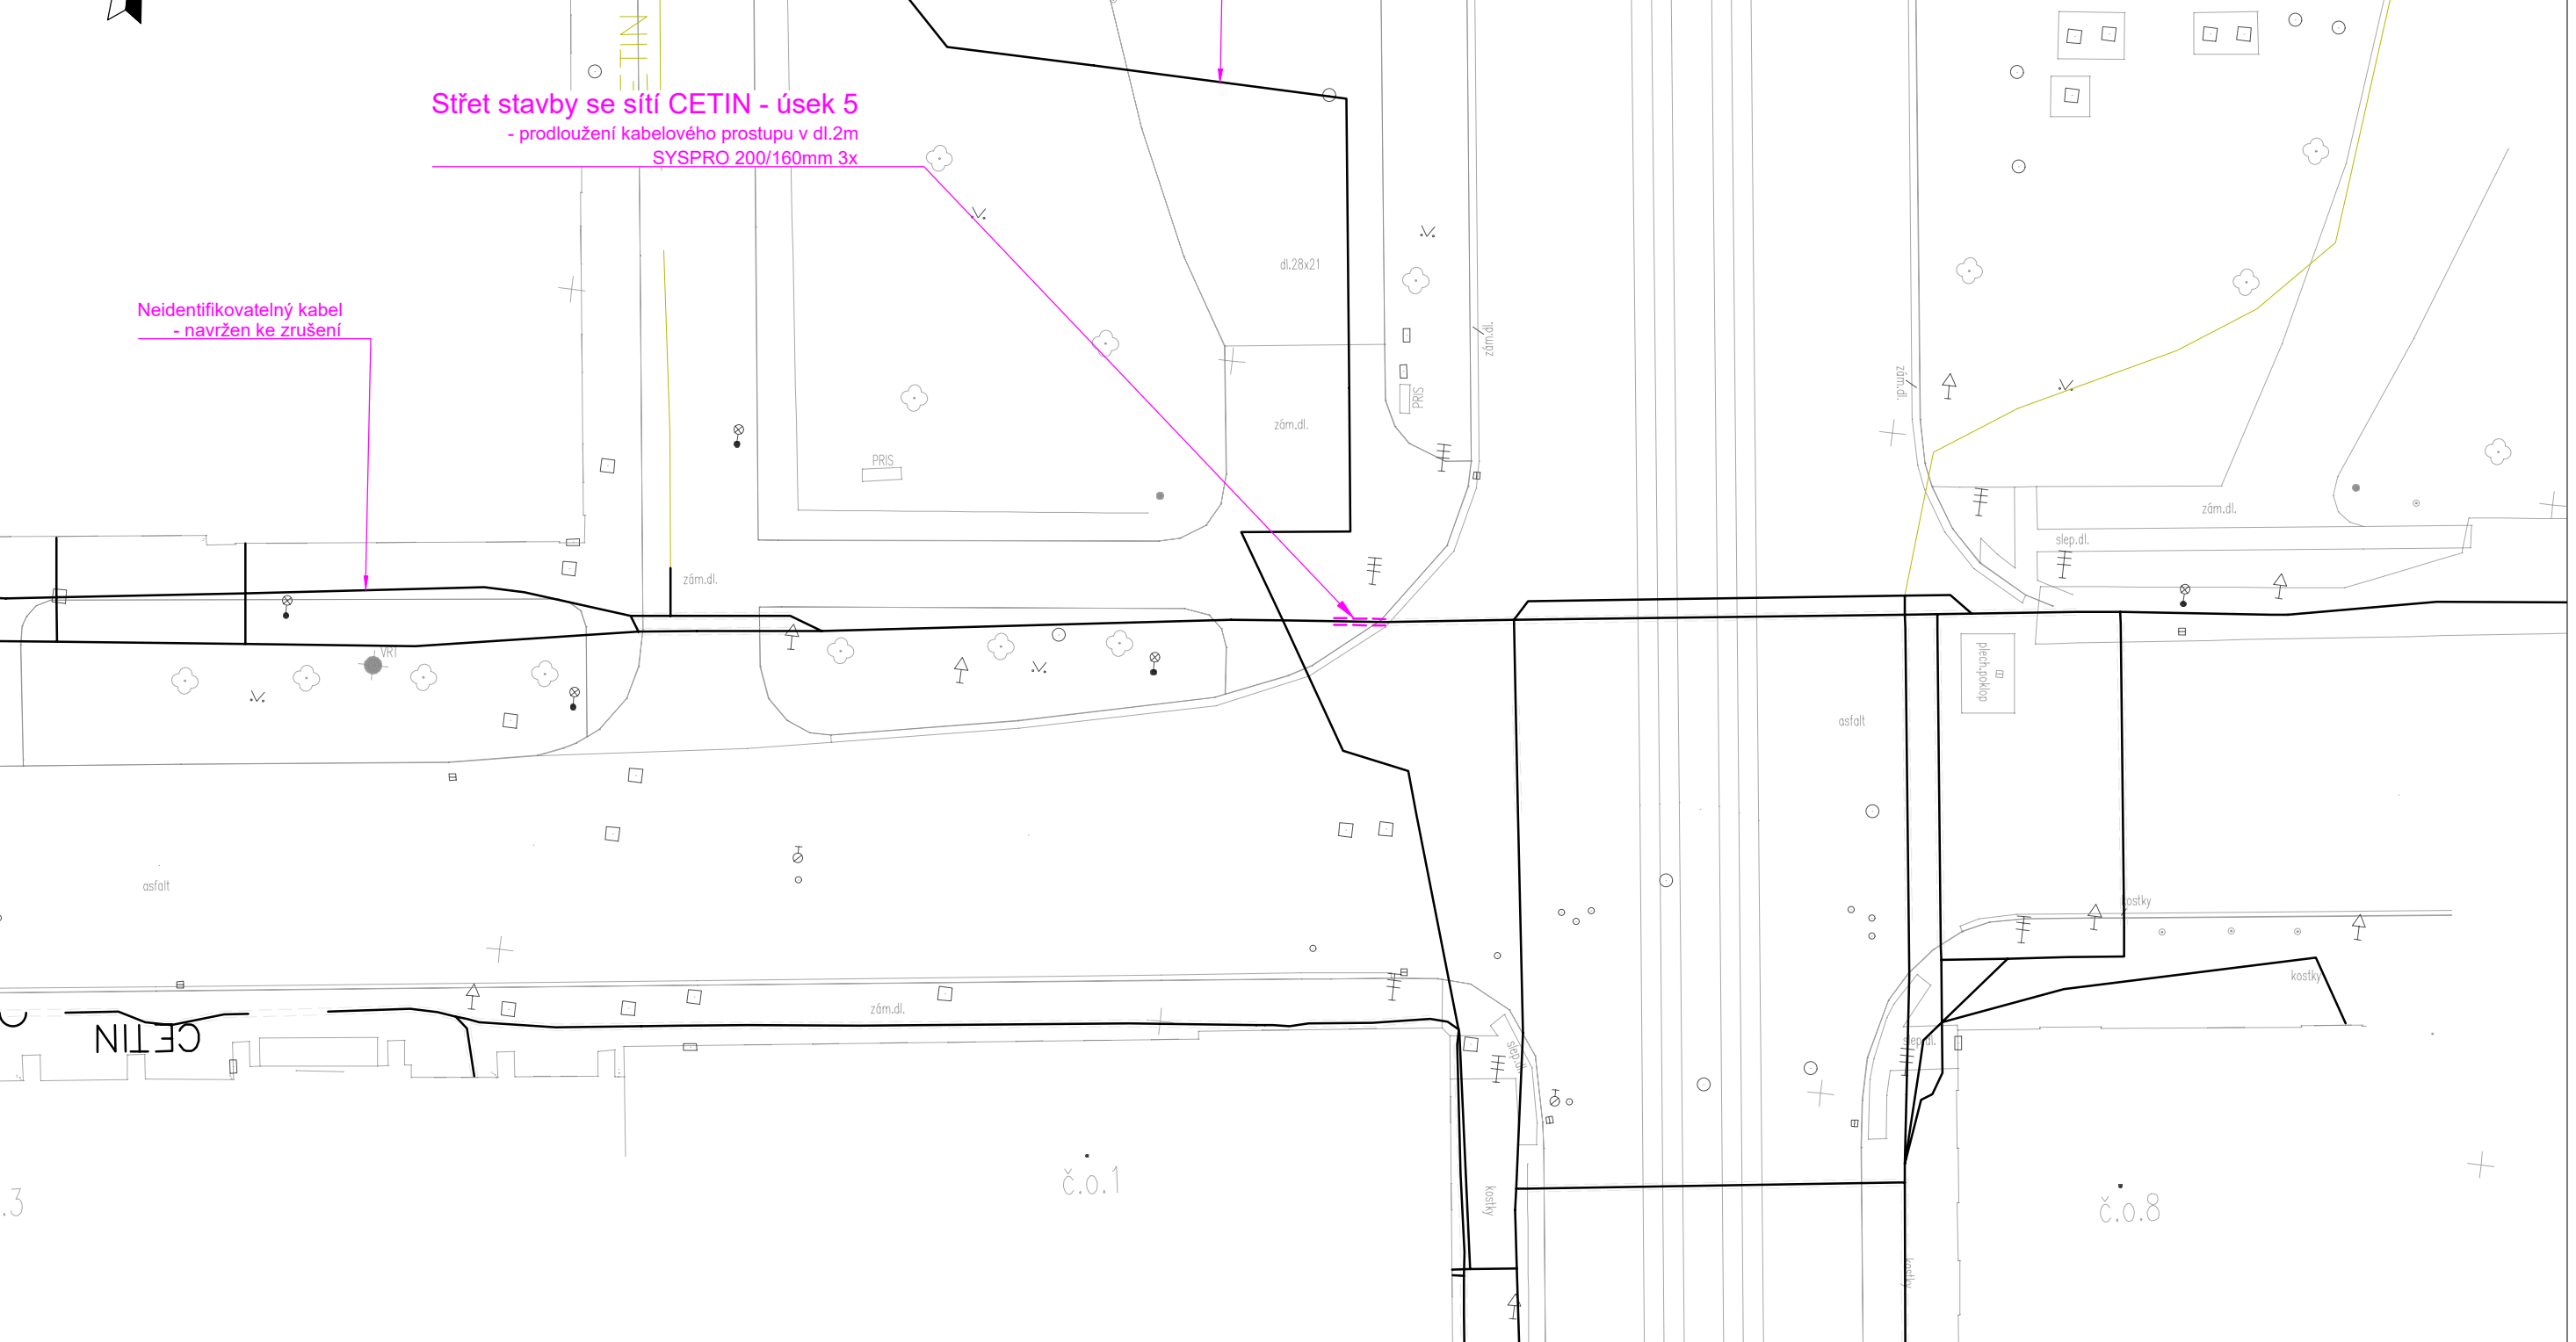


1 - 250

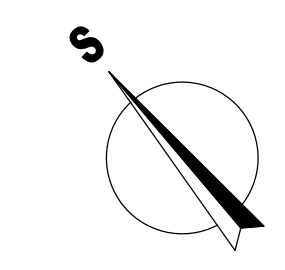

Podzemní optické kabely
Nadzemní sdělovací kabely

_____  _____	Horowod – zrušenj
HOROWODN / PAROWODN	
_____  _____	Horowod, osa wieden
_____  _____	Horowod, okraj chłótnicy, kandy
_____  _____	Parowd, osa wodni
_____  _____	Parowd, okraj chłótnicy, kandy

VÝKRESŮ

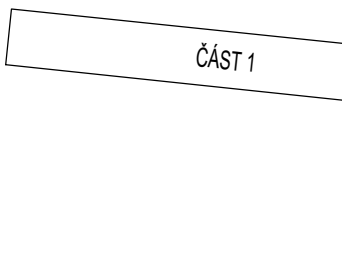

CC BY-NC-ND 4.0 International license.

SOURAD



Statutární město Brno
Dominikánské nám. 195/1, 601 67 Brno

ZODP. PROJEKTANT	ING. ODRDĚJ TICHÝ
PROJEKTOVACÍ	ING. ODRDĚJ TICHÝ
KONTROLOVAL	ING. ODRDĚJ TICHÝ
RAJ. INŽENÝRSKÝ	KAT. (Z. MĚSTO BRNO (B3003), VEŘEJ. (B3372), STŘANICE (B3333)
AKCE/STAVBA	

VPIC Brno - Rekonstrukce části ul. Údolní


PRŮBĚH PRÁCE

SITUACE V ZAMĚŘENÍ

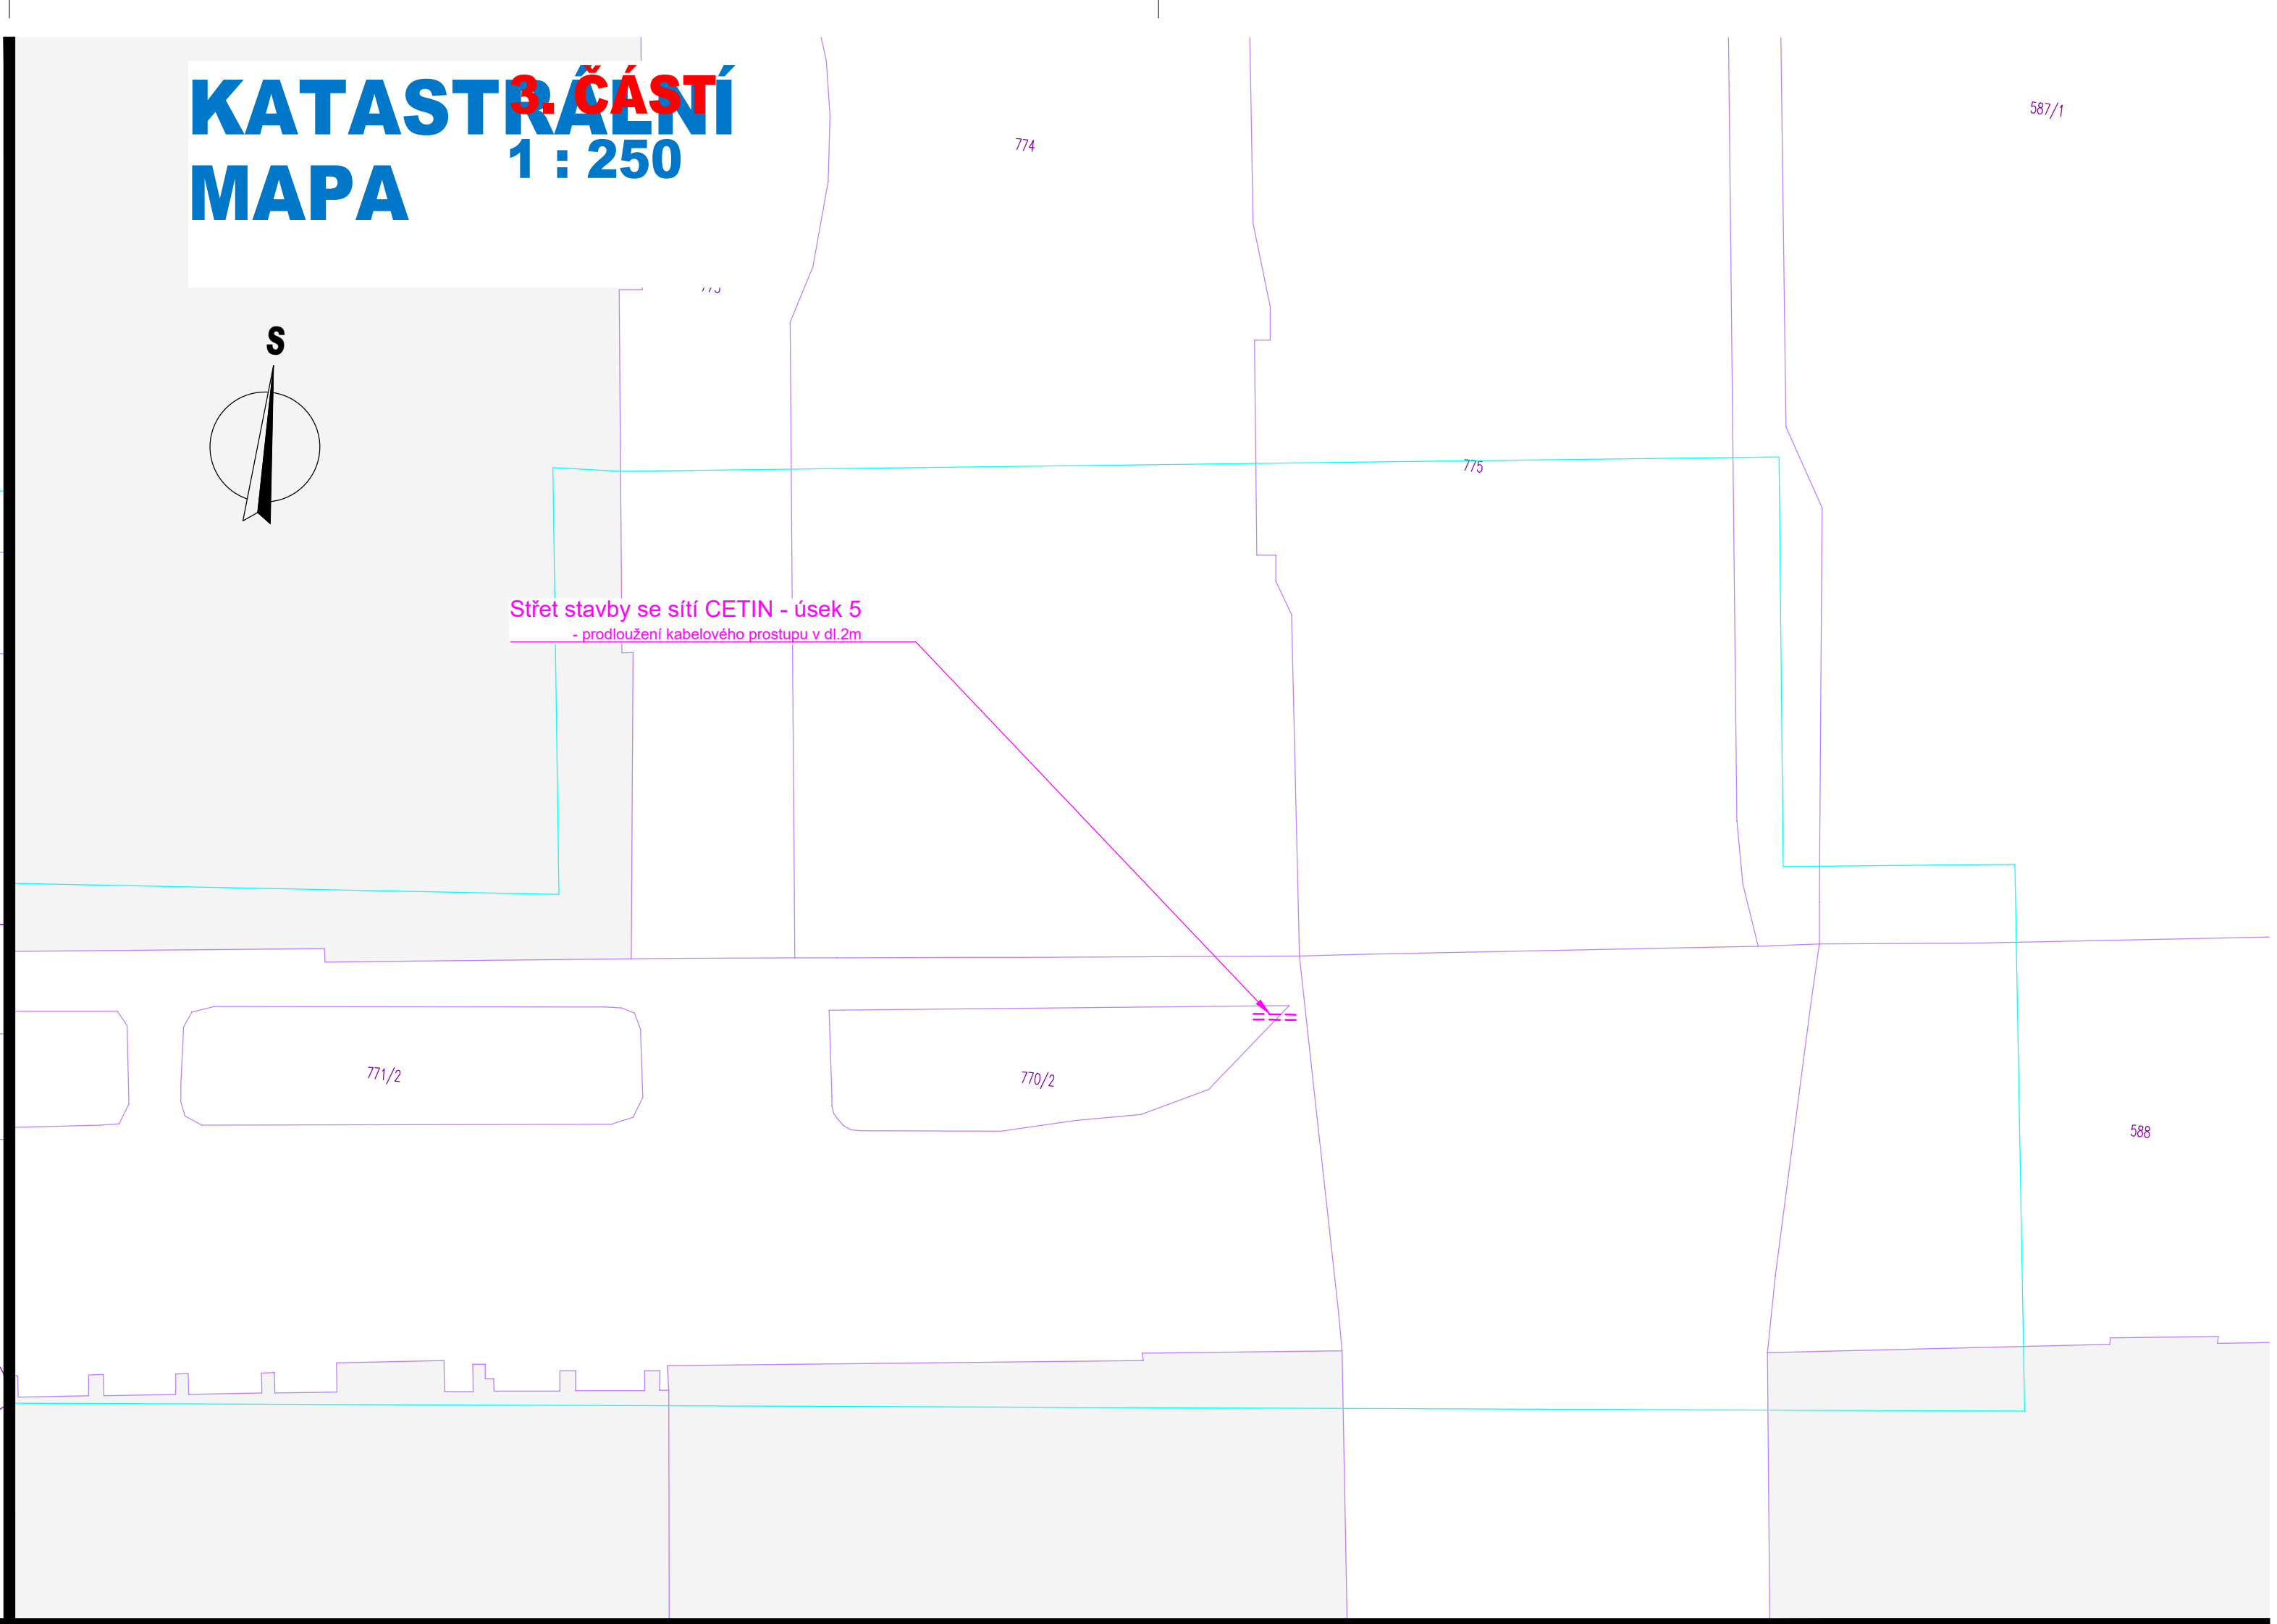

- LEGENDA - KATASTR NEMOVITOSTÍ**
- hranice katastrálního území
 - hranice parcely KN
 - vnitřní členění parcel
 - číslo parcely KN
 - hranice sítě CETIN

KLAD VÝKRESŮ

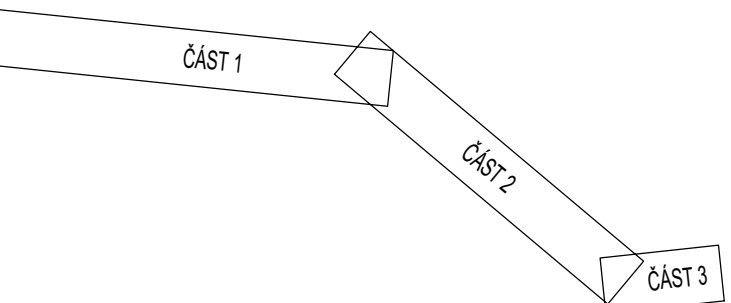

SO 451 SĐELOVACÍ KABELY, CETIN

Statutární město Brno
Dobroslavská nám. 190/1, 601 67 Brno

ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ TICHÝ			
VÝPRAVČILNÍK	ING. ONDŘEJ TICHÝ			
KONTROLNÍK	ING. ONDŘEJ TICHÝ			
KRAJ. PRŮMYSLOVÝ ÚSTAV	KAT. ÚZ. MĚSTO BRNO - BRNO 190/1, 601 67 BRNO			
AKCE/DĚLA				
ČÍSLO DOKUMENTU	03			
ČÍSLO MAPY	03			

Specifikace nákladů dle CTN VPIC Brno -Rekonstrukce části ul. Údolní

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2024.11

Položková 2024.11

Název stavby: **VPIC Brno -Rekonstrukce části ul. Údolní**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s.,

KPO: JMO

HOST: Brno - Kr. Pole

VUJ: Veverží

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	16 151,52 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	652 848,95 Kč
MONTÁŽ	1 188 667,46 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	27 728,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	21 923,33 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	810 555,45 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 2 722 029,12 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	2 692 262,31 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	29 766,81 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	16 151,52 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		160.00 m	4 798,40 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		7626.00 JV	7 626,00 Kč
Kontrola průtočnosti vpustí				
952346 S	Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm		410.00 m	149 658,20 Kč
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70		205.00 m	293 516,95 Kč
954962 S	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm		15.00 m	8 756,70 Kč
954952 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130		5.00 m	14 920,10 Kč
958774 S	Rýha vjezd litý asf. 50/130 rozš.o 10cm		80.00 m	46 899,20 Kč
958773 S	Rýha vjezd litý asfalt 50/130		40.00 m	121 179,60 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		250.00 m	3 810,00 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		10.00 ks	1 683,80 Kč
MONTÁŽ				
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		502.00 m	2 595,34 Kč

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	34.00 ks	7 688,76 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2996.00 ks	156 511,04 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	2738.00 ks	95 255,02 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	17.00 ks	2 070,60 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	17.00 ks	3 844,38 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	2902.00 ks	100 960,58 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	2903.00 ks	126 309,53 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	448950.00 JV	448 950,00 Kč
rozpočtová rezerva			
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	29.00 ks	70 569,18 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	16.00 ks	26 428,48 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	10.00 ks	662,50 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné - kvalifikovaná	5.00 hod.	3 392,00 Kč
Montáž SYSPRO			
952602 S	Montáž trubky úložné	502.00 m	11 415,48 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	227.00 m	6 753,25 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	698.00 m	36 463,52 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	309.00 m	11 318,67 Kč
954993 S	Montáž úložných kabelů nad 300 XN	39.00 m	2 852,07 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	36 804,87 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	7127.85 JV	7 127,85 Kč
náklady na kolaudaci			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	11.00 ks	17 061,00 Kč
958728 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 1 km (ks=10C	6.00 ks	6 467,04 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	7 166,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	15006.00 JV	15 006,00 Kč
Vytýčení nové trasy pro překládku + poplatek EZA, vytýčení hranic pozemků			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	150.00 m	5 107,50 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pev	1.00 ks	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	12 462,06 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	2000.00 JV	2 000,00 Kč
náhrada za VBŘ odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 231,05 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z K	1.00 ks	4 230,22 Kč
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303857 S	Deska krycí plast. 250x1000 mm	410.00 ks	14 579,60 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	215.00 m	900,85 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	290.00 m	1 389,10 Kč
300110 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	105.00 m	29 131,20 Kč
300131 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	45.00 m	45 526,50 Kč

300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	6.00 m	232,44 Kč
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	221.00 m	12 062,18 Kč
300111 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4	79.00 m	41 763,35 Kč
300123 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	90.00 m	104 042,70 Kč
300108 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	41.00 m	3 248,43 Kč
300112 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4	379.00 m	300 308,23 Kč
300113 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,4	39.00 m	40 439,49 Kč
300109 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	133.00 m	18 826,15 Kč
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	135.00 m	39 579,30 Kč
316576 S	Koncovka smršť. SKH V4 27/58 mm	1.00 ks	203,07 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	28.00 ks	7 457,24 Kč
312417 S	Modul konektor. 4000-25P	392.00 ks	22 524,32 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	171.00 ks	4 613,58 Kč
410636 S	Souprava čistící metalic. kabelů - velká	44.00 ks	22 009,24 Kč
315066 S	Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	2.00 ks	597,98 Kč
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	6.00 ks	1 013,88 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	956,12 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	11.00 ks	6 584,93 Kč
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	3.00 ks	2 489,70 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	11.00 ks	9 179,28 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	27.00 ks	1 204,47 Kč
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	8.00 ks	7 358,40 Kč
320295 S	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	10.00 ks	13 816,40 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	10.00 ks	1 324,80 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO	90.00 ks	3 285,00 Kč
319210 S	Trubka dělená SYSPRO 200/160	15.00 m	12 897,15 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	251.00 m	7 499,88 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	251.00 m	7 499,88 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	27.00 ks	23 798,61 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	40.00 m	2 212,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	44.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	18.00 ks	0,00 Kč



Úřad městské části města Brna
Brno-střed

B

R

N

O

Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2020/0123013/ADAM
K podání: MCBS/2020/0001082
Spisová značka: 3200/MCBS/2020/0001082
Oprávněná úřední osoba: ■■■■■ DiS., tel.: ■■■■■

Brno 12.08.2020

Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

Územní řízení pro stavbu nazvanou: „**Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz, Brno**“

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 277

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 03.01.2020 doplněnou (16.06.2020) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „**Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz, Brno**“. Žadatelem je Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, které zastupují Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno.

Stavební úřad posoudil v územním řízení výše uvedenou žádost podle ust. § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle ust. § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona

žadateli, kterým je:

Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

rozhodnutí o umístění stavby

nazvané:

„Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz, Brno“

na pozemcích parc. č. 621, 693, 698/1, 698/2, 703/1, 703/25, 717/1, 717/2, 717/3, 717/4, 719/1, 769, 770/2, 771/1, 771/2, 774, 775, 776/1, 778 v k.ú. Město Brno, obec Brno, dále na pozemcích parc. č. 591, 606 v k.ú. Stránice, obec Brno a na pozemcích parc. č. 458, 479, 480, 503, 504/1, 505, 521, 540, 558 v k.ú. Veveří, obec Brno.

I. vydává podle ust. § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

nazvané:

„Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz, Brno“

na pozemcích parc. č. 621, 693, 698/1, 698/2, 703/1, 703/25, 717/1, 717/2, 717/3, 717/4, 719/1, 769, 770/2, 771/1, 771/2, 774, 775, 776/1, 778 v k.ú. Město Brno, obec Brno, dále na pozemcích parc. č. 591, 606 v k.ú. Stránice, obec Brno a na pozemcích parc. č. 458, 479, 480, 503, 504/1, 505, 521, 540, 558 v k.ú. Veveří, obec Brno,

II. podle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

povoluje kácení dřevin

Jedná se o kácení 10 ks slivoně - *Prunus serrulata* 'Amanogava', 10 ks trnovníku akátu - *Robinia pseudoacacia* a 1 ks líska turecká - *Corylus colurna*, na pozemku par. č. 479, k.ú. Veveří, obec Brno a na pozemcích par. č. 769, 770/2, 771/1 a 771/2, k.ú. Město Brno, obec Brno

a ukládá náhradní výsadbu

7 ks habr obecný (*Carpinus betulus*), 26 ks habr obecný 'Lucas' (*Carpinus betulus* 'Lucas') a 12 ks muchovník stromitý 'Robin Hill' (*Amelanchier arborea* 'Robin Hill').

Obsah stavby

Stavba je navržena od křižovatky ul. Údolní/Husova až po napojení na stávající stav za křižovatkou ul. Údolní/Úvoz směr náměstí Míru (dokončeno v roce 2009).

Jedná se o úpravu jízdních pruhů, doplnění parkovacích stání, zúžení a rozšíření chodníků, rekonstrukci a posunutí tramvajové tratě, úpravu křižovatky ul. Úvoz/Údolní, úpravu a posunutí zastávek, vč. dělicího ostrůvku, vybudování pruhu pro cyklisty. Součástí rekonstrukce jsou dále přeložky inženýrských sítí, výměna veřejného osvětlení, výsadba nových stromů a umístění nového městského mobiliáře.

Stavební objekty, které jsou předmětem územního řízení:

SO 101 Pozemní komunikace - část

SO 102 Chodníky - část

SO 105 Odvodnění

PS 121 SSZ 0.20 Údolní – Husova

PS 122 SSZ 9.02 Úvoz – Údolní

SO 301 Kanalizace

SO 302 Kanalizační přípojky -část

SO 303 Vodovod

SO 304 Vodovodní přípojky - část

SO 401 Kabely VN, EON

SO 402 Kabely NN, EON

SO 403 Přípojka NN, kašna

SO 431 Veřejné osvětlení – přeložka

SO 432 Veřejné osvětlení – doplnění

SO 451 Sdělovací kabely, CETIN

SO 452 Sdělovací kabely, VUT

SO 453 Sdělovací kabely, MU

SO 454 Sdělovací kabely, UPC

SO 455 Sdělovací kabely, T-MOBILE

SO 456 Sdělovací kabely, FASTER

SO 457 Sdělovací kabely, DIAL
SO 501 Plynovod STPE 160, Údolní sudá čísla
SO 502 Plynovod STPE 110, Údolní lichá čísla
SO 661 Tramvajová trať – spodek a svršek (část)
SO 662 Tramvajová trať – zastávky (část)
SO 663 Tramvajová trať – napájecí a zpětné vedení
SO 664 Tramvajová trať – trolejové vedení (část)
SO 666 Tramvajová trať – přípojky NN pro ELP
SO 801 Vegetační úpravy

Součástí stavby jsou stavební úpravy komunikace, drážního tělesa ve stávající trase, úpravy zastávek, výměna kanalizačních a vodovodních přípojek ve stávajících trasách, výměna kabelů veřejného osvětlení ve stávající trase, výměna stožárů, které podle ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžadují územní rozhodnutí, a tudíž nejsou předmětem územního řízení.

Jedná se o stavební objekty:

SO 103 Odstavné a parkovací plochy - není předmětem územního řízení
SO 104 Plochy pro kontejnery na tříděný odpad - není předmětem územního řízení
SO 106 Dopravní značení svislé a vodorovné – není předmětem územního řízení
SO 486 Městský parkovací systém – není předmětem územního řízení
SO 503 Úprava EPD – není předmětem územního řízení
SO 665 Tramvajová trať – sdělovací zařízení – ELP – není předmětem územního řízení
SO 901 Městský mobiliář – není předmětem územního řízení

Předmětem řízení je:

SO 101 Pozemní komunikace – Úprava křižovatky ul. Údolní/Úvoz spočívá v úpravě, reagující především na nové uspořádání a zastávky tramvajové tratě. Před křižovatkou s Úvozem bude chodník a zastávková plocha vpravo rozšířena na 3,78 m, osová vzdálenost kolejí TT je rozšířena na 3,50 m, vlevo je vložen zastávkový ostrůvek šířky 2,25 m, podél ostrůvku je navržen jízdní pruh šířky 3,50 m, chodník na levé straně je zúžen na 2,90 m. Budou upraveny oblouky nároží křižovatky, které napojují ul. Údolní na Úvoz, šířkové uspořádání v Úvoze je stávající. Za křižovatkou směrem do centra je na pravé straně nově vložen chodník šířky 1,80 m, provoz individuální dopravy je veden po TT, osová vzdálenost TT je rozšířena na 3,50 m. Vlevo je stejně jako ve stávajícím stavu navržen odbočovací pruh pro odbočení doleva šířky 3,00 m, jízdní pruh přímý a pro odbočení doprava je navržen šířky 3,25 m. Chodník na levé straně je zúžen na 2,55 m. Novému stavu budou přizpůsobeny nároží křižovatky s Úvozem, šířkové uspořádání na Úvoze je stávající. V odstupu cca 77 m od hranice křižovatky směrem do centra je navrženo místo pro přecházení, kryté bezpečnostním ostrůvkem šířky 2,75 m. Úprava se nachází na pozemcích par. čís. 479, 480, 521, 540, k.ú. Veveří, obec Brno, dále na pozemcích par. čís. 591, 606, k.ú. Stránice, obec Brno a na pozemcích par. čís. 693, 698/1, k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 102 Chodníky – za křižovatkou s Úvozem ve směru do centra je doplněn chodník šířky min. 1,75 m před objekty č.o. 49 a 51 na pozemku par. čís. 698/1, k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 105 Odvodnění – odvodnění komunikace je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí a kolejových odvodňovačů tramvajové trati. Uliční vpusti resp. jejich přípojky budou napojeny do rekonstruovaných jednotných stok. Do přípojek ul. vpustí budou zapojeny drenáže vozovek. Odvodnění je umístěno na pozemcích parc. č. 621, 693, 698/1, 698/2, 703/1, 703/25, 717/1, 717/2, 717/3, 717/4, 719/1, 769, 776/1, 778 v k.ú. Město Brno, obec Brno, dále na pozemcích parc. č. 591, 606 v k.ú. Stránice, obec Brno a na pozemcích parc. č. 458, 479, 480, 503, 505, 521, 540 v k.ú. Veveří, obec Brno.

PS 121 SSZ 0.20 Údolní – Husova – jedná se o úpravu polohy dvou indukčních smyček světelného signalizačního zařízení na křižovatce ul. Husova/Údolní na pozemku par. čís. 769, k.ú. Město Brno, obec Brno.

PS 122 SSZ 9.02 Úvoz – Údolní – jedná se o úpravu světelného signalizačního zařízení na křižovatce ul. Úvoz/Údolní. V rámci úpravy budou přemístěny do nových poloh stožáry SSZ č. 2 a 9. Úprava dále zahrnuje HW a SW úpravu řadiče SSZ, tři chodecké stožáry, tři stožárové svorkovnice, pokládku devíti indukčních smyček, kabelových rozvodů ke stožárům a indukčním smyčkám, tři nová návěstidla a svody k návěstidlům. Objekt se nachází na pozemcích par. čís. 479, 480, 521, 540, k.ú. Veverčí, obec Brno, na pozemku par. čís. 591 a 606, k.ú. Stránice, obec Brno a na pozemku par. čís. 698/1, k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 301 Kanalizace – v rámci rekonstrukce kanalizace bude provedena i rekonstrukce kanalizačních přípojek a to od místa napojení na stoku až po hranici nemovitostí.

- *Rekonstrukce stoky úsek Joštova – Obilní trh* – stoka DN 1200/1800 (Š1631033 – Š6) z vejčitých polymer betonových trub v délce 236,00 m. Stoka bude umístěna pod tělesem rekonstruované tramvajové trati a to tak, aby vstupy revizních šachet byly umístěny právě uprostřed tělesa tramvajové trati. Do rekonstruované stoky bude napojena stoka profilu DN 600/900 u ul. Obilní trh (úsek Š6 – Š62) v délce 38,00 m, umístěná 8,60 m od sousedních pozemků par. čís. 748, 734, 725, k.ú. Město Brno, obec Brno a 10,10 m od pozemku par. čís. 481, k.ú. Veverčí obec, Brno.
- *Úsek Obilní trh – Úvoz* – rekonstrukce stoky DN 1000/1500 od Š6 po šachtu Š16 z vejčitých polymer betonových trub v celkové délce 356,5m. Stoka DN 600/900 (Š16 – Š161) z vejčitých betonových trub s čedičovým žlábkem v délce 31,0m. Stoka DN 500/750 (Š16 – Š162) z vejčitých betonových trub s čedičovým žlábkem v délce 30,0 m, umístěná 5,90 m od sousedních pozemků par. čís. 724, 699, 697 a 12,66 m od pozemku 514, k.ú. Veverčí, obec Brno.
- *úsek Úvoz – Údolní 52* – rekonstrukce stoky DN 800/1200 (Š16 – Š35059) z vejčitých betonových trub s čedičovým žlábkem, v délce 159,00 m. Stoka bude umístěna pod tělesem rekonstruované tramvajové trati a to tak, aby vstupy revizních šachet byly umístěny právě uprostřed tělesa tramvajové trati. Stoka je umístěná 5,90 m od sousedního pozemku par. čís. 601, k.ú. Veverčí, obec Brno.
- *úsek Husova – Joštova* – rekonstrukce stoky DN 400 (Š30 – Š1) z kameninových trub v délce 233,70 m, umístěná od sousedních pozemků par. čís. 623 - 6,17 m, p.č. 766 - 7,90 m a od p.č. 753 - 8,39 m, k.ú. Město Brno, obec Brno.

Kanalizace se nachází na pozemcích par. čís. 458, 479, 480, 503, 521, 540, k.ú. Veverčí, obec Brno, na pozemku par. čís. 606, k.ú. Stránice, obec Brno a na pozemcích par. čís. 769, 778, k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 302 Kanalizační přípojky – Jedná se o rekonstrukci kanalizačních přípojek od místa napojení na stoku až po hranici nemovitosti. Kanalizační přípojky budou provedeny z obetonované kameniny příslušných profilů. Jedná se pouze o přípojky, které nebudou ve směru toku.

SO 303 Vodovod – rekonstrukce vodovodu – objekt je rozdělen na úseky:

- *Joštova – Obilní trh* – rekonstrukce vodovodu I profilu DN 300 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozi ochranou PE povlakem) bude probíhat od stávajícího vodovodu profilu DN 300 nacházejícího se v křižovatce Údolní/Joštova až po stávající vodovod profilu DN 300 nacházející se před nemovitostí Marešova 16 s celkovou délkou 31,00 m. Vodovod II profilu DN 200 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozi ochranou PE povlakem) bude probíhat od rekonstruovaného vodovodu I až po rekonstruovaný vodovod IV profilu DN 200, který se nachází v ul. Údolní (úsek Obilní trh – Úvoz). Vodovod III profilu DN 200 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozi ochranou PE povlakem) bude probíhat

od rekonstruovaného vodovodu II až po stávající vodovod profilu DN 200, který se nachází v ul. Obilní trh s celkovou délkou 30,00 m. Vodovod je umístěný od sousedních pozemků par. čís. 748 - 13,58 m, p.č. 734 - 13,26 m, p.č. 725 - 13,60 m, k.ú. Město Brno, obec Brno a 5,50 m od pozemku par. čís. 481, k.ú. Veveří obec, Brno.

- *Obilní trh – Úvoz* – rekonstrukce vodovodu IV profilu DN 200 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozií ochranou PE povlakem) bude probíhat od rekonstruovaného vodovodu II až po rekonstruovaný vodovod VI resp. VII, který se nachází v ul. Úvoz v celkové délce 362,58 m. Rekonstrukce vodovodu V profilu DN 200 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozií ochranou PE povlakem) bude probíhat od rekonstruovaného vodovodu IV až po stávající vodovod profilu DN 200, který se nachází v ul. Obilní trh v celkové délce 16,64 m. Rekonstrukce vodovodu VI profilu DN 200 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozií ochranou PE povlakem) bude probíhat od rekonstruovaného vodovodu IV až po stávající vodovod profilu DN 200, který se nachází v ul. Úvoz v celkové délce 19,00 m. Rekonstrukce vodovodu VII profilu DN 150 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozií ochranou PE povlakem) bude probíhat od rekonstruovaného vodovodu IV až po stávající vodovod profilu DN 150, který se nachází v ul. Úvoz v celkové délce 15,00 m. Umístěná 11,70 m od sousedních pozemků par. čís. 724, 699 - 10,57 m, 697 - 10,57 m, 514 - 8,04 m, k.ú. Veveří, obec Brno.
- *Úvoz – Údolní 52* – rekonstrukce vodovodu VIII profilu DN 100 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozií ochranou PE povlakem) bude probíhat od rekonstruovaného vodovodu IV, který se nachází na ul. Úvoz až po stávající vodovod profilu DN 100 nacházejícího se v ul. Údolní v celkové délce 152,21 m. Vodovod je umístěný 11,21 m od sousedního pozemku par. čís. 601, k.ú. Veveří, obec Brno.
- *Husova – Joštova* – rekonstrukce vodovodu IX profilu DN 300 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozií ochranou PE povlakem) bude probíhat od stávajícího vodovodu profilu DN 300, který vede k hradu Špilberk v celkové délce 106,79 m. Rekonstrukce vodovodu X profilu DN 150 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozií ochranou PE povlakem) bude probíhat od stávajícího vodovodu profilu DN 150, který se nachází v ul. Údolní až po rekonstruovaný vodovod IX profilu DN 300 v celkové délce 95,13 m. Rekonstrukce vodovodu XI profilu DN 250 (tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou protikorozií ochranou PE povlakem) bude probíhat od stávajícího vodovodu profilu DN 250, který se nachází v ul. Solniční až po rekonstruovaný vodovod IX profilu DN 300 v celkové délce 93,17 m. Vodovod je umístěný od sousedních pozemků par. čís. 623 - 4,47 m, p.č. 766 - 10,03 m a od p.č. 761 - 9,83 m, k.ú. Město Brno, obec Brno.

Vodovod se nachází na pozemcích par. čís. 480, 521, 540, k.ú. Veveří, obec Brno a na pozemku par. čís. 769, k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 304 Vodovodní přípojky – jedná se o novou přípojku DN 150, pomocí které bude napojena nová kašna na pozemku par. čís. 769, k.ú. Město Brno, obec Brno. Přípojka je délky 7,60 m.

SO 401 Kabely VN, EON – jedná se o přeložku stávajícího kabelového vedení VN do nové polohy, která je vyvolaná výstavbou nových podélných parkovacích stání. První přeložka bude před domy č.o. 24 a 26 v délce 38,0 m, na pozemku par. čís. 479, k.ú. Veveří, obec Brno, která je umístěná 2,12 m od hranice se sousedními pozemky par. čís. 477 a 481, k.ú. Veveří obec Brno. Druhá přeložka bude před domy č.o. 6 a 8 v délce 42,0 m. Přeložka se nachází na pozemku par. čís. 479, k.ú. Veveří, obec Brno a je umístěná 0,36 m od hranice se sousedními pozemky par. čís. 462/1 a 463/1, k.ú. Veveří, obec Brno.

SO 402 Kabely NN, EON – jedná se o přeložku stávajícího kabelového vedení NN do nové polohy, která je vyvolána výstavbou nových podélných parkovacích stání. První přeložka bude vedena v chodníku před domy č.o. 24 a 26 v délce 38,0 m, na pozemku par. čís. 479, k.ú. Veveří,

obec Brno, která je umístěná 2,12m od hranice se sousedními pozemky par. čís. 477 a 481, k.ú. Veveří obec Brno.

Druhá přeložka bude před domy č.o. 6 a 8 v délce 42,0 m. Přeložka se nachází na pozemku par. čís. 479, k.ú. Veveří, obec Brno a je umístěná 0,36 m od hranice se sousedními pozemky par. čís. 462/1 a 463/1, k.ú. Veveří, obec Brno.

SO 403 Přípojka NN, kašna – jedná se o přípojku NN ze stávající distribuční sítě, kterou bude využívat nový vodní prvek v upraveném prostoru před objektem č.o. 5. Kabele budou uloženy v chodníku ve výkopu, v zeleni a pod poježděnými plochami, kde budou uloženy do chrániček. Přípojka se nachází na pozemku par. čís. 769, k.ú. Město Brno, obec Brno a je celkové délky 26,0 m.

SO 431 Veřejné osvětlení – přeložka – jedná se o novou trasu veřejného osvětlení tvořenou kabelem 1-CYKY-J 4x16 mm, který bude po celé trase uložen do chráničky. Společně s kabelem bude do výkopu uložen zemnicí drát FeZn pr. 10 mm.

Trasa 1 - bude napojena na stávající kabel, vybudovaný v rámci předchozí etapy (za křižovatkou Údolní/Úvoz směr nám. Míru). Nový kabel povede souběžně s komunikací až po křižovatku ul. Údolní/Úvoz. Přeložka je umístěna na pozemku par. čís. 591, k.ú. Stránice, obec Brno.

Trasa 2 – vede z rozvodné skříně na pozemku par. čís. 717/1, k.ú. Město Brno, obec Brno, napříč komunikací - pozemek par. čís. 480, k.ú. Veveří, obec Brno, až do rozvodné skříně na pozemku par. čís. 504/1, k.ú. Veveří, obec Brno.

Trasa 3 – vede z pozemku par. čís. 771/1, k.ú. Město Brno, obec Brno, přes pozemky 769, 771/2 na pozemek par. čís. 770/2, vše k.ú. Město Brno, obec Brno.

Trasa 4 – vede na pozemku par. čís. 769, k.ú. Město Brno, obec Brno. Kabel je veden od úrovně hranic pozemků par. čís. 753 a 754, k.ú. Město Brno, pokračuje podélně, následně přechází kolmo přes vozovku a napojuje se na stávající stožár na protější straně.

SO 432 Veřejné osvětlení – doplnění – jedná se o doplnění jednoho svítidla na nový trakční sloup u křižovatky s ul. Obilní trh, doplnění 3 nových sloupů výšky 10,0 m, osazení dvou nových svítidel, které osvětlí nový přechod v křižovatce ul. Údolní/Joštova a 2 nových sadových sloupů VO v zeleni. Nové sloupy se nachází na pozemcích par. čís. 771/1, 771/2, 770/2, 769, k.ú. Město Brno, obec Brno a na pozemku par. čís. 591, k.ú. Stránice, obec Brno.

SO 451 Sdělovací kabely, CETIN – jedná se o přeložky místních i optických kabelů v 5 úsecích.

Úsek č. 1 – v prostoru před křižovatkou ulice Údolní a Úvoz u č. o. 38. Na stávajících kabelech bude nutno prodloužit stávající kabelový prostup v dl. 3 m, z důvodu rozšíření komunikace a změně jejího uspořádání. Přeložka je na pozemku par. čís. 540, k.ú. Veveří, obec Brno.

Úsek č. 2 – na pravé straně ul. Údolní mezi č.o. 29 – 11. Přeložka bude provedena v délce 184 m novými kabely. Na začátku a na konci přeložky bude provedeno přepojení kabelů pomocí zemních smršťovacích spojek. Přeložka je umístěna na pozemku par. čís. 769, k.ú. Město Brno, obec Brno.

Úsek č. 3 – na pravé straně ul. Údolní mezi č.o. 7 – 5. Přeložka bude provedena v délce 28 m novými kabely. Na začátku a na konci přeložky bude provedeno přepojení kabelů pomocí zemních smršťovacích spojek. Přeložka je umístěna na pozemku par. čís. 769, k.ú. Město Brno, obec Brno.

Úsek č. 4 – na levé straně ul. Údolní u č. o. 13. Přeložka bude provedena v délce 33 m novými kabely. Na začátku a na konci přeložky bude provedeno přepojení kabelů pomocí zemních smršťovacích spojek. Přeložka je umístěna na pozemku par. čís. 769 a 771/1, k.ú. Město Brno, obec Brno.

Úsek č. 5 – v prostoru křižovatky ulic Údolní a Komenského náměstí. Na stávajících kabelech bude nutno prodloužit stávající kabelový prostup v dl. 2 m z důvodu rozšíření komunikace a změně jejího prostorového uspořádání. Prodloužení prostupu bude provedeno dělenou

chráničkou PE 160/110 mm. Přeložka je umístěna na pozemku par. čís. 769, k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 452 Sdělovací kabely, VUT – jedná se o přeložky optických sdělovacích kabelů ve 2 úsecích. K prvnímu střetu dojde v prostoru kolem zdi fakultní porodnice Obilní trh na levé straně ul. Údolní. Přeložka bude provedena v délce 137 m na nové kombinované trakční stožáry. Pro přeložku bude použit nový kabel odpovídajícího profilu, ukotven bude na stožáry pomocí systémových kotevních armatur. Na začátku a na konci přeložky budou instalovány hrncové optické spojky.

K druhému střetu dojde v místě křížení stávající trasy zemního optického kabelu s ul. Údolní mezi č.o. 22 – 31. Přeložka bude provedena novými optotrubkami v délce 32 m v nové trase. Pro přeložku bude použit stávající optický kabel, který bude přefouknut do nových trubek a uložen do chráničky. Optotrubky budou naspojovány spojkami PLASSON SPP40. Přeložka je umístěna na pozemcích par. čís. 479 a 480, k.ú. Veveří, obec Brno.

SO 453 Sdělovací kabely, MU – jedná se o přeložky optických sdělovacích kabelů ve dvou úsecích.

K prvnímu střetu dojde v místě budovy VUT na pravé straně ul. Údolní. Přeložka bude provedena novými optotrubkami v délce 55 m v nové trase. Na přeložku bude použit stávající optický kabel, který bude přefouknut do nových trubek. Přeložka je umístěna na pozemku par. čís. 591, k.ú. Veveří, obec Brno.

K druhému střetu dojde na levé straně ul. Údolní mezi č.o. 26 – 4. Přeložka bude provedena novými optotrubkami v délce 208 m v nové trase. K přeložce bude použit stávající optický kabel, který bude přefouknut do nových trubek. Pod komunikací budou optotrubky uloženy do chráničky. Přeložka je umístěna na pozemcích par. čís. 479, 480 a 769 k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 454 Sdělovací kabely, UPC – jedná se o přeložky místních i optických sdělovacích kabelů ve třech úsecích.

K prvnímu střetu dojde v prostoru před křižovatkou ulic Údolní a Úvoz u č.o. 38. Na stávajících kabelech bude nutno prodloužit stávající kabelový prostup v délce 3 m z důvodu rozšíření komunikace a změně jejího prostorového uspořádání. Prodloužení prostupu bude provedeno dělenou chráničkou PE 160/110 mm.

K druhému střetu dojde na levé straně ul. Údolní mezi č.o. 24 – 4. Přeložka bude provedena v délce 176 m novými kabely. Na začátku a na konci přeložky bude provedeno přepojení kabelů pomocí zemních smršťovacích spojek. Optotrubky budou naspojovány spojkami PLASSON SPP40. Přeložka je umístěna na pozemcích par. čís. 479, 480, k.ú. Veveří, obec Brno a pozemku par. čís. 769 k.ú. Město Brno, obec Brno.

K třetímu střetu dojde na pravé straně ul. Údolní mezi č.o. 29 – 13. Přeložka bude provedena v délce 141 m novými kabely. Na začátku a na konci přeložky bude provedeno přepojení kabelů pomocí zemních smršťovacích spojek. Optotrubky budou naspojovány spojkami PLASSON SPP40. Přeložka je umístěna na pozemku par. čís. 769 k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 455 Sdělovací kabely, T-MOBILE – jedná se o přeložky optických sdělovacích kabelů ve dvou místech.

Úsek č. 1 je v prostoru za křižovatkou ulic Údolní a Obilní trh u č.o. 37. Na stávajících kabelech bude nutno prodloužit stávající kabelový prostup v délce 4 m z důvodu rozšíření komunikace a změně jejího prostorového uspořádání. Prodloužení prostupu bude provedeno dělenou chráničkou PE 160/110 mm.

Úsek č. 2 je na levé straně ul. Údolní mezi č.o. 24 – 16. Přeložka bude provedena novými optotrubkami v délce 80 m v nové trase. Pro přeložku bude použit stávající optický kabel, který bude přefouknut do nových trubek. Pod komunikací budou optotrubky uloženy v chráničce. Přeložka je umístěna na pozemcích par. čís. 479, 480, k.ú. Veveří, obec Brno a pozemku par. čís. 769 k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 456 Sdělovací kabely, FASTER – jedná se o zabezpečení optických sdělovacích kabelů ve dvou místech střetu s navrhovanou stavbou.

Na stávajících kabelech bude nutno prodloužit stávající kabelový prostup v délce 4 m a 5 m. Prodloužení prostupu bude provedeno dělenou chráničkou PE 160/110 mm.

SO 457 Sdělovací kabely, DIAL – jedná se o přeložení optického kabelu ve třech místech.

K prvnímu střetu dojde v prostoru za křižovatkou ulic Údolní a Bratří Čapků u č.o. 56. Na stávajících kabelech bude nutno prodloužit kabelový prostup v délce 5 m. Prodloužení prostupu bude provedeno dělenou chráničkou PE 160/110 mm.

K druhému střetu dojde na levé straně ul. Údolní mezi č.o. 26 – 4. Přeložka bude provedena novými optotrubkami v délce 194 m v nové trase. Pro přeložku bude použit stávající optický kabel, který bude přefouknut do nových trubek. Přeložka je umístěna na pozemku par. čís. 479 k.ú. Veveří, obec Brno.

Ke třetímu střetu dojde v prostoru křižovatký Údolní a Komenského nám. Na stávajících kabelech bude nutno prodloužit stávající kabelový prostup v délce 5 m. Prodloužení prostupu bude provedeno dělenou chráničkou PE 160/110 mm.

SO 501 Plynovod STPE 160, Údolní sudá čísla – jedná se o přeložku plynovodního potrubí. Začátek trasy navazuje na stávající STPE 160 z roku 2007 na ulici Marešova. Nová trasa STPE 160 je navržena v komunikaci v blízkosti krajnice v odstupové vzdálenosti od UV a sloupů VO. V tomto úseku mezi domy č.p. 4 – 26 je navrženo 12 nových domovních přípojek s upravenou dimenzí dle odběr, ukončených cca 1,5 m od objektů. Dopojení přípojek do HUP s regulátory je řešeno v rámci akce GasNetu. Před domem č.p. 6 je provedeno napojení SO 502, větev PE 110 v ochranném potrubí, křížící ulici. Konec úpravy plynovodu je v ústí ulice Obilní trh na hranici domů č.p. 2 a 3. Zde dochází k napojení na stávající potrubí PE 160, které bude využito a přetlakováno na provozní tlakovou hladinu 1 bar. Přeložka se nachází na pozemcích par. čís. 479, 458, 480 a 503, k.ú. Veveří, obec Brno. Celková délka přeložky je 231 m, s maximálním provozním tlakem 300 kPa, která je umístěná od hranice se sousedními pozemky par. čís. 481 5,55 m, p.č. 471 (5,02 m) a od pozemku p.č. 461 3,85 m k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 502 Plynovod STPE 110, Údolní lichá čísla – jedná se o přeložku plynovodního potrubí. Začátek úpravy je napojení navrhované přeložky na nový STPE 160 před domem č.p. 6 na ulici Údolní. Nová trasa STPE 110 nejprve kříží komunikaci v ochranném potrubí a za přechodem komunikace přeložka pokračuje v nové niveletě směrem k ulici Úvoz. V místě přechodu na druhou stranu k ulici Husova je veden plynovod STPE 90.

Trasa je navržena v komunikaci v blízkosti krajnice v odstupové vzdálenosti od UV a sloupů VO. V tomto úseku mezi domy č.p. 19 – 35 je navrženo 10 nových domovních plynovodních přípojek s upravenou dimenzí dle odběru, ukončených cca 1,5 m od objektů. Dopojení přípojek do HUP s regulátory je řešeno v rámci akce GasNetu. Před domem č.o. 36 je přeložka ukončena a navazuje na ni plynovod STPE 63, zásobující 3 domy. Přeložka se nachází na pozemku par. čís. 480 k.ú. Veveří a 769, k.ú. Město Brno, obec Brno.

Celková délka trasy je 191,0 m s maximálním provozním tlakem 300 kPa, která je umístěná 5,0 m od hranice se sousedními pozemky par. čís. 725, 734 a 747 k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 661 Tramvajová trať – spodek a svršek - jedná se o rekonstrukci dvoukolejné tramvajové trati v ulici Údolní. Předmětem územního řízení je nové umístění v křižovatce ul. Údolní/Úvoz, kde dochází k posunu tramvajové trati vlevo ve směru z centra tak, aby vpravo za křižovatkou byl samostatný jízdní pruh, zastávky a pruh pro cyklisty, a vlevo pojížděné tramvajové těleso. Nové umístění v křižovatce ul. Údolní/Úvoz bude na pozemcích par. čís. 480, 521 a 540, k.ú. Veveří, obec Brno.

SO 662 Tramvajová trať – zastávky – jedná se pouze o novou zastávku před křižovatkou s Úvozem (směrem do centra), vlevo je vložen zastávkový ostrůvek šířky 2,25 m a délky 40,0 m s výškou nástupní hrany 200 mm. Zastávka je na pozemku par. čís. 540, k.ú. Veveří, obec Brno.

SO 663 Tramvajová trať – napájecí a zpětné vedení – pro uložení nových kabelů bude v úseku mezi Obilním trhem a křižovatkou Úvoz/Údolní vybudován nový kabelovod tvořený devítitvorovým multikanálem a plastovými kabelovými komorami. Celková délka kabelovodu je 279 m.

V úseku mezi stávající měnírnou na ulici Údolní a stávajícími skříněmi (N13 a Z13) na křižovatce ulic Úvoz/Údolní, budou do nového kabelovodu uloženy čtyři nové trakční kabely typu 1-YYY 1x500 (2x napájecí kabel 2x zpětný kabel). Dále bude kabelovodem veden v tomto úseku kabel pro dálkově ovládaný odpojovač, typu 1-CYKY 12x4mm.

Dále bude vybudován nový kabelovod tvořený jedním multikanálem v délce 26 m v místě přechodu ulice Úvoz.

SO 664 Tramvajová trať – trolejové vedení – objekt řeší rekonstrukci trolejového vedení tramvajové a trolejbusové trati, především zřízení nových stožárů – ocelové trubkové nebo svařované metalizované o délce max. 11,0 m umístěné v chodníku.

- Úsek od křižovatky Husova po křižovátku Joštova/Marešova – součástí rekonstrukce je zřízení 5 nových stožárů umístěných na pozemcích par. čís. 771/1 a 769, k.ú. Město Brno, obec Brno.
- Úsek od křižovatky Joštova/Marešova po Obilní trh – součástí rekonstrukce je zřízení 9 nových stožárů na pozemcích par. čís. 769, k.ú. Město Brno, obec Brno a na pozemku par. čís. 480, k.ú. Veveří, obec Brno,
- Úsek Obilní trh – Úvoz – součástí rekonstrukce je zřízení 6 nových stožárů umístěných na pozemku par. čís. 479 a 540 k.ú. Veveří, obec Brno.
- Úsek Úvoz – Bratří Čapků – součástí rekonstrukce je zřízení 5 nových stožárů umístěných na pozemcích par. čís. 540 a 591, k.ú. Veveří, obec Brno.

SO 666 Tramvajová trať – přípojky NN pro ELP. Připojení bude provedeno ze stávající přípojkové skříně umístěné ve fasádě č.o. 40 na tramvajovou zastávku. Druhá přípojka bude provedena ze stávající rozpojovací skříně umístěné v zeleném pásu poblíž tramvajové zastávky na tramvajovou zastávku. Přípojky budou umístěny na pozemcích par. čís. 591, k.ú. Stránice, obec Brno a na pozemcích par. čís. 480, 540, k.ú. Veveří, a p.č. 769 k.ú. Město Brno, obec Brno.

SO 801 Vegetační úpravy – součástí objektu je kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a náhradní výsadba.

Druh pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje:

Pozemky par. č. 621, 693, 698/1, 698/2, 703/25, 717/1, 719/1, 769, 775, 776/1, 778, k.ú. Město Brno, obec Brno a pozemky par. čís. 458, 479, 480, 503, 505, 521, 540, 558, k.ú. Veveří, obec Brno a pozemek par. čís. 591, 606 v k.ú. Stránice, obec Brno, jsou v katastru nemovitostí evidovány jako „Ostatní plocha“, ostatní komunikace.

Pozemky par. čís. 703/1, 717/2, 717/3, 770/2, 771/1, 771/2, 774, k.ú. Město Brno, obec Brno a pozemek par. čís. 504/1, k.ú. Veveří, obec Brno, jsou v katastru nemovitostí evidovány jako „Ostatní plocha“, zeleň.

Pozemek par. čís. 717/4, k.ú. Město Brno, obec Brno, je v katastru nemovitostí evidován jako „Ostatní plocha“, jiná plocha.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků a staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci územního řízení vymezení v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozemky, na kterých se stavba umísťuje: pozemky parc. č. 621, 693, 698/1, 698/2, 703/1, 703/25, 717/1, 717/2, 717/3, 717/4, 719/1, 769, 770/2, 771/1, 771/2, 774, 775, 776/1, 778 v k.ú. Město Brno, obec Brno, dále na pozemcích parc. č. 591, 606 v k.ú. Stránice, obec Brno a na pozemcích parc. č. 458, 479, 480, 503, 504/1, 505, 521, 540, 558 v k.ú. Veveří, obec Brno, sousední pozemky: parc. č. 622, 623, 624, 694, 695, 697, 699, 701,

702/1, 702/2, 703/9, 703/22, 713/1, 716/1, 723, 724, 725, 728/1, 729, 733, 734, 737, 738/1, 743/1, 744, 747, 748, 753, 754, 761, 762/1, 766, 768, 772, 773 v k.ú. Město Brno, obec Brno, parc. č. 593/1, 594/1, 594/2, 601, 605 v k.ú. Stránice, obec Brno a parc. č. 459, 461, 462/1, 463/1, 465, 468, 469/1, 471, 473, 475, 477, 481, 483, 504/2, 506/16, 507, 509/1, 509/2, 509/4, 509/13, 511, 512, 513/1, 514, 524, 525, 533, 535, 536, 538, 541, 548, 550, 552 v k.ú. Veveří, obec Brno.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby a realizaci části stavby se stanoví tyto podmínky:

1. V dalším stupni projektové dokumentace bude dodržen druh a účel stavby, základní parametry jejího prostorového řešení a umístění, uvedené v popisu stavby ve výrokové části tohoto rozhodnutí a obsažené v projektové dokumentaci ověřené v územním řízení. Případné změny musí být předem projednány a povoleny stavebním úřadem.
2. Bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Brna č. j. MMB/0431868/2019/K/zs ze dne 11.10.2019 - bez připomínek.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku vydaném Odborem dopravy MMB, č.j. MMB/0344246/2019 ze dne 04.10.2019, zejména:
 - bude povolena úprava stávajících křižovatek,
 - bude povoleno zvláštní užívání komunikace – uložení inženýrských sítí,
 - nejpozději čtyři měsíce před uvedením stavby do provozu bude MMB OD požádán o vydání opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a jako drážní správní úřad,
 - bude doplněno kótování u dopravního značení, přechodů, míst pro přecházení a doplněno dopravní značení,
 - je nutné doložit stanovisko DPmB a.s.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku OVLHZ MMB č.j. MMB/364891/2019 ze dne 04.09.2019:
 - SO 301 Kanalizace a SO 303 Vodovod jsou vodními díly a podléhají povolení podle vodního zákona.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku MMB OŽP:
 - Odboru životního prostředí z hlediska ochrany ovzduší:
 - Do dalšího stupně PD budou zapracována podrobná navrhovaná technická a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti (např. kropení prašných ploch, očista komunikací, organizační opatření atd.)
 - Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO III a vyšší.
 - Odboru životního prostředí z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie:
 - V rámci oprav bude zachováno umístění nádob pro směsný komunální odpad a pro tříděný odpad (papír, sklo, plasty), o případné změně umístění těchto nádob bude informován OŽP MMB.
 - Odboru životního prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny:
 - Upozorňujeme, že plocha parku Komenského náměstí je vedena pod pořadovým číslem 10 v „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně“, který je přílohou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku KHS JMK č.j. KHSJM 54200/2019/BM/HOK ze dne 11.10.2019:
 - V dalším stupni řízení dle zákona č. 258/2006 Sb, bude zejména na základě precizovaného plánu organizace výstavby, navržených dlouhodobých objízdných tras, použitých technologických postupů a jejich délky trvání provedeno vyhodnocení hlukové zátěže během realizace stavby (stavební činnost a doprava na objízdných pozemních komunikacích) a navržena protihluková opatření dokladující předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR-DI:
 - Veškeré parkovací zálivy budou stavebně odděleny zvýšenou obrubou (min. +10 cm) od chodníkového tělesa, nikoliv jen varovným pásem – bezpečnost pěších v kontextu § 1 zák. č. 12/1997 Sb., pohybujících se po chodníku je třeba jednoznačně upřednostnit před požadavkem nad rychlým vmanévrováním řidiče s vozidlem na zálivové parkovací stání.
 - Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy.
 - Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
 - Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Policií ČR-DDI a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
8. Příjezdové trasy na staveniště vč. tonáže použitých vozidel budou před vydáním stavebního povolení projednány s Brněnskými komunikacemi a.s., Renneská tř. 1a, Brno.
9. Budou zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do objektů.
10. Bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce v šíři min. 1,5 m, příp. pochůznými lávkami.
11. Výkop bude po celé délce ohrazen a v noci osvětlen.
12. Při provádění prací a s tím související skládce stavebního materiálu, bude dbáno na dodržení ochrany veřejné zeleně. V případě, že bude nezbytné využít veřejnou zeleň ke skládce materiálu, bude použito všech dostupných prostředků tak, aby nedocházelo k jejímu poškození, v případě poškození bude navráceno v původní stav.
13. O zvláštní užívání komunikace a uzavírku komunikace, požádá zhotovitel min. 30 dní před zahájením prací OD MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.
14. Vyžádejte si stanovisko a.s. Brněnské komunikace, Renneská tř. 1a, Brno, která stanoví rozsah obnovy komunikací.
15. Pro umístění stavby a realizaci části stavby budou splněny podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem, které se týkají vytyčení stavby, výkopových prací v blízkosti zařízení, kontroly nepoškozenosti sítí před záhozem, zabezpečení a ochrany stávajících sítí, zajištění výkopů, podmínek křížení sítí, staveništní dopravy, při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 733050 Zemní práce, křížení kabelů musí být v souladu s ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, uvedené v jejich vyjádření:
 - Brněnských komunikací a.s. zn.: 3100-Nov-369/19 ze dne 08.10.2019,
 - Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., zn. 722/022889/2019/EŠk/ŠK ze dne 11.11.2019,
 - Dopravního podniku města Brna, a.s., zn.: 10739/2019/5040 ze dne 19.11.2019,
 - GridServices, s.r.o. zn. 5002076035 ze dne 12.03.2020 a zn. 5002108375 ze dne 09.04.2020,
 - Primátorky Statutárního města Brna č.j. MMB/0017482/2020 ze dne 13.01.2020 a č.j. MMB/0241694/2020 ze dne 15.06.2020,
 - Odboru investičního MMB č.j. MMB/0344332/2019 ze dne 2.9.2019,
 - Katastrálního úřadu JMK č.j. PD-26696/2019-702 ze dne 22.8.2019 a č.j. KÚ-04681/2019-700-02020 ze dne 22.11.2019,
 - Majetkového odboru MMB č.j. MMB/0348328/2019 ze dne 29.08.2019,
 - Kanceláře veřejného ochránce práv č.j. KVOP-51468/2019/OVS ze dne 15.11.2019,
 - Veřejné zeleně města Brna, p.o. zn. S/255/1253/19 ze dne 18.09.2019,
 - Tepláren Brno, a.s. zn. 019447/2019/TB ze dne 10.09.2019,
 - Technických sítí Brno, a.s., zn.: TSB/09318/2019 ze dne 17.10.2019,
 - společnosti UPC Česká republika, s.r.o., zastoupené InfoTel, spol. s r.o., zn. JurKo01109/19 ze dne 27.08.2019,
 - Odboru správy majetku MMB ze dne 17.01.2020,
 - společnosti ČD - Telematika a.s., č.j. 1201914232 ze dne 22.08.2019,
 - společnosti E.ON Distribuce, a.s. zn. T6779-27000801 ze dne 23.08.2019,
 - společnosti Faster CZ spol. s r.o. ze dne 11.09.2019,
 - společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E32364/19 ze dne 21.08.2019,
 - společnosti České Radiokomunikace, a.s. zn. UPTS/OS/226467/2019 ze dne 23.08.2019,

- společnosti CETIN, a s. č.j. 728033/19 ze dne 10.09.2019,
- společnosti Dial Telecom, a.s. zn. BM717564 ze dne 02.09.2019,
- Masarykovy univerzity ze dne 13.09.2019 pod č.j. MU-IS/171824/2019/1005928/ÚVT-1/3670
- Vysokého učení technického v Brně č.j.: VUTBR/160812/2019 ze dne 10.10.2019.

Účastník řízení stanovený podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, je Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno.

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 03.01.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „**Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz, Brno**“ na pozemcích parc. č. 621, 693, 698/1, 698/2, 703/1, 703/25, 717/1, 717/2, 717/3, 717/4, 719/1, 769, 770/2, 771/1, 771/2, 774, 775, 776/1, 778 v k.ú. Město Brno, obec Brno, dále na pozemcích parc. č. 591, 606 v k.ú. Stránice, obec Brno a na pozemcích parc. č. 458, 479, 480, 503, 504/1, 505, 521, 540, 558 v k.ú. Veveří, obec Brno. Žadatelem je Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, které zastupují Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno. Podáním žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Po doplnění chybějících podkladů dne 16.06.2020, stavební úřad opatřením ze dne 30.06.2020 č.j. MCBS/2020/0102668/ADAM oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a upustil od ústního jednání a ohledání na místě. V oznámení o zahájení řízení poučil účastníky řízení o možnosti podat námitky a stanovil jim k tomu lhůtu a rovněž stanovil lhůtu pro seznámení se s podklady řízení.

V průběhu řízení byly uplatněny tyto námitky:

Kancelář veřejného ochránce práv zaslala pod č.p. MCBS/2020/0107511 dne 13.07.2020 následující námitky:

Požaduje, aby nové řešení vjezdu č. 8 a 9 nezhoršovalo rozhledové pole řidiče, tj. rozhledové pole obou vjezdů bylo řešeno v souladu s ČSN 73 6110 a současně musí být řešení vjezdů v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dle sdělení projektanta, bylo řešení vjezdů se zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv konzultováno. Oba vjezdy jsou navrženy v souladu s uvedenou ČSN a vyhláškou.

Požaduje zajištění nepřetržitého přístupu pro pěší a vyhrazeného příjezdu do areálu po celou dobu realizace stavby. V nezbytném případě je možné, a to po nezbytnou dobu, po předchozím projednání omezit příjezd do areálu na jeden z vjezdů. V takovém případě bude zajištěna bezplatně náhradní zpevněná parkovací plocha včetně příjezdu na sousedním pozemku dle výkresu situace organizace výstavby. Náhradní parkovací plocha bude vyhrazena po celou dobu trvání omezení vjezdu na jednom z dotčených vjezdů. Námitka se netýká územního řízení, ve kterém se stavba umísťuje. Řešení příjezdu a přístupu k nemovitostem je připomínka k realizaci stavby, je ji tedy třeba uplatnit v následném řízení.

Požaduje předložení návrhu změn v dopravě – příjezdu k vjezdu č. 8 a 9 a současně přístupu pro pěší v průběhu realizace stavby vždy s dostatečným předstihem (min. 14 dní před provedením změny). Řešení příjezdu a přístupu k nemovitostem je připomínka k realizaci stavby, je ji tedy třeba uplatnit v následném řízení.

V rámci pěšího přístupu požadujeme bezúplatné zajištění orientačního systému pro pěší z navazujících uzlů MHD tj. od ulice Úvoz a od centra města. Etapy výstavby, uzavírky a koridory pro pěší budou řešeny až při realizaci stavby, nelze uplatnit v rámci umístění stavby, ale až v následném řízení.

Požaduje uvést všechny plochy a stavební objekty dotčené stavbou po jejím dokončení do původního stavu. Po dokončení stavby bude provedena protokolární kontrola dotčených ploch a stavebních objektů. Námitka je součástí podmínek územního rozhodnutí a při kolaudaci bude protokol vyžadován.

Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznými stanovisky a stanovisky dotčených orgánů. Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními:

OD MMB vydal souhlasné stanovisko pod č.j. MMB/0344246/2019 dne 04.10.2019, rozhodnutí o povolení úpravy připojení vydané pod č.j. MMB/345128/2019 ze dne 25.11.2019 a rozhodnutí o uložení inženýrských sítí v komunikačním pozemku pod č.j. MMB/429764/2019 ze dne 31.10.2019. Policie ČR-DI vydala souhlasné stanovisko č.j. KRPB-112655-5/ČJ-2019-0600DI-NEP dne 18.11.2019, MMB odbor památkové péče vydal souhlasné stanovisko pod č.j. MMB/0431868/2019/K/zs ze dne 11.10.2019, MMB odbor územního plánování a rozvoje vydal souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MMB/0344238/2019/Neu ze dne 16.10.2019, MMB odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství vydal vyjádření pod č.j. MMB/364891/2019 ze dne 04.09.2019, MMB odbor životního prostředí vydal souhlasné vyjádření pod č.j. MMB/0344276/2019/JN ze dne 03.10.2019, souhlasná závazná stanoviska pod č.j. MMB/0363312/2019/Rezh ze dne 30.08.2019 a č.j. MMB/0357669/2019/MIDA ze dne 27.08.2019, ÚMČ Brno-střed odbor životního prostředí vydal stanovisko ke kácení dřevin pod č.j. MCBS/2019/0152961/PRUJ dne 16.09.2019, Hasičský záchranný sbor JmK vydal souhlasné závazné stanovisko pod č. e. HSBM-73-1-1532/1-OPST-2019 dne 02.09.2019, Krajská hygienická stanice JmK vydala dne 11.10.2019 pod sz S-KHSJM 45724/2019 souhlasné závazné stanovisko, Ministerstvo obrany odbor ochrany zemních zájmů vydal souhlasné závazné stanovisko dne 22.08.2019 pod sp. z. 94510/2019-1150-OÚZ-BR, Drážní úřad vydal souhlasné stanovisko pod zn. MO-SOO1344/19-2/Os dne 24.09.2019.

Dále bylo k žádosti doloženo vyjádření: Brněnských komunikací a.s. zn.: 3100-Nov-369/19 ze dne 08.10.2019, Brněnských vodáren a kanalizace, a.s., zn. 722/022889/2019/EŠk/ŠK ze dne 11.11.2019, Dopravního podniku města Brna, a.s., zn.: 10739/2019/5040 ze dne 19.11.2019, GridServices, s.r.o. zn 5002076035 ze dne 12.03.2020 a zn 5002108375 ze dne 09.04.2020, Primátorky Statutárního města Brna č.j. MMB/0017482/2020 ze dne 13.01.2020 a č.j. MMB/0241694/2020 ze dne 15.06.2020, Odboru investičního MMB č.j. MMB/0344332/2019 ze dne 2.9.2019, Katastrálního úřadu JMK č.j. PD-26696/2019-702 ze dne 22.8.2019 a č.j. KÚ-04681/2019-700-02020 ze dne 22.11.2019, Majetkového odboru MMB č.j. MMB/0348328/2019 ze dne 29.08.2019, Kanceláře veřejného ochránce práv č.j. KVOP-51468/2019/OVS ze dne 15.11.2019, Veřejné zeleně města Brna, p.o. zn. S/255/1253/19 ze dne 18.09.2019, Tepláren Brno, a.s. zn 019447/2019/TB ze dne 10.09.2019, Technických sítí Brno, a.s., zn.: TSB/09318/2019 ze dne 17.10.2019, společnosti UPC Česká republika, s.r.o., zastoupené InfoTel, spol. s r.o., zn JurKo01109/19 ze dne 27.08.2019, Odboru správy majetku MMB ze dne 17.01.2020, společnosti ČD - Telematika a.s., č.j. 1201914232 ze dne 22.08.2019, společnosti E.ON Distribuce, a.s. zn T6779-27000801 ze dne 23.08.2019, společnosti Faster CZ spol. s r.o. ze dne 11.09.2019, společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E32364/19 ze dne 21.08.2019, společnosti České Radiokomunikace, a.s. zn. UPTS/OS/226467/2019 ze dne 23.08.2019, společnosti CETIN, a.s. č.j. 728033/19 ze dne 10.09.2019, společnosti Dial Telecom, a.s. zn BM717564 ze dne 02.09.2019, Masarykovy univerzity ze dne 13.09.2019 pod č.j. MU-IS/171824/2019/1005928/ÚVT-1/3670 a Vysokého učení technického v Brně č.j.: VUTBR/160812/2019 ze dne 10.10.2019.

Podmínky vlastníků dotčených nemovitostí uvedené v souhlasech nebyly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí, neboť se týkají realizace stavby, budou zapracovány do projektové dokumentace v dalším stupni.

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli, tj. Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. Statutární město Brno, zastoupené starostou Městské části města Brna, Brno-střed. Dle ust.

§ 85 odst. 2 písm. a) vlastníkovu pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 818/11, 604 47 Brno, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno, dále tomu, kdo má jiné věcné právo k dotčenému pozemku, tj. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha, Faster CZ spol. s r.o., Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské náměstí 1/1, 602 00 Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 164/3, 601 67 Brno, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha, Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 602 00 Brno, Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 656 46 Brno, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, InfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno, UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha – přešla pod Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno. Dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 622, 623, 624, 694, 695, 697, 699, 701, 702/1, 702/2, 703/9, 703/22, 713/1, 716/1, 723, 724, 725, 728/1, 729, 733, 734, 737, 738/1, 743/1, 744, 747, 748, 753, 754, 761, 762/1, 766, 768, 772, 773 v k.ú. Město Brno, obec Brno, parc. č. 593/1, 594/1, 594/2, 601, 605 v k.ú. Stránice, obec Brno a parc. č. 459, 461, 462/1, 463/1, 465, 468, 469/1, 471, 473, 475, 477, 481, 483, 504/2, 506/16, 507, 509/1, 509/2, 509/4, 509/13, 511, 512, 513/1, 514, 524, 525, 533, 535, 536, 538, 541, 548, 550, 552 v k.ú. Veveří, obec Brno.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

č.p. 219, č.p. 221, č.p. 204, č.p. 205, č.p. 619, č.p. 212, č.p. 577, č.p. 597, č.p. 599, č.p. 596, č.p. 567, č.p. 552, č.p. 529, č.p. 527, č.p. 528, č.p. 523, č.p. 503, č.p. 496, č.p. 495, č.p. 487, č.p. 435, č.p. 420, č.p. 326, č.p. 254, č.p. 223, č.p. 222 a č.p. 220, k.ú. Město Brno, obec Brno, č.p. 244, k.ú. Stránice, obec Brno a č.p. 305, č.p. 306, č.p. 387, č.p. 388, č.p. 389, č.p. 390, č.p. 392, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 395, č.p. 396, č.p. 307, č.p. 308, č.p. 397, č.p. 398, č.p. 399, č.p. 400, č.p. 401, č.p. 402, č.p. 403, č.p. 404, č.p. 405, č.p. 406, č.p. 407, č.p. 408, č.p. 409 a č.p. 376, k.ú. Veveří, obec Brno.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, tj. podle ust. § 144 správního řádu, oznámení o zahájení řízení a další písemnosti byly podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona doručeny účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jednotlivě a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Současně s vyvěšením na úřední desce bylo oznámení o zahájení řízení a další dokumenty zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Za den doručení veřejnou vyhláškou se považuje podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu 15. den po jejím vyvěšení na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno-střed.

Stavební úřad v územním řízení přezkoumává žádost podle ust. § 90 stavebního zákona. Tedy zda je záměr žadatele v souladu:

- a) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

- b) s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Stavební úřad konstatuje, že navrhovaný záměr vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 501/2006 Sb., neboť stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemek v souladu s ust. § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., stavba je umístěna tak, že umožňuje napojení na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace, umístěním navrhované stavby je zachována kvalita prostředí.

Stavba vyhovuje také vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, je v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, a proto je přípustná.

Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB) jeho závazné části, Vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, v platném znění, přílohy č.1 Regulativy pro uspořádání území a podrobnější územně plánovací dokumentace Regulačního plánu Městské památkové rezervace (dále jen „RP MPR“), Vyhlášky statutárního města Brna č. 28/2006, je stavba navržena

převážně v plochách pro dopravu s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem PLOCHY KOMUNIKACÍ A PROSTRANSTVÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU
okrajově

v plochách stavebních stabilizovaných PLOCH BYDLENÍ s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem BO – PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ

v plochách stavebních stabilizovaných PLOCH PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčními typy OV – VEŘEJNÁ SPRÁVA, OS – ŠKOLSTVÍ a OZ – ZDRAVOTNICTVÍ

v plochách stavebních návrhových PLOCH PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST

v plochách stavebních návrhových PLOCH SMÍŠENÝCH s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem SJ – JÁDROVÉ tj. SMÍŠENÉ PLOCHY CENTRÁLNÍHO CHARAKTERU

v plochách nestavebních – volných návrhových PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem ZP – PLOCHY PARKŮ

v plochách nestavebních – volných stabilizovaných PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem ZO – PLOCHY OSTATNÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ.

MMB OÚPR posoudil záměr a dospěl k závěru, že navrhovaný záměr, mimo dotčené území záměrem vymezeným v ZÚR, respektuje funkční a prostorové regulativy dotčených ploch a je v souladu s platným Územním plánem města Brna a je přípustný, což vyplývá z předloženého závazného stanoviska pod č.j. MMB/0344238/2019/Neu ze dne 16.10.2019.

Stavební úřad na základě provedeného posouzení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby, proto rozhodl, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Část stavebních objektů nepodléhá ohlášení ani povolení stavebního úřadu, ale před užíváním je nutno požádat o vydání kolaudačního souhlasu popř. kolaudačního rozhodnutí.

Část stavebních objektů podléhá povolení MMB OVLHZ.

Část stavebních objektů podléhá povolení MMB OD.

Stavební objekty SO 661, 662, 663, 664, 665, 666, podléhají povolení Drážního úřadu.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení nebo bude započato se stavbou.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měninská 4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručáním stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Za den doručení veřejnou vyhláškou se považuje patnáctý den po vyvěšení na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno-střed. Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. [redacted]
vedoucí
Stavebního úřadu

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno-střed:**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup,
v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 správního řádu:

Zveřejněno dne:

Zveřejnění ukončeno dne:

Otisk razítka a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí
a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Žadatel je v souladu s ust. § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, osvobozen od správního poplatku.

Příloha

všem – katastrální situační výkres

Doručí se

Stavebník – doručuje se jednotlivě

1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, které zastupují Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
2. Statutární město Brno, Kancelář primátora města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - primátorka

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. b), c) a d) stavebního zákona – doručuje se jednotlivě

3. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
5. ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha
6. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
7. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 818/11, 604 47 Brno
8. Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha
9. Faster CZ spol. s r.o., Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
10. GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
11. Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno
12. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské náměstí 1/1, 602 00 Brno
13. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
14. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
15. Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 164/3, 601 67 Brno
16. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha
17. Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 602 00 Brno
18. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno
19. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
20. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
21. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 656 46 Brno
22. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
23. InfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno
24. Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno
25. UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha – přešla pod Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha
26. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona – doručuje se veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 622, 623, 624, 694, 695, 697, 699, 701, 702/1, 702/2, 703/9, 703/22, 713/1, 716/1, 723, 724, 725, 728/1, 729, 733, 734, 737, 738/1, 743/1, 744, 747, 748, 753, 754, 761, 762/1, 766, 768, 772, 773 v k.ú. Město Brno, obec Brno, parc. č. 593/1, 594/1, 594/2, 601, 605 v k.ú. Stránice, obec Brno a parc. č. 459, 461, 462/1, 463/1, 465, 468, 469/1, 471, 473, 475, 477, 481, 483, 504/2, 506/16, 507, 509/1, 509/2, 509/4, 509/13, 511, 512, 513/1, 514, 524, 525, 533, 535, 536, 538, 541, 548, 550, 552 v k.ú. Veveří, obec Brno.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

č.p. 219, č.p. 221, č.p. 204, č.p. 205, č.p. 619, č.p. 212, č.p. 577, č.p. 597, č.p. 599, č.p. 596, č.p. 567, č.p. 552, č.p. 529, č.p. 527, č.p. 528, č.p. 523, č.p. 503, č.p. 496, č.p. 495, č.p. 487, č.p. 435, č.p. 420, č.p. 326, č.p. 254, č.p. 223, č.p. 222 a č.p. 220, k.ú. Město Brno, obec Brno, č.p. 244, k.ú. Stránice, obec Brno a č.p. 305, č.p. 306, č.p. 387, č.p. 388, č.p. 389, č.p. 390, č.p. 392, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 395, č.p. 396, č.p. 307, č.p. 308, č.p. 397, č.p. 398, č.p. 399, č.p. 400, č.p. 401, č.p. 402, č.p. 403, č.p. 404, č.p. 405, č.p. 406, č.p. 407, č.p. 408, č.p. 409 a č.p. 376, k.ú. Veveří, obec Brno.

Na vědomí

Dotčené orgány

27. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
28. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
29. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v Brně, Jeřábekova 1847/4, 602 00 Brno
30. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
31. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
32. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
33. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
34. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
35. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
36. Policie České republiky, Specializované pracoviště DI, Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 687/24, 602 00 Brno
37. Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí, Měnínská 4, 601 92 Brno

Dále obdrží

38. ÚMČ Brno – střed, **úřední deska**, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
39. právník
40. evidence ÚR
41. oprávněná úřední osoba
42. spis



Úřad městské části města Brna
Brno-střed

B R N O

Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2022/0178622/ADAM
K podání: MCBS/2022/0146009
Spisová značka: 3200/MCBS/2022/0146009
Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 25.11.2022

Úřad městské části města Brna,
Brno-střed
Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 BRNO
pracoviště: Měnínská 4

Ověřil dne: 08.03.2023, [Signature]

Brno 20.10.2022

Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 24.08.2022 žádost žadatele, kterým je Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, které zastupují Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 277 ze dne 12.08.2020 pod č. j. MCBS/2020/0149351, které nabylo právní moci dne 18.09.2020, pro stavbu s názvem:

„Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz, Brno“,
na pozemcích parc. č. 621, 693, 698/1, 698/2, 703/1, 703/25, 717/1, 717/2, 717/3, 717/4, 719/1, 769, 770/2, 771/1, 771/2, 774, 775, 776/1, 778 v k.ú. Město Brno, obec Brno, dále na pozemcích parc. č. 591, 606 v k.ú. Stránice, obec Brno a na pozemcích parc. č. 458, 479, 480, 503, 504/1, 505, 521, 540, 558 v k.ú. Veveří, obec Brno.

Stavební úřad v souladu s ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje platnost

územního rozhodnutí č. 277 ze dne 12.08.2020 pod č. j. MCBS/2020/0149351, které nabylo právní moci dne 18.09.2020 o pět let, tj. do 18.09.2027.

Ostatní podmínky územního rozhodnutí zůstávají v platnosti.

Účastníkem řízení stanoveným v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, (dále jen správní řád), je Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno.

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 24.08.2022 žádost žadatele, kterým je Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, které zastupují Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 277 ze dne 12.08.2020 pod č. j. MCBS/2020/0149351, které nabylo právní moci dne 18.09.2020 pro stavbu s názvem „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz, Brno“. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Dne 14.09.2022 pod č.j. MCBS/2022/0157857 zaslal účastník řízení Vysoké učení technické v Brně stanovisko (námitky) – vzájemnou koordinaci záměrů výše uvedené stavby a plánované stavby „Rekonstrukce a dostavba budov v areálu Údolní 53“.

K uvedeným námitkám uvádí stavební úřad následující: řízení o prodloužení platnosti územního řízení nepřipouští námitky k novému umístění inženýrských sítí nebo změnu trakčního vedení. Nové umístění podléhá projednávání v řízení o změně územního řízení nebo bude projednáno v rámci stavebního řízení, nikoli v řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Dle vyjádření stavebníka a odůvodněním prodloužení platnosti je zřejmé, že o koordinaci zmíněných staveb jedná a nové umístění se bude řešit v dalším stupni PD.

Žádost je zdůvodněna tím, že byly zdrženy práce na dokumentaci pro stavební povolení (mj. zapracování požadavků VUT).

Platnost je tímto rozhodnutím prodloužena o 5 let, tj. do 12.08.2027.

Stavební úřad opatřením ze dne 31.08.2022 č.j. MCBS/2022/0149351/ADAM oznámil dotčeným orgánům a účastníkům řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci. Na řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí se v souladu s ust. 93 odst. 3 stavebního zákona přiměřeně vztahují ustanovení o územním řízení. V oznámení o zahájení řízení stavební úřad, určil lhůtu, v které mohli uplatnit dotčené orgány svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy k prováděnému řízení a zároveň podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovil lhůtu 5 dnů, ve které se mohli účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle ust. § 85 stavebního zákona v souladu s ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona. Stavební úřad do okruhu účastníků zahrnul: Statutární město Brno, Kancelář primátora města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – primátorka, Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 818/11, 604 47 Brno, Faster CZ spol. s r.o., Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské náměstí 1/1, 602 00 Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 966/67a, 602 00 Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 164/3, 601 67 Brno, Quantcom, a.s., Křížíkova 237/36a, 186 00 Praha, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha, Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 602 00 Brno, Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 656 46 Brno, EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 612 00 Brno, InfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Šumavská 416/15, 602 00 Brno, Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno a *Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům*: parc. č. 622, 623, 624, 694, 695, 697, 699, 701, 702/1, 702/2, 703/9, 703/22, 713/1, 716/1, 723, 724, 725, 728/1, 729, 733, 734, 737, 738/1, 743/1, 744, 747, 748, 753, 754, 761, 762/1, 766, 768, 772, 773 v k.ú. Město Brno, obec Brno, parc. č. 593/1, 594/1, 594/2, 601, 605 v k.ú. Stránice, obec Brno a parc. č. 459, 461, 462/1, 463/1, 465, 468, 469/1, 471, 473, 475, 477, 481, 483, 504/2, 506/16, 507, 509/1, 509/2, 509/4, 509/13, 511, 512, 513/1, 514, 524, 525, 533,

535, 536, 538, 541, 548, 550, 552 v k.ú. Veverří, obec Brno, dále *Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám*: č.p. 219, č.p. 221, č.p. 204, č.p. 205, č.p. 619, č.p. 212, č.p. 577, č.p. 597, č.p. 599, č.p. 596, č.p. 567, č.p. 552, č.p. 529, č.p. 527, č.p. 528, č.p. 523, č.p. 503, č.p. 496, č.p. 495, č.p. 487, č.p. 435, č.p. 420, č.p. 326, č.p. 254, č.p. 223, č.p. 222 a č.p. 220, k.ú. Město Brno, obec Brno, č.p. 244, k.ú. Stránice, obec Brno a č.p. 305, č.p. 306, č.p. 387, č.p. 388, č.p. 389, č.p. 390, č.p. 392, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 395, č.p. 396, č.p. 307, č.p. 308, č.p. 397, č.p. 398, č.p. 399, č.p. 400, č.p. 401, č.p. 402, č.p. 403, č.p. 404, č.p. 405, č.p. 406, č.p. 407, č.p. 408, č.p. 409 a č.p. 376, k.ú. Veverří, obec Brno.

Stavební úřad v provedeném řízení posoudil uvedené důvody, pro které nebyla podána žádost o stavební povolení, a protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů, žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měninská 4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. [REDACTED]
vedoucí
Stavebního úřadu

Stavebník je dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění osvobozen od poplatku.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno-střed:**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup,
v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 správního řádu:

Zveřejněno dne:

Zveřejnění ukončeno dne:

Otisk razítka a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí
a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Doručí se

Stavebník – doručuje se jednotlivě

1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, které zastupují Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
2. Statutární město Brno, Kancelář primátora města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - primátorka

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. b), c) a d) stavebního zákona – doručuje se jednotlivě

3. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
5. ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
6. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
7. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 818/11, 604 47 Brno
8. Faster CZ spol. s r.o., Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
9. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
10. Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno
11. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské náměstí 1/1, 602 00 Brno
12. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
13. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 966/67a, 602 00 Brno
14. Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 164/3, 601 67 Brno
15. Quantcom, a.s., Křížíkova 237/36a, 186 00 Praha
16. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha
17. Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 602 00 Brno
18. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno
19. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
20. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
21. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 656 46 Brno
22. EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 612 00 Brno
23. InfoTel, spol. s r. o., Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno
24. Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Šumavská 416/15, 602 00 Brno

25. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha
26. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona – doručuje se veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 622, 623, 624, 694, 695, 697, 699, 701, 702/1, 702/2, 703/9, 703/22, 713/1, 716/1, 723, 724, 725, 728/1, 729, 733, 734, 737, 738/1, 743/1, 744, 747, 748, 753, 754, 761, 762/1, 766, 768, 772, 773 v k.ú. Město Brno, obec Brno, parc. č. 593/1, 594/1, 594/2, 601, 605 v k.ú. Stránice, obec Brno a parc. č. 459, 461, 462/1, 463/1, 465, 468, 469/1, 471, 473, 475, 477, 481, 483, 504/2, 506/16, 507, 509/1, 509/2, 509/4, 509/13, 511, 512, 513/1, 514, 524, 525, 533, 535, 536, 538, 541, 548, 550, 552 v k.ú. Veveří, obec Brno.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

č.p. 219, č.p. 221, č.p. 204, č.p. 205, č.p. 619, č.p. 212, č.p. 577, č.p. 597, č.p. 599, č.p. 596, č.p. 567, č.p. 552, č.p. 529, č.p. 527, č.p. 528, č.p. 523, č.p. 503, č.p. 496, č.p. 495, č.p. 487, č.p. 435, č.p. 420, č.p. 326, č.p. 254, č.p. 223, č.p. 222 a č.p. 220, k.ú. Město Brno, obec Brno, č.p. 244, k.ú. Stránice, obec Brno a č.p. 305, č.p. 306, č.p. 387, č.p. 388, č.p. 389, č.p. 390, č.p. 392, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 395, č.p. 396, č.p. 307, č.p. 308, č.p. 397, č.p. 398, č.p. 399, č.p. 400, č.p. 401, č.p. 402, č.p. 403, č.p. 404, č.p. 405, č.p. 406, č.p. 407, č.p. 408, č.p. 409 a č.p. 376, k.ú. Veveří, obec Brno.

Na vědomí

Dotčené orgány

27. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
28. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
29. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
30. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
31. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
32. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
33. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
34. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
35. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
36. Policie České republiky - DI, Kounicova 687/24, 602 00 Brno
37. Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor majetku, Měnínská 4, 601 92 Brno

Dále obdrží

38. oprávněná úřední osoba
39. ÚMČ Brno – střed, **úřední deska**, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
40. Spis

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 2022-0146009.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 155574666-213269-230308082912. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1097685243 byla systémem přenesena dne 25.10.2022 10:52:55. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 08.03.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 58 A7 2E, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 25.10.2022 11:20:20, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 6C, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1097685243	ID schránky příjemce: tk7c8xt
ID schránky odesilatele: qykbwe7	Datum a čas dodání: 25.10.2022 10:52:55

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 24.10.2022 12:35:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.03.2023 07:40:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 53 7B EF, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. [REDACTED] 753, Statutární město Brno. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 24.10.2022 12:35:00. Údaje o časovém razítku: 24.10.2022 12:35:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 27 B3 99 2E, kvalifikovaný poskytovatel: ACAeID3 - Root Certificate, eIdentity a.s..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Brno-střed, IČ: 44992785

Pracoviště: Městská část Brno-střed

Datum vyhotovení: 08.03.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [REDACTED]

Otisk úředního razítka:



155574666-213269-230308082912

Poznámka:

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.
