



S004P0179FSB

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. VPI/MJ/2017/00134**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Město Hodonín

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě dle pověření

bankovní spojení [REDAKCE]

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Hodonín

se sídlem Masarykovo nám 1

IČO :00284891

DIČ :CZ699001303

Zastoupená ve smluvních záležitostech Ing. Jaroslavem Hortvíkem, vedoucím odboru IaÚ,

v technických záležitostech [REDAKCE] referentkou odboru IaÚ

bankovní spojení [REDAKCE]

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 16.11.2016 vydané pod číslem 757666/16 včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Hodonín ZOO provozní budova**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č.1 této Smlouvy (dále jen „**CTN**“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) zajistit zemní práce související s Překládkou,
- iii) k převzetí výkopu a předání staveniště písemně vyzvat společnost CETIN, včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 8 této Smlouvy
- iv) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 8 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Stavebník se zavazuje po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, převést na CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost

CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **67.353,-Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

- 7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hortvík
funkce: vedoucí odboru IaÚ
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: referentka investičních akcí
e-mail: [REDACTED]

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. V případě, že dojde k zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději do pěti dnů následujících po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

- 10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 10.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 10.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Stavebník obdrží tři (3) vyhotovení a CETIN jedno (1) vyhotovení.
- 10.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

10.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Tato Smlouva je uzavřena na základě směrnice města Hodonína č. 12/2017 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

CETIN:

Stavebník:

V Brně dne - 7 -08- 2017

V Hodoníně dne 10.8.2017


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ludmila Uhrová
specialista pro výstavbu sítě


Stavebník: Město Hodonín
Ing. Jaroslav Hortvík
Vedoucí odboru

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ořanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
231



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 45038/17/0034

Název

VPIC Hodonín ZOO provozní budova

Budoucí uživatel

GMO-BO Novák Radek
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí
Manažer

Schváleno

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Hodonín ZOO provozní budova
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	
Číslo interní:	45038/17/0034
Prvek SPP:	
ABC:	B
HOST:	HOST 1 Hodonín(Sv.Čecha)-HOST
ATÚ:	HOST 1 Hodonín(Sv.Čecha)-HOST

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0.037 km	kmk mk
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	0.370 km	km kv
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0 BD	
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500_Počet rodinných domů	0 RD	
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks	
Skřín SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks	
Skřín SIS 900 B HD180	0 ks	
Skřín SIS 900 C HD180	0 ks	
Skřín SIS 900 D HD180	0 ks	
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks	
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks	
Skřín mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks	
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks	
Skřín SIS 1350 D HD 180	0 ks	
Délka HDPE trubek pro OK	0 km	

Požadavky:

Název polygonu: VPIC Hodonín ZOO provozní budova

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	22.05.2017
Plánované ukončení přípravy:	15.06.2017
Plánované zahájení realizace:	15.07.2018
Plánované ukončení realizace:	15.10.2018
Nabídka k přejímce (Plán):	15.09.2018

1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 45038/17/0034 na zpracování CaTN: VPIC Hodonín ZOO provozní budova

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu výstavby nové provozní budovy v areálu ZOO v Hodoníně, dojde k přeložení stávající SEK spol. CETIN. Jedná se o dva samonosné kabely FLES (kapacita není na DLSS evidována). Samonosné kabely budou nahrazeny podzemním vedením _ kabelem PFLE 5XN 0,6.

Začátek kabelové překládky bude v místě stávající nepatkované dřevěné podpěry spol. CETIN. Tato podpěra bude nahrazena novým dvojítm patkováným sloupem _ DP7. Na této podpěře bude umístěn nový rozvaděč MRS3 QT (PUR1 nový).

Z tohoto rozvaděče bude vyveden zemní kabel PFLE 5XN 0,6. Kabel bude ukončen v nové provozní budově ZOO v rozvaděči MRK 20QT.

Staniční vedení v nové provozní budově nachystá investor.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabel typu TCEPKPFLE 0,6

MRS3 QT

MRK20 QT

DP7

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metallické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metallické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metallické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Ing. Jaroslav Hortvík, tel.: 518 316 442 _ vedoucí odboru investic města Hodonína, zástupce investora

Eva Tomčalová, tel.: 518 316 467 _ referentka odboru investic a údržby města Hodonína

7 Ostatní:

D: NE
UR: NE - zajistí stavebník
VBR: ANO
GEO: ANO
SoUZ: NE
PEW: ANO
Staniční vedení: Nachystá investor

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) - 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a pracovníka provozu.

CaTN je na přání zákazníka zpracován bez výkopových prací (§.35/hl.70-100cm). Výkopy, kabelové lože, zához a úpravy povrchů provede investor stavby prostřednictvím svého zhotovitele zemních prací (vč. výkopů pro novou dřevěnou podpěru DP7 do hloubky 1,6m). V případě, že při výkopech stávající trasy dojde k poškození kabelů, bude nutné tyto kabely v celém úseku vyměnit a znovu naspojovat _ bude zhotovena okamžitá fotodokumentace vč. zápisů do stav. deníku, aby se předešlo pozdějším sporům.

Je nutné dodržet prostorovou normu od souběžně vedeného NN_min. 30cm. V případě použití cihly pro oddělení může být tato vzdálenost 10cm.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Zadávací podklady.zip	SD
Doplňující podmínky POS.pdf	SD
Vyjádření o existenci sítě 757666_16.pdf	SD

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [2440/7](#)
 Obec: [Hodonín \(586021\)](#)
 Katastrální území: [Hodonín \(640417\)](#)
 Číslo LV: [17287](#)
 Výměra (m²): 29428
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Grafický nebo v digitalizované mapě
 Způsob využití: jiná plocha
 Druh pozemku: ostatní plocha




Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín	
Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce	Podíl
Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace, U Červených domků 3529, 69503 Hodonín	

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [st. 6087](#)
 Obec: [Hodonín \(586021\)](#)
 Katastrální území: [Hodonín \(640417\)](#)
 Číslo LV: [17287](#)
 Výměra (m²): 413
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
 Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

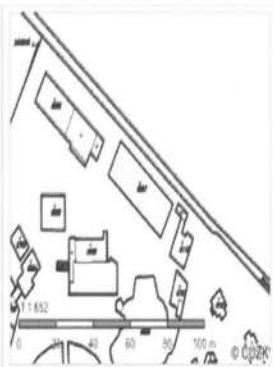


Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného
 nebo evidenčního: jiná stavba
 Stavba stojí na pozemku: p. č. [st. 6087](#)

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín	
Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce	Podíl
Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace, U Červených domků 3529, 69503 Hodonín	

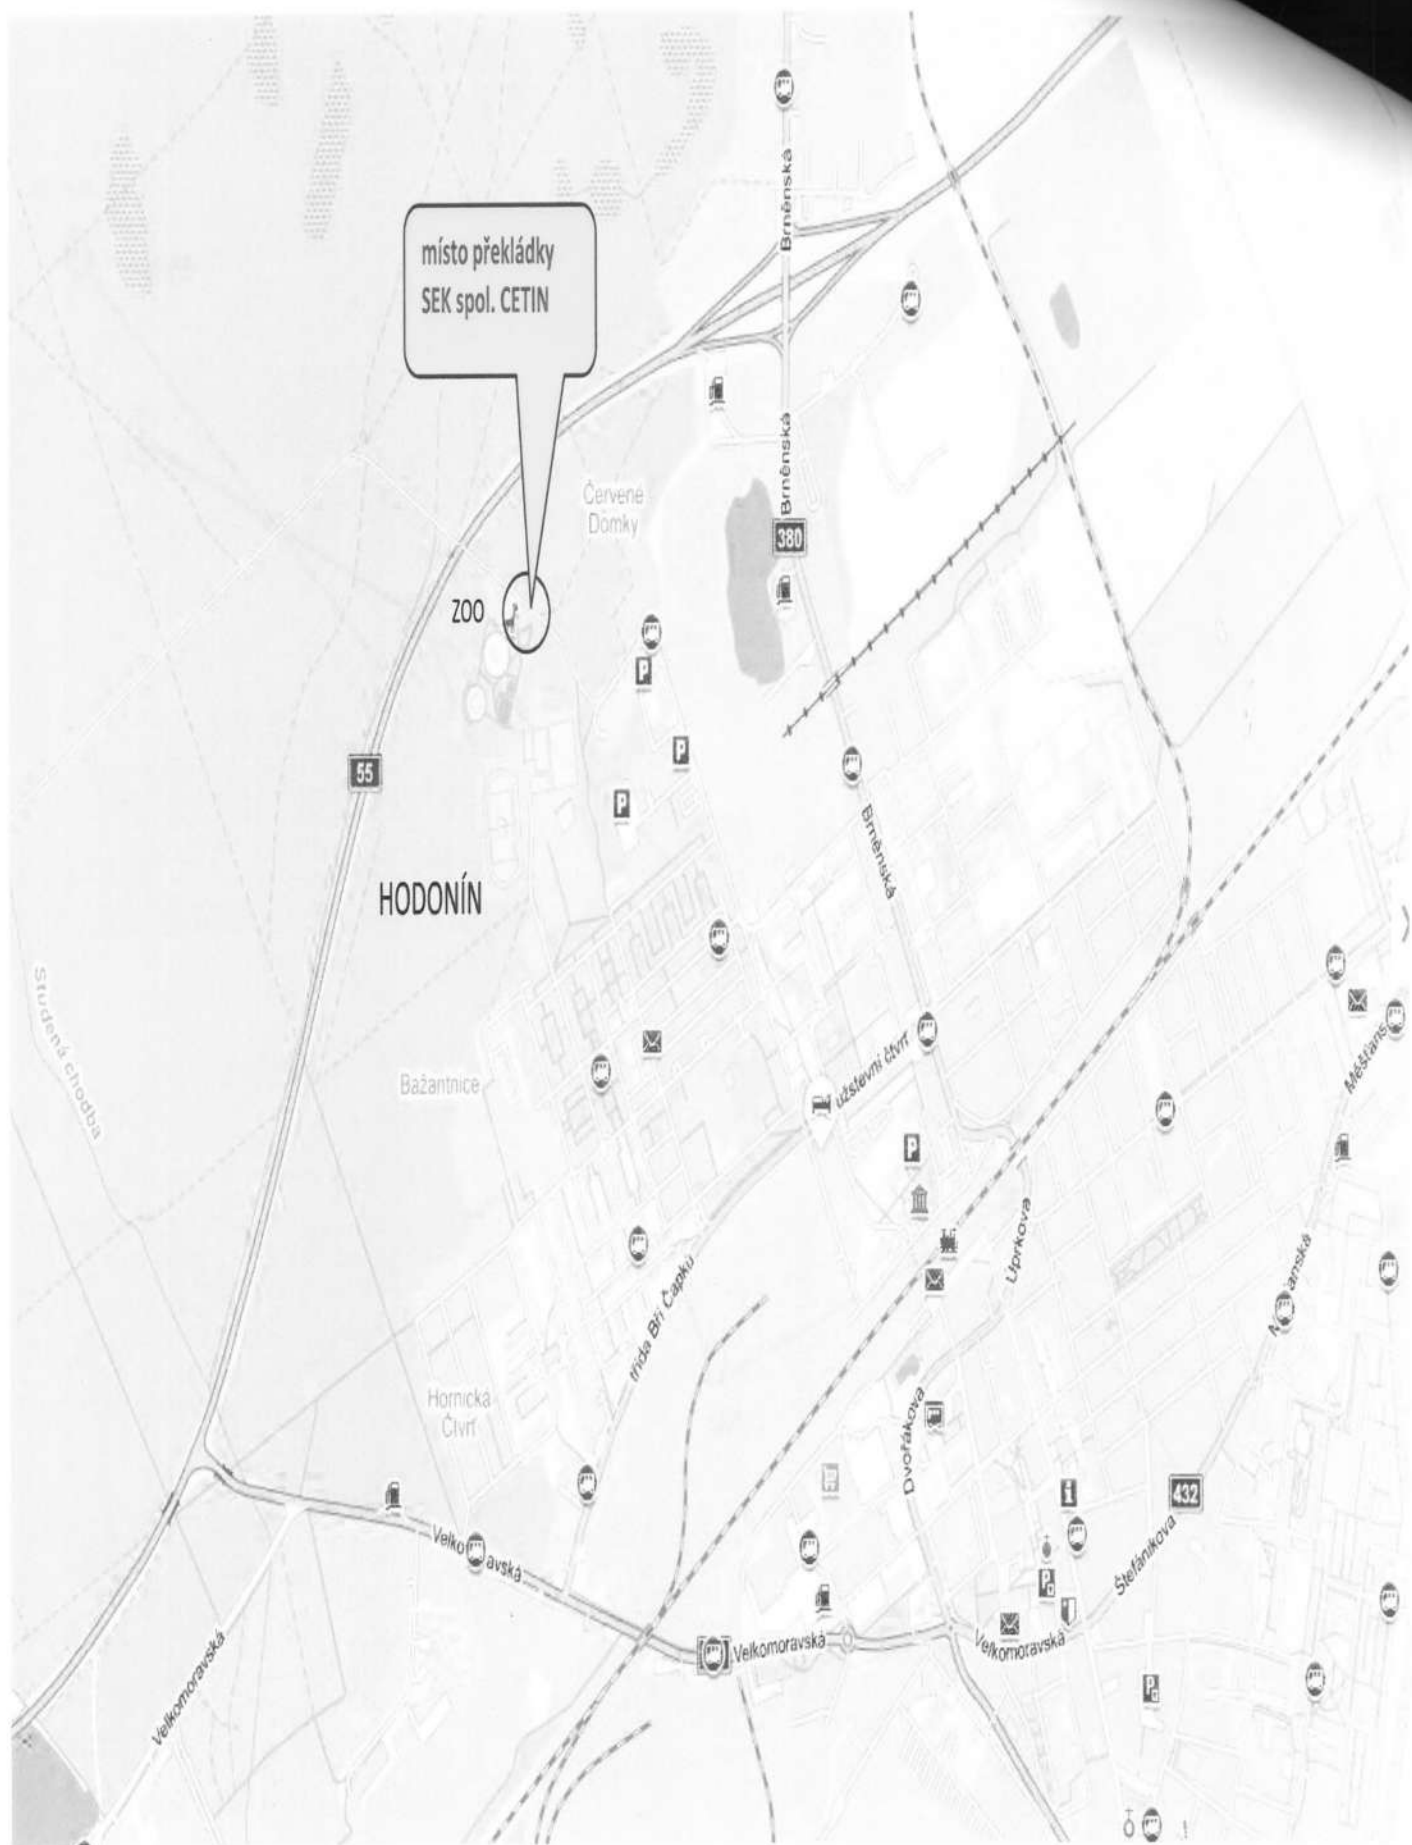

45038/17/0034 VPIC Hodonín ZOO provozní budova


KR1 nový

~~UR28~~



PUR1 nový

UR6

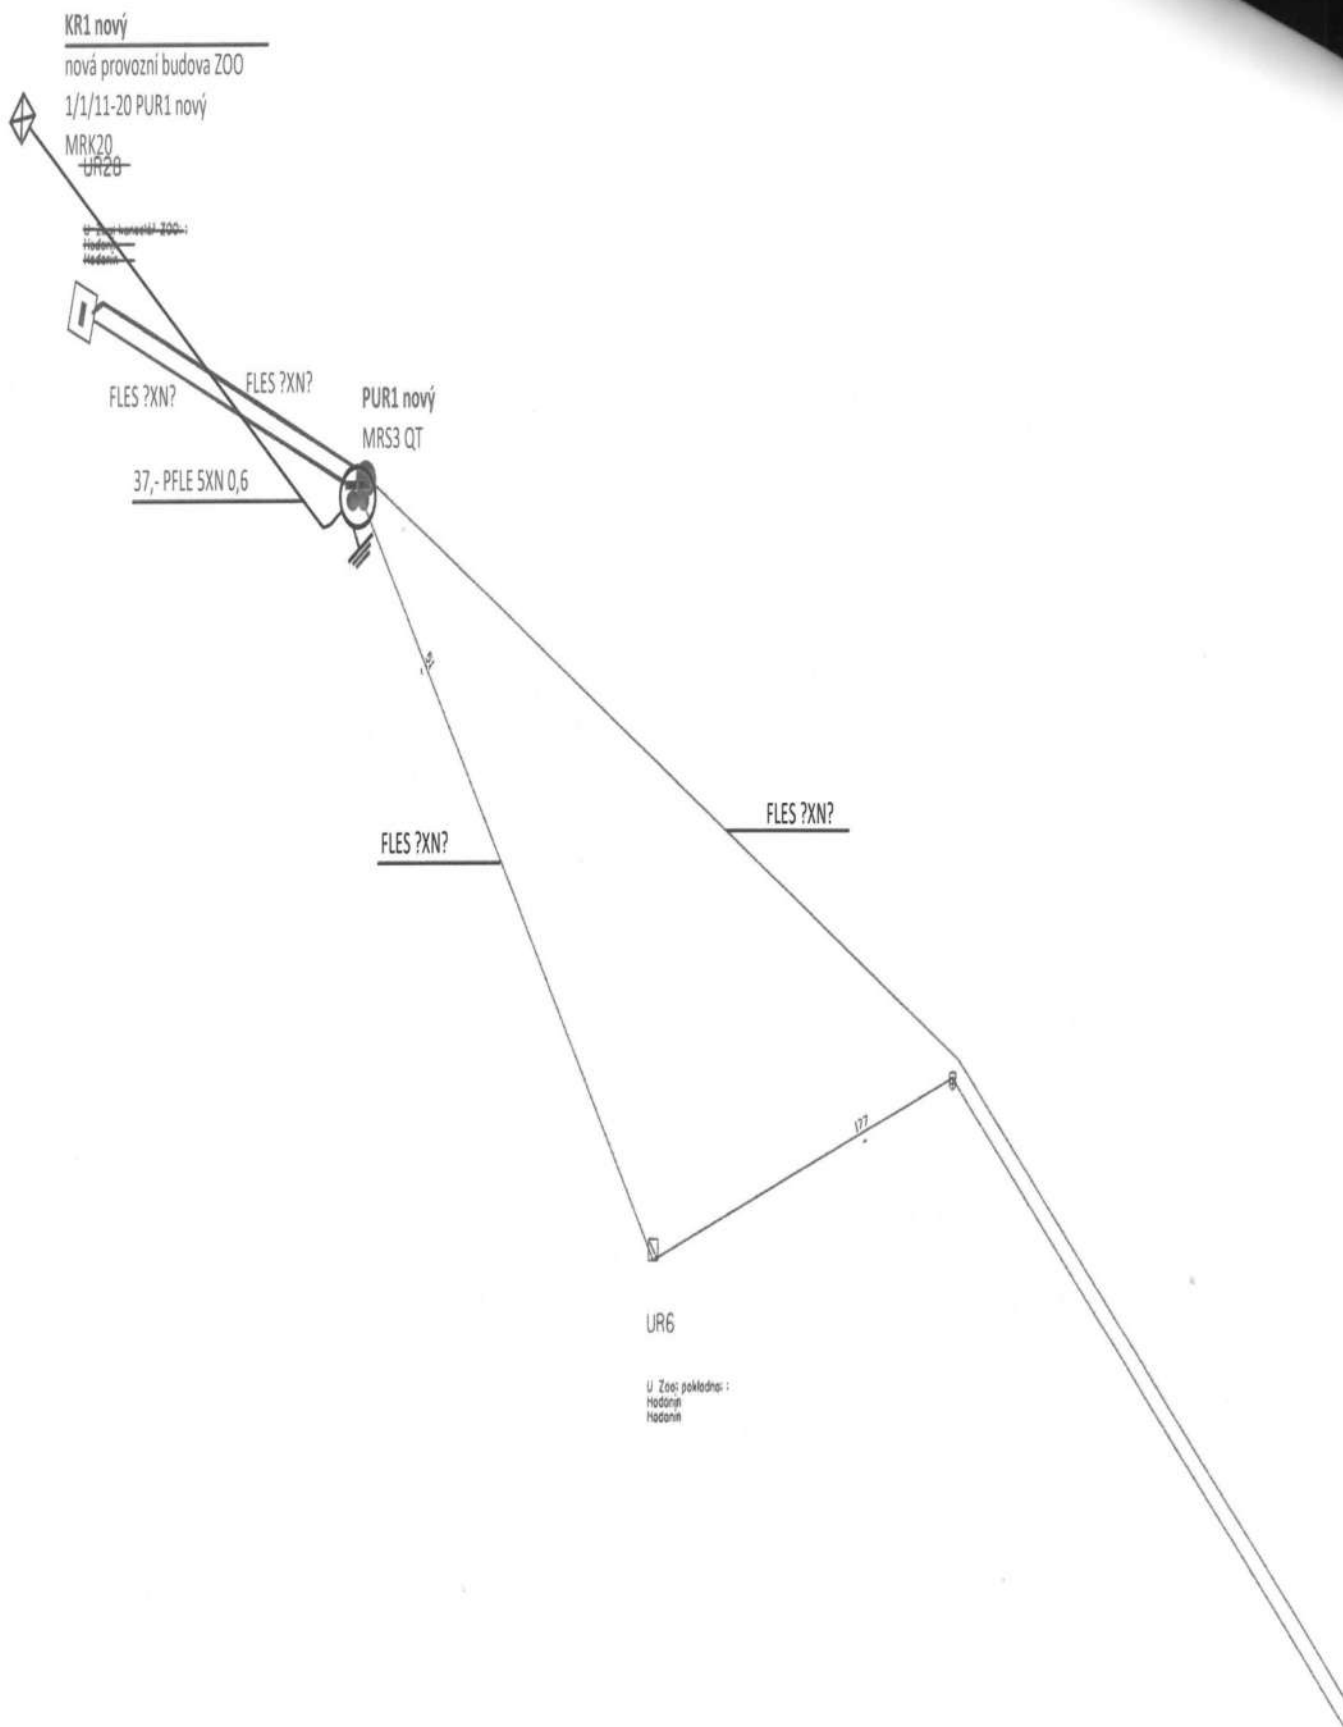

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.06
 Položková 2017.0
 databáze: 6

Název stavby: 45038/17/0034 VPIC Hodonín ZOO provozní budova_celkem

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s.

KPO: JMO

HOST: Hodonín

VUJ: Hodonín

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE -

Nevykazovaný

POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	
ZEMNÍ PRÁCE				
954943	S	Průvrt zdívkou smíšeným tl.od 300 do 600 mm	1.00 ks	
956266	S	Rýha bez výkopových prací, bez zřízení kabelového lože	28.00 m	
MONTÁŽ				
955015	S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	70.00 m	
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	8.00 ks	
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	6.00 ks	
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	

952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické rozpočtová mín. rezerva	1.00 ks
955292	S	Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	1.00 ks
955296	S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks
954981	S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	70.00 m
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	37.00 m
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	16.00 ks
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks
955987	S	Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči	1.00 ks
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks
náklady na kolaudaci			
954988	S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks
955022	S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	50.00 m
955312	S	Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	6.00 ks
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBř odhadovaná	1.00 ks

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE			
956130	S	Zrušení jednod. nepatkovaného stožáru	1.00 ks
955204	S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks
955205	S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	2.00 ks
955208	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks
955209	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	2.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306577	S	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA	20.00 ks	
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	28.00 ks	
305789	S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	

303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	28.00 m
315633	S	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	3.00 ks
300117	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	37.00 m
306438	S	Lano uzemňovací 7 x 3 mm FeZn 1kg=2,44m	3.00 kg
301277	S	Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná	1.00 ks
306701	S	Napínač šroubový oko-hák M 16	1.00 ks
303174	S	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	1.00 ks
309698	S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks
309931	S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg
305506	S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks
308707	S	Sběrnice zemnicí 6-ti pólová	1.00 ks
306320	S	Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-pod omítku	1.00 ks
306356	S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	1.00 ks
301339	S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks
307033	S	Svorka lanová D 9-12 mm	2.00 ks
309992	S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks
309380	S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	7.00 ks
306824	S	Svorník M 20x370x90x25	2.00 ks
306843	S	Svorník M 20x410x90x25	7.00 ks
303222	S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	4.00 ks
315502	S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	5.00 m
306188	S	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	2.00 ks
302289	S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	1.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

401646	S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks
401706	S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	18.00 ks
404063	S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks
404231	S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	18.00 ks
408324	S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	2.00 ks
314473	S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	3.00 m
402871	S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě dle pověření

na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

IČ: DIČ:

se sídlem

zastoupena

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „, kteréžto bylo vydáno dne , (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o

umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Brně dne

V dne

za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ludmila Uhrová
Specialista pro výstavbu sítě
