



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

1 Smluvní strany:

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 WINGL s.r.o.

Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zastoupený: Ing. Ladislavem Michlovským, DiS., jednatelem
IČO: 21420840
DIČ: CZ21420840
vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, sp. zn. 401650
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Bezpečnostní úpravy posluchárny ve dřevařském pavilonu“ smlouvu následujícího znění:

2 Předmět Smlouvy

- 2.1** Předmětem Smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího v provedení stavebních prací s názvem „Bezpečnostní úpravy posluchárny ve dřevařském pavilonu“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimírem Čapkou, se sídlem Gerstnerova 658/5 170 00 Praha 7, IČO: 12630713 (dále jen „Projektová dokumentace“), které zhotovitel potvrzuje, že obdržel před zhotovením díla, a dále v rozsahu oceněného soupisu prací a souhrnného listu stavby výkazu výměr (dále jen „Výkaz výměr“), které tvoří přílohu č. 2 a 3 Smlouvy a se všemi sjednanými a obvyklými vlastnostmi, součástmi a příslušenstvím (dále jen „**Dílo**“).
- 2.2** Předmětem Smlouvy na straně druhé je závazek Objednatele řádně a včas dokončené Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení Zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými ve Smlouvě.

3 Doba a místo plnění

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:
- Zahájení prací na Díle: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však 2. 5. 2025
- Dokončení a předání Díla: do 90 dnů od zahájení prací na Díle (viz tento odst. Smlouvy)
- 3.2** Místem plnění je: Česká zemědělská univerzita v Praze, budova Dřevařského pavilonu v areálu sídla Objednatele, tj. Kamýčká 1322, 165 00 Praha – Suchdol,
- 3.2** Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“), ve kterém jsou stanoveny veškeré časové i věcně významné milníky postupu provedení Díla, a který je v souladu s termínem pro dokončení Díla uvedeným v odst. 3.1 tohoto článku Smlouvy.

4 Cena a platební podmínky

- 4.1** Cena za Dílo v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět Smlouvy.
- 4.2** Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu ve výši **649 147,- Kč** bez DPH (dále jen „**Cena díla**“). DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů. Pokud Zhotovitel není plátcem DPH, k ujednání o DPH uvedených ve Smlouvě se nepřihlíží. Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedených ve Výkazu výměr a v Projektové dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli.
- 4.3** Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění Díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné poplatky za energie a vodu po dobu provádění Díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním Díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění Díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou ve Smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a jako příslušník dané profese s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.
- 4.4** Sjednanou Cenu díla lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy Zhotovitel není v prodlení s plněním dle Smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových předpisů dojde v době prodlení Zhotovitele s plněním dle Smlouvy, nese případné riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně Zhotovitel, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Uvedené se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové zátěže.
- 4.5** Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění se nazývají vícepráce. Práce a dodávky, které v předmětu plnění obsaženy jsou, a Objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 4.6** Sjednanou Cenu díla je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi a méněpracemi, kdy jsou Smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti písemný dodatek ke Smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně započítat.
- 4.7** Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá Zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

- 4.8** Cena díla bude Objednatelům uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném předání a převzetí Díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě písemného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 4.9** Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli. Daňový doklad – faktura musí dále obsahovat označení projektu, z něhož je Dílo financováno. Pro potřeby plnění Smlouvy se jedná o projekt s názvem: „Zkvalitnění prostor, přístrojového vybavení pro výuku a strategického software na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.02.01/00/23_023/0009070“.
- 4.10** Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka nebo v elektronické podobě na e-mail [xxxxx](#). Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.11** Cena díla nebo její část bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.
- 4.12** Pokud bude do okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o Zhotoviteli zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si Objednatel, jakožto ručitel, právo snížit Cenu díla včetně DPH, která má být hrazena Zhotoviteli, o částku odpovídající výši DPH. Tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky Zhotovitele za Objednatelům o příslušnou částku DPH a Zhotovitel se vzdává práva po Objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.

5 Provádění Díla a jiná ustanovení

- 5.1** Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění Objednateli tak, aby Dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání Objednateli, a to za podmínek sjednaných Smlouvou, k tomu se Objednatel zavazuje Zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost.
- 5.2** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu Díla.
- 5.3** Objednatel předá staveniště Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy a zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran. Zhotovitel se

zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení Díla zařízení staveniště, a dále že zajistí energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení Díla třeba.

- 5.4 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání Díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od Smlouvy. Zástupci Smluvních stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé Smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, pokud budou potvrzeny Objednatelem.
- 5.5 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru Objednatele může provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 5.6 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně v účinném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli anebo třetím osobám v důsledku porušení prohlášení anebo závazku Zhotovitele ze Smlouvy anebo porušením právních předpisů, či norem.
- 5.8 Vlastníkem Díla, či jakékoliv jeho části je od počátku, popř. od zpracování, Objednatel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem řádného předání Díla Objednateli.
- 5.9 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny Díla proti Smlouvě a jejím přílohám. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí a životní prostředí. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 5.10 Pověřený pracovník Objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní. Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 5.11 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných Objednatelem v pravidelných časových intervalech a konaných přímo na staveništi. Objednatel o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního dne.
- 5.12 Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut písemně ve stavebním deníku. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkryt na vlastní náklad.
- 5.13 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených

prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

- 5.14** Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u něj a jeho zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k Objednateli a jeho zaměstnancům a u dotčených subjektů, které jsou Zhotoviteli ke dni podpisu Smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 5.15** Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je informován o povinnostech spadajících na povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“) a potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro všechny jeho poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 5.16** Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činností Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není:
- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo
 - dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b).

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i (i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy,

v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

- 5.17** Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení Díla. Pokud je v českých právních předpisech nebo v podmínkách poskytovatele dotace na předmět Smlouvy stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen dodržet tuto delší lhůtu.
- 5.18** Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení Díla či projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Díla či projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŠMT, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen „OFS“) a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla či projektu a poskytnout jim při provádění kontroly plnou součinnost.

6 Předání a převzetí Díla, záruka a odstraňování vad

- 6.1** Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla v předávacím řízení Objednateli. Předávací řízení bude ukončeno písemným protokolem o předání a převzetí Díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem Objednatele i Zhotovitele. V opačném případě nebude Dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí písemného protokolu o předání a převzetí Díla bude i soupis případných vad a nedodělků Díla, které nebrání řádnému užívání Díla, s dohodnutým termínem jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce na Díle.
- 6.2** Zhotovitel vyzve k převzetí Díla Objednatele písemně nejméně 3 dny předem.
- 6.3** Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Pokud k odstranění případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5 dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků.
- 6.4** Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li jich třeba k řádnému provedení a užívání Díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat v předávacím řízení Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v České republice, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 6.5** Zhotovitel je povinen předat Objednateli po dokončení Díla kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, které vznikly v souvislosti s provedením Díla, a předložit na žádost Objednatele originály ke kontrole.
- 6.6** Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo a všechny jeho součásti a příslušenství záruku za jakost po dobu 36 měsíců (dále také jen „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
- 6.7** Během Záruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Díle vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí a popř. včetně bezplatného provádění validací a kalibrací Díla (resp. jeho relevantních částí), provádění běžných či bezpečnostně technických kontrol a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami a provozními potřebami Objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat Objednateli během Záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na

Díle vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací. Záruka zahrnuje také provádění povinných bezpečnostně technických kontrol, elektro revizí a dalších kontrol, které jsou pro Dílo nebo jeho jednotlivou část stanoveny právními či jinými předpisy.

- 6.8** Odstranění vad v Záruční době se Zhotovitel zavazuje provést ve lhůtě do 10 dnů od ohlášení vady Objednatelem, pokud nebude Smluvními stranami sjednána lhůta delší. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.9** Objednatel má v případě vzniku práv z vadného plnění dle své volby právo (i) na odstranění vady Díla dodáním náhradních částí Díla za části vadné nebo dodáním chybějících částí Díla, (ii) na odstranění vady opravou Díla, nebo (iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla. Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
- 6.10** Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Objednatelem, pokud je Objednatel oznámí Zhotoviteli do konce Záruční doby, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu info@wingl.cz nebo na adresu Zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 Smlouvy. V oznámení práva z vadného plnění (reklamaci) uvede Objednatel popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit v souladu s odst. 6.9 Smlouvy.
- 6.11** V případě, že Objednatel bude k uspokojení svých práv z vadného plnění v souladu s odst. 6.9 Smlouvy požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla a nedohodnou-li se Smluvní strany bez zbytečného odkladu na přiměřené výši slevy z Ceny díla, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy, ledaže se se Zhotovitelem současně dohodne na jiném způsobu odstranění vady.
- 6.12** V případě sporu Smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Objednatele.
- 6.13** V případě opravy Díla v Záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení vady Objednatelem do jejího řádného odstranění Zhotovitelem.
- 6.14** Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí, že v případě dodání nového Díla, či jeho části za Dílo vadné, či jeho části v souladu s ustanovením tohoto článku, se Záruční doba prodlužuje o 12 měsíců a Objednateli zůstávají zachována veškerá práva z vadného plnění dle Smlouvy a Občanského zákoníku.
- 6.15** V případě, že Zhotovitel vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtě uvedené v odst. 6.8 Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, přičemž oprávněnost reklamace bude v takovém případě ověřena znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Objednatel. V případě, že bude reklamace označena znalcem za oprávněnou, je Zhotovitel povinen uhradit znalci či Objednateli náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli účelně a prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- 6.16** Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že v průběhu celé Záruční doby je Zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady a odpovědnost veškeré úkony a činnosti (zejména v podobě záručního servisu, které jsou nezbytné k řádnému fungování Díla, jeho součástí či příslušenství), které jsou stanoveny výrobcem či dodavatelem pro zachování záruky. Není rozhodné, zda jsou tyto úkony a činnosti realizovány Zhotovitelem či jinými subjekty (zejména podílejšími se na realizaci Díla v podobě poddodávek poskytovaných Zhotoviteli). Za zachování jakékoliv záruky Díla či jeho části, včetně technologické části Díla (tj. zařízení, stroje, technologie, osvětlení, a další) je tedy po celou Záruční dobu plně odpovědný Zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud ke ztrátě funkce dané části Díla došlo úmyslným jednáním na straně Objednatele nebo jeho zaměstnanců, nebo pokud si Objednatel smluvně sám zajistí plnění konkrétních úkonů a činností třetí osobou, o čemž bude Zhotovitele případně informovat.

7 Pojištění odpovědnosti za škodu a zajištění závazků Zhotovitele

- 7.1** Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla a předat Objednateli nejpozději při uzavření Smlouvy takovou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 1,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Kopie pojistné smlouvy či pojistného certifikátu je přílohou č. 4 Smlouvy.
- 7.2** Zhotovitel je dále povinen mít nejpozději ke dni uzavření Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši celkové ceny Díla a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy, do doby protokolárního předání Díla bez vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

8 Autorská práva

- 8.1** Ochrana autorských práv se řídí platným zněním zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2** Zhotovitel tímto ujednáním poskytuje Objednateli licenci ke všem způsobům užití Díla zhotoveného dle Smlouvy jakožto autorského díla ve smyslu výše citovaného autorského zákona, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva autorského dílo neomezeně upravit, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle volby Objednatele (možnost udělit podlicenci). Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence podle tohoto ujednání je zahrnuta v Ceně díla. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem pro účely Smlouvy rozumí jakýkoli jedinečný výsledek či výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele, které Zhotovitel provede na základě Smlouvy a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické. Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele k autorskému dílu.
- 8.3** Zhotovitel souhlasí s tím, že je Objednatel (nabyvatel licence) oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část nebo jeho název, či jeho část spojit nebo zařadit do díla souborného, kolektivního, vždy však takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. Objednatel (nabyvatel licence) je tak oprávněn užít autorské dílo i ke všem jiným účelům, než je uvedeno ve Smlouvě.

9 Sankční ujednání

- 9.1** Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem písemného protokolu o předání a převzetí Díla oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- 9.2** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu s Harmonogramem, tj. v případě nedodržení některého z termínů dokončení Díla vyplývajících z Harmonogramu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý, byť i započatý den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s dokončením Díla. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 9.1 tohoto článku Smlouvy.
- 9.3** Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve sjednané lhůtě.
- 9.4** V případě prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných Objednatelem v Záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 9.5** V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 9.6** Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení Ceny díla.
- 9.7** Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši.

10 Platnost a účinnost Smlouvy

- 10.1** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. V případě, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
- 10.2** Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
- 10.3** Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
- 10.4** Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od Smlouvy zejména v případech, kdy:
- a. bude Zhotovitel v prodlení s dodáním i části Díla oproti dohodnutému termínu,
 - b. nebude Zhotovitelem dodána i část Díla ve smlouvené kvalitě, či v kvalitě Díla obvyklé,
 - c. postupuje-li Zhotovitel při provádění Díla v rozporu s ujednáními Smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce Objednatele, či s právními předpisy.
- 10.5** Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 10.6** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení Díla a Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 15 dní po doručení písemné výzvy Zhotovitele Objednateli.
- 10.7** V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran je Zhotovitel povinen předat Objednateli dosud provedené práce i nedokončené části Díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a opustit místo plnění dle odst. 3.2 Smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší Objednatel i Zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.
- 10.8** Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

11 Závěrečná ustanovení

- 11.1** Ve vzájemném styku Smluvních stran ve věcech souvisejících se Smlouvou, kromě zástupců uvedených v úvodu Smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení činností při realizaci Díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí Díla nebo jeho části zmocnění jednat:
- za Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]
- za Zhotovitele: [REDACTED] z
- 11.2** Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 11.3** Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
- 11.4** Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 11.5** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 11.6** Smluvní strany budou vždy usilovat o mimosoudní řešení případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případný soudní spor bude řešen u soudu, který je místně příslušný podle sídla Objednatele.
- 11.7** Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- a. Příloha č. 1 - Časový harmonogram
 - b. Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
 - c. Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr
 - d. Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu)
 - e. Příloha č. 5 - Pojistná smlouva (pojištění stavebně montážní)
- 11.8** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 11.9** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 11.10** Smlouva je uzavírána v elektronické podobě. Pokud je Smlouva uzavírána v listinné podobě, je sepsána v třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení.

11.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....


Ing. Jakub Kleindienst

kvestor

.....

Ing. Ladislav Michlovský, DiS.

jednatel

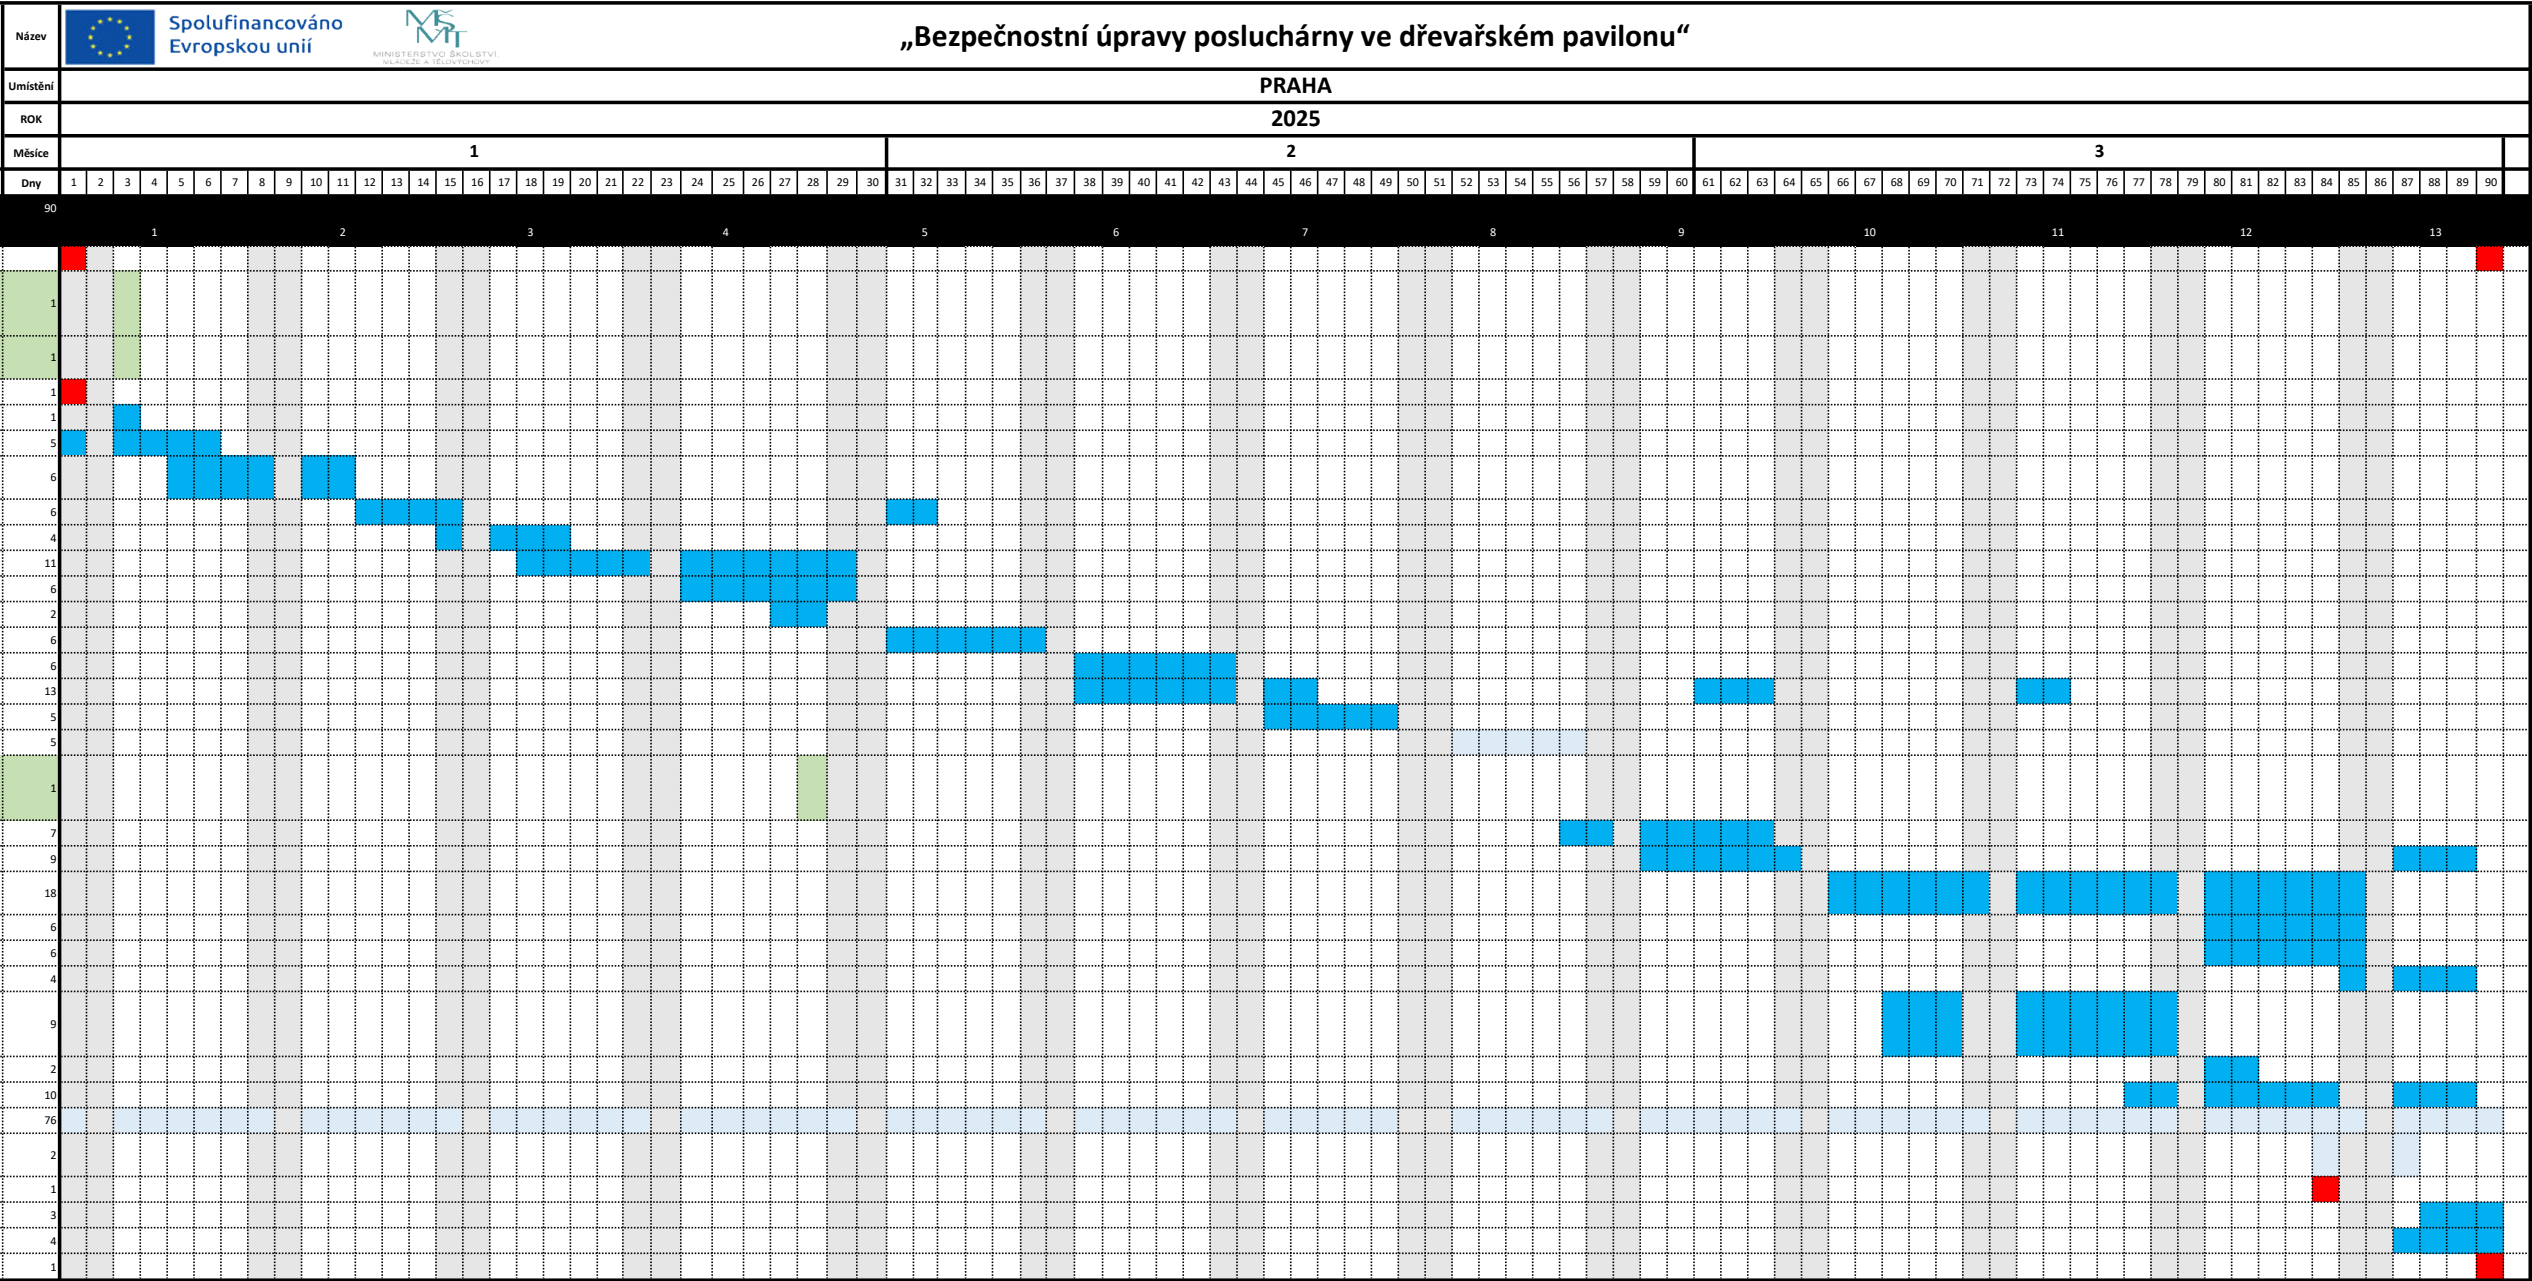

Dodávky jednotlivých materiálů je ovlivněno výrobcem. Termíny realizací jsou nyní předběžné.

Nástup na jednotlivé profese jsou orientační, bude řešeno dle konkrétních dodávek a nástup se zástupcem Objednatelé.

Upozorňujeme na možnosti měnit HMG práci podle aktuální situace a dodávek na stavbu, v případě potřeby bude vyhotoven upravený HMG jako dodatek smlouvy.

OBSAH DOKUMENTACE

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

- D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- D.1.4.4 SILNOPROUD
- D.1.5. INTERIÉR

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 01 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | |
| 02 | PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.01 - stávající stav - bourání | M 1:50 |
| 03 | PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.01 – nový stav | M 1:50 |
| 04 | DETAILY | M 1:1, M 1:5, M 1:10 |

OBSAH DOKUMENTACE

- | | | |
|---------|--|---------|
| DET. 01 | PŘÍČNÝ ŘEZ PODLAHOU POSLUCHÁRNY 2.01 | M 1: 10 |
| DET. 02 | PŘÍČNÝ ŘEZ SEDAČKOU POSLUCHÁRNY 2.01 | M 1: 10 |
| DET. 03 | SCHOD STŘEDNÍ ULÍČKY POSLUCHÁRNY 2.01 | M 1: 5 |
| DET. 04 | PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODEM STŘEDNÍ ULÍČKY 2.01 | M 1: 1 |

Ing. **Vladimír Čapka**
projekce a inženýring
Gerstnerova 5/658
170 00 Praha 7

MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1
OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL
ŠÉFPROJEKTANT | PROJEKTANT | VYPRACOVAL
XXXXX | XXXXX | XXXXX

NÁZEV AKCE
DŘEVAŘSKÝ PAVILON
STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY m.č. 2.01

ČÍSLO ZAKÁZKY	0624
STUPEŇ	DPS
POČET FORMÁTŮ	9A4
DATUM	ŘÍJEN 2024
MĚŘÍTKO	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
	D 1.1.	AS	01

Č.PŘ. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

- 1. ÚČEL OBJEKTU**
- 2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ**
- 3. DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ**
- 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY**
- 5. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY**
- 6. TEPELNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ**
- 7. OCHRANA PŘED HLUKEM**
- 8. OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ, OCHRANA PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI**
- 9. ORIENTACE, OSLUNĚNÍ, OSVĚTLENÍ**
- 10. TERÉNNÍ ÚPRAVY**
- 11. SADOVÉ ÚPRAVY**
- 12. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU, POUŽITÉ NORMY**
- 13. ZÁVĚR**

1. ÚČEL OBJEKTU

Dřevařský pavilon, který je součástí Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole, je komplexní pracoviště, které se zabývá testováním vlastností dřeva včetně jeho zpracování. V pavilonu se nacházejí výukové prostory, dílenské pracoviště, výzkumné a technické prostory laboratoře a kanceláře.

V budově Dřevařského pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské je umístěna ve 2. nadzemním podlaží m.č.2.01 Posluchárna. Tato dokumentace řeší návrh úpravy sezení ve zmíněné posluchárně. Stávající stupňovitá podlaha má po obou stranách posluchárny přístupovou uličku s vloženými schodovým stupni pro přístup k jednotlivým řadům sezení. Požadavek investora je vytvoření třetí a to střední uličky pro lepší přístup k sedadlům uprostřed jednotlivých řad. Při současném stavu pouze s krajními uličkami studenti neosazují místa ve středu řad a to z důvodů příliš dlouhého a obtížného přístupu. Návrh třetí střední uličky by měl zjednodušit přístup ke středním sedadlům v jednotlivých řadách.

2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Venkovní tvar objektu zůstává beze změny. Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy v m.č 2.01 Posluchárna ve 2. NP. Jde o návrh vytvoření střední třetí přístupové uličky do prostoru sezení v posluchárně. Pro vytvoření uličky je nutné demontáž všech řad sedaček a jejich zpětná montáž ve stávajících řadách. Současně bude nutné doplnění krajních modulů sedaček v jednotlivých řadách.

Budou použity stávající sestavy sedaček včetně ocelové konstrukce, barevnost ponechána. Vzhledem ke stavebním úpravám stávajících betonových stupňů v uličkách, kdy dojde k jejich pokrácení, bude kompletně vyměněna v celé posluchárně podlahová krytina včetně hrany všech stupňů. Stavebními úpravami nedojde k zásadním zásahům do architektonického, výtvarného a materiálového řešení této posluchárny.

STÁVAJÍCÍ STAV

m.č. 2.01 Posluchárna

Před návrhem stavebních úprav v posluchárně byl proveden záměr základních rozměrů místnosti, především byla ověřena šířka místnosti, velikost jednotlivých stupňů a modul konstrukce sedaček v posluchárně.

Stavební úpravy v posluchárně budou realizovány v nutném rozsahu týkající se vytvoření nové střední přístupové uličky s vloženými stupni a přeskupením sezení v uličkách s doplněním krajních modulů konstrukce stávajících sedaček.

Stěny – obloženy akustickým obkladem, barva povrchu bílá, schodišťové stupně lemovány nalepeným soklem s lemovací plastovou lištou s vloženou podlahovou krytinou. Na stěnách ozvučení posluchárny. Vstup na kartový systém EKV, dvoje dvoukřídlové dřevěné vstupní dveře. Na čelní stěně promítací plátno.

Strop – Strop rovný s akustickým obkladem, barva povrchu bílá, na stropě 4 ks světlíků, svítidla zářivková přisazená, 2 ks dataprojektorů.

Podlaha – stupňovitá podlaha posluchárny, železobetonová konstrukce podlahy, vložené betonové stupně v postranních uličkách. Podlahová krytina – Marmoleum, barva zelená, hrany stupňů PVC rohová lišta.

Výplně otvorů -

Vstupní dveře 1700/1970 mm dřevěné do obložkových ocelových zárubní, s proskleným svislým pásem z čirého skla, s požární odolností EI30 DP3 + C3 + koordinátor zavírání. Materiál dveří – povrch lamino. Vstup přes přístupový systém, na chodbě čtečka.

3. DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Posluchárna m.č. 2.01 se nachází ve 2. NP Dřevařského pavilonu, Fakulty lesnické a dřevařské. Přístup k posluchárně je z prostoru galerie, do které vede železobetonové vřetenové schodiště m.č. 1.02 vstupní hala v 1. NP. Bezbariérový přístup je pomocí výtahu z m.č. 1.02.1 vstupní hala, nebo po dvouramenném schodišti z této haly. Vstup do posluchárny je dvojicí dvoukřídlových dveří přes čtečku karet. U čelní stěny je umístěna katedra pro přednášející pedagogy, na stěně je umístěno promítací plátno. Na stupňovité železobetonové podlaze tl. 150 mm je umístěno sezení pro studenty, celkové je zde 8 řad vždy s 20 ti místy v každé řadě, 9. řada má pouze 2 x 3 místa k sezení. Řadu tvoří moduly lavic pro 2 místa a pro 3 místa.

Celková kapacita posluchárny je 166 míst.

Každou řadu tvoří ocelová konstrukce – stojiny. Stojiny jsou propojeny vodorovnou konstrukcí, na které jsou ukotveny sklopné čalouněné sedáky a opěradla z tvarované překližky. Maska mezi stojinami je z perforovaného ocelového plechu. Na stojinách je ukotvena průběžná stolová deska šířky 300 mm.

Stolové kovové nohy v barvě matná černá, maska stolových nohou je provedena z perforovaného plechu v barvě matné černé, konstrukce pro sklopné sedáky kovová rovněž v matné černé barvě.

Čalouněný sedák je barvě zelenomodré, opěrák v přírodní barvě dřeva překližky.

Po obou stranách posluchárny je vždy přístupová ulička s vloženými schody. Výškový rozdíl jednotlivých řad je 320 mm, vložené schody v uličkách mají výšku

160 mm. Větrání posluchárny je zajištěno přívodem vzduchu – otvory v čelní stěně železobetonové stupňovité podlahy. Otvory jsou překryty předsazenou maskou, na které jsou osazeny silové povrchové zásuvky v počtu 1 ks na každé sedadlo.

Odvod vzduchu přes žaluzie umístěné v prostoru ostění stropních světlíků.

4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba je navržena v souladu s vyhláškami platnými v době zpracování projektové dokumentace o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze - Pražské stavební předpisy, v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba zůstává beze změn.

5. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní konstrukční systém celé budovy zůstává beze změn. Železobetonová konstrukce stupňovité podlahy posluchárny bez změny.

Jediná stavební úprava bude zkrácení – odbourání přisazeného nabetonovaného stupně 160/285 mm.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy v posluchárně m.č. 2.01 se týkají úprav sezení na stupňovité podlaz. Cílem je vytvoření střední přístupové uličky a zachování stejného počtu sezení.

posluchárně. Vytvořením střední uličky dojde ke zkrácení cesty k místům ve středu řady každé řady.

DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ

Bude provedena odborná demontáž ocelové konstrukce sedaček z celého prostoru stupňovité podlahy posluchárny. Budou demontovány jednotlivé stojiny konstrukce pro sezení se stolovou deskou. Stojiny jsou propojeny vodorovnou konstrukcí na které jsou ukotveny sklopné čalouněné sedáky a opěradla z tvarované překližky. Maska mezi stojinami je z perforovaného ocelového plechu. Na stojinách je ukotvena průběžná stolová deska šířky 300 mm. Sestavy sedaček budou po stavebních úpravách opět namontovány na stupňovitou podlahu.

Provedena odborná demontáž povrchových silových zásuvek za každým sedadlem, zásuvky jsou přivrtané k dřevotřískové desce, která tvoří předsazenou masku stupně jednotlivých řad. Spodní hrana čela masky je 70 mm nad úroveň podlahy, je vzdálená 120 mm od čela železobetonového stupně, ve kterém jsou v čelní stěně otvory pro přívod vzduchu pro větrání celého prostoru posluchárny.

Dodavatel stavby zajistí odbornou demontáž všech instalací, zařízení a koncových prvků z katedry. Následně může být provedena demontáž a vystěhování vlastní katedry. Vystěhování zařízení katedry je v rámci profese D.1.5 INTERIÉR.

V celé ploše odstraněna stávající podlahová krytina Marmoleum. Po odstranění podlahové krytiny bude provedeno zkrácení délky železobetonového přibetonovaného stupně výšky 160 mm tak, aby upravená délka byla 950 mm od stávajícího akustického obkladu na obou stranách posluchárny.

Skladba podlahy stupně jednotlivých řad výšky 320 mm: (P12)

- krytina Marmoleum Real 2,5 mm
- lepidlo
- vyrovnávací stěrka 10 mm
- železobetonová deska stupňovité podlahy tl. 150 mm

Skladba podlahy vloženého schodu v krajních uličkách: (P12)

- krytina Marmoleum Real 2,5 mm
- lepidlo
- betonový stupeň nabetonován, výška 160 mm

Po odstranění podlahové krytiny bude zmapována a zaměřena konstrukce předložené masky – čela řady.

Skladba rovné podlahy posluchárny v místě vstupů: (P9)

- krytina Marmoleum Real 2,5 mm
- lepidlo
- anhydrit 60 mm
- separační fólie
- kročejová izolace – Rigifloor 40 mm
- železobetonová stropní deka tl. 250 mm

NOVÝ STAV

Cílem stavebních úprav je vytvoření nové střední uličky a zpětné umístění lavic se stolovou deskou do stupňovité podlahy posluchárny. Přisazené betonové stupně v krajních uličkách jsou zkráceny na délku 950 mm – od akustického obkladu obvodových stěn posluchárny. V místech po zkrácení stupně bude doplněna čelní maska stupňovité podlahy (provedení bude upřesněno po odstranění podlahové krytiny). Následně bude provedena montáž schodových stupňů do nové střední přístupové uličky. Po konečné přípravě povrchu stávajících přisazených betonových stupňů, po doplnění čelní masky stupňovité podlahy včetně uprav povrchu pro podlahovou krytinu a po montáži schodů nové střední uličky bude provedena pokládka podlahové krytiny v celé ploše posluchárny. Hrany všech schodů a stupňovité podlahy budou opatřeny po obvodě schodišťovou lištou. Detail kotvení a způsob provedení vlastní montáže bude podle vybraného typu schodišťové lišty. Materiál schodišťové lišty navrhujeme jako systémový hliníkový profil.

Po ukončení pokládky podlahové krytiny bude provedeno osazení konstrukce sedadel posluchárny. Protože dojde k rozdělení sestavy stávající konstrukce sedaček, bude nutné doplnit 16 kusů krajních stojin konstrukce sedaček a 2 kusy nohou pro stolovou desku do 1 řady – řeší D.1.5 INTERIÉR.

V masce stupňovité podlahy bude provedeno osazení povrchových silových zásuvek 230 V a to vždy po jedené zásuvce za každým sedadlem a jejich zapojení – řeší D.1.4.SILBOPROUD.

Po dokončení zpětné montáže katedry zajistí dodavatel stavby odbornou zpětnou montáž všech instalací, zařízení a koncových prvků katedry a to včetně revizí všech zařízení.

STAVEBNÍ PRVKY

Akustické obklady stěn

Stávající, bez úprav. Po dobu stavebních úprav ochránit v prostoru u podlahy.

Podlahy

Stávající povrch podlahy – Marmolem odstraněno v celé ploše posluchárny, včetně soklových lišt na akustickém obkladu stěn. V celé ploše položena nová podlahová krytina - Marmoleum, hrany všech stupňů lemovány schodišťovým profilem. Na stěnách soklová lišta s vlepenou podlahovou krytinou.

Akustické podhledy stropu

Stávající, bez úprav.

Vstupní dveře

Stávající, bez úprav.

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Navržené úpravy v posluchárně m.č.2.01 se nezasahují do nosné konstrukce stupňovité podlahy. Při navržených dojde ke zkrácení délky nabetonovaných schodišťových stupňů v postranních přístupových uličkách. Nově navržená konstrukce schodišťové stupně bude ze dřeva.

D.1.5 INTERIÉR - Stávající lavicové sezení bude zpětně namontováno na stupňovitou podlahu a to tak že v každé řadě bude symetricky se střední osou umístěno vždy 10 míst, celkem v řadě 20 míst. Pracovní desky je třeba

vyměnit za nové, je třeba počítat s výrobou nových desek do celé posluchárny.

Při demontáži nýtovaných spojů masky sezení z děrovaných plechů, hrozí nebezpečí poškození těchto plechů při odvrtávání nýtů, Proto bude nutné počítat s opravou a povrchovou úpravou. Dále je nutné prověřit stav mechaniky sklápěcích sedáků a stav čalounění sedáků.

Součástí dodávky interiéru je i zpětná odborná montáž nábytku katedry. Po dokončení montáže zajistí dodavatel stavby odbornou montáž všech instalací, zařízení a koncových prvků z katedry včetně revizí zařízení.

D.1.3 POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Koncepce PBŘ se nemění.

Na základě zprávy PBŘ je třeba po dokončení stavebních úprav provést revize stávajícího zařízení - citujeme.

Navrhovaná změna stavby vyžaduje z hlediska požární bezpečnosti splnění podmínek, podrobněji popsanych v jednotlivých bodech tohoto PBŘ, tj.

- kontrola funkčnosti požárních uzávěrů - viz výše, odst. 3.
- kontrola únikových cest - viz výše, odst. 4.
- kontrola funkčnosti EPS, SOZ nouzového osvětlení a evakuačního rozhlasu viz výše, odst. 6.
- kontrola vybavení vnitřními odběrními místy požární vody a přenosnými hasicími přístroji a jejich funkčnosti – viz výše odst.7

D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Kanalizace

Bez změny.

Vodovod

Bez změny.

D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Bez změny.

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

Bez změny.

D.1.4.4 SILNOPROUD

V masce stupňovité podlahy bude provedeno osazení povrchových silových zásuvek 230 V a to vždy po jedené zásuvce za každým sedadlem a jejich zapojení.

D.1.4.5 EPS + EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Bez změny.

D.1.4.6 DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY

Bez změny.

AVT

Bez změny.

D.1.4.7 EZS + EKV

Bez změny.

D.1.4.8 MĚŘENÍ A REGULACE

Bez změny.

D.1.5. INTERIER

Cílem stavebních úprav v interiéru posluchárny m.č. 2.01 ve 2. NP je vytvoření střední přístupové uličky k jednotlivým řadám stupňovité podlahy se sestavou sedaček. Tím, že se zmenší počet sezení v řadě na 10 míst, dojde k lepší přístupnosti míst ve středu řady. Budou použity stávající sestavy sedaček. Protože dojde k rozdělení sestavy stávající konstrukce sedaček na 10 míst v řadě, bude nutné doplnit 16 kusů krajních stojin konstrukce sedaček a 2 kusy nohou pro stolovou desku do 1 řady. Celkový počet míst k sezení zůstává nezměněn – 166 míst.

6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Beze změn.

7. OCHRANA PŘED HLUKEM

Beze změn.

8. OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ, OCHRANA PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

Není nutné řešit.

9. ORIENTACE, OSLUNĚNÍ, OSVĚTLENÍ

Orientace okenních otvorů – stávající.

Oslunění – beze změny, stávající.

Osvětlení v posluchárně beze změny.

9. TERÉNNÍ ÚPRAVY

Nejsou prováděny.

10. SADOVÉ ÚPRAVY

Nejsou prováděny.

11. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Použité normy a vyhlášky:

- Zákon 283/2021 Sb. (Stavební zákon)
- Nařízení č.10/2016 Sb. Hl.m. Prahy (Pražské stavební předpisy)
- Vyhl. č. 268/2009 Sb. o techn. požadavcích na stavby, změna vyhl. č. 20/2012 Sb.
- Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- Vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, novela vyhl. č. 63/2013 Sb
- Vyhl. č. 501/2006 Sb. vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, novela vyhl. č. 431/2012 Sb.
- Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění
- Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, změna vyhl. č. 62/2013 Sb. a vyhl. 405/2017 Sb.
- Zákon č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Novela č. 225/2017 Sb.
- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy
- Zákon Č. 185/2001 Sb. o odpadech
- informace o parcelách z katastru nemovitostí
- kopie katastrální mapy
- Dřevařský pavilon FLD-dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 11.2015
zpracoval SM-PROJEKT s.r.o., Blatenská 2306, Chomutov, Ing. Milan Steňko
ČKAIT č. 0300371
- Dřevařský pavilon FLD-dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) 03.2014
zpracoval SM-ROJEKT s.r.o., Blatenská 2306, Chomutov, Ing. Milan Steňko
ČKAIT č. 0300371
- Stavební povolení – Dřevařský pavilon FLD v areálu ČZU v Praze, Praha Suchdol, č.j. MCP6 020651/2014, spis. zn.: MCP6 100154/2013/OV/Fr ze dne 13.3. 2014, nabytí právní moci 18.3.2014
- Kolaudační souhlas č.j. MCP6 043608/2016, spis. zn.: MCP6 030193/2016/OV/Fr ze dne 17.05. 2015
- Dokumentace pro změnu v užívání – Dřevařský pavilon FLD – Stavební úpravy m.č. 2.09,2.10,2.11,2.12 zpracovaná Ing. Vladimírem Čapkou v 02. 2024
- Rozhodnutí - Stavební povolení - Dřevařský pavilon FLD – Stavební úpravy m.č. 2.09,2.10,2.11,2.12, spis. zn.: SZ MCP6 072398/2024/OV/Fra ze dne 17.4.2024, nabytí právní moci v 03.05. 2024


12. ZÁVĚR

Ve stávajícím stavu byla po obou stranách posluchárny vždy jedna krajní ulička pro přístup k jednotlivým řadám sezení. Vytvoření třetí střední přístupové uličky ve stupňovité podlaze posluchárny se zlepší přístupnost ke středním sedadlům v každé řadě. Celkový počet sedadel v řadě zůstane stejný tedy 10 + 10 míst, zkrátí se tím délka přístupu k jednotlivým místům v každé řadě.

Projektem byla splněna zadání stavebního programu investora. Navržené stavební úpravy přispějí k celkovému zlepšení přístupu k sezení v řadách posluchárny v Dřevařském pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské.

V Praze: říjen 2024

vypracoval: xxxxx

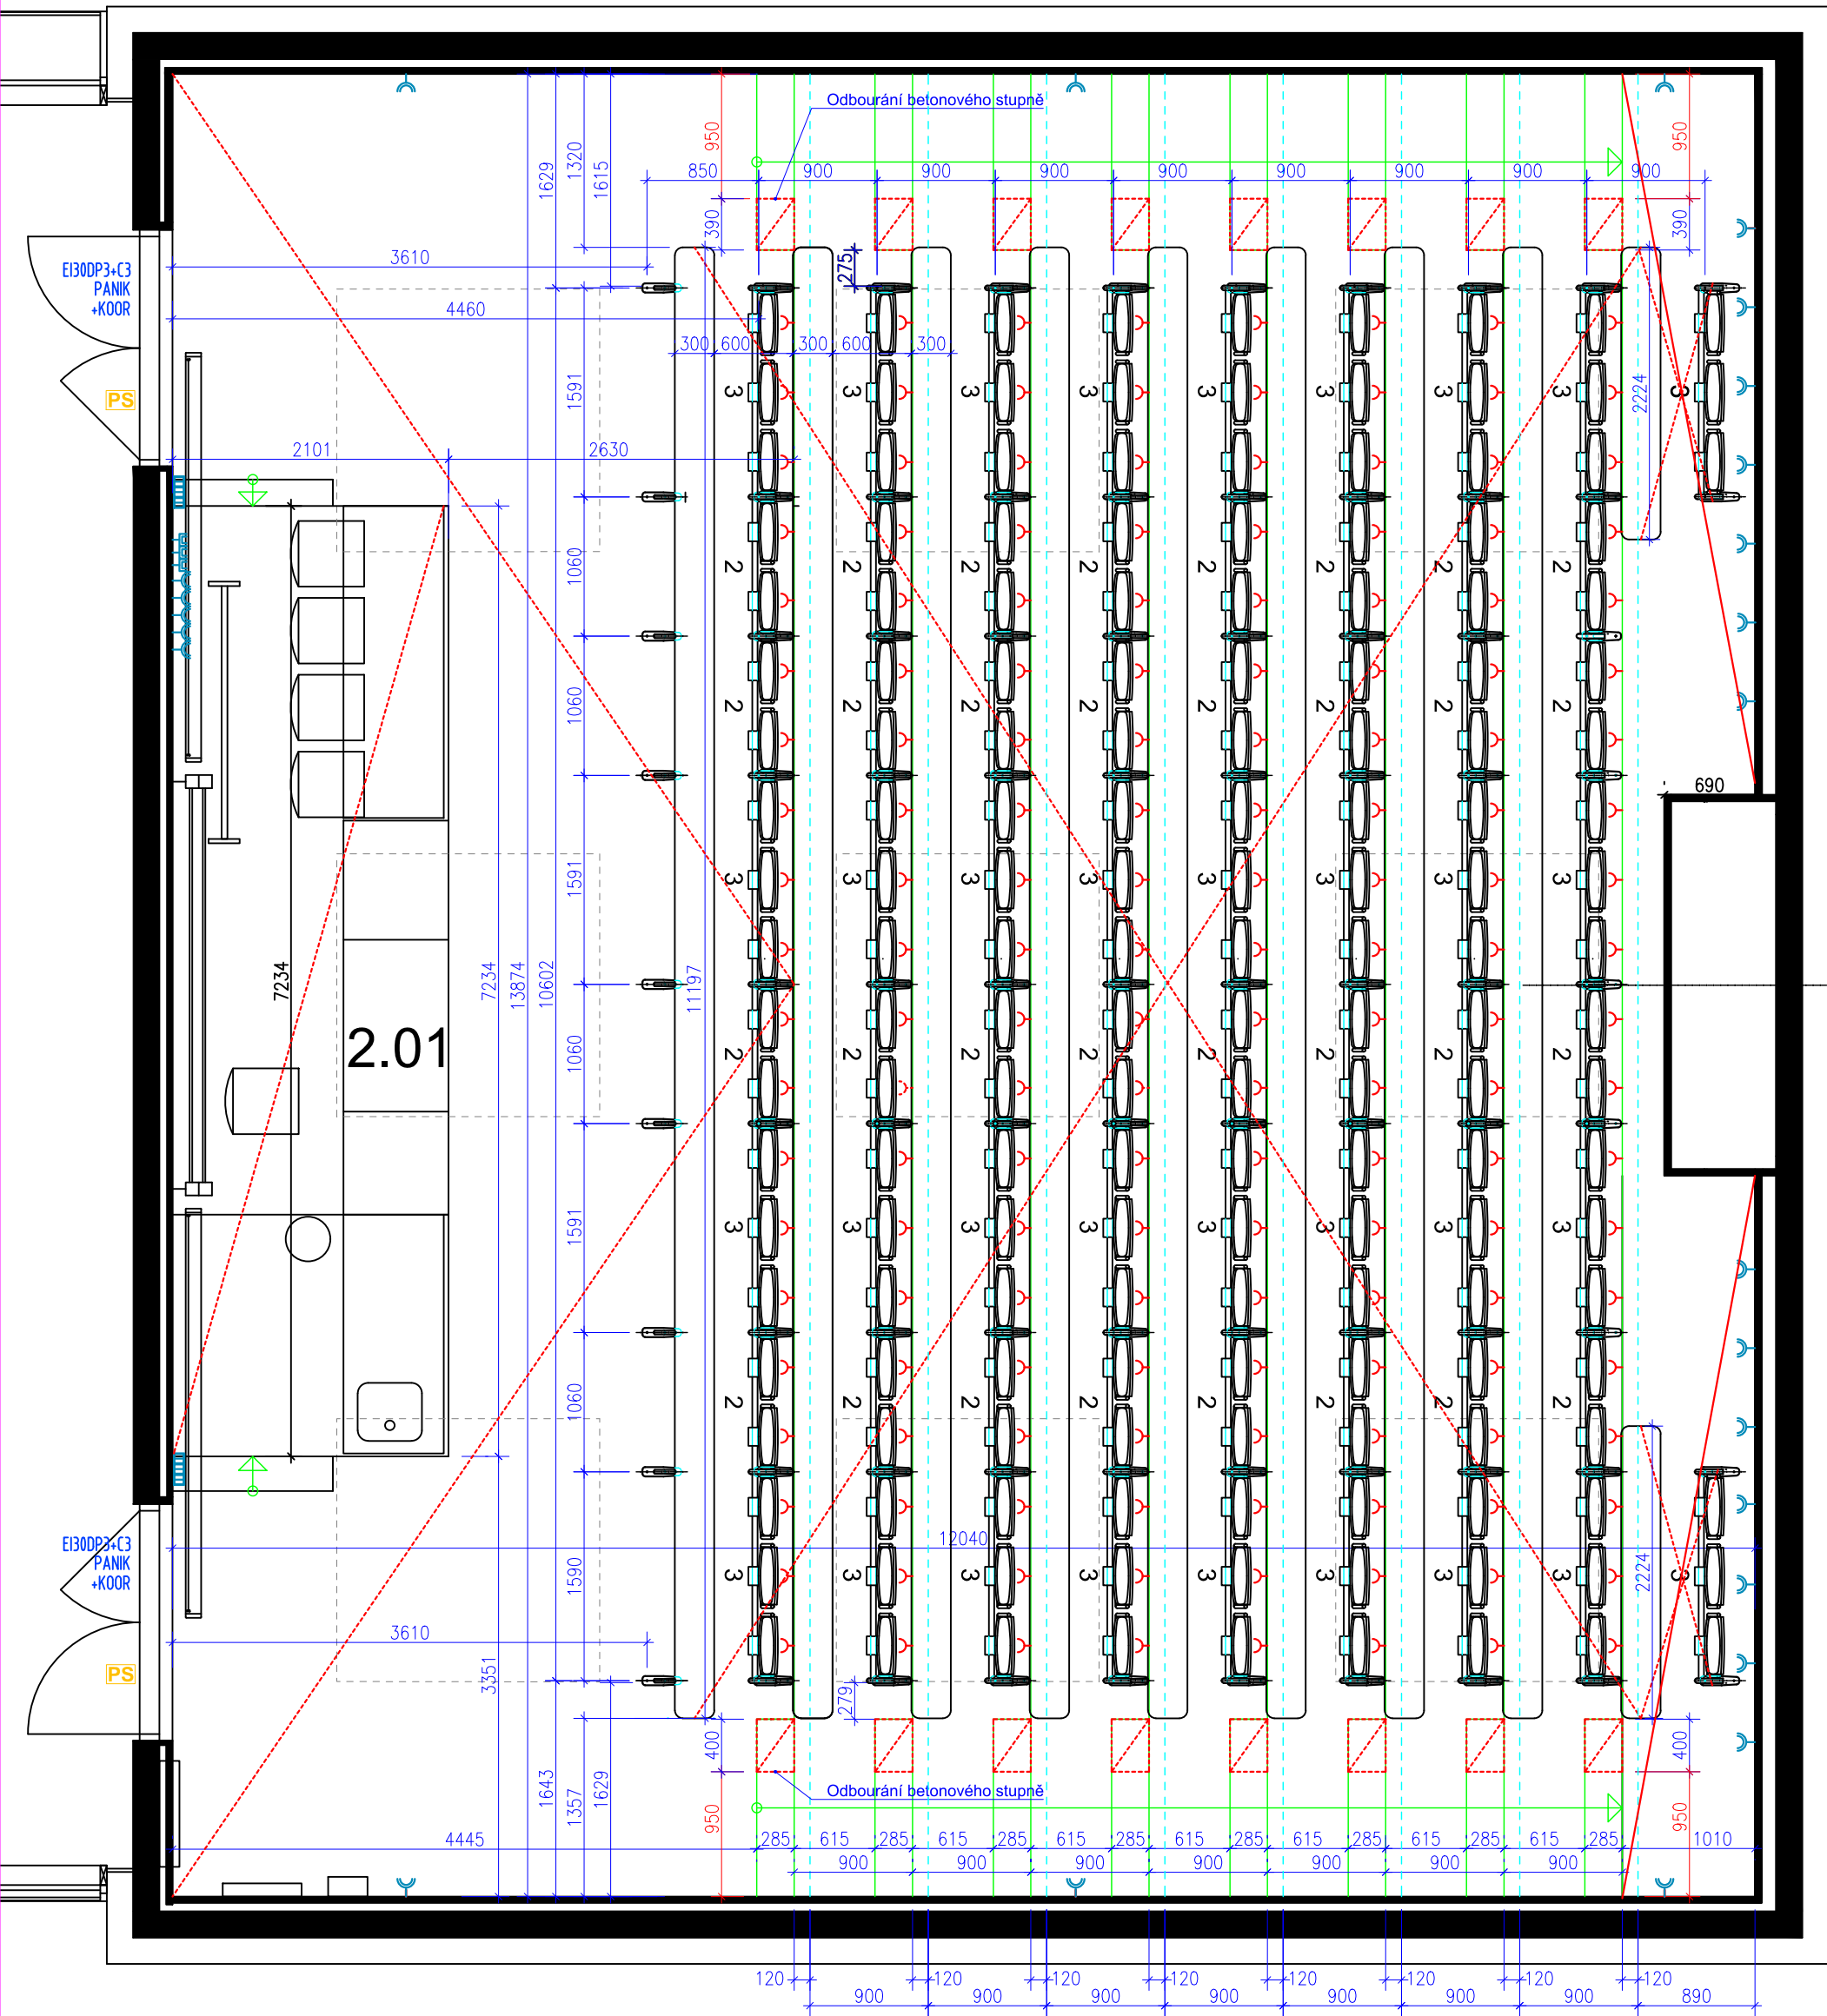

LEGENDA BOURÁNÍ

DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - SEDAČKY A KATEDRA JSOU SOUČÁSTÍ D.1.5 INTERIÉR

ODBORNÁ DEMONTÁŽ VŠECH SEDAČEK
MODUL 2 SEDAČKY, MODUL 3 SEDAČKY
(SESTAVY SEDAČEK BUDOU POUŽITY PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ)

ODBORNÁ DEMONTÁŽ VŠECH INSTALACÍ, ROZVODŮ
A KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Z KATEDRY - SOUČÁSTÍ STAVBY

ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (MARMOLEA)
Z CELÉ PLOCHY POSLUCHÁRNY VČETNĚ SCHODŮ

ZKRÁCENÍ - ODBOURÁNÍ ČÁSTI BETONOVÉHO STUPNĚ


ODBORNÁ DEMONTÁŽ VŠECH ZÁSUVK ZA SEDAČKAMI
(ZPĚTNÁ MONTÁŽ DO NOVÉ POLOHY ZA SEDADLA)

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE- PONECHANÉ

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STROP	STĚNY
2.01	POSLUCHÁRNA	166,09	MARMOLEUM REAL P9,P12	AKUST. KAZETY, S.V. 4900 mm	AKUST. OBKLAD

STÁVAJÍCÍ STAV - CELKEM 166 MÍST + VYUČUJÍCÍ

Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7		MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/71 OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL	
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY M.Č. 2.01		ŠÉFPROJEKTANT Ing. Vladimír Čapka	VYPRACOVAL Ing. arch. Vít Svoboda
		PROJEKTANT Ing. arch. Vít Svoboda	ČÍSLO ZAKÁZKY 0624
			STUPEŇ DPS
			POČET FORMÁTŮ 2 A4
			DATUM ŘÍJEN 2024
			MĚŘÍTKO 1:50
		Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
		D.1.1.	AS 02

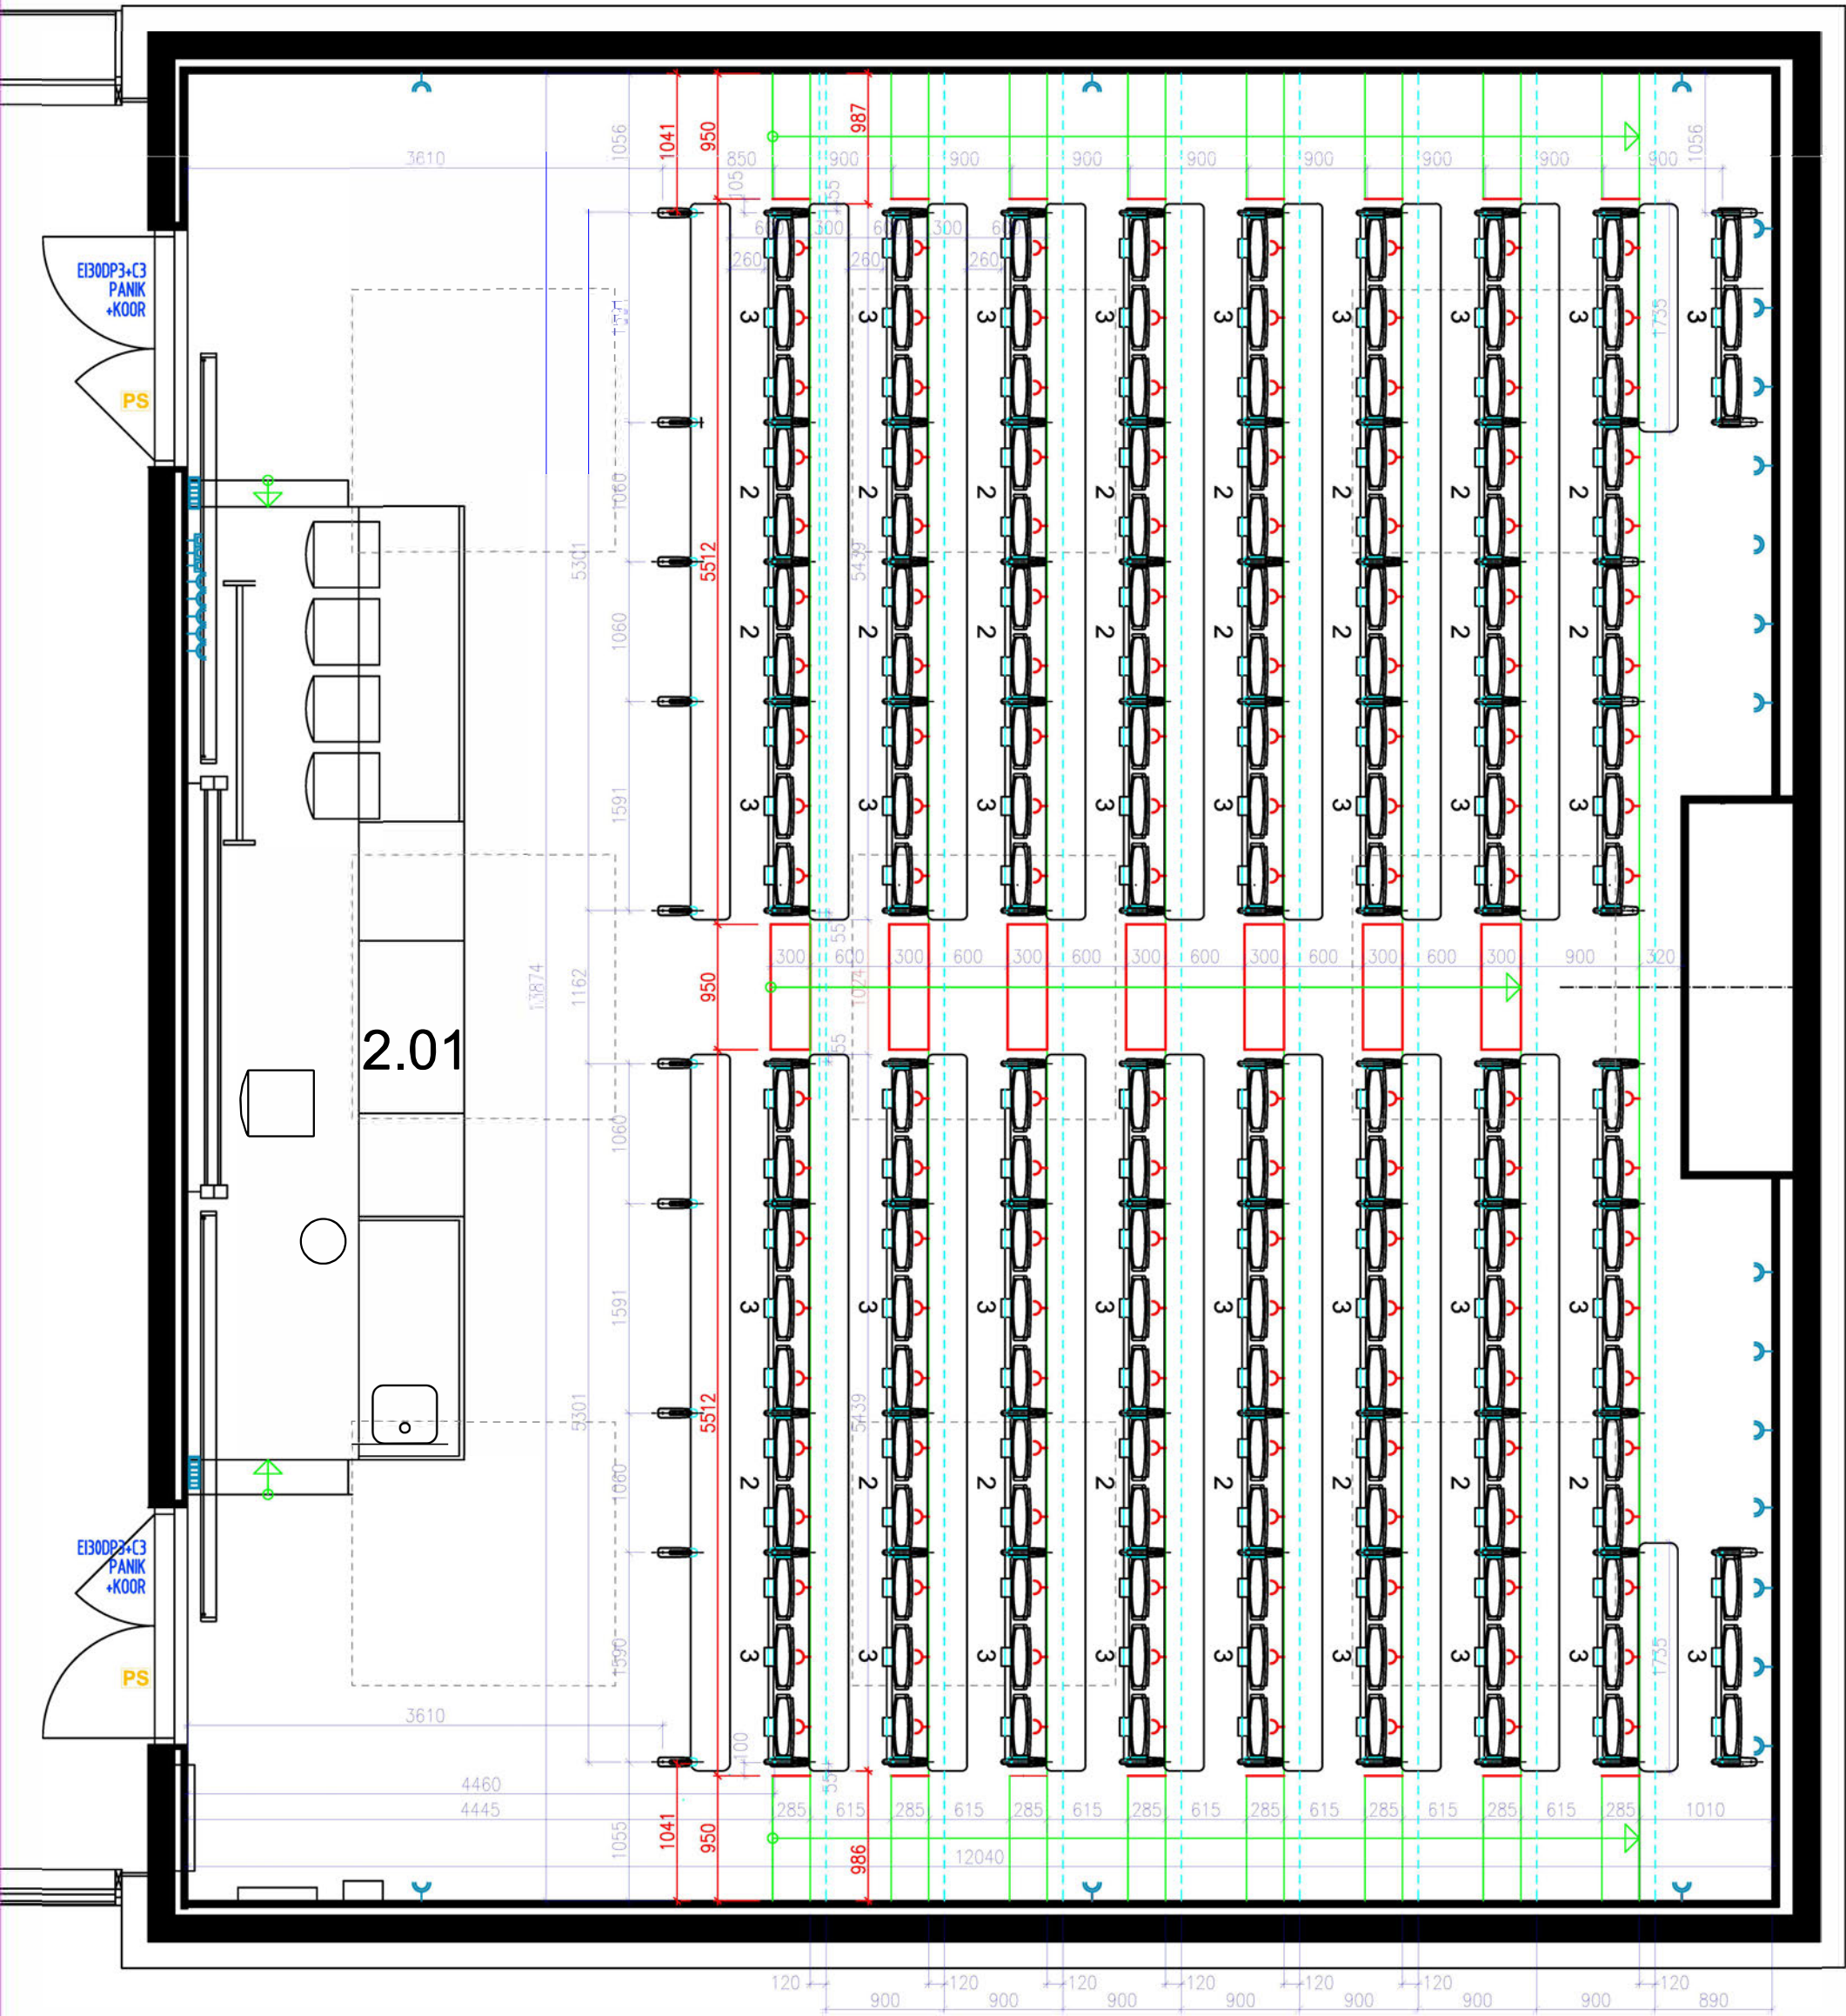

LEGENDA

ODBORNÁ MONTÁŽ VŠECH SEDAČEK DO NOVÝCH POLOH
MODUL 2 SEDAČKY, MODUL 3 SEDAČKY A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
KATEDRY - SOUČÁSTÍ D.1.5 INTERIÉR
ODBORNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ VŠECH INSTALACÍ, ROZVODŮ
A KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ KATEDRY VČETNĚ VŠECH REVIZÍ
KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ - SOUČÁSTÍ STAVBY

NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA (MARMOLEUM)
V CELÉ PLOŠE POSLUCHÁRNÝ

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE - PONECHANÉ

ZÁSUVKY V NOVÝCH POLOHÁCH (POUŽITY STÁVAJÍCÍ)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STROP	STĚNY
2.01	POSLUCHÁRNA	167,61	MARMOLEUM REAL	AKUST. KAZETY, S.V. 4900 mm - STÁVAJÍCÍ	AKUST. OBKLAD - STÁVAJÍCÍ

NOVÝ STAV - CELKEM 166 MÍST + VYUČUJÍCÍ

Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/71		
	OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL		
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	lxxxxx	xxxxxx	xxxxx
NÁZEV AKCE			
DŘEVAŘSKÝ PAVILON			
STAVEBNÍ POSLUCHÁRNÝ M.Č. 2.01			
PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.01 - NOVÝ STAV			
Č. KOPIE		ČÁST	PROFESE Č.PŘÍLOHY
		D.1.1.	AS 03

Ing. **Vladimír Čapka**
projekce a inženýring
Gerstnerova 5/658
170 00 Praha 7


MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1
OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL
ŠÉFPROJEKTANT | PROJEKTANT | VYPRACOVAL
lxxxxx | xxxxx | xxxxx

NÁZEV AKCE
DŘEVAŘSKÝ PAVILON
STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY m.č. 2.01


ČÍSLO ZAKÁZKY	0624
STUPEŇ	DPS
POČET FORMÁTŮ	9A4
DATUM	ŘÍJEN 2024
MĚŘÍTKO	

DETAILY


Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
	D 1.1.	AS	04

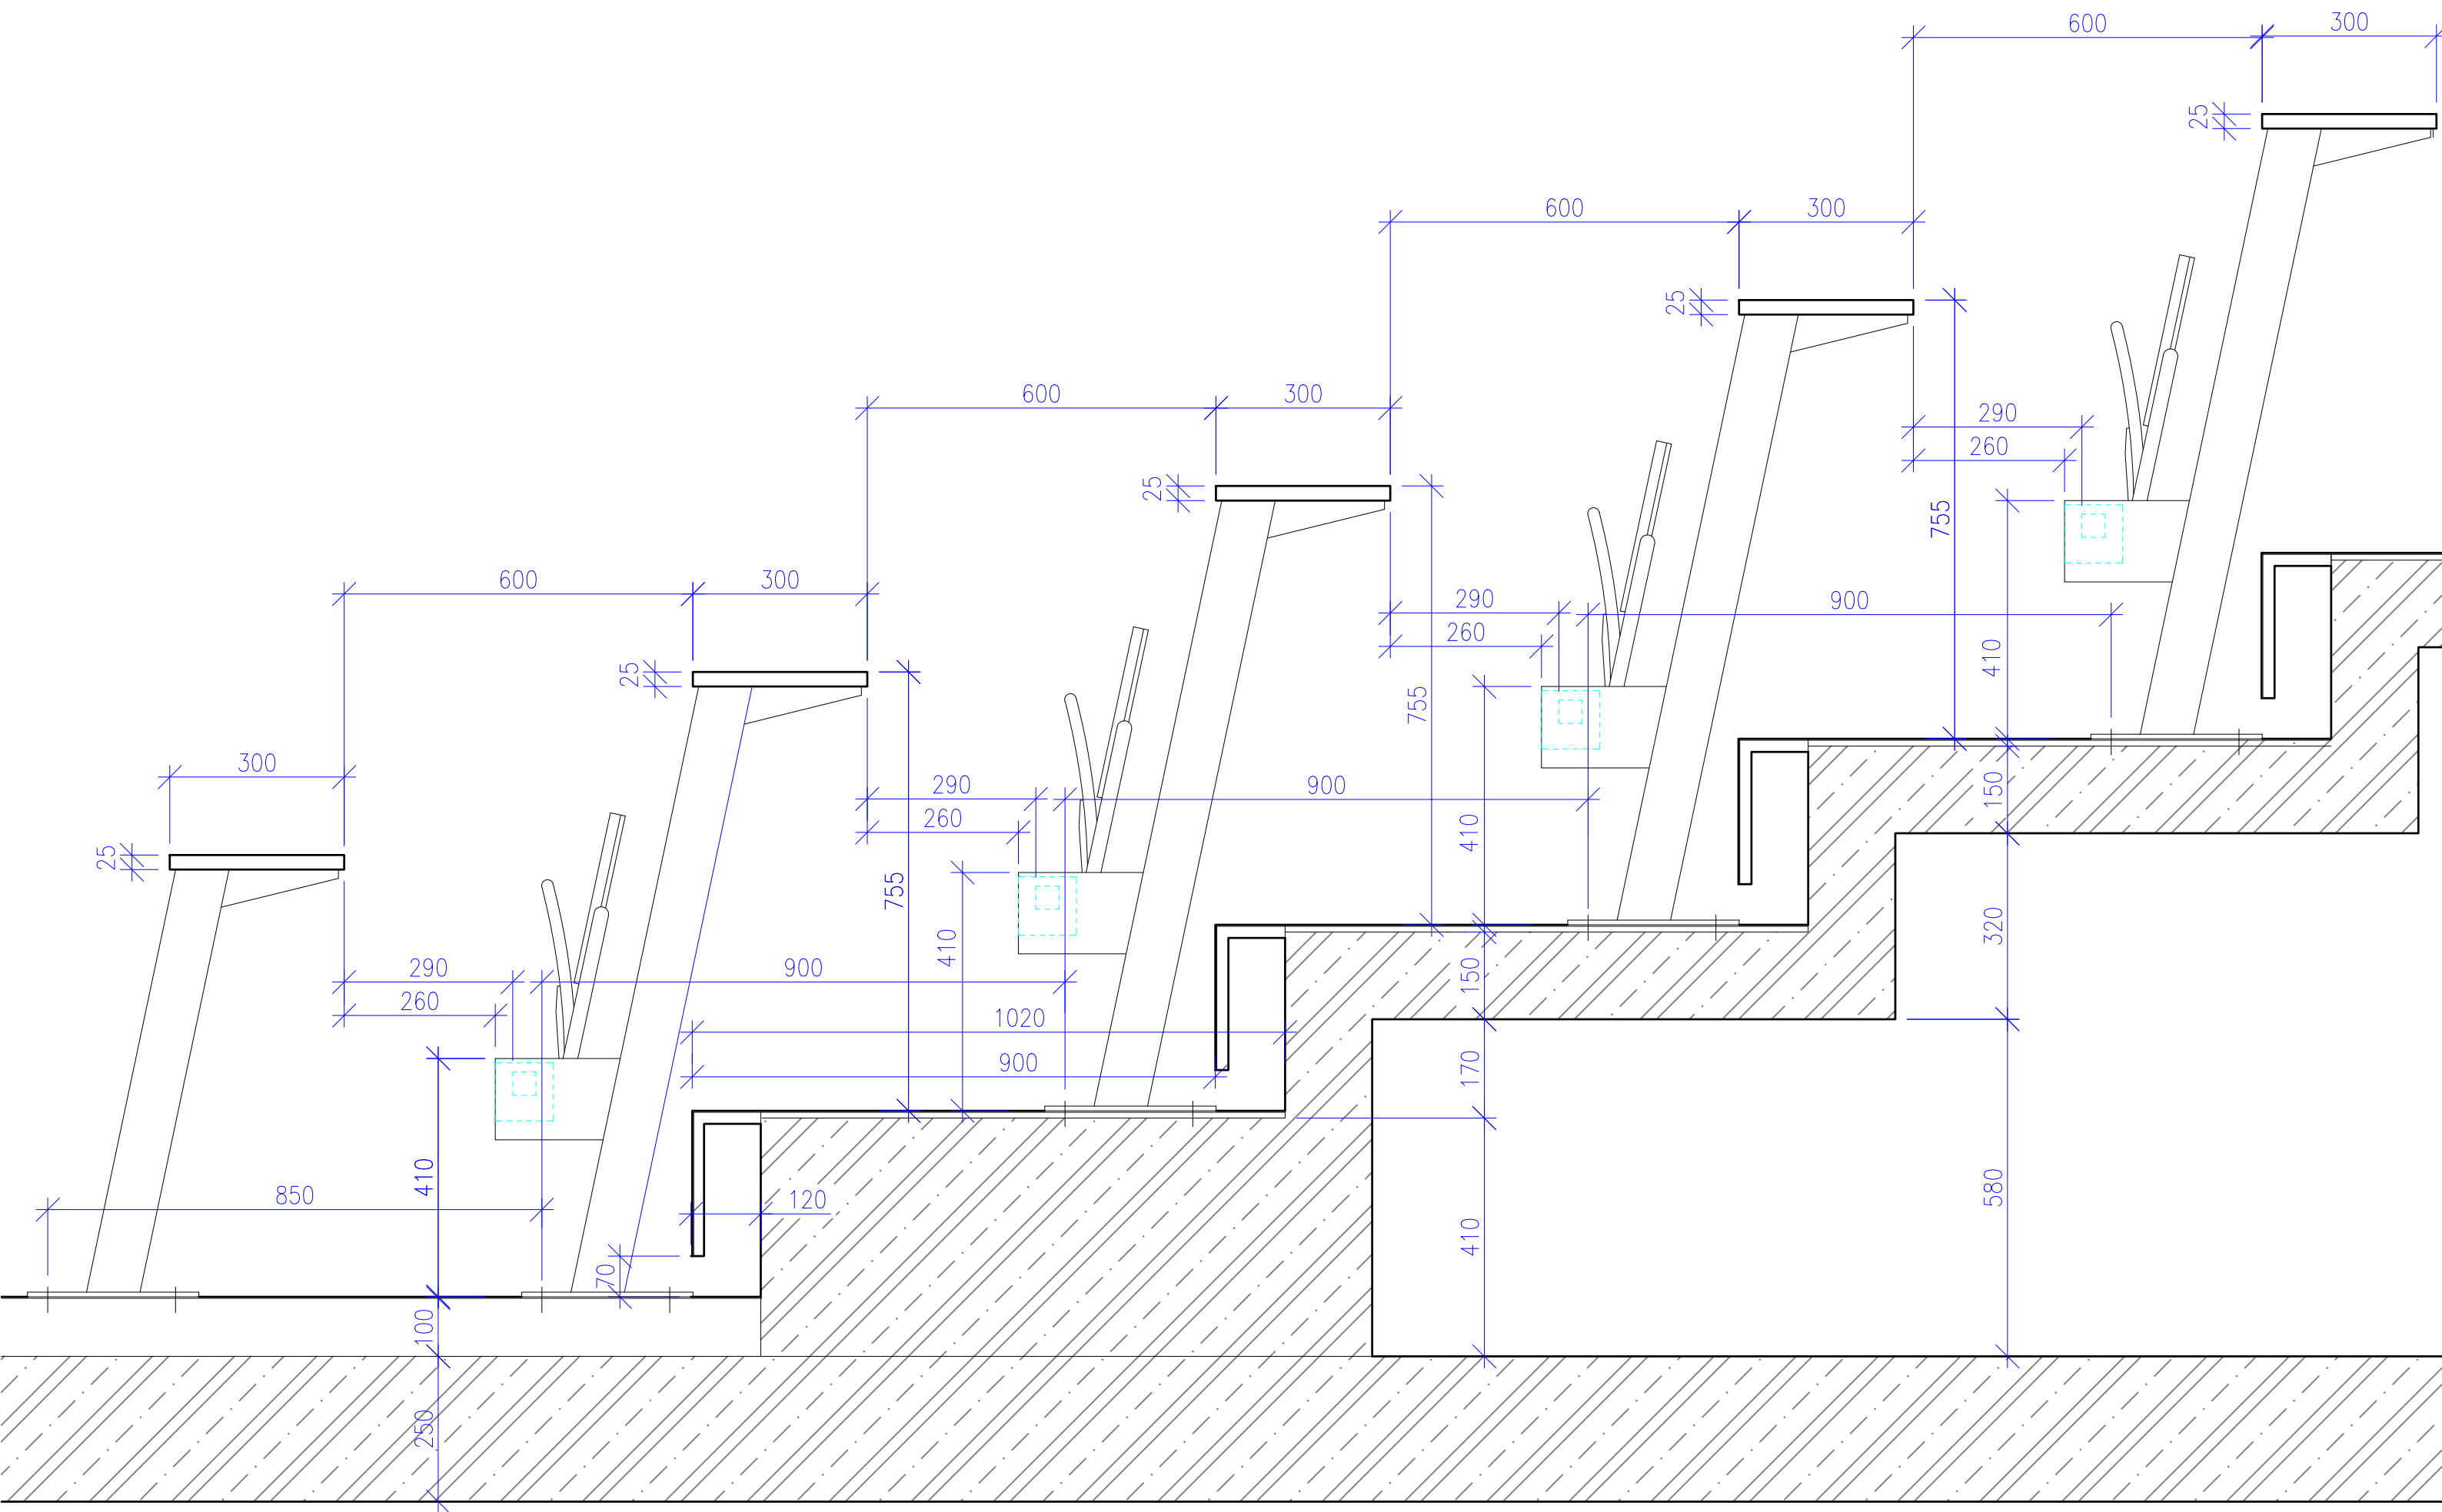


M 1:10 PŘÍČNÝ ŘEZ SEDAČKAMI POSLUCHÁRNÝ 2.01 DET.02

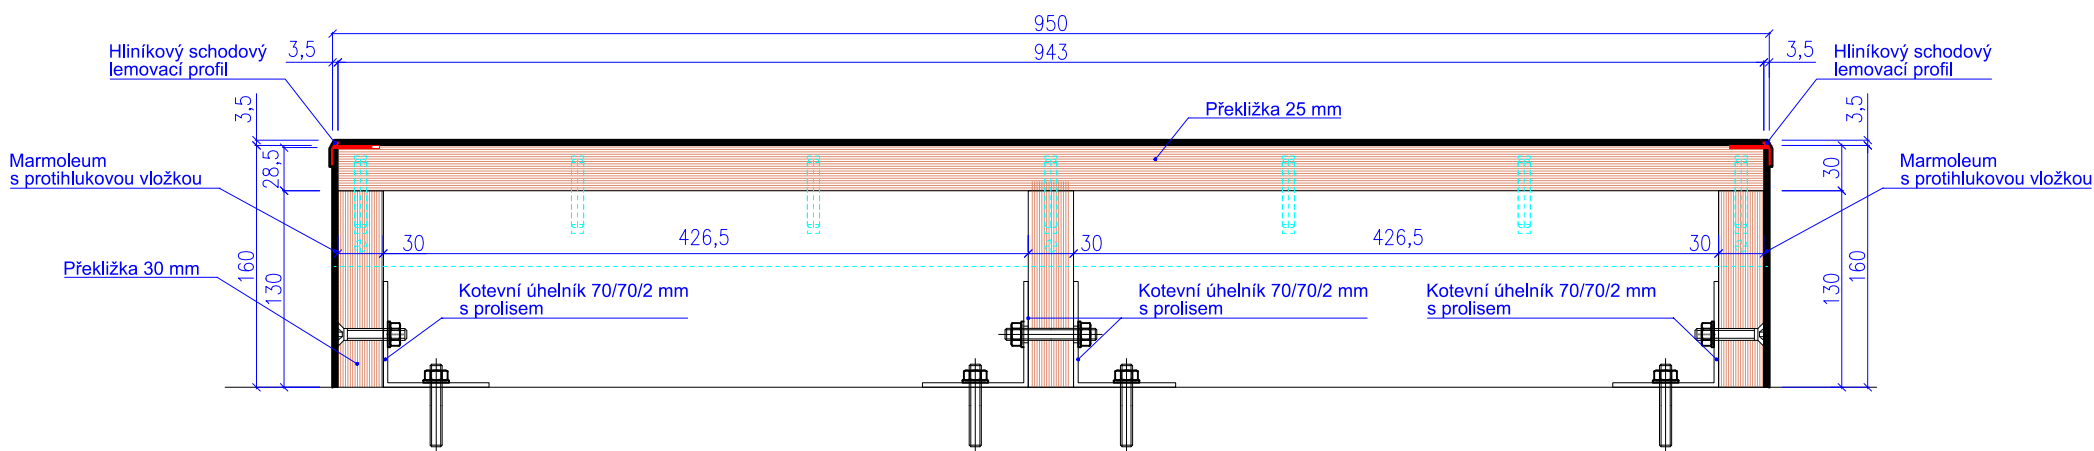


PODÉLNÝ ŘEZ SCHODEM M 1:5

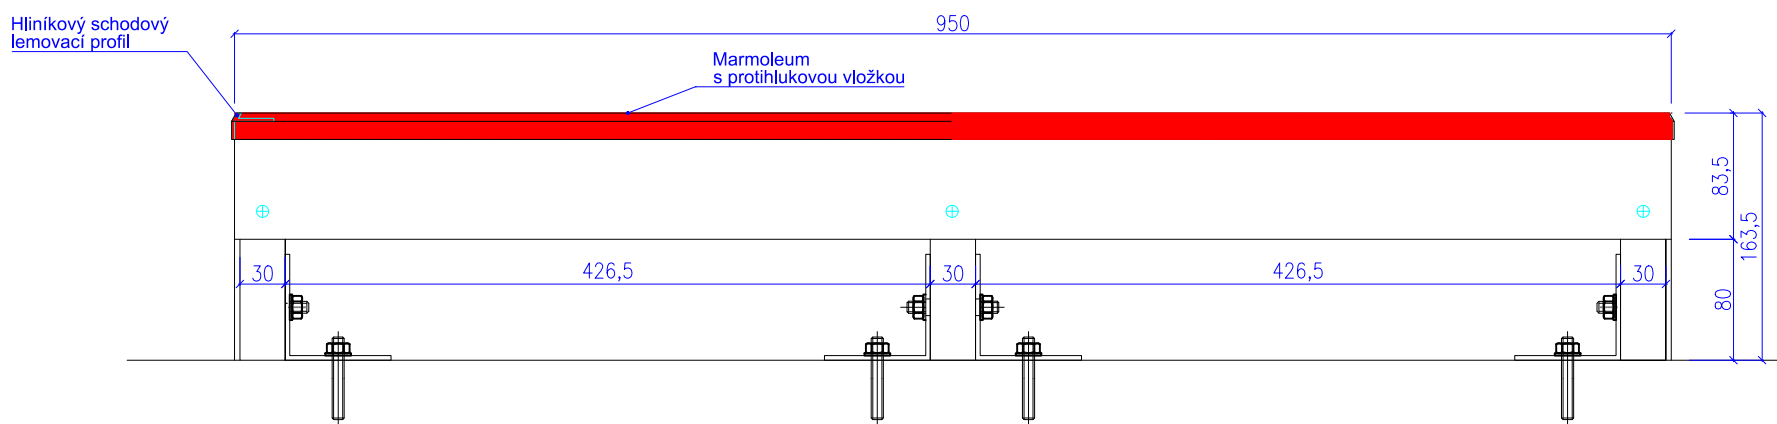

POHLED NA SCHOD M 1:5

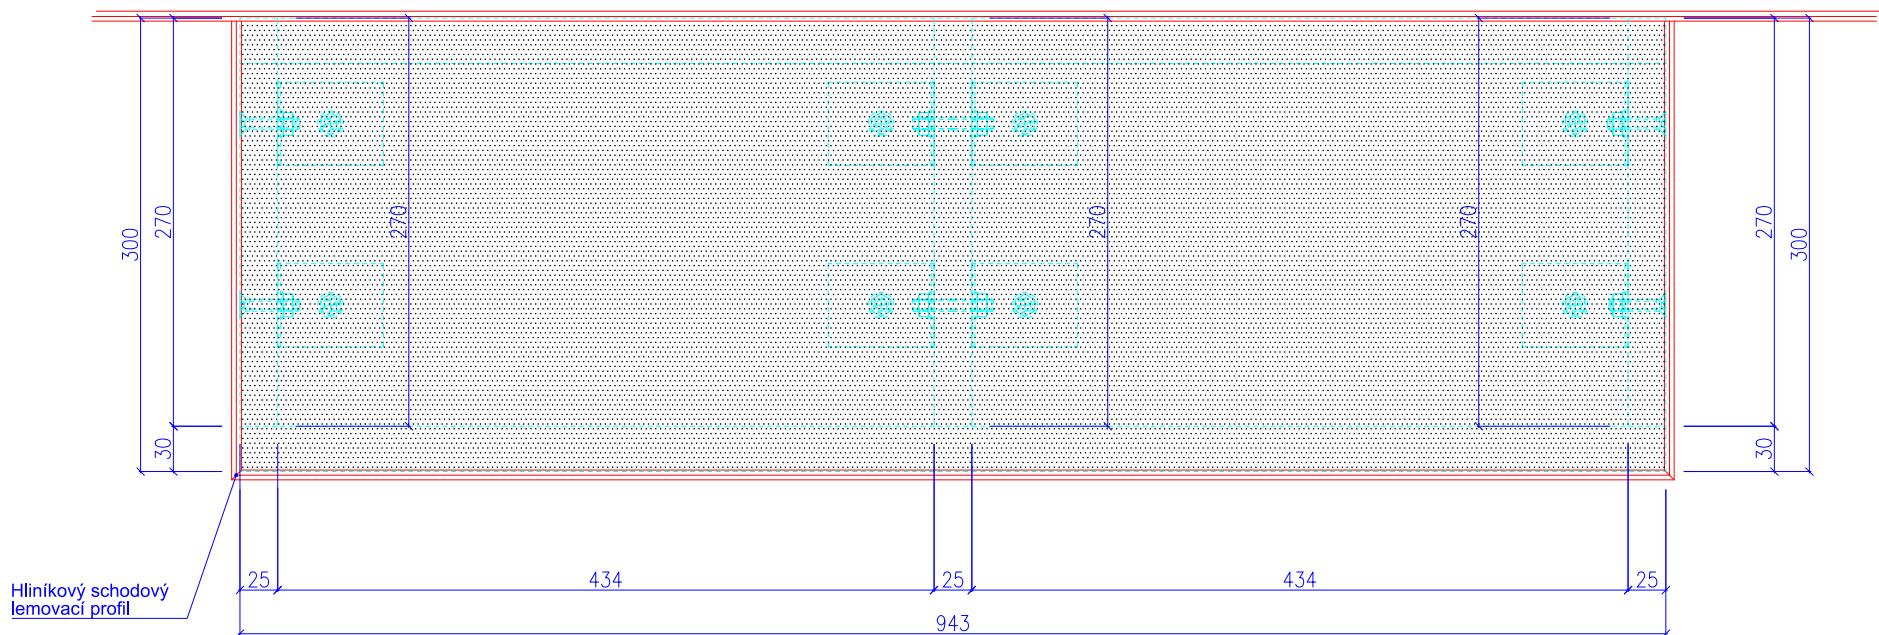

PŮDORYS SCHODU M 1:5

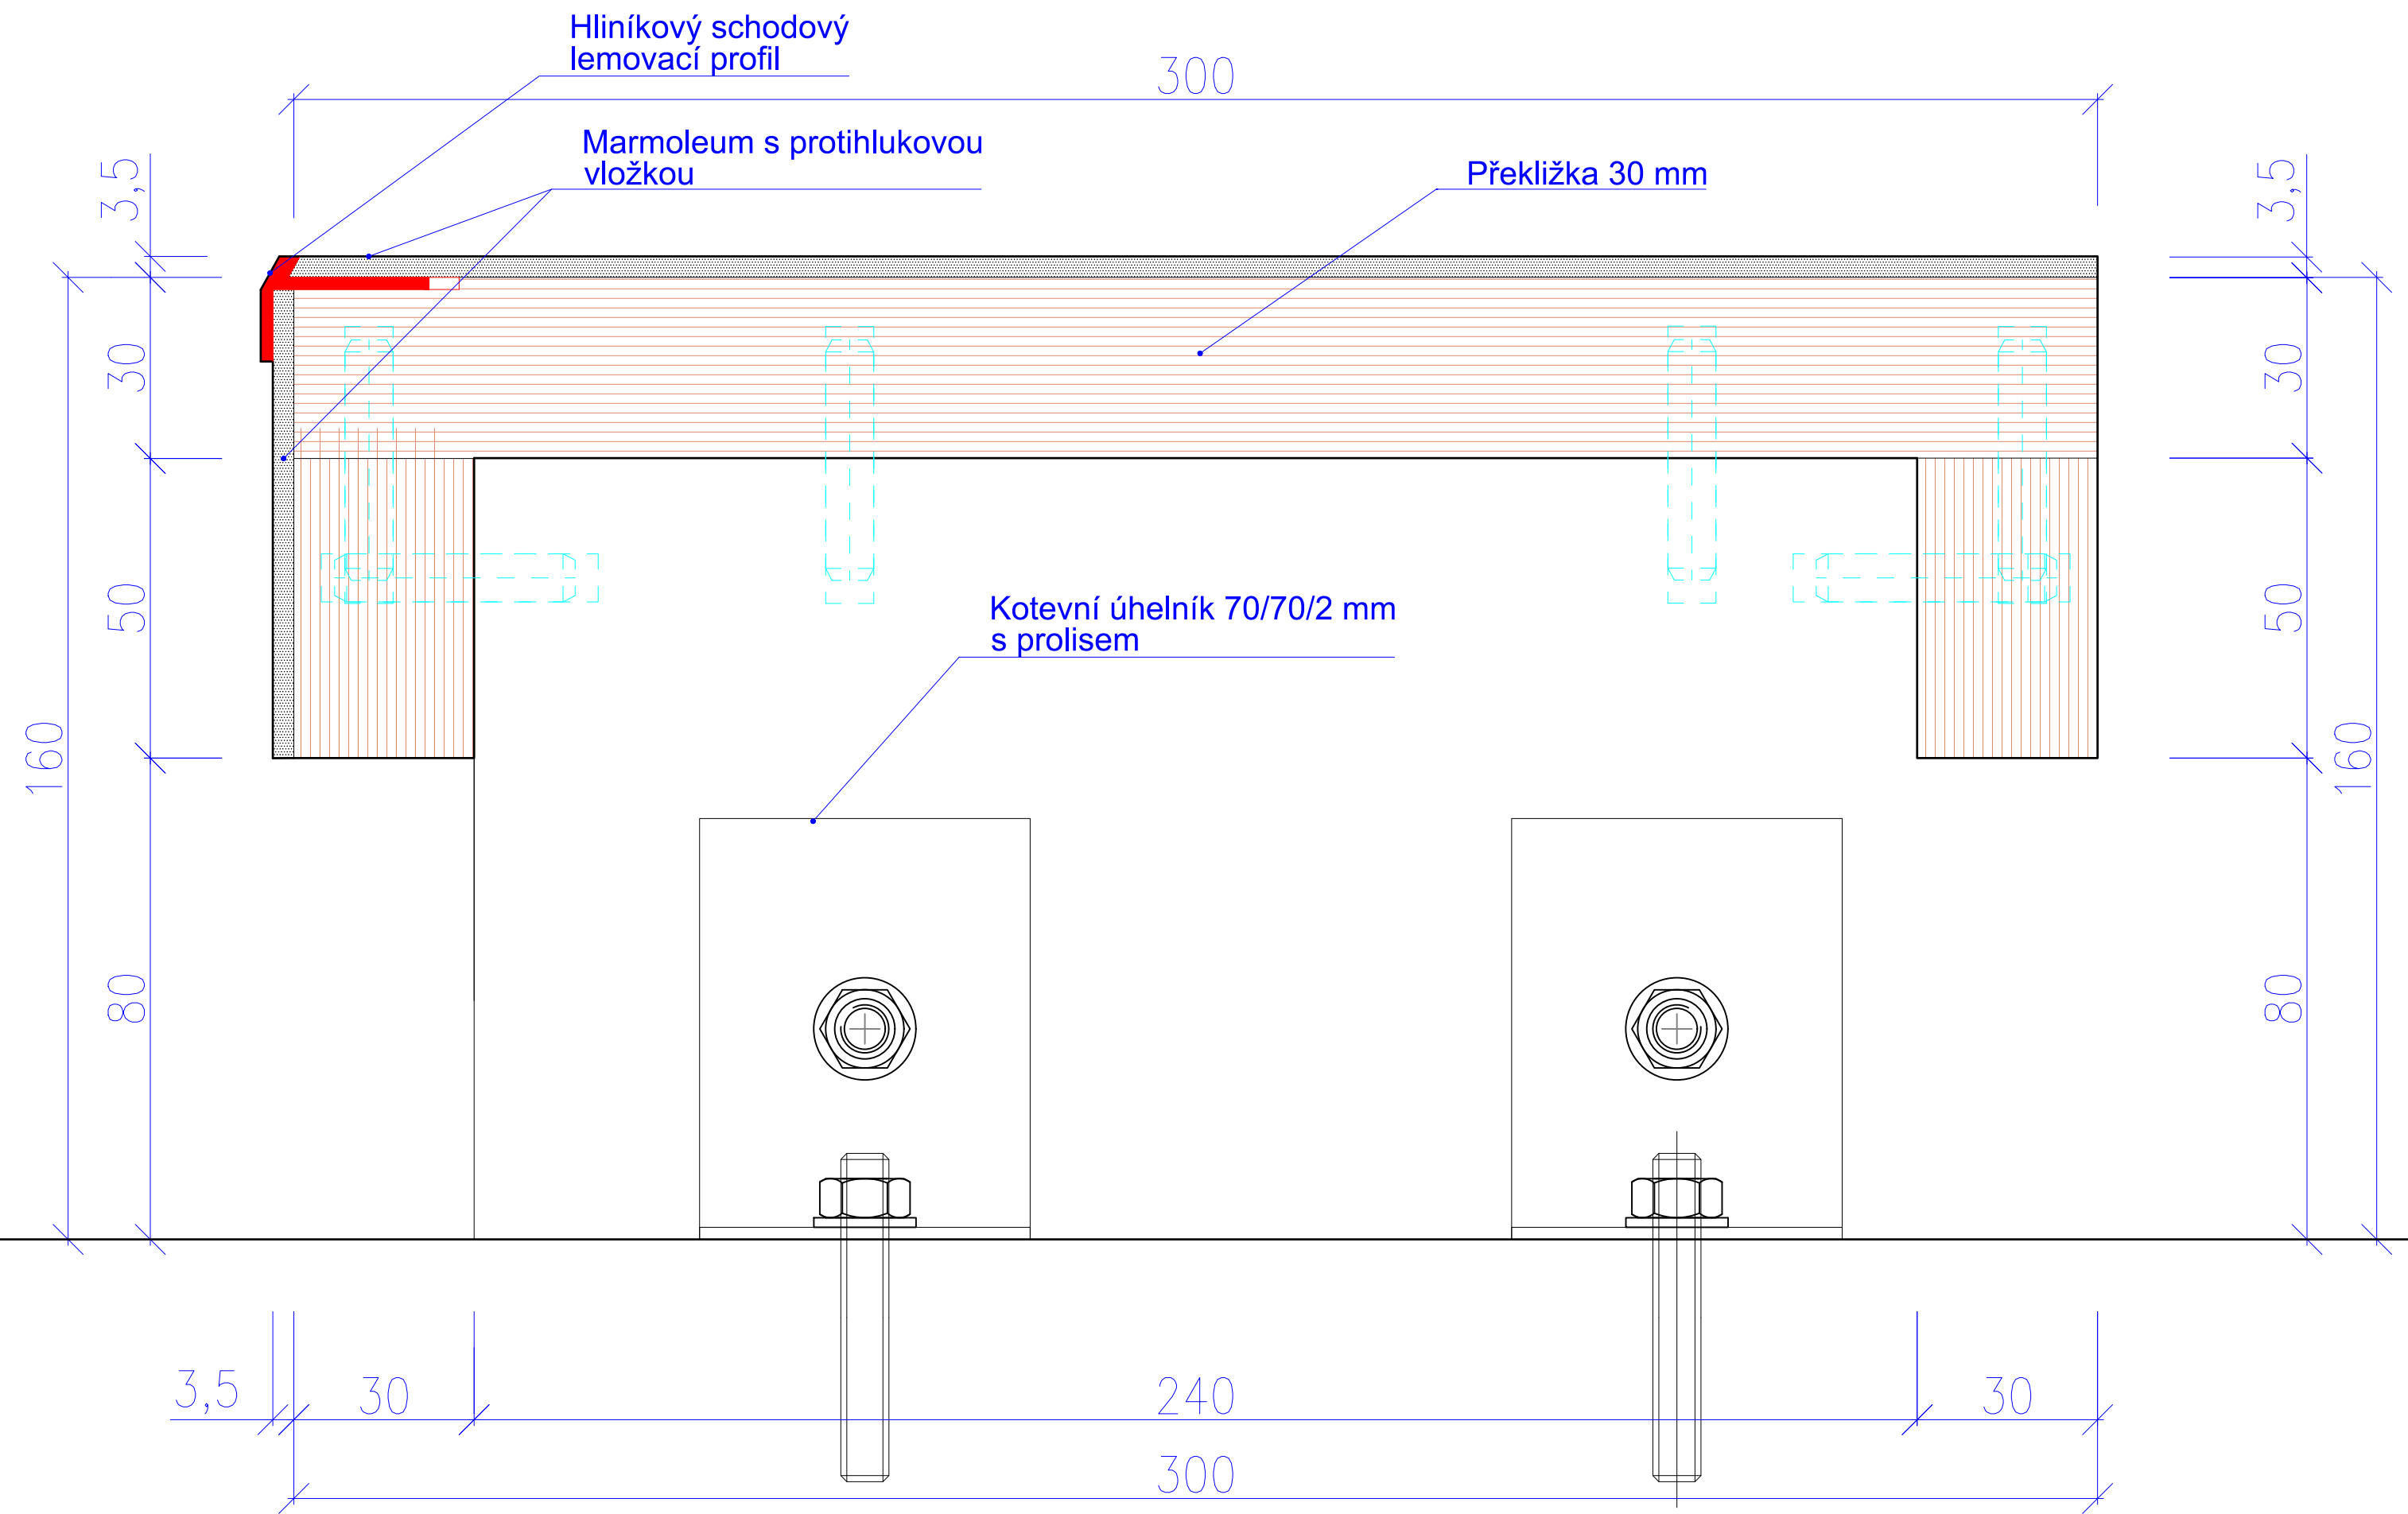

M 1:1
PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODEM STŘEDNÍ ULÍČKY DET.04

Ing. Martin Dvorský autoriz. tech. PBS - ČKAIT - 0012162 odborně způsobilá osoba v PO - č.kat. Z-OZO-12/2011 Přístavní 36, 170 00 Praha 7 - Holešovice	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1		
	OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6		
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY m.č. 2.01		ČÍSLO ZAKÁZKY	0624
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	ŘÍJEN 2024
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Č. KOPIE	ČÁST
			D.1.3

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Dokumentace pro provedení stavby

DŘEVAŘSKÝ PAVILON - STAVEBNÍ ÚPRAVY
m.č. 2.01 - POSLUCHÁRNA

MÍSTO STAVBY:
Kamýcká 129, Praha 6, poz. parc. č. 1627/71, k.ú. Suchdol

INVESTOR:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

VYPRACOVAL:

autoriz. tech. [redacted]
odborně způsobilá osoba v PO - [redacted]
Přístavní 36, Praha 7 - Holešovice
TEL: [redacted]

DATUM: 09/2024

1. Úvod. [§ 41 odst. 2 písm. a), b) vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – dále v textu „vyhláška o požární prevenci“].

Toto požárně bezpečnostní řešení stanovuje podmínky požární bezpečnosti pro stavení úpravy posluchárny - místnosti č. 2.01 v 2. NP budovy Dřevařského pavilonu 02 FLD v areálu ČZU, Kamýcká 129, Praha 6.

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení možnosti navržené změny a stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Popis navrhované změny:

Na základě požadavku provozovatele je navržena úprava interiéru posluchárny - místnost š. 2.01 v 2. NP.

Dokumentace řeší návrh úpravy sezení v posluchárně. Stávající stupňovitá podlaha má po obou stranách posluchárny přístupovou uličku s vloženými schodovým stupni pro přístup k jednotlivým řadům sezení. Požadavek investora je vytvoření třetí a to střední uličky pro lepší přístup k sedadlům uprostřed jednotlivých řad. Při současném stavu pouze s krajními uličkami studenti neosazují místa ve středu řad a to z důvodů příliš dlouhého a obtížného přístupu. Návrh třetí střední uličky by měl zjednodušit přístup ke středním sedadlům v jednotlivých řadách.

Stavební úpravy v posluchárně budou realizovány v nutném rozsahu týkající se vytvoření nové střední přístupové uličky s vloženými stupni a přeskupením sezení v uličkách s doplněním krajních modulů sedaček.

Pro vytvoření uličky je nutná demontáž všech řad sedaček a jejich zpětná montáž ve stávajících řadách. Současně bude nutné doplnění krajních modulů sedaček v jednotlivých řadách.

Budou použity stávající sestavy sedaček včetně ocelové konstrukce, barevnost ponechána. Vzhledem ke stavebním úpravám stávajících betonových stupňů v uličkách, kdy dojde k jejich zkrácení, bude kompletně vyměněna v celé posluchárně podlahová krytina včetně hrany všech stupňů, použita bude stejná krytina – Marmoleum.

Stavebními úpravami nedojde k zásadním zásahům do architektonického, výtvarného a materiálového řešení této posluchárny.

Nedochází k zásahům do nosných nebo požárně dělících konstrukcí.

V daném prostoru nejsou a nebudou užívány nebo skladovány hořlavé kapaliny nebo nádoby se stlačenými plyny, nebo jiné nebezpečné látky.

Popis objektu:

Stávající objekt Dřevařského pavilonu 02 FLD byl projektován v letech 2010 – 2013, stavba byla dokončena a zkolaudována v r. 2016.

Požární bezpečnost objektu byla původně řešena podle ČSN 73 0802.

Objekt má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, požární výška dle čl. 5.2.3 ČSN 73 0802 je 11,70 m. Konstrukční systém objektu je hodnocen jako nehořlavý dle čl. 7.2.8a/ ČSN 73 0802.

Původní určení a využití objektu, resp. posuzovaných prostor v NP se nemění - prostory pro specializovanou vysokoškolskou výuku a výzkum, a administrativu školy (učebny, laboratoře, kanceláře/pracovny a pomocné prostory), a samostatný (přistavěný) sklad řeziva.

Shromažďovací prostory ve smyslu ČSN 73 0831 se nevyskytují.

Budova byla z hlediska požární bezpečnosti určena pro možnost pobytu více než 10 osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Tato dokumentace navazuje na původní schválené požárně bezpečnostní řešení v rámci dokumentace skutečného provedení stavby 11/2015 (dále v textu je „původní PBŘ“).

Vzhledem k minimálnímu dopadu navržené změny na požární bezpečnost budovy nebo její části není nutno řešit jako změnu stavby dle ČSN 73 0834, i když použití ČSN 73 0834 pro změnu skupiny I by v daném případě dle odst. 1 této normy bylo povoleno.

Naopak je pro co nejpřesnější řešení dispozice sedadel (šířky průchodů, dispozice uliček a východů) využito postupů a podmínek dle ČSN 73 0831, i když upravovaná posluchárna není klasifikována jako shromažďovací prostor.

Podklady:

- rozpracovaná dokumentace úprav, 09/2024, xxxxx
autorizovaný inženýr ČKAIT, číslo autorizace 0002624, xxxxx, autorizovaný architekt ČKA, číslo autorizace 00894
- části původní dokumentace dokumentace - DSPS, 11/2015, zprac. SM
PROJEKT Chomutov, vč. PBŘ DSPS, zprac. JKPO xxxxx, Chomutov, 11/2015
- kolaudační souhlas, MČ Praha 6, ÚMČ, Odbor výstavby, č.j. MCP6
04360/2016, ze dne 17.5.2016
- podklady investora - části původní dokumentace, dokumentace PO, popis a dokumentace objektu a technologií
- veřejné databáze a informační systémy

Další dokumentace:

- 1) Vyhl. č. 268/2009 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o technických požadavcích na stavby ze dne 12. srpna 2009.
- 2) Vyhl. č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ze dne 29. června 2001 (prováděcí vyhláška k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).
- 3) Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
- 4) Vyhl. č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti s ochrany obyvatelstva.
- 5) Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle „Eurokódů“. Autor: Roman Zoufal a kolektiv. PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu – Praha 2009.

Citované normy:

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení osobami.

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.

Pozn.:

Normy řady ČSN 73 08xx ve znění, platném v době zpracování této dokumentace.

Kategorizace stavby podle vyhl. č. 460/2021 Sb.:

Podle § 8 vyhl. č. 460/2021 Sb. je stavba z hlediska požární bezpečnosti zařazena do **kategorie II**.

Pozn.:

Stanoveno dle údajů původního PBR.

2. Požární úseky. [§ 41 odst. 2 písm. c), d) vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci].

Posuzovaná místnost č. 2.01 je podle původního PBR samostatným požárním úsekem N 1.10/N 2 se zařazením do II. SPB.

Základní údaje:

$p_v = 20,99 \text{ kg.m}^{-2}$

$a = 0,832$

$c = 1,000$

Pro navrhovanou úpravu nejsou stanoveny nové požadavky na vytvoření požárních úseků – platí původní PBR, požární úsek N 1.10/N 2 a jeho zařazení do II. stupně požární bezpečnosti se nemění.

3. Stavební konstrukce. [§ 41 odst. 2 písm. e), f), m) vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci].

Nedochází k zásahům do nosných nebo požárně dělících konstrukcí, požární uzávěry – dveře východů jsou stávající požární EI30DP3+C3,PANIK+KOOR - dle původního PBR.

Nové prostupy rozvodů a instalací požárními stěnami nebo požárními stropy se nepředpokládají.

Po ukončení úprav bude odborně způsobilou osobou provedena kontrola funkčnosti požárních uzávěrů (dveří).

4. Únikové cesty. [§ 41 odst. 2 písm. g) vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci].

Počet osob v požárním úseku se nemění – kapacita 166 míst, obsazení dle ČSN 73 0818 183 osob. Z požárního úseku jsou k dispozici 2 východy (dveře š. 1700 mm, s panikovým kováním), vedoucí přímo do CHÚC typu A.

Byla provedena kontrola počtu sedadel v řadách, šířek průchodů mezi řadami, a šířek a dispozice uliček, s využitím příl. D.2 ČSN 73 0831.

Navržený stav:

- uličky vždy z obou stran řady
 - v řadě max. počet 10 sedadel
 - šířka průchodů mezi řadami 600 mm (rozměr dle obr. D.2 ČSN 73 0831)
 - šířka schodů v uličkách je vždy 950 mm, průchod 986 mm v krajních uličkách, v prostřední 1020 mm
- Navržené řešení vyhovuje podmínkám tab. D.1 a obr. D.3 ČSN 73 0831.

Pro navrhovanou úpravu nejsou stanoveny nové požadavky na únikové cesty.

Nadále platí podmínky původního PBŘ.

Po ukončení úprav bude odborně způsobilou osobou provedena kontrola bezpečnostního značení a navazujících únikových cest.

5. Odstupové vzdálenosti. [§ 41 odst. 2 písm. h) vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci].

Pro navrhovanou změnu stavby nejsou stanoveny nové požadavky z hlediska odstupových vzdáleností. Platí původní PBŘ.

6. Technická a požárně bezpečnostní zařízení. [§ 41 odst. 2 písm. l), n) vyhl. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci].

Pro navrhovanou změnu stavby nejsou stanoveny nové požadavky na technická a požárně bezpečnostní zařízení. Platí původní PBŘ.

Umístění a provedení prvků EPS, SOZ, nouzového osvětlení a evakuačního rozhlasu se nemění, vyhovuje dle nově navrženého stavu.

Po dokončení úprav však musí být funkčnost ověřena osobami oprávněnými ke kontrole těchto zařízení.

7. Zařízení pro protipožární zásah. [§ 41 odst. 2 písm. i), j), k) vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci].

Parametry pro protipožární zásah se nemění. Platí původní PBŘ.

Vybavení vnitřními odběrními místy požární vody a přenosnými hasicími přístroji se nemění, vyhovuje i pro nově navržený stav.

Po dokončení úprav však musí být vybavení, stav a funkčnost ověřena osobami oprávněnými ke kontrole těchto zařízení.

8. Závěr.

Shrnutí:

Navrhovaná změna stavby vyžaduje z hlediska požární bezpečnosti splnění podmínek, podrobněji popsanych v jednotlivých bodech tohoto PBR, tj.

- kontrola funkčnosti požárních uzávěrů - viz výše, odst. 3.
- kontrola únikových cest - viz výše, odst. 4.
- kontrola funkčnosti EPS, SOZ nouzového osvětlení a evakuačního rozhlasu - viz výše, odst. 6.
- kontrola vybavení vnitřními odběrními místy požární vody a přenosnými hasicími přístroji a jejich funkčnosti - viz výše, odst. 7.

Řešení požární bezpečnosti je provedeno dle § 31 Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a platných norem v oblasti požární ochrany. Při provedení podle požadavků této zprávy vyhovuje zajištění požární bezpečnosti platným normám v době zpracování této dokumentace.

Podle § 8 vyhl. č. 460/2021 Sb. je stavba z hlediska požární bezpečnosti zařazena do kategorie II.

09/2024




Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1		
	OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL		
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY m.č. 2.01		ČÍSLO ZAKÁZKY	0624
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	ŘÍJEN 2024
KOMPLETNÍ DOKUMENTACE			Č. KOPIE

Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1		
	OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL		
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY m.č. 2.01		ČÍSLO ZAKÁZKY	0624
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	ŘÍJEN 2024
KOMPLETNÍ DOKUMENTACE			Č. KOPIE

Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1		
	OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL		
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY m.č. 2.01		ČÍSLO ZAKÁZKY	0624
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	ŘÍJEN 2024
KOMPLETNÍ DOKUMENTACE			Č. KOPIE

Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1		
	OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL		
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY m.č. 2.01		ČÍSLO ZAKÁZKY	0624
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	ŘÍJEN 2024
KOMPLETNÍ DOKUMENTACE			Č. KOPIE

Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1		
	OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL		
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY m.č. 2.01		ČÍSLO ZAKÁZKY	0624
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	ŘÍJEN 2024
KOMPLETNÍ DOKUMENTACE			Č. KOPIE



Ing. Karel Kořář Chaplinovo náměstí 654/20 152 00 Praha 5	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1			
	OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6			
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
NÁZEV AKCE		ČÍSLO ZAKÁZKY	0624	
DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY m.č. 2.01		STUPEŇ	DPS	
		DATAUM	ŘÍJEN 2024	
SILNOPROUD			Č. KOPIE	ČÁST
				D.1.4.4

Obsah:

1.	VŠEOBECNÁ ČÁST.....	1
1.1.	Všeobecné údaje	1
1.2.	Výchozí podklady.....	1
1.3.	Technické údaje.....	1
2.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	2
2.1.	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	2
2.1.1.	Všeobecný popis.....	2
2.1.2.	Popis návrhu úprav v místnosti 2.01 pro zásuvkové rozvody	2
2.1.3.	Zásuvky	2
2.1.4.	Rozvody	2
3.	ZÁVĚR	2
3.1.1.	Pokyny, upozornění	2
3.1.2.	Revize.....	4
3.1.3.	Všeobecná upozornění	4

1. VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1. Všeobecné údaje

Název stavby: Dřevařský pavilon
Stavební úpravy posluchárny m.č. 2.01 ČZU
v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol

Projektant: xxxxx

Název PS: D1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika

1.2. Výchozí podklady

Pro zpracování této zprávy bylo použito následujících podkladů:

- Půdorysné podklady dodané GP
- Osobní prohlídka v objektu
- Konzultace se zástupcem investorem

1.3. Technické údaje

Soustava napětí: 3NPE, AC, 3x400/230V – TNS

Ochrana před nebezp. dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

základní: - základní izolace živých částí (čl.A1), přepážkami nebo kryty (čl.A2)

při poruše: - automatickým odpojením od zdroje (čl.411.5), proud. chráničem (čl.415.1)

Vnější vlivy prostředí:

- stanoveno dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 protokolem o určení vnějších vlivů (původní PD)

Měření spotřeby elektrické energie:

- není požadováno

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2.1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

2.1.1. Všeobecný popis

Dřevařský pavilon, který je součástí Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole, je komplexní pracoviště, které se zabývá testováním vlastností dřeva včetně jeho zpracování. V pavilonu se nacházejí výukové prostory, dílenské pracoviště, výzkumné a technické prostory laboratoře a kanceláře.

V budově Dřevařského pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské je umístěna ve 2. nadzemním podlaží m.č. 2.01 Posluchárna.

2.1.2. Popis návrhu úprav v místnosti 2.01 pro zásuvkové rozvody

2.1.2.1 Osazení nových rozvodů, demontáž a montáž zásuvek

Dle požadavku investora bude v místnosti posluchárny s rozváděčem osvětlení (m.č. 2.01) demontován zásuvkový rozvod 230V, který je rozmístěn za sedadly posluchačů. Jde celkem o 160 zásuvek povrchového provedení 230V/16A s ochranou přepětovými ochranami 3.třídy. Tyto zásuvky jsou napájeny ze společného rozváděče 2R7.

Z rozváděče jsou jednotlivé okruhy č. 31 až č. 62 vedeny skrytě pod sedadly podél a po skupinách po 4 zásuvkách smyčkovány. V rámci rekonstrukce sedačkové části posluchárny budou zásuvky za sedadly demontovány a to včetně měděných kabelů J 3x2,5 bezhalogenového provedení.

Během instalace nových sedadel posluchárny (navýšení na 160ks) v rámci interiéru budou od stávajícího rozváděče 2R7 v posluchárně položeny nové napájecí okruhy (31 až 62) k jednotlivým zásuvkovým skupinám vždy po 5 zásuvkách na jeden jističí okruh. Kabely budou uloženy obdobným způsobem jako jsou stávající (tj. v kabelových kanálech bezhalogenového provedení). Kabely budou mezi zásuvkami smyčkovány. Zásuvky budou použity demontované stávající 230V/16A, přičemž z důvodu navýšení počtu sedadel o 16ks budou dodány zásuvky další stejného provedení.

2.1.3. Zásuvky

Instalované (vyměňované) zásuvky 230V budou označeny písmenkočíselným popisem pro jednoznačné identifikování k příslušnému jističi v rozváděči 2R7.

2.1.4. Rozvody

Metalické rozvody mezi zásuvkami budou oheň retardujícími kabely B2cas1d0.

Nové kabelové trasy budou uloženy v tuhých bezhalogenových lištách či trubkách na povrchu, za kryty i v ohebných bezhalogenových.

Hlavní trasa v 1.PP bude vedena v drátěném kabelovém žlabu.

Při souběhu kabelů strukturované kabeláže se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křížování vedení nejméně 1cm. Prostupy všemi požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE. Každá požární ucpávka bude označena identifikačním štítkem.

2.1.5. Pokyny, upozornění

3.1.2.1 Zásady provádění a bezpečnost práce

- Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

- Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdravé neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce).
- Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům přísl. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnici týkajícími se kontaktu s dopravou silniční.
- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
- Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány.
- Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.
- Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP.
- Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné.
- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.
- Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby.
- Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými
- Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví:
 - Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 - Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění
 - Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 - NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění
 - NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění
 - NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění
 - NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění
 - NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění
- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění
- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění
- Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění
- Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, v platném znění
- Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění
- Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění
- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění
- Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, v platném znění
- Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění
- Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění.

2.1.6. Revize

Po ukončení prací zajistí dodavatel zpracování platné výchozí revizní zprávy a „Průkazu způsobilosti určeného technického zařízení“ dle §47 Vyhl. 266/94 Sb. Uvedené doklady budou poskytnuty investorovi stavby a správci zařízení.

2.1.7. Všeobecná upozornění

Prováděcí firma musí dodržovat podmínky dotčených organizací, která jsou uvedena v jejich vyjádřeních. Veškeré manipulace a práce, tj. vypínání, zapínání, montážní práce apod. budou prováděny dle postupů stanovených správcem zařízení. Po ukončení prací bude zajištěn zkušební provoz zařízení a zaškolení obsluhy. Správci zařízení bude následně předána dokumentace provedení podle skutečného stavu, pracovníkům správce bude zajištěn přístup ke všem vybudovaným zařízením.

Použitý materiál musí odpovídat platnému materiálovému standardu dle ČSN, veškeré výrobky používané na této stavbě musí být provedeny v souladu s platnými zákony. Případné změny proti materiálu navrženému v projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny projektantem a zadavatelem.

S přebytečným materiálem, který nebude v rámci stavby dále využit, bude naloženo dle podmínek pro nakládání s odpady, které jsou pro předmětnou stavbu stanoveny.

2.2. ZÁVĚR

Veškerý použitý elektroinstalační materiál a provedení všech elektromontážních prací musí odpovídat platným ČSN, EN a dalším platným předpisům.

Zpracoval: Karel Košar



NOVÉ ZÁSUVKY A ROZVODY JSOU ZAKRESLENY ČERVENĚ

LEGENDA MÍSTNOSTI

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STROP	STĚNY
2.01	POSLUCHÁRNA	167,61	MARMOLEUM REAL P9,P12	AKUST. KAZETY, S.V. 4900 mm	AKUST. OBKLAD

NOVÉ ZÁSUVKY BUDOU KAŽDÁ DESÁTÁ V ŘADÁCH, T.J. CELKEM 160 ZÁSUVK 230V/16A V POVRCHOVÉM PROVEDENÍ
POČET OKRUHŮ BEZE ZMĚN (NA OKRUH VŽDY 5 ZÁSUVK). ROZVODY K ZÁSUVKÁM BUDOU V NOVÝCH TRUBKÁCH (LIŠTÁCH)

NOVÝ STAV - CELKEM 166 MÍST + VYUČUJÍCÍ

Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/71		
	OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL		
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY M.Č. 2.01	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.01 - NOVÝ STAV ELEKTRO	ČÍSLO ZAKÁZKY		0624
	STUPEŇ		DPS
	POČET FORMÁTŮ		2 A4
	DATUM		ŘÍJEN 2024
	MĚŘÍTKO		1:50
	Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE Č.PŘÍLOHY
		D.1.4.4	EL 02

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
###	1	Demontáž zásuvky povrchové 230V/16A, včetně odpojení	ks	140,000	0,00	0,00
	2	Demontáž stávajících kabelů Cu 3x2,5	m	90,000	0,00	0,00
	3	Kabel CHKE-R 3x2,5-J, včetně montáže	m	100,000	0,00	0,00
###	4	Ukončení kabelů 3x2,5 v osazených povrchových zásuvkách	ks	160,000	0,00	0,00
15	5	Lišta vkladací LH 40x40 HD bezhalogenová, včetně montáže	m	96,000	0,00	0,00
###	6	Zásuvka na omítku, (stávající zásuvka), pouze montáž	ks	160,000	0,00	0,00
	7	Vrtání otvorů pro kabely v interiérové konstrukci (pro osazení krabic)	ks	160,000	0,00	0,00
###	8	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení (pokud je neobsahuje stavební část TP)	ks	1,000	0,00	0,00
###	9	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	0,00	0,00
###	10	Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1,000	0,00	0,00
###	11	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	0,00	0,00
###	12	Výchozí revize	ks	1,000	0,00	0,00
		CELKEM				0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-085
Stavba: ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01

KSO:
Místo: KAMÝČKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:
ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WINGL s.r.o.

IČ: 21420840
DIČ: CZ21420840

Projektant:
[redacted], Gerstnerova 5/658, Praha 7

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			649 147,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	649 147,00	136 320,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			785 467,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-085

Stavba:

ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01

Místo:

KAMÝČKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

Zadavatel:

ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

Uchazeč:

WINGL s.r.o.

Datum:

31. 10. 2024

Projektant:

Gerstnerova 5/658, Praha

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		649 147,00	785 467,87	
2024-085-01	Stavební úpravy - Posluchárna 2.01	445 441,92	538 984,72	STA
2024-085-02	Profese - silnoprout	129 427,46	156 607,23	STA
2024-085-03	Ostatní - PBŘ- kontrola	29 834,09	36 099,25	STA
2024-085-04	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	44 443,53	53 776,67	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01
Objekt: 2024-085-01 - Stavební úpravy - Posluchárna 2.01

KSO:
Místo: KAMÝČKÁ 1176, Praha 6-Suchdol
Zadavatel: ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

Uchazeč: WINGL s.r.o.

Projektant: , Gerstnerova 5/658, Praha 7

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: 21420840
DIČ: CZ21420840
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2024/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena

Cena bez DPH		445 441,92	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	445 441,92	21,00%	93 542,80
		0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK	538 984,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01	Datum:	31. 10. 2024
Objekt:	2024-085-01 - Stavební úpravy - Posluchárna 2.01	Projektant:	Gerstnerova 5/658, Praha 7
Místo:	KAMÝČKÁ 1176, Praha 6-Suchdol	Zpracovatel:	
Zadavatel:	ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6		
Uchazeč:	WINGL s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	445 441,92
HSV - Práce a dodávky HSV	46 167,58
61 - Úprava povrchů vnitřních	16 081,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 260,31
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	15 696,83
96 - Bourání konstrukcí	2 171,58
997 - Přesun sutě	3 742,02
998 - Přesun hmot	2 215,71
PSV - Práce a dodávky PSV	363 238,30
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	3 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	17 082,36
776 - Podlahy povlakové	325 384,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 771,61
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	36 036,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01
Objekt: 2024-085-01 - Stavební úpravy - Posluchárna 2.01
Místo: KAMÝČKÁ 1176, Praha 6-Suchdol
Zadavatel: ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6
Uchazeč: WINGL s.r.o.

Datum: 31. 10. 2024
Projektant: Gerstnerova 5/658, Praha 7
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							445 441,92	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					46 167,58	
D	61	Úprava povrchů vnitřních					16 081,13	
1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	173,480	31,04	5 383,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001						
	VV	1.NP						
	VV	Ochrana podlah,komunikací dotčených stavbou						
	VV	m.č./1.01						
	VV	Vstup - žulová dlažba P6, 4,35x2,72-0,94=10,9 (včetně 6ti schodů)						
	VV	10,90					10,900	
	VV	m.č./1.02						
	VV	Vstupní hala - Marmoleum P4, 2,66x4,9-0,95=12,10						
	VV	12,10					12,100	
	VV	m.č./1.02-1						
	VV	Vstupní hala - Marmoleum P4, 3,45x3,6=12,42						
	VV	12,42					12,420	
	VV	Mezisoučet					35,420	
	VV	2.NP						
	VV	Ochrana podlah,komunikací dotčených stavbou						
	VV	m.č./2.02						
	VV	Galerie - Marmoleum P9, 8,95x7,9+3,97x5,6+2,8=95,73						
	VV	95,73					95,730	
	VV	m.č./2.02-1						
	VV	Schodiště						
	VV	16,08					16,080	
	VV	m.č./2.03						
	VV	Schodiště - Marmoleum P9, 3x8,75=26,25 (včetně 14+14schodů)						
	VV	26,25					26,250	
	VV	Mezisoučet					138,060	
	VV	Součet					173,480	
2	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	214,660	28,82	6 186,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005						
	VV	1.NP						
	VV	Ochrana stěn						
	VV	m.č./1.01						
	VV	Ohrana stěn, 3,4x2,2=7,48						
	VV	7,48					7,480	
	VV	m.č./1.02						
	VV	Ohrana stěn, 4,95x2,2-3,15x2,2=3,96						
	VV	3,96					3,960	
	VV	m.č./1.02-1						
	VV	Ohrana stěn, 14,7x2+3,45x2 - 0,8x2+1,18x2=32,34						
	VV	32,34					32,340	
	VV	Mezisoučet					43,780	
	VV	2.NP						
	VV	Ochrana stěn						
	VV	m.č./2.02						
	VV	Ohrana stěn, 6x2+10,5x1,1+13,5x2-(1,97x2x2)=42,67						
	VV	42,67					42,670	
	VV	m.č./2.03						
	VV	Ohrana stěn, 3x3,65x2-(1,5x2+0,7x2+1,18x2+1,8x2)=11,54						
	VV	11,54					11,540	
	VV	m.č./2.02-1						
	VV	Ohrana stěn, 15,3x1,1=16,83						
	VV	16,83					16,830	
	VV	m.č./2.01						
	VV	Ohrana stěn, 13,87x2-(2x2x2)+12,4x2+12,4x2+15,25x2=99,84						
	VV	99,84					99,840	
	VV	Mezisoučet					170,880	
	VV	Součet					214,660	
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	107,100	42,12	4 510,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011						
	VV	1.NP						
	VV	Ochrana dveří v komunikacích dotčených stavbou						
	VV	m.č./1.01						
	VV	Ochrana dveří, 1x 2,1=2,1						
	VV	2,10					2,100	
	VV	m.č./1.02						
	VV	Ochrana dveří, 1x2,1=2,1						
	VV	2,10					2,100	
	VV	m.č./1.02-1						
	VV	Ochrana dveří, 1x2=2						
	VV	2,00					2,000	
	VV	Mezisoučet					6,200	
	VV	2.NP						
	VV	Ochrana dveří v komunikacích dotčených stavbou						
	VV	m.č./2.02						
	VV	Ochrana dveří, (0,9x2+,9x2)x2=7,2						
	VV	7,20					7,200	
	VV	m.č./2.03						
	VV	Ochrana dveří,1,6x2+0,8x2=4,8						
	VV	4,80					4,800	
	VV	m.č./2.01						
	VV	Ochrana dveří, (0,9x2+,9x2)x2=7,2						
	VV	7,20					7,200	
	VV	Mezisoučet					19,200	
	VV	1.NP						
	VV	Ochrana skla fasády						
	VV	m.č./1.01						
	VV	Ochrana skla fasády, (0,38+0,38+1,6)x2,2=5,19						
	VV	5,19					5,190	
	VV	m.č./1.02						
	VV	Ochrana skla fasády, (0,38+0,38+3,2)x2,2=8,71						
	VV	8,71					8,710	
	VV	Mezisoučet					13,900	
	VV	2.NP						
	VV	Ochrana skla fasády + světlíků						
	VV	m.č./2.02						
	VV	Ochrana skla fasády, 4,8x2 + 11,10x2 =31,80 (včetně nosných profilů fasády)						
	VV	31,80					31,800	
	VV	m.č./2.01						
	VV	Ochrana střešních světlíků, 2x2x9=36						
	VV	36,00					36,000	
	VV	Mezisoučet					67,800	
	VV	Součet					107,100	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 260,31	
4	K	977342111.1	Frézování drážek v konstrukcích z betonu, rozměru do 30x3 mm	m	33,990	171,80	5 839,56	
	VV	Frézování drážek v konstrukcích z betonu, rozměru do 30x3 mm						
	VV	Úprava betonových schodů katedry a katedry pro osazení profilu hrany stupně, odfrézování betonu pro osazení - drážka š.						
	VV	30, v 3 mm,						
	VV	(1,2+0,2)x2 + 2,1+2,1+7,23=14,23						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,23					
	VV		Úprava betonových schodů a stupňovité podlahy pro osazení profilu hrany stupně, odfrézování betonu pro osazení - drážka		14,230			
	VV		š. 30, v. 3 m					
	VV		0,95+0,285 x 16=19,76					
	VV		19,76		19,760			
	VV		Součet		33,990			
5	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči - bok schodů	m2	0,730	576,37	420,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311					
	VV		Začištění čela odbouraného betonového stupně, 0,285x0,16x16=0,729					
	VV		0,73		0,730			
	VV		Součet		0,730			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				15 696,83	
6	K	952901104	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	81,700	59,58	4 867,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901104					
	VV		1.NP					
	VV		očištění - skla fasády					
	VV		m.č./1.01					
	VV		Ochrana skla fasády, (0,38+0,38+1,6)x2,2=5,19					
	VV		5,19		5,190			
	VV		m.č./1.02					
	VV		očištění - skla fasády, (0,38+0,38+3,2)x2,2=8,71					
	VV		8,71		8,710			
	VV		Mezisoučet		13,900			
	VV		2.NP					
	VV		očištění - skla fasády + světlíků					
	VV		m.č./2.02					
	VV		očištění - skla fasády, 4,8x2 + 11,10x2 =31,80 (včetně nosných profilů fasády)					
	VV		31,80		31,800			
	VV		m.č./2.01					
	VV		očištění - střešních světlíků, 2x2x9=36					
	VV		36,00		36,000			
	VV		2.NP					
	VV		Mezisoučet		67,800			
	VV		Součet		81,700			
7	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	25,400	43,33	1 100,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901122					
	VV		1.NP					
	VV		očištění - dveří v komunikacích dotčených stavbou					
	VV		m.č./1.01					
	VV		očištění - dveří, 1x 2,1=2,1					
	VV		2,10		2,100			
	VV		m.č./1.02					
	VV		očištění - dveří, 1x2,1=2,1					
	VV		2,10		2,100			
	VV		m.č./1.02-1					
	VV		očištění - dveří, 1x2=2					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,200			
	VV		2.NP					
	VV		očištění - dveří v komunikacích dotčených stavbou					
	VV		m.č./2.02					
	VV		očištění - dveří, (0,9x2+0,9x2)x2=7,2					
	VV		7,20		7,200			
	VV		m.č./2.03					
	VV		očištění - dveří, 1,6x2+0,8x2=4,8					
	VV		4,80		4,800			
	VV		m.č./2.01					
	VV		očištění - dveří, (0,9x2+0,9x2)x2=7,2					
	VV		7,20		7,200			
	VV		Mezisoučet		19,200			
	VV		Součet		25,400			
8	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	339,570	13,00	4 414,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902031					
	VV		1.NP					
	VV		Odstranění ochrany podlah - úklid					
	VV		m.č./1.01					
	VV		Vstup - žulová dlažba, 4,35x2,72-0,94=10,9 (včetně 6ti schodů)					
	VV		10,90		10,900			
	VV		m.č./1.02					
	VV		Vstupní hala - Marmoleum, 2,66x4,9-0,95=12,10					
	VV		12,10		12,100			
	VV		m.č./1.02-1					
	VV		Vstupní hala - Marmoleum, 3,45x3,6=12,42					
	VV		12,42		12,420			
	VV		Mezisoučet		35,420			
	VV		2.NP					
	VV		Odstranění ochrany podlah - úklid					
	VV		m.č./2.02					
	VV		Galerie - Marmoleum, 8,95x7,9+3,97x5,6+2,8=95,73					
	VV		95,73		95,730			
	VV		m.č./2.02-1					
	VV		Schodiště					
	VV		16,08		16,080			
	VV		m.č./2.03					
	VV		Schodiště - Marmoleum, 3x8,75=26,25 (včetně 14+14schodů)					
	VV		26,25		26,250			
	VV		Mezisoučet		138,060			
	VV		Úklid nově položené podlahové krytiny : Marmoleum					
	VV		m.č./2.01					
	VV		Posluchárna - Marmoleum - vodorovné plochy					
	VV		166,09		166,090			
	VV		Mezisoučet		166,090			
	VV		Součet		339,570			
9	K	952902321	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky přes 2m	m2	245,270	21,67	5 314,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902321					
	VV		1.NP					
	VV		stěn- očištění					
	VV		m.č./1.01					
	VV		stěn, očištění, 3,4x2,2=7,48					
	VV		7,48		7,480			
	VV		m.č./1.02					
	VV		stěn, očištění, 4,95x2,2-3,15x2,2=3,96					
	VV		3,96		3,960			
	VV		m.č./1.02-1					
	VV		stěn, očištění, 14,7x2+3,45x2 - 0,8x2+1,18x2=32,34					
	VV		32,34		32,340			
	VV		Mezisoučet		43,780			
	VV		2.NP					
	VV		stěn- očištění					
	VV		m.č./2.02					
	VV		stěn, očištění, 6x2+10,5x1,1+13,5x2-(1,97x2x2)=42,67					
	VV		42,67		42,670			
	VV		m.č./2.03					
	VV		stěn, očištění, 15,3x1,1=16,83					
	VV		16,83		16,830			
	VV		m.č./2.02-1					
	VV		stěn, očištění, 3x3,65x2-(1,5x2+0,7x2+1,18x2+1,8x2)=11,54					
	VV		11,54		11,540			
	VV		m.č./2.01					
	VV		stěn, očištění, 13,87x2-(2x2x2)+12,4x2+12,4x2+15,25x2=99,84					
	VV		99,84		99,840			
	VV		Mezisoučet		170,880			
	VV		očištění,					
	VV		Posluchárna - Marmoleum - svislé plochy, 3,47+27,14=30,61					
	VV		30,61		30,610			
	VV		Mezisoučet		30,610			
	VV		Součet		245,270			
	D	96	Bourání konstrukcí				2 171,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,320	343,60	2 171,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819					
		VV	Odbourání části nabetonovaných schodů - levá část posluchárny, 0,39x0,285x0,16x8=0,13 m3					
		VV	8*0,39		3,120			
		VV	Odbourání části nabetonovaných schodů - pravá část posluchárny,0,4x0,285x0,16x8=0,145					
		VV	8*0,4		3,200			
		VV	Součet		6,320			
D 997			Přesun sutě				3 742,02	
11	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,119	986,48	1 103,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,119	320,33	358,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,119	60,96	68,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	21,261	49,88	1 060,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	1,119*19 *Přepočtené koeficientem množství		21,261			
15	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,545	731,55	398,69	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601					
		VV	Frézování drážek v konstrukcích z betonu, rozměru do 30x3 mm					
		VV	0,102		0,102			
		VV	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
		VV	0,443		0,443			
		VV	Součet		0,545			
16	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,543	1 385,50	752,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
		VV	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
		VV	0,010		0,010			
		VV	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
		VV	0,013		0,013			
		VV	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
		VV	0,007		0,007			
		VV	Mezisoučet		0,030			
		VV	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
		VV	0,493		0,493			
		VV	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
		VV	0,020		0,020			
		VV	Mezisoučet		0,513			
		VV	Součet		0,543			
D 998			Přesun hmot				2 215,71	
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,675	3 282,53	2 215,71	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				363 238,30	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 000,00	
18	K	725-R1	D+M vodovodní baterie a odpad od dřezu- bude upřesněno na stavbě dle skutečné potřeby	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
D 766			Konstrukce truhlářské				17 082,36	
19	K	766438111	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi	m	6,650	1 230,95	8 185,81	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766438111					
		VV	Osazení dřevěného stupně střední uličky - v.č.04 Detaily					
		VV	počet 7 ks					
		VV	0,95*7		6,650			
		VV	Součet		6,650			
20	M	60624134.R	překlíčka stavební tl 30 mm.....Osazení dřevěného stupně střední uličky - v.č.04 Detaily	m2	3,168	2 535,34	8 031,95	
		VV	překlíčka stavební tl 25mm					
		VV	Osazení dřevěného stupně střední uličky - v.č.04 Detaily					
		VV	počet 7 ks					
		VV	7*(0,05+0,3+0,05)*0,943		2,640			
		VV	Součet		2,640			
		VV	2,64*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		3,168			
21	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,059	14 654,16	864,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766121					
D 776			Podlahy povlakové				325 384,33	
22	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	197,390	55,42	10 939,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
		VV	Odstranění podlahové krytiny včetně schodových PVC lišt, 7,23x2,1+0,2x1,21x2+(4,73x3,287-1,35X0,285)x2+2,63x7,234+ +(0,9x13,87-1,35x0,285x2)x7+13,87x1					
		VV	166,09		166,090			
		VV	Mezisoučet		166,090			
		VV	Odstranění krytiny ze svislých ploch stupňovitě podlahy a katedry, (1,2+0,2)x0,15x2+0,88x0,3x2+1,2x0,15x2+(1,35+0,285)x0,16x16+ +0,25x11,184x8+1,35x0,					
		VV	31,30		31,300			
		VV	Mezisoučet		31,300			
		VV	Součet		197,390			
23	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	66,910	22,17	1 483,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
		VV	Ostranění soklových lišt s podlahovou krytinou, 54,2-2,1x2 + +(1,2+0,2+0,88)x2+7,234+0,16x32=66,91					
		VV	66,91		66,910			
		VV	Součet		66,910			
24	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	197,390	22,17	4 375,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991821					
		VV	Odstranění lepidla z podahy posluchárny - obroušení					
		VV	166,09		166,090			
		VV	Odstranění lepidla ze svislých ploch podlahy - obroušení					
		VV	31,30		31,300			
		VV	Součet		197,390			
25	K	776111117	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	98,700	38,79	3 828,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111117					
		VV	Oprava povrchu podlahy a stupňů pro pokládku podlahové krytiny, 166,09+31,30=197,39 z toho 50%					
		VV	98,70		98,700			
		VV	Součet		98,700			
26	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	98,700	12,19	1 203,39	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
		VV	Oprava povrchu podlahy a stupňů pro pokládku podlahové krytiny, 166,09+31,30=197,39 z toho 50%					
		VV	98,7		98,700			
		VV	Součet		98,700			
27	K	776121323	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná schodišť	m2	27,140	34,01	922,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121323					
		VV	Penetrace povrchu čela masky a podstupnice schodů, 5,51x0,25x8x2+(0,95+0,285)x0,16x16+(0,95+0,285+0,285) x					
		VV	x0,16x8=27,14		27,140			
		VV	27,14		27,140			
		VV	Součet		27,140			
28	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	166,090	293,64	48 770,99	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111					
		VV	příprava podkladu Marmolea extra					
		VV	166,09		166,090			
		VV	Mezisoučet		166,090			
		VV	Součet		166,090			
29	K	776143131	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn tmelení schodišť podstupnic stěrka tloušťky do 3 mm	m2	27,140	341,19	9 259,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776143131					
		VV	příprava podkladu čelo masky a podstupnice schodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		27,14				27,140	
	VV		Mezisoučet				27,140	
	VV		Součet				27,140	
30	K	776431211	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných	m	155,620	68,01	10 583,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776431211					
	VV		Osazení profilu hrany schodů a stupňovité podlahy - lepení a kotvení,(1,2+0,2)x2+2,1x2+7,23+(0,95+0,285)x16+ +(0,285+0,285+0,95)x7 + 13,874x8 =155					
	VV		155,62				155,620	
	VV		Součet				155,620	
31	M	59054141.1	profil schodový protiskluzový - např. ref. výř.Profil na hrany schodů Roll - 3,3 x 12 mm na lino,vrtaný - Alu stříbro - filigránské ukončení hrany. Vrtaný a zešíkmený.	m	158,732	119,19	18 918,97	
	VV		Osazení profilu hrany schodů a stupňovité podlahy - lepení a kotvení,(1,2+0,2)x2+2,1x2+7,23+(0,95+0,285)x16+ +(0,285+0,285+0,95)x7 + 13,874x8 =155					
	VV		155,62				155,620	
	VV		Součet				155,620	
	VV		155,62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				158,732	
32	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	193,230	266,38	51 472,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776251111					
	VV		Nalepení podlahové krytiny na čelo masky a podstupnici schodů					
	VV		27,14				27,140	
	VV		Mezisoučet				27,140	
	VV		Pokládka podlahové krytiny na plochu stupňů a na podlahu					
	VV		166,09				166,090	
	VV		Mezisoučet				166,090	
	VV		Součet				193,230	
33	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 - bude upřesněno s investorem	m2	212,553	668,53	142 098,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nalepení podlahové krytiny na čelo masky a podstupnici schodů					
	VV		27,14				27,140	
	VV		Mezisoučet				27,140	
	VV		Pokládka podlahové krytiny na plochu stupňů a na podlahu					
	VV		166,09				166,090	
	VV		Mezisoučet				166,090	
	VV		Součet				193,230	
	VV		193,23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				212,553	
34	K	776111331	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí stěn	m2	3,470	12,19	42,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111331					
	VV		Penetrace svislé plochy katedry včetně přilehlých schodů,(1,2+0,2)x0,15x2+1,2x0,15x2+0,88x0,3x2+7,23x0,3=3,47					
	VV		3,47				3,470	
	VV		Součet				3,470	
35	K	776121324	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná stěn	m2	3,470	34,01	118,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121324					
	VV		Penetrace svislé plochy katedry včetně přilehlých schodů,(1,2+0,2)x0,15x2+1,2x0,15x2+0,88x0,3x2+7,23x0,3=3,47					
	VV		3,47				3,470	
	VV		Součet				3,470	
36	K	776551111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m	m2	3,470	578,10	2 006,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776551111					
	VV		Pokládka podlahové krytiny na svislé plochy katedry					
	VV		3,47				3,470	
	VV		Součet				3,470	
37	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 - bude upřesněno s investorem	m2	3,817	690,16	2 634,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		Pokládka podlahové krytiny na svislé plochy katedry					
	VV		3,47				3,470	
	VV		Součet				3,470	
	VV		3,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				3,817	
38	K	776111331	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí stěn	m2	4,015	12,19	48,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111331					
	VV		Penetrace stěny pro osazení plastové soklové lišty v. 60 mm celkem 66,91m					
	VV		66,91*0,06				4,015	
	VV		Součet				4,015	
39	K	776121324	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná stěn	m2	4,015	34,01	136,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121324					
	VV		Penetrace stěny pro osazení plastové soklové lišty v. 60 mm celkem 66,91m					
	VV		66,91*0,06				4,015	
	VV		Součet				4,015	
40	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nafažení	m	66,910	119,02	7 963,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421711					
	VV		Nalepení soklové lišty + vlepění podlahové krytiny, v.60 mm					
	VV		66,91				66,910	
	VV		Součet				66,910	
41	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 - bude upřesněno s investorem	m2	4,818	611,42	2 945,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nalepení soklové lišty + vlepění podlahové krytiny, v.60 mm					
	VV		66,91*0,06				4,015	
	VV		Součet				4,015	
	VV		4,015*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				4,818	
42	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	196,700	11,34	2 229,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991121					
	VV		Pokládka podlahové krytiny na svislé plochy katedry					
	VV		3,47				3,470	
	VV		Mezisoučet				3,470	
	VV		Nalepení podlahové krytiny na čelo masky a podstupnici schodů					
	VV		27,14				27,140	
	VV		Mezisoučet				27,140	
	VV		Pokládka podlahové krytiny na plochu stupňů a na podlahu					
	VV		166,09				166,090	
	VV		Mezisoučet				166,090	
	VV		Součet				196,700	
43	K	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,714	1 983,68	3 400,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776121					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 771,61	
44	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,840	22,82	2 278,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111031					
	VV		m.č.2.01					
	VV		Oprava malby na akustickém obkladu stěn a na stěněch, 13,87x2-(2x2x2)+12,4x2+12,4x2+15,25x2=99,84 ?? - dle stavu skutečného stavu bude					
	VV		99,84				99,840	
	VV		Součet				99,840	
45	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m - bude upřesněno dle skutečné potřeby	m2	99,840	31,95	3 189,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
	VV		m.č.2.01					
	VV		Oprava malby na akustickém obkladu stěn a na stěněch, 13,87x2-(2x2x2)+12,4x2+12,4x2+15,25x2=99,84 ?? - dle stavu skutečného stavu bude					
	VV		99,84				99,840	
	VV		Součet				99,840	
46	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m - bude upřesněno dle skutečné potřeby	m2	99,840	17,12	1 708,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121011					
	VV		m.č./2.01					
	VV		Oprava malby na akustickém obkladu stěn a na stěněch, 13,87x2-(2x2x2)+12,4x2+12,4x2+15,25x2=99,84 ?? - dle stavu skutečného stavu bude					
	VV		99,84				99,840	
	VV		Součet				99,840	
47	K	784181101	Penetrace podkladu jedonosobná základní bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,840	25,10	2 506,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		m.č./2.01					
	VV		Oprava malby na akustickém obkladu stěn a na stěněch, 13,87x2-(2x2x2)+12,4x2+12,4x2+15,25x2=99,84 ?? - dle stavu skutečného stavu bude					
	VV		99,84				99,840	
	VV		Součet				99,840	
48	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jedonosobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,840	81,01	8 088,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./2.01					
	VV		Oprava malby na akustickém obkladu stěn a na stěněch, 13,87x2-(2x2x2)+12,4x2+12,4x2+15,25x2=99,84 ?? - dle					
	VV		stavu skutečného stavu bude					
	VV		99,84				99,840	
	VV		Součet				99,840	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							36 036,04	
49	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný - odborná demontáž zařízení a zpětná montáž- bude upřesněno dle skutečné potřeby	hod	64,000	563,06	36 036,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2122					
	VV		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný - odborná demontáž zařízení a					
	VV		zpětná montáž- bude upřesněno dle s					
	VV		dle skutečné potřeby					
	VV		demontáž cca. 2 lidé cca. 2 dny po 8 hodinách					
	VV		2*2*8				32,000	
	VV		zpětná montáž					
	VV		montáž cca. 2 lidé cca. 2 dny po 8 hodinách					
	VV		2*2*8				32,000	
	VV		Součet				64,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01
Objekt:
2024-085-02 - Profese - silnoproud

KSO:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

Zadavatel:
ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

Uchazeč:
WINGL s.r.o.

Projektant:
[redacted],Chaplinovo náměstí 654/20,Praha 5

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 21420840
DIČ: CZ21420840

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle řízení stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2024/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH			129 427,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	129 427,46	21,00%	27 179,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	156 607,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01

Objekt: 2024-085-02 - Profese - silnoprroud

Místo: KAMÝCKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

Zadavatel: ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

Uchazeč: WINGL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 31. 10. 2024

Projektant: [redacted] ř.Chaplinovo
náměstí
654/20,Praha 5

Zpracovatel: [redacted]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	129 427,46
PSV - Práce a dodávky PSV	129 427,46
741 - Elektroinstalace - silnoprroud	129 427,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01

Objekt: 2024-085-02 - Profese - silnoprroud

Místo: KAMÝCKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

Zadavatel: ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

Uchazeč: WINGL s.r.o.

Datum: 31. 10. 2024

Projektant: [redacted],Chaplinovo náměstí

654/20,Praha 5

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 129 427,46

D PSV Práce a dodávky PSV 129 427,46

D 741 Elektroinstalace - silnoprroud 129 427,46

1	K	741-01	Demontáž zásuvky povrchové 230V/16A, včetně odpojení	ks	140,000	73,88	10 343,01	
2	K	741-02	Demontáž stávajících kabelů Cu 3x2,5	m	90,000	12,66	1 139,84	
3	K	741-03	Kabel CHKE-R 3x2,5-J, včetně montáže	m	100,000	77,64	7 763,59	
4	K	741-04	Ukončení kabelů 3x2,5 v osazených povrchových zásuvkách	ks	160,000	116,09	18 575,20	
5	K	741-05	Lišta vkládací LH 40x40 HD bezhalogenová, včetně montáže	m	96,000	241,84	23 216,30	
6	K	741-06	Zásuvka na omítku, (stávající zásuvka), pouze montáž	ks	160,000	39,05	6 248,02	
7	K	741-07	Vrtání otvorů pro kabely v interiérové konstrukci (pro osazení krabic)	ks	160,000	73,88	11 820,58	
8	K	741-08	Stavební přímoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení (pokud je neobsahuje stavební část TP)	ks	1,000	29 503,49	29 503,49	
9	K	741-09	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	1 397,90	1 397,90	
10	K	741-10	Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1,000	10 026,39	10 026,39	
11	K	741-11	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	4 432,72	4 432,72	
12	K	741-12	Výchozí revize	ks	1,000	4 960,42	4 960,42	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01

Objekt:
2024-085-03 - Ostatní - PBŘ- kontrola

KSO:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

Zadavatel:
ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

Uchazeč:
WINGL s.r.o.

Projektant:
[redacted], Gerstnerova 5/658, Praha 7

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 21420840
DIČ: CZ21420840

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle řízení stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2024/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH			29 834,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 834,09	21,00%	6 265,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			36 099,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01

Objekt: 2024-085-03 - Ostatní - PBŘ- kontrola

Místo: KAMÝCKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

Zadavatel: ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

Uchazeč: WINGL s.r.o.

Datum: 31. 10. 2024

Projektant: ,
Gerstnerova 5/658,
Praha 7

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		29 834,09
HSV - Práce a dodávky HSV		10 942,27
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		10 942,27
PSV - Práce a dodávky PSV		18 891,82
742 - Elektroinstalace - slaboproud		18 891,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01

Objekt: 2024-085-03 - Ostatní - PBŘ- kontrola

Místo: KAMÝČKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

Projektant: Ing. Vladimír Čapka,
Gerstnerova 5/658,
Praha 7

Uchazeč: WINGL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 834,09

D HSV Práce a dodávky HSV 10 942,27

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 942,27

1	K	952-R1	kontrola funkčnosti požárních uzávěrů - bude upřesněno dle skutečné potřeby	ks	1,000	3 249,92	3 249,92	
2	K	952-R2	kontrola únikových cest- bude upřesněno dle skutečné potřeby	ks	1,000	3 033,26	3 033,26	
3	K	952-R3	kontrola vybavení vnitřními odběrními místy požární vody a přenosnými hasicími přístroji a jejich funkčnosti- bude upřesněno dle skutečné potřeby	ks	1,000	4 659,09	4 659,09	

D PSV Práce a dodávky PSV 18 891,82

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 18 891,82

4	K	742210902	Servisní prohlídka EPS přezkoušení funkce ústředny	kus	1,000	3 166,23	3 166,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210902					
5	K	742210921	Servisní prohlídka EPS přezkoušení funkce automatického hlásiče	kus	1,000	2 638,52	2 638,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210921					
6	K	742210923	Servisní prohlídka EPS přezkoušení funkce technologického hlásiče	kus	1,000	1 952,51	1 952,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210923					
7	K	742210931	Servisní prohlídka EPS přezkoušení funkce pomocného zdroje	kus	1,000	2 638,52	2 638,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210931					
8	K	742210951	Servisní prohlídka EPS přezkoušení funkce tlačítkového hlásiče	kus	1,000	1 319,26	1 319,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210951					
9	K	742210961	Servisní prohlídka EPS přezkoušení funkce sirény, majáku nebo signalizace	kus	1,000	2 744,06	2 744,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210961					
10	K	7422-R1	kontrola funkčnosti SOZ nouzového osvětlení a evakuačního rozhlasu- bude upřesněno dle skutečné potřeby	kus	1,000	4 432,72	4 432,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01
Objekt:
2024-085-04 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:
ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WINGL s.r.o.

IČ: 21420840
DIČ: CZ21420840

Projektant:
[redacted], Gerstnerova 5/658, Praha 7

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle řízení stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2024/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a doloženo z výkresů

Cena bez DPH			44 443,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 443,53	21,00%	9 333,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 776,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01

Objekt: 2024-085-04 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: KAMÝCKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

Zadavatel: ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

Uchazeč: WINGL s.r.o.

Datum: 31. 10. 2024

Projektant: ,
Gerstnerova 5/658,
Praha 7

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	44 443,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 443,53
VRN3 - Zařízení staveniště	18 861,20
VRN4 - Inženýrská činnost	19 379,92
VRN6 - Územní vlivy	3 839,59
VRN9 - Ostatní náklady	2 362,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČZÚ-FLD-stavební úpravy -posluchárna 2.01

Objekt: 2024-085-04 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: KAMÝCKÁ 1176, Praha 6-Suchdol

Zadavatel: ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6

Uchazeč: WINGL s.r.o.

Datum: 31. 10. 2024

Projektant: Gerstnerova 5/658, Praha 7

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							44 443,53	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							44 443,53	
D VRN3 Zařízení staveniště							18 861,20	
1	K	032002000	Vybavení staveniště	%	1,400	5 907,05	8 269,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032002000								
2	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	2,000	5 295,66	10 591,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000								
D VRN4 Inženýrská činnost							19 379,92	
3	K	041403000.1	Koordinátor BOZP na staveništi	hod	6,000	866,65	5 199,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041403000.1								
4	K	041414000	Plán BOZP	ks	1,000	9 749,76	9 749,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041414000								
5	K	045303000	Koordinační činnost	%	0,750	5 907,05	4 430,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000								
D VRN6 Územní vlivy							3 839,59	
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	0,650	5 907,05	3 839,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000								
D VRN9 Ostatní náklady							2 362,82	
7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	%	0,400	5 907,05	2 362,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Pojistná smlouva

Pojištění podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** číslo 5185817605

Pojistitel

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále jen „pojišťovna“)

Pojišťovací zprostředkovatel

Samostatný zprostředkovatel (SZ)

titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma

IČO

Generali Česká Distribuce a.s.

44795084

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

Na Pankráci 1658/121

Praha 4

140 00

Vázaný zástupce (VZ)

titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma

IČO

12488259

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

KAMÝČKÁ 942

PRAHA 6

165 00

e-mail

telefon

Pojistník

obchodní firma

IČO

WINGL s.r.o., dále jen WINGL s.r.o.

21420840

zapsán

v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

Na Folimance 2155/15

Praha - Vinohrady

120 00

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka.

plátce DPH

ANO

e-mail

telefon

Pojištění je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Doba pojištění

počátek pojištění

00:00 hod. 07.06.2024

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Přehled pojištění

pořadové číslo	Název pojištění	Datum účinnosti	Pojistné*
1	Pojištění obecné odpovědnosti	07.06.2024	9 912 Kč

* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přírážkách dle Vyúčtování pojistného.

Celkové roční pojistné

9 912 Kč

Pojistník se zavazuje ponechat tuto pojistnou smlouvu v platnosti minimálně 5 let a za to je mu poskytnuta sleva na pojistném ve výši 15,00 %.

Pokud pojistník svými úkony nebo porušením povinností způsobí zánik pojistné smlouvy dříve než 06.06.2029, zavazuje se uhradit částku odpovídající výši poskytnuté slevy za dobu trvání pojištění od 07.06.2024.

Obecná ujednání a výluky

Územní výluky

Pojištění se nevztahuje a z pojištění nevzniká právo na jakékoliv plnění či nárok v jakékoli souvislosti:

a se škodní/pojistnou událostí, k níž dojde na území následujících států/regionů: Bělorusko, Írán, Korejská lidově demokratická republika, Kuba s americkým prvkem, Ruská federace, Sýrie, Venezuela, Krymský region, Doněcký region, Chersonský region, Luhanský region a Záporožský region (dále jen „země s úplným embargem“).

Více informací naleznete na webu pojišťovny www.generaliceska.cz/sankce-zemi-osob.

b s jakoukoliv činností, která přímo či nepřímo souvisí s vládou země s úplným embargem nebo právníky osobami se sídlem v zemi s úplným embargem, jakož i fyzickými nebo právníky osobami, které se nacházejí na území země s úplným embargem, případně mají výše jmenovaní z této činnosti prospěch.

Územím se vždy rozumí území země s úplným embargem vč. jejich vnitřních a pobřežních vod, přilehlých zón a výlučných ekonomických zón.

Přehled pojištění

Americký prvek (US nexus) pro účely tohoto ujednání zahrnuje obchodní případy s možným uplatněním jurisdikce USA, např. z důvodu zapojení společnosti registrované v USA (či její zahraniční pobočky), občana USA nebo fyzické osoby s pobytem v USA (rezidenta v USA), finančního systému USA, banky USA, amerických dolarů (USD) nebo zboží pocházejícího z USA.

Od této výluky je možné se odchýlit pouze, pokud se k tomu pojišťovna předem písemně zaváže.

1. POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI

Kód produktu: DMO 01 / 2

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále jen „VPPMO-P“) a ujednáními této pojistné smlouvy.

1. 1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Hlavní činnost klienta (NACE) 41 Výstavba budov

Výše příjmů z podnikatelské činnosti, na kterou se vztahuje pojištění a které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

10 000 000

V souladu s článkem 5 odst. 1 písm. a VPPMO-P se ujednává, že zvýšení příjmů je pojištěný povinen oznámit pojišťovně pouze v případě, že došlo k jejich zvýšení o více než 10 % ve srovnání s údajem uvedeným při sjednávání pojištění.

1. 2. Pojištěný předmět činnosti

1. 2. 1 Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného WINGL s.r.o. nahradit škodu či újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě: výpis z živnostenského rejstříku ze dne 1. 4. 2024, která/ý je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s těmito činnostmi:
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku, Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, Provádění pyrotechnického průzkumu, Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací, i když jsou uvedeny v příslušném oprávnění.

1. 3. Princip pojištění

1. 3. 1 Ujednává se, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou podmínky stanovené v článku 21 bodu 2 VPPMO-P. Pojišťovna poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni vzniku škody či újmy (loss occurrence).

1. 4. Rozsah pojištění

1. 4. 1 Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 21 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P (základní rozsah) a dále uvedených doložek.

Rozsah pojištění / pojistné nebezpečí	Limit / sublimit pojistného plnění	Spoluúčast	Územní rozsah
Základní rozsah včetně povinnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem	10 000 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika
Doložka V70 Čisté finanční škody	500 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika
Doložka V723 Věci převzaté a užívané	500 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika
Doložka V99 Škody na životním prostředí	500 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika
Doložka V103 Majetková propojenost	1 000 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika
Doložka V111 Regresní náhrady	5 000 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika
Doložka V112 Nemajetková újma	500 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika

1. 5. Smluvní ujednání, doložky

1. 5. 1 Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu či nemajetkovou újmu (pokud se nejedná o újmu na zdraví) související s jakýmkoli kybernetickým incidentem, nebo jakýmkoli kybernetickým útokem, nebo poškozením, zničením či ztrátou dat, nebo omezením či ztrátou možnosti užívat data. Tato výluka se nevztahuje na škodu na hmotné věci či újmu na zdraví nebo usmrcení.
Kybernetickým incidentem se rozumí jakýkoli omyl či opomenutí týkající se přístupu k jakémukoli počítačovému systému, jeho provozu či užívání, nebo jakákoli částečná či úplná nepřístupnost či selhání počítačového systému, nemožnost přístupu k němu, jeho provozu či užívání.
Kybernetickým útokem se rozumí jakékoli úmyslné neoprávněné jednání kterékoli osoby či hrozba takového jednání týkající se přístupu k jakémukoli počítačovému systému, jeho provozu či užívání.
Daty se rozumí jakákoliv informace v digitální podobě, bez ohledu na způsob, jakým je používána nebo zobrazována (text, obrázky, kresby, video či software).
Počítačovým systémem se rozumí jakýkoli počítač, hardware, software, komunikační systém, elektronické zařízení (včetně chytrých telefonů, notebooků, tabletů, nositelné elektroniky), servery, datová uložiska, cloudy nebo jednočipové počítače a podobná zařízení, a to bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem, provozovatelem či uživatelem.

1. 5. 2 Doložka V70 Čisté finanční škody

Odchylně od článku 21 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajících, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.
Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ povinnosti pojištěného k náhradě čisté finanční škody:
a) nastalé v důsledku vady výrobku;
b) nastalé v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným;
c) spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou;
d) nastalé v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná;
e) spočívající v ušlém zisku, který je následkem přerušení provozu třetí osoby, kdy k přerušení provozu došlo v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti;
 - b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen;
 - c) vzniklou při obchodování s cennými papíry;
 - d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva;
 - e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách;
 - f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek;
 - g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek třetích osob;
 - h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.
- V případě škody způsobené vadným výrobkem se pojištění dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý jinak, než následkem přerušení provozu třetí osoby v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

1. 5. 3 Doložka V723 Věci převzaté a užívané

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pokud není uvedeno v této pojistné smlouvě jinak, pojištění v rozsahu této doložky se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou v rámci činnosti kurýrní (rozmávkové) služby.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou;
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv;
- c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci;
- d) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních;
- e) vzniklé na zvířatech.

1. 5. 4 Doložka V99 Škody na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 3 písm. a VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi, ke kterému došlo následkem škodní události.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně;
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření;
- c) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby;
- d) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí;
- e) zapříčiněnou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekologické zátěže;
- f) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodní události;
- g) u které nemohla být možnost jejího vzniku odhalena v době, kdy nastala škodní událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval.

Pojistník a pojištěný, nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodní událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojištník nebo pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodní událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodní události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

1. 5. 5 Doložka V103 Majetková propojenost

Ujednává se, že odchylně od článku 23 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěný i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

1. 5. 6 Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

1. 5. 7 Doložka V112 Nemajetková újma

Odchylně od článku 21 bodu 1 a článku 23 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit:

- a) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
- b) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 23 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

1. 5. 8 Zvláštní ujednání

1. 5. 8. 1 Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

1. 5. 8. 2 Ujednává se, že za věc ve smyslu článku 23 bod 1 písm. i VPPMO-P, na které byla prováděna objednaná činnost, se nepovažuje celá nemovitá hmotná věc, ale pouze ty části, na kterých byla prováděna objednaná činnost.

1. 6. Pojistné

Roční pojistné celkem

18 022 Kč

Obchodní sleva 30,00 % a Sleva za dlouhodobost 15,00 %, tj.

8 110 Kč

Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení

9 912 Kč

Společná a závěrečná ustanovení

- Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále na obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje, že:
 - pojišťovně/pojišťovacím zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádné a úplně zaznamenány a žádné další nemá,
 - pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojistitelem/pojišťovacím zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávánému pojištění,
 - jsou všechny jeho uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné,
 - bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).
- Pojistník bere na vědomí, že byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. V těchto případech vrátí pojišťovna pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný, pojišťovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
- Pojistník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojišťovnu, může využít adresu pro doručování Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno nebo elektronickou schránku stiznosti@generaliceska.cz. Nedohodne-li se pojistník s pojišťovnou jinak, stížnosti se vyřizují písemnou formou. V případě, že není pojistník spokojen s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasí nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s. Se stížností se lze také obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz).
- Pojistník nebo některý z pojištěných nespĺňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojištníci, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:
 - čistý obrát min. 13 600 000 EUR (cca 340 000 000 Kč),
 - úhrn rozvahy min. 6 600 000 EUR (cca 165 000 000 Kč),
 - průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

Dokumenty k pojistné smlouvě

Předmluvní dokumenty:

- Informace o pojišťovacím zprostředkovateli
- Informační dokument o pojistném produktu
- Předmluvní informace
- Záznam z jednání

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytuje důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:

- VPPMO-P-02/2020
- Sazebník administrativních poplatků
- výpis z živnostenského rejstříku

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy, řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojistník dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Dále pojistník potvrzuje, že mu výše uvedené dokumenty, tj. předmluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy způsobem, který si zvolil.

Souhlas s elektronickou komunikací při jednání o uzavření pojistné smlouvy

Chcete dostávat informace raději e-mailem?



ANO

Pojistník si volí, aby mu předmluvní informace týkající se pojištění u Generali České pojišťovny a.s. (bude-li jednání kdykoliv v budoucnu směřovat ke sjednání jakéhokoliv pojištění) posílala pojišťovna či společnost Generali Česká Distribuce a.s. na jím sdělený e-mail. Jedná se zejména o informace o pojišťovně, informace o pojištění, případné další informace o životním pojištění, rezervotvorném pojištění či pojištění vázaném na koupi zboží nebo služby (bude-li jednání kdykoliv v budoucnu směřovat ke sjednání některého z těchto typů pojištění), dále informace o pojišťovacím zprostředkovateli a záznam z jednání. Pojistník si uvědomuje úroveň zabezpečení svého e-mailu a případná rizika s tím spojená.



NE, souhlas neuděluji.

Souhlas s elektronickou komunikací během trvání pojištění

Chcete dostávat informace raději e-mailem?



ANO

Pojistník si zvolil, aby mu Generali Česká pojišťovna a.s. a Generali Česká Distribuce a.s. posílaly informace, např. informace o pojišťovně, pojištění, pojišťovacím zprostředkovateli, záznam z jednání o změně pojištění, pokud k ní dojde, na jím sdělený e-mail. Tato volba se týká i všech dříve sjednaných pojištění. Pojistník si je vědom úrovně zabezpečení svého e-mailu a případných rizik s tím spojených.



NE, souhlas neuděluji.

Upozornění pro klienta: Tuto svou volbu můžete kdykoliv změnit. Pokud o to požádáte, dostanete výše uvedené informace také v listinné podobě. Naše e-mailová komunikace je zabezpečena prostřednictvím šifrovacího protokolu TLS/SSL. V některých případech s Vámi můžeme komunikovat i jinak, zejména když to bude potřebné z důvodu ochrany našich práv.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.
Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovna.

Společná a závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

datum uzavření pojistné smlouvy

WINGL s.r.o.

Osoba zastupující pojistníka
[REDACTED], jednatel

Podpis (razítko) osoby zastupující pojistníka

místo **Praha**

[REDACTED]
911006377, IČO: 12488259

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s. oprávněného k uzavření této smlouvy


**Pojištění podnikatele
a právnických osob ProfiPlán**

Nabídka pojistné smlouvy č.	5784096294
Pojistník	WINGL s.r.o.



WINGL s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha - Vinohrady
ČESKÁ REPUBLIKA

Praha 8. 5. 2025

Potvrzujeme sjednání pojištění

Vážená paní, vážený pane,

potvrzujeme, že platba za pojištění k pojistné smlouvě číslo 5784096294 dorazila na náš účet. Pojištění Vás chrání od 0:00 hod. dne **10. 5. 2025**.

Jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy Vám posíláme Pojistku.


Máte k Vaší smlouvě dotazy?

Zeptejte se svých poradců, kterými jsou [redacted], telefon: + [redacted] e-mail: [redacted] nebo [redacted], telefon: + [redacted], e-mail: [redacted]

Zeptejte se nás přes online chat na webových stránkách www.generaliceska.cz/chat.

Děkujeme, že jste s námi, a přejeme příjemný den.

Generali Česká pojišťovna a.s.

[redacted signature]

[redacted name]

senior manažer správy neživotního pojištění

TC99406102029

O2217554023373



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 5784096294



Pojistník

Název	WINGL s.r.o.
Adresa	Na Folimance 2155/15, Praha - Vinohrady, 120 00
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	21420840

Stavební a montážní pojištění

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplnkové pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění DPPSM-P-02/2020.

Sjednává se pojištění budovaného díla: Bezpečnostní úpravy posluchárny ve dřevařském pavilonu.
Pojistná částka budovaného díla se sjednává ve výši 700 000 Kč.

Informace o místě pojištění

Poř. č.	Pol. č.	Místo pojištění
1	S01	Praha, Kamýcká 129, 165 00



Počátek a doba pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 10. 5. 2025 do 31. 8. 2025.
Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod. dne 10. 5. 2025.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 10. 5. 2025

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

senior manažer správy neživotního pojištění
