
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2025_0033**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření Ing. Hanou Holušovou, Specialistou výstavby sítě – smlouvy, Výstavba liniových sítí ČV

(„CETIN“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

ID DS: ffhk8fq

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 162

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

(„Stavebník“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích tuto

**Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(„Smlouva“)**

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Etapa Překládky znamená kteroukoliv část Překládky, která je v Projektu určená za etapu, vymezená v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky, která je přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Radim spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „**Most ev. č. 356-001 Radim**“ jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelety;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne 27. 11. 2024 vydané pod č.j. 326537/24, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Radim(CR), most 356_001 SO461**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v Projektu.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
 - a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Smluvní strany ujednávají, že není-li Smlouvou určeno jinak, platí pro Etapu Překládky práva a povinnosti Smluvních stran, lhůty a podmínky, ujednané Smlouvou pro Překládku.
- 3.5. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6. Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
 - a) před realizací Překládky:
 - (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:

- a) zajistit rozhodnutí o povolení záměru o umístění stavby Překládky, přičemž stavba Překládky bude v žádosti o vydání povolení označena jako stavební objekt „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- b) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
- c) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“);
- d) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru předat společnosti CETIN toto rozhodnutí včetně grafické a dokladové části, a to zasláním na email kontaktní osobě ve věcech smluvních dle odst. 8.1. Smlouvy.

4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

- a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.

4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

4.7. Dnem ukončení realizace Překládky a/nebo Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu

elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky a/nebo Etapy Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **356 280,- Kč** (slovy: tři sta padesát šest tisíc dvě stě osmdesát korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, se Stavebník zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
 - b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - f) náklady na identifikaci parcel,
 - g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, a které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,
 - i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.4. Výše nákladů na Překládku uvedená v odst. 5.2. Smlouvy se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost

CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2. a/nebo odst. 5.4. Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- a) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace dotčené Etapy Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy;
 - b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy.
- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.3. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: fakturace.tu@suspk.cz. Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Hana Holušová
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel.: 720 752 377, e-mail: hana.holusova@cetin.cz

ve věcech technických: Tomáš Pekař
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
tel.: 602 120 786, e-mail: tomas.pekar@cetin.cz; tomas.pekar@novaoptika.cz

8.2. Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašák

funkce: ředitel

tel: 466 052 711, e-mail: zdenek.vasak@suspk.cz

ve věcech technických: Radka Kvirencová

Funkce: technik úseku výstavby

tel: 602 202 381, e-mail: radka.kvirencova@suspk.cz

ve věcech technických: Radim Malát

Funkce: technik úseku výstavby

tel: 602 202 381, e-mail: radim.malat@suspk.cz

- 8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1. Smlouvu lze zrušit:

- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
- (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:

- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
- b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4. Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.

- 10.2 Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy:
- a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
 - b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
- 10.3 Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činnosti dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.
- 10.4 Pozbytím účinnosti Smlouvy nebo její části touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.
- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
- Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu contract_termination@cetin.cz.
- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na téže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny

kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
 - b) § 1767 odst. 2;
 - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
 - d) § 1743; a
 - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

V Praze dne

V Pardubicích dne

Za CETIN:

Za Stavebníka:

Ing. Hana
Holušová

Digitálně podepsal Ing. Hana
Holušová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-04084063,
o=CETIN a.s., ou=77424, cn=Ing. Hana
Holušová, sn=Holušová,
givenName=Hana,
serialNumber=P928656
Datum: 2025.06.04 08:58:38 +02'00'


Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.06.04
13:47:24 +02'00'


Ing. Hana Holušová
specialista výstavby sítě – smlouvy
na základě pověření
CETIN a.s.
(podepsáno elektronicky)

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
(podepsáno elektronicky)

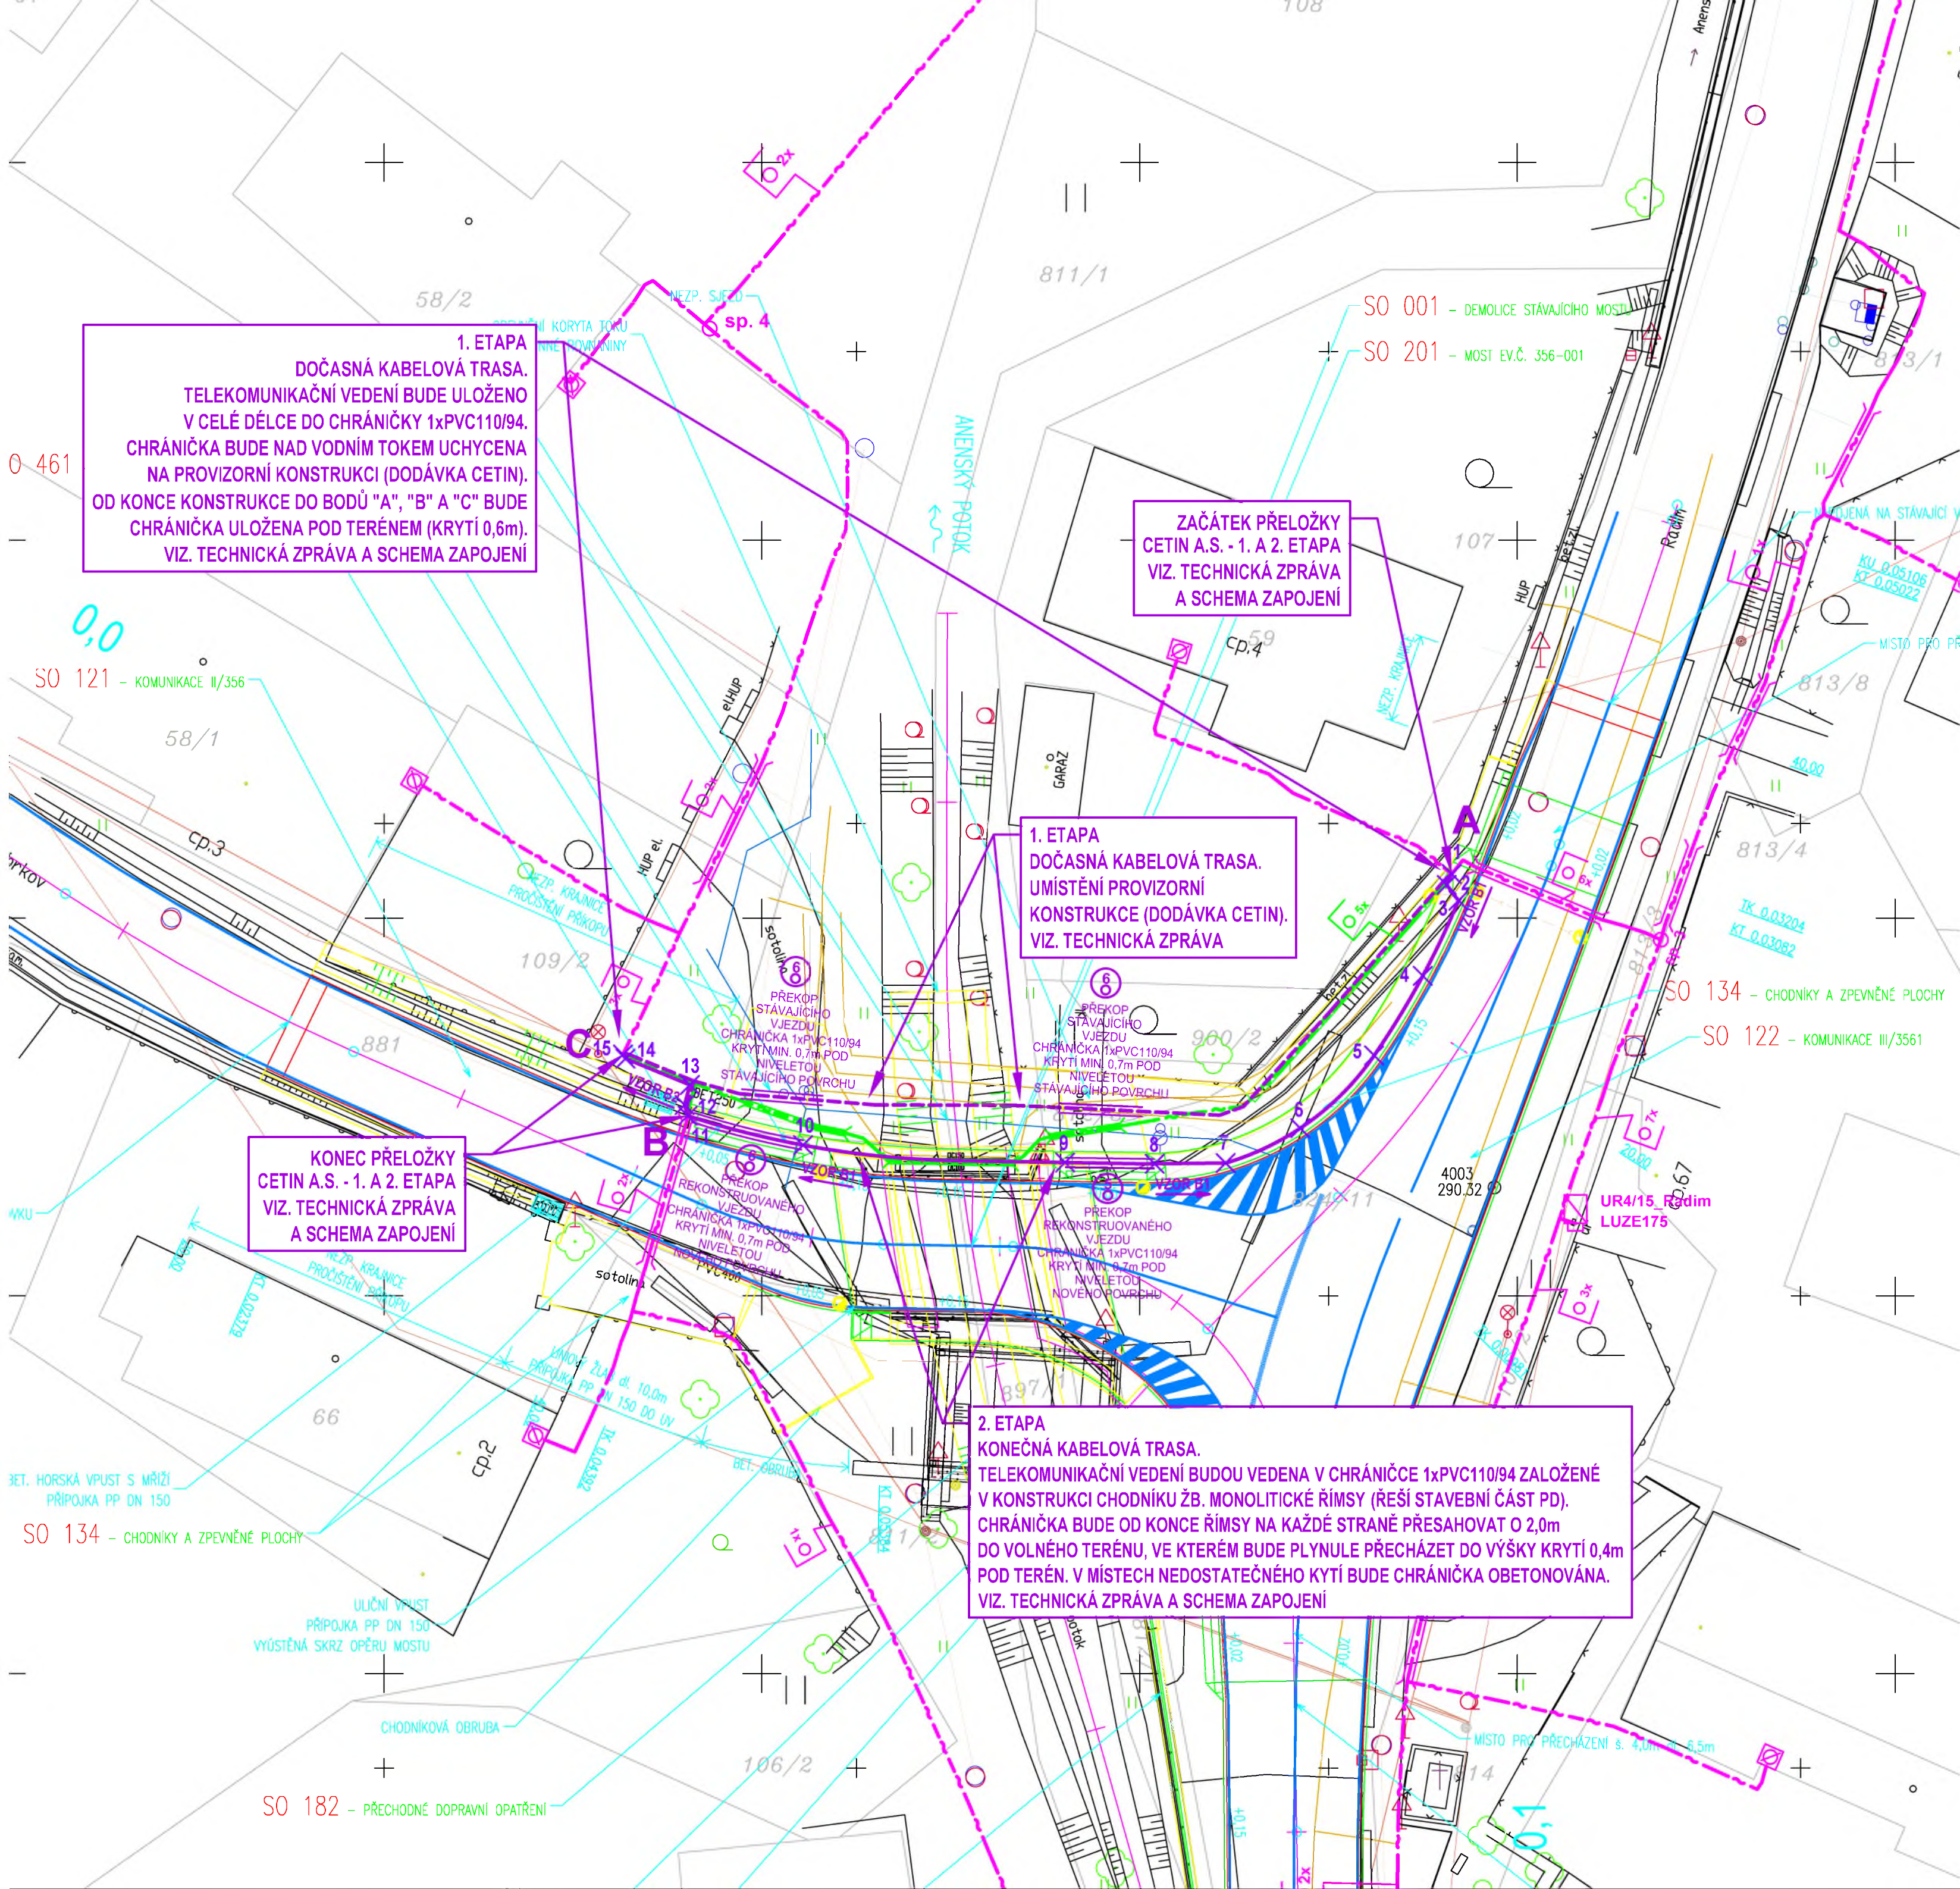

SEZNAM LOMOVÝCH BODŮ (VÝKOP)		
PŘESNÁ TRASA BUDE URČENA PO PROVEDENÍ KOORDINACI S OSTATNÍMI SÍTĚMI V RÁMCI STAVBY		
	X	Y
1	-631968470	-1078352670
2	-631968741	-1078353244
3	-631968113	-1078354077
4	-631970004	-1078358057
5	-631972581	-1078362276
6	-631976496	-1078366126
7	-631980443	-1078367970
8	-631984198	-1078368005
9	-631988937	-1078367940
10	-632002814	-1078367020
11	-632008923	-1078365466
12	-632009089	-1078364895
13	-632008807	-1078363830
14	-632012218	-1078362435
15	-632012350	-1078362220

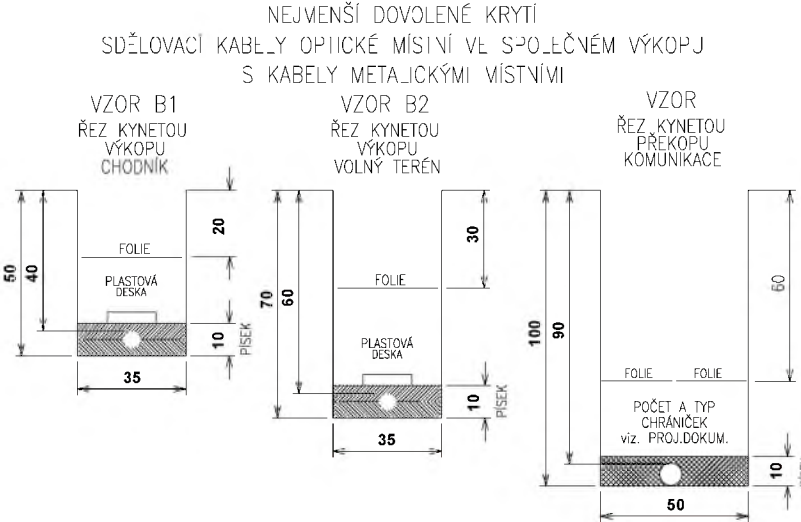

POZNÁMKA: ZHOTOVITEL STAVBY MOSTU JE POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ. PO DOBU STAVBY JE POVINEN V MÍSTECH VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘELOŽENÝCH SÍTÍ ZAJISTIT DOSTATEČNOU OCHRANU TĚCHTO SÍTÍ PŘED POŠKOZENÍM V PŘÍPADĚ DOČASNĚ SNÍŽENÉHO KRYTÍ.

POKLÁDKA NOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S POKLÁDKOU OSTATNÍCH NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A S VÝSTAVBOU NOVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:	LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE a.s. - ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE a.s. - PODZEMNÍ STL PLYNOVOD – GASNET SLUŽBY S.R.O. - PODZEMNÍ VODOVOD – VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM A.S. - PODZEMNÍ KANALIZACE – VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM A.S. - PODZEMNÍ A NADZEMNÍ VO A MR – MĚSTO LUŽE	- VODOVOD – VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM A.S. - STL PLYNOVOD – GASNET SLUŽBY S.R.O. - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETIN a.s.:	
NAVŘZENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 1.ETAPA DOČASNÁ TRASA	
NAVŘZENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 2.ETAPA KONEČNÁ TRASA	
STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ	
PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ZEMNÍ	

POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELU JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZARÍZENÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELU - SONDAMI A VYTÝČENÍM. NORMATIVNÍ ULOŽENÍ KABELU A TRUBEK HDPE V PŘEKOPECH A VÝKOEPECH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESE.

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK. KABELU JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT:		FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ		MDS PROJEKT	
ZPRACOVAL:		ING. JAN BURSA		Ing. Stanislav Marhold	
ZODP. PROJEKTANT:		BULENA PETR		CTI PROJEKT	
TECHNICKÁ KONTROLA:		ING. STANISLAV MARHOLD		V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz	
KRAJ: PARDUBICKÝ		OKRES: CHRUDIM		OBEC: RADIM	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE		AKCE:		STUPEŇ: PDPS	
				ZAK. Č.: 3228-24-3	
				ARCH. Č.: 3228	
				DATUM: 02/2025	
				FORMÁT: 6A4	
				MĚŘÍTKO: 1:250	
				ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍL. VÝKRESU:	
				D.7.2.	

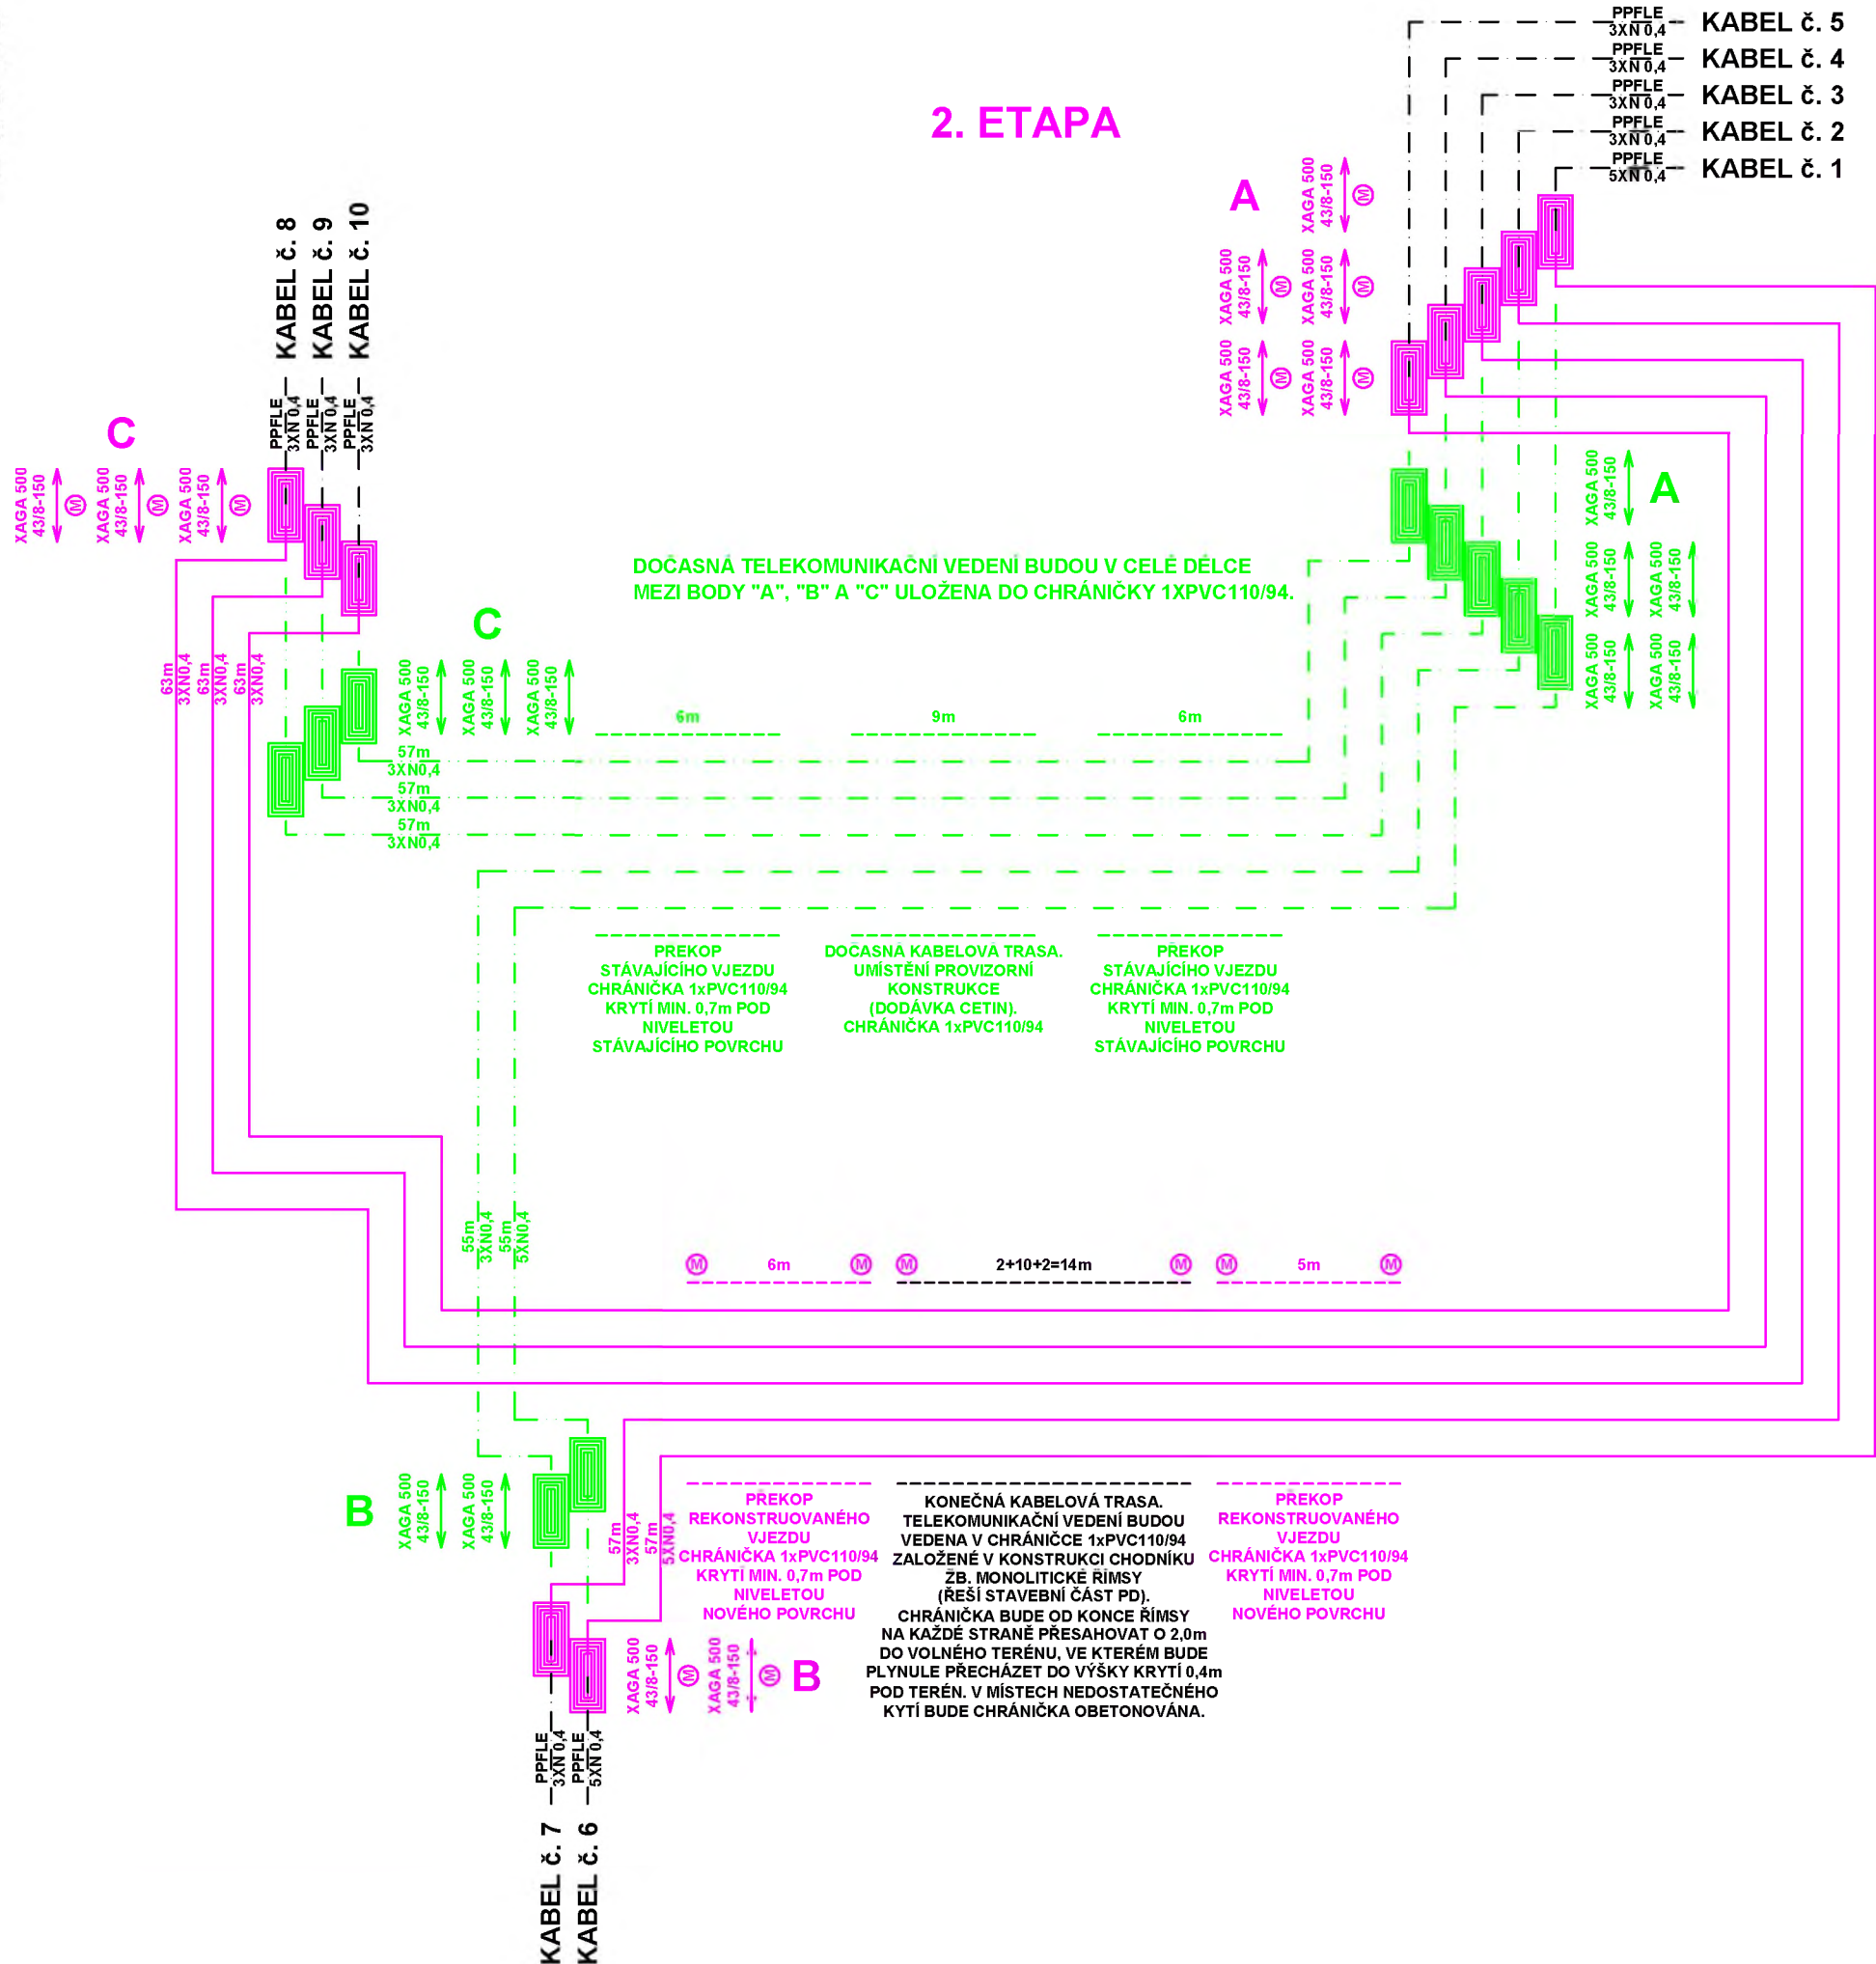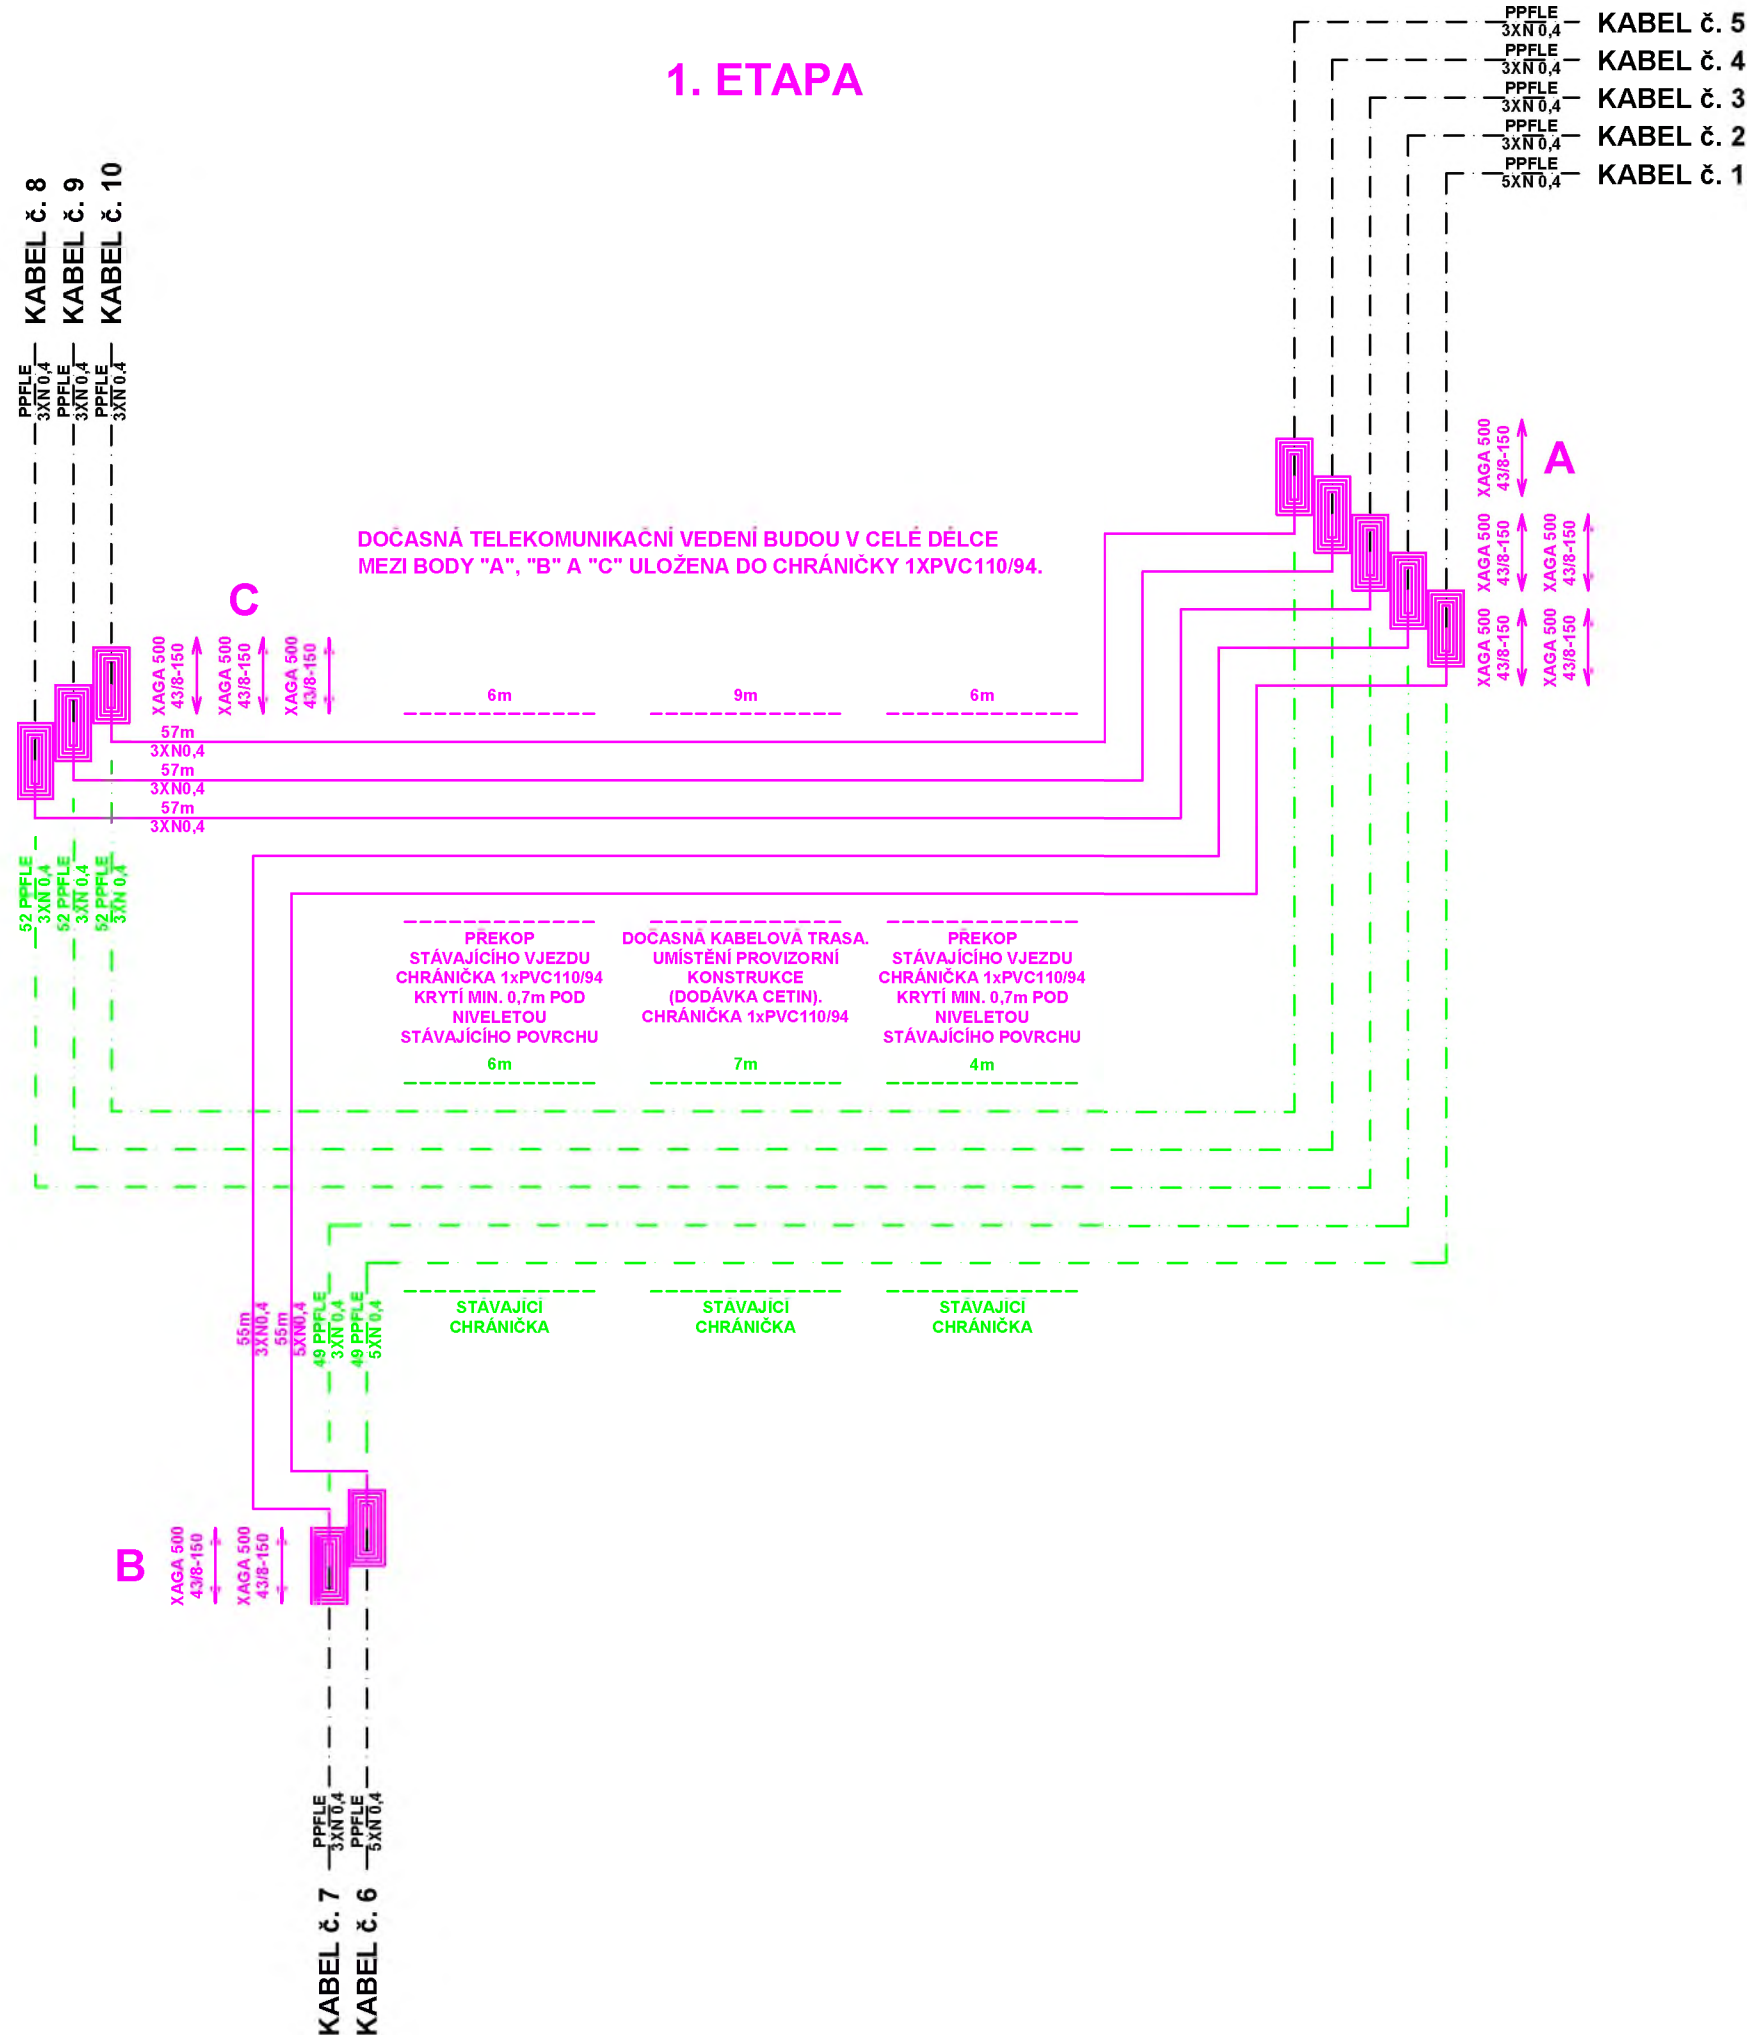

KABEL č. 1 SMĚR D_Nap_SR4_Radim LUZE18 1.1.1/321-330 SMĚR LUZE174 xLUZE1HR(Luze)/1.9.2/1-100 1xMIS - 1bN; 4xv.f.LSA 10x1;20xSID-C pf.modul; :::SR4 Radim Luže Radim	KABEL č. 2 AŽ 5 SMĚR UR4/15_Radim LUZE175 1.UK.5/1-6 SMĚR LUZE1618 1.UK.3/1-6 SMĚR LUZE1619 1.UK.7/1-6 SMĚR LUZE1628 1.UK.8/1-6 SMĚR LUZE1627 1.UK.9/1-6 SMĚR LUZE1621 1.UK.10/1-6 SMĚR LUZE1623 xLUZE18/1.1.1/331-350 1xSIS - 1h; 2xsv.f.LSA 10x1;60xkab.forma 1p.; :::UR4/15 Radim sloupek účastnický Luže Radim
--	--



KABEL č. 6 SMĚR UR4/14_Radim LUZE174 1.1.1/1-10 xLUZE18/1.1.1/321-330 1xMIS - 1bN; 1xsv.f.LSA 10x1;12xkab.forma 1p.; :::SR4 Radim Luže Radim	KABEL č. 7 SMĚR 2_Radim LUZE1618 1.1.1/1-6 xLUZE175/1.UK.5/1-6 1xKO 68; 6xkab.forma 1p.; :::2 ; Luže Radim	KABEL č. 8 SMĚR 3_Radim LUZE1619 1.1.1/1-6 xLUZE175/1.UK.3/1-6 1xKO 68; 6xkab.forma 1p.; :::3 ; Luže Radim	KABEL č. 9 SMĚR 85_Radim LUZE1628 1.1.1/1-6 xLUZE175/1.UK.7/1-6 1xKO 68; 6xkab.forma 1p.; :::85 ; Luže Radim	KABEL č. 10 SMĚR 5_Radim LUZE1621 1.1.1/1-6 xLUZE175/1.UK.9/1-6 1xKO 68; 6xkab.forma 1p.; :::5 ; Luže Radim
---	---	---	---	--

LEGENDA SÍTÍ CETIN:

- projektovaný telekomunikační kabel zemní
- projektovaná trubka HDPE zemní
- přeložený telekomunikační kabel zemní
- přeložená trubka HDPE zemní
- překládaný telekomunikační kabel zemní
- překládaná trubka HDPE zemní
- stávající telekomunikační kabely zemní
- stávající trubky HDPE zemní
- zrušený telekomunikační kabel zemní
- zrušená trubka HDPE zemní

POZNÁMKA:
Neoznačené kabely jsou typu TCEPKPFLE

SO 461
PDPS

HLAVNÍ PROJEKTANT:		FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ			
		ING. JAN BURSA			
ZPRACOVAL:		BULENA PETR			
ZODP. PROJEKTANT:		ING. STANISLAV MARHOLD			
TECHNICKÁ KONTROLA:		ING. STANISLAV MARHOLD			
KRAJ:	PARDUBICKÝ	OKRES:	CHRUĐIM		
		OBEČ: / RADIM			
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE				STUPEŇ:	PDPS
AKCE:				ZAK. Č.:	3228–24–3
MOST EV.Č. 356-001 RADIM				ARCH. Č.:	3228
				DATUM:	02/2025
				FORMÁT:	A4A
				MĚŘÍTKO:	---
				OBJEKT: D.7. SO 461 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN	
OBSAH:				ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍL. VÝKRESU:
SCHEMA ZAPOJENÍ - 1. A 2. ETAPA					D.7.4.

PPD - Propočet projektové dokumentace

Položková databáze:

2025.04

Název stavby: MOST EV.Č. 356-001 RADIM - 1.ETAPA

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	49 171,86 Kč
MONTÁŽ	53 691,16 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	12 111,81 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	14 471,57 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 129 446 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	117 334,59 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	12 111,81 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		50.00 m	1 229,00 Kč
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	6 191,95 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		41.00 m	18 805,47 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		18.00 m	2 369,34 Kč
954955 S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90		12.00 m	19 510,20 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		50.00 m	737,50 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		2.00 ks	328,40 Kč
MONTÁŽ				
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		8.00 ks	1 666,56 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		18.00 ks	865,08 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		4.00 ks	128,32 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		1.00 ks	112,21 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním		34.00 ks	1 362,38 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové		15375.00 J1	15 375,00 Kč

Materiál a montáž spojené s dočasnou konstrukcí nad vodním tokem - 9m

955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	4920.00 JV	4 920,00 Kč
	Práce spojené se zatažením telek. vedení do chráničky PVC dočasné trasy - 50m		
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	4920.00 JV	4 920,00 Kč
	Finance na případné vícenáklady		
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	10.00 ks	15 200,30 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné	1439.10 JV	1 439,10 Kč
	Materiál a práce spojené s uchycením chráničky PVC na provizorní konstrukci - 9m		
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	281.00 m	7 702,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	12 111,81 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		35.00 m	144,20 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		12.00 m	56,52 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		100.00 m	223,00 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		226.00 m	4 506,44 Kč
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4		55.00 m	1 377,20 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		10.00 ks	264,90 Kč
410636 S	Souprava čistící metalic. kabelů - velká		1.00 ks	491,11 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		10.00 ks	4 693,70 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		50.00 m	2 714,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		2.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml		1.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: MOST EV.Č. 356-001 RADIM - 2.ETAPA

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	79 712,19 Kč
MONTÁŽ	71 197,24 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 173,56 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 811,25 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	42 462,74 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	17 016,42 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 460,00 Kč

Celkové náklady:	226 833 Kč
-------------------------	-------------------

STAVEBNÍ ČINNOST	178 282,40 Kč
------------------	---------------

NESTAVEBNÍ ČINNOST	48 551,00 Kč
--------------------	--------------

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
951624 S	Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba		10.00 m	656,30 Kč
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		11.00 m	270,38 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		8954.40 JV	8 954,40 Kč
Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček PVC110 (vč.dopravy) - 4m				
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		40.00 m	28 611,20 Kč
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		22.00 m	4 501,86 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		35.00 m	16 053,45 Kč
954955 S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90		12.00 m	19 510,20 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		56.00 m	826,00 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		2.00 ks	328,40 Kč
MONTÁŽ				
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN		281.00 m	6 735,57 Kč
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		70.00 m	4 146,80 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		8.00 ks	1 666,56 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		18.00 ks	865,08 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		4.00 ks	128,32 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		1.00 ks	112,21 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním		34.00 ks	1 362,38 Kč

955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	7687.50 JV	7 687,50 Kč
	Práce spojené s demontáží dočasné konstrukce nad vodním tokem - 9m		
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2460.00 JV	2 460,00 Kč
	Práce spojené se vytažením telek. vedení z chráničky PVC dočasné trasy - 50m		
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	4920.00 JV	4 920,00 Kč
	Finance na případné vícenáklady		
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	10.00 ks	15 200,30 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné	719.55 JV	719,55 Kč
	Práce spojené s demontáží chráničky PVC z provizorní konstrukce - 9m		
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	233.00 m	6 386,53 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	4814.22 JV	4 814,22 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks	3 428,92 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	10.00 ks	10 563,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	7 173,56 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 811,25 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 545,30 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	19557.00 J	19 557,00 Kč
	Náhrada vlastníků za VBŘ		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	8 004,48 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	11 355,96 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	2460.00 JV	2 460,00 Kč
	Správní poplatek		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm		35.00 ks	741,30 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		57.00 m	234,84 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		246.00 m	4 905,24 Kč
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4		57.00 m	1 427,28 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		14.00 ks	3 660,86 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		10.00 ks	264,90 Kč
410636 S	Souprava čistící metalic. kabelů - velká		1.00 ks	491,11 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		10.00 ks	4 693,70 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		11.00 m	597,19 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný				
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		2.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml		1.00 ks	0,00 Kč
