

# SMLOUVA O DÍLO

## A

### OBCHODNÍ PODMÍNKY

#### JÚ 3383104

Číslo zhotovitele: 25046

**„III/4537 opěrné zdi (6 úseků)“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**  
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**  
zastoupena:

**Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK (tel.: [REDACTED])**

**[REDACTED], vedoucí SÚ Šumperk**

**[REDACTED] vedoucí TSÚ SÚ Šumperk**

**[REDACTED], investiční technik SÚ Šumperk**

**IČO : 70960399**

**DIČ: CZ70960399**

bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

tel: **[REDACTED]**

**DS: ur4k8nn**

e-mail: **[REDACTED]**

a

**Z h o t o v i t e l:** **SART – stavby a rekonstrukce a.s.**  
se sídlem: **Uničovská 2944/1B, 78701 Šumperk**  
kontaktní adresa: **Uničovská 2944/1B, 78701 Šumperk**  
zápis v **OR u OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2550**  
zastoupen: **Ing. Gustavem Hodkem - členem představenstva**  
**IČO: 25898671 DIČ: CZ25898671**

telefon: **[REDACTED]**

e-mail: **[REDACTED]**

bankovní spojení: **KB Šumperk**

číslo účtu: **5881970287/0100**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**SART – stavby a rekonstrukce a.s.**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Gustav Hodek – člen představenstva**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Ing. Gustav Hodek – člen představenstva**

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

**Ing. Gustav Hodek - aut. inž. v oboru mosty a inž. konstr., č. 41293**

**[REDACTED] – aut. tech. v oboru mosty a inž. konstr., č. 34645**

## **1. Předmět smlouvy**

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

### **„III/4537 opěrné zdi (6 úseků)“**

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

## **2. Podklady**

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Petr Slezák, PROJEKCE s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk pod názvem: „Havarijní zajištění opěrných zdí po povodni na silnici III/4537“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 29.5.2025, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

- 2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

### 3. Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platnou po celou dobu provádění díla a činí:

**Cena celkem bez DPH                      4.226.200,00 Kč**

**DPH 21%                                      887.502,00 Kč**

---

**Celková cena díla vč. DPH            5.113.702,00 Kč**

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle cenové soustavy použité v nabídce zhotovitele, a to v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla,
  - b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

### 4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **60 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště **nejpozději do 30 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště** je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.
- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční technik ( [REDACTED] email: [REDACTED] ) a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele [REDACTED].
  - Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
- 4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dnů od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli **při předání díla** vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 90 kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení geometrických plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

## 5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí díla popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

## 6. Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřeně obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamáce písemně nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamáce u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamáce.
- 6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

## 7. Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
  - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
  - předmět díla,
  - číslo faktury,
  - fakturovanou částku,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
  - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 Každá dílčí faktura musí být označena číslem jmenovitého úkolu (JÚ), které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.
- 7.5 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.6 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.7 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
- 7.8 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

## **8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce**

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
- 8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a náhrada nákladů za provedení zkoušek.
- 8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p. o.
- 8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na výkon technického dozoru stavebníka.

## **9. Stavební deník**

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, zejména:
- a) specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
  - b) specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
  - c) dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,
- a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.
- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní listy materiálů, zejména v případě použití asfaltových směsí, šterkodrtí a materiálů ukládaných na skládky apod.
- 9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 166 odst. 3 stavebního zákona.
- 9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

## **10. Ostatní ujednání**

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prostě všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.3 Nejpozději do 10 dnů po dni předání staveniště předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení kompletní projektovou dokumentaci ve stupni RDS pro nové části zdi (viz položkový soupis prací).
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - odpovídajících pracovních podmínek,
  - opatření k požární ochraně,
- stanovených příslušnými právními předpisy.

- 10.5 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
- 10.8 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za **částečné, případně úplné uzavírky**. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržívat dopravní značky v řádném technickém stavu;
  - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
  - zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
  - zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
  - živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
  - veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou **před zahájením stavby**
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. **Ke zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele.**
- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují.
- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo objednatelem. bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, a to až do dokončení a předání díla objednateli.
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
  - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
  - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz. TKP),
  - doklad o nakládání s odpady,
  - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
  - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
  - objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

## **11. Závěrečná ujednání**

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů uveřejněno v registru smluv.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění poskytnutá dle této smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31.12.2036:
- a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
  - b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
  - c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,

- d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
- 11.5 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, příp. z dotace „Živel 1“, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.6 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, příp. z dotace „Živel 1“, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.7 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.8 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.9 Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 11.10 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.11 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Elektronický podpis: 12.6.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Ivo Černý  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.  
Ing. Ivo Černý  
ředitel organizace

V Šumperku dne 10.6.2025

Za zhotovitele:

Ing. Gustav Hodek Digitálně podepsal  
Ing. Gustav Hodek  
Datum: 2025.06.10  
12:50:08 +02'00'

SART – stavby a rekonstrukce a.s.  
Ing. Gustav Hodek  
člen představenstva

## Stavba: 2025/8PDII - III/4537 opěrné zdi (6 úseků)

Celková cena: 4 226 200,00 Kč

| Značka  | Název                                          | Cena [Kč]    |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
| 01      | SO - silnice III/4537, Bernartice (u č.p. 302) | 48 358,00    |
| 02      | SO - silnice III/4537, Bernartice (u č.p. 291) | 128 020,00   |
| 03      | SO - silnice III/4537, Bernartice (u č.p. 296) | 909 896,79   |
| 04      | SO - silnice III/4537, Buková (u č.p. 91)      | 1 648 032,71 |
| 05      | SO - silnice III/4537, Buková (u č.p. 92)      | 787 617,99   |
| 06      | SO - silnice III/4537, Buková (u č.p. 106)     | 704 274,51   |
| Celkem: |                                                | 4 226 200,00 |

## Stavba: 2025/8PDII - III/4537 opěrné zdi (6 úseků)

Celková cena: 4 226 200,00 Kč

| Značka                                                             | Název                                                           | JC        | Množství | MJ  | Cena [Kč]        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|------------------|
| <b>Objekt: 01 - SO - silnice III/4537, Bernartice (u č.p. 302)</b> |                                                                 |           |          |     | <b>48 358,00</b> |
| 02920A0                                                            | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                 | 12 000,00 | 1,000    | KPL | 12 000,00        |
| 02940A0                                                            | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                     | 6 500,00  | 1,000    | KPL | 6 500,00         |
| 02944A0                                                            | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ    | 8 000,00  | 1,000    | KPL | 8 000,00         |
| 03350A0                                                            | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY        | 15 000,00 | 1,000    | KPL | 15 000,00        |
| 11512A0                                                            | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN                                      | 164,00    | 10,000   | HOD | 1 640,00         |
| 17780A0                                                            | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                           | 410,00    | 3,000    | M3  | 1 230,00         |
| 261312A0                                                           | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM         | 960,00    | 0,400    | M   | 384,00           |
| 285392A0                                                           | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | 365,00    | 2,000    | KUS | 730,00           |
| 327213A0                                                           | OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE                     | 10 200,00 | 0,120    | M3  | 1 224,00         |
| 627470A0                                                           | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU                           | 1 650,00  | 1,000    | M2  | 1 650,00         |
| <b>Celkem:</b>                                                     |                                                                 |           |          |     | <b>48 358,00</b> |

| Značka                                                             | Název                                                        | JC        | Množství | MJ  | Cena [Kč]         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|-------------------|
| <b>Objekt: 02 - SO - silnice III/4537, Bernartice (u č.p. 291)</b> |                                                              |           |          |     | <b>128 020,00</b> |
| 029200A0                                                           | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ              | 12 000,00 | 1,000    | KPL | 12 000,00         |
| 029400A0                                                           | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                  | 6 500,00  | 1,000    | KPL | 6 500,00          |
| 029440A0                                                           | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | 16 000,00 | 1,000    | KPL | 16 000,00         |
| 033500A0                                                           | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY     | 40 000,00 | 1,000    | KPL | 40 000,00         |
| 115120A0                                                           | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN                                   | 164,00    | 30,000   | HOD | 4 920,00          |
| 177800A0                                                           | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                        | 410,00    | 6,000    | M3  | 2 460,00          |
| 3272120A0                                                          | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC        | 9 500,00  | 3,000    | M3  | 28 500,00         |
| 462510A0                                                           | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                      | 980,00    | 18,000   | M3  | 17 640,00         |
| <b>Celkem:</b>                                                     |                                                              |           |          |     | <b>128 020,00</b> |

| Značka                                                             | Název                                                                                | JC        | Množství | MJ   | Cena [Kč]         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-------------------|
| <b>Objekt: 03 - SO - silnice III/4537, Bernartice (u č.p. 296)</b> |                                                                                      |           |          |      | <b>909 896,79</b> |
| 014101OA0                                                          | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                  | 330,00    | 4,440    | M3   | 1 465,20          |
| 029200A0                                                           | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                      | 12 000,00 | 1,000    | KPL  | 12 000,00         |
| 029400A0                                                           | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                          | 6 500,00  | 1,000    | KPL  | 6 500,00          |
| 029440A0                                                           | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                         | 16 000,00 | 1,000    | KPL  | 16 000,00         |
| 033500A0                                                           | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY                             | 40 000,00 | 1,000    | KPL  | 40 000,00         |
| 035700A0                                                           | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - ČERPADLA                                                   | 8 000,00  | 3,000    | KPL  | 24 000,00         |
| 111206OA0                                                          | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM                                                  | 54,00     | 10,000   | M2   | 540,00            |
| 111300A0                                                           | SEJMUTÍ DRNU                                                                         | 32,00     | 44,400   | M2   | 1 420,80          |
| 115120A0                                                           | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN                                                           | 164,00    | 30,000   | HOD  | 4 920,00          |
| 123835OA0                                                          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 8KM                         | 716,00    | 4,440    | M3   | 3 179,04          |
| 129600A0                                                           | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ                                         | 2 230,00  | 16,800   | M3   | 37 464,00         |
| 13283AOA0                                                          | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY                              | 1 190,00  | 5,600    | M3   | 6 664,00          |
| 177800A0                                                           | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                | 410,00    | 45,000   | M3   | 18 450,00         |
| 261312OA0                                                          | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 16MM                              | 960,00    | 22,400   | M    | 21 504,00         |
| 261615OA0                                                          | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. VI D DO 50MM, vč. dodávky zavrtávací tyče | 2 850,00  | 112,000  | M    | 319 200,00        |
| 272324OA0                                                          | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                                    | 5 100,00  | 10,470   | M3   | 53 397,00         |
| 272366OA0                                                          | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                           | 34 800,00 | 0,394    | T    | 13 719,55         |
| 281611OA0                                                          | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU                                | 19 500,00 | 7,913    | M3   | 154 299,60        |
| 285392OA0                                                          | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ                      | 365,00    | 112,000  | KUS  | 40 880,00         |
| 561100A0                                                           | PODKLADNÍ BETON                                                                      | 3 540,00  | 2,240    | M3   | 7 929,60          |
| 569330A0                                                           | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                          | 310,00    | 44,400   | M2   | 13 764,00         |
| 627470A0                                                           | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU                                                | 1 650,00  | 23,200   | M2   | 38 280,00         |
| 938441OA0                                                          | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ                                 | 280,00    | 232,000  | M2   | 64 960,00         |
| 941900A0                                                           | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA                                                     | 65,00     | 144,000  | M3OP | 9 360,00          |
| <b>Celkem:</b>                                                     |                                                                                      |           |          |      | <b>909 896,79</b> |

| Značka                                                        | Název                                                                                | JC        | Množství | MJ  | Cena [Kč]           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|---------------------|
| <b>Objekt: 04 - SO - silnice III/4537, Buková (u č.p. 91)</b> |                                                                                      |           |          |     | <b>1 648 032,71</b> |
| 014101OA0                                                     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                  | 330,00    | 56,000   | M3  | 18 480,00           |
| 014101OA0.02                                                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                  | 890,00    | 3,600    | M3  | 3 204,00            |
| 015340OA0                                                     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY                     | 2 200,00  | 0,200    | T   | 440,00              |
| 027300OA0                                                     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                               | 9 000,00  | 1,000    | KPL | 9 000,00            |
| 029200OA0                                                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                      | 12 000,00 | 1,000    | KPL | 12 000,00           |
| 029400OA0                                                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                          | 6 500,00  | 1,000    | KPL | 6 500,00            |
| 029430OA0                                                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                  | 17 982,65 | 1,000    | KPL | 17 982,65           |
| 029440OA0                                                     | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                         | 16 000,00 | 1,000    | KPL | 16 000,00           |
| 033500OA0                                                     | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY                             | 40 000,00 | 1,000    | KPL | 40 000,00           |
| 035700OA0                                                     | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - ČERPADLA                                                   | 8 000,00  | 3,000    | KPL | 24 000,00           |
| 111300OA0                                                     | SEJMUTÍ DRNU                                                                         | 32,00     | 16,000   | M2  | 512,00              |
| 112216OA0                                                     | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM                                           | 1 850,00  | 2,000    | KUS | 3 700,00            |
| 113136OA0                                                     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM                    | 980,00    | 3,600    | M3  | 3 528,00            |
| 113291OA0                                                     | ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 1KM        | 1 230,00  | 13,000   | M3  | 15 990,00           |
| 115120OA0                                                     | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN                                                           | 164,00    | 80,000   | HOD | 13 120,00           |
| 123836OA0                                                     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM                        | 840,00    | 56,000   | M3  | 47 040,00           |
| 129600OA0                                                     | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ                                         | 2 230,00  | 7,800    | M3  | 17 394,00           |
| 13283AOA0                                                     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY                              | 1 190,00  | 10,880   | M3  | 12 947,20           |
| 174810OA0                                                     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                             | 960,00    | 37,000   | M3  | 35 520,00           |
| 177800OA0                                                     | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                | 410,00    | 19,500   | M3  | 7 995,00            |
| 261312OA0                                                     | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM                              | 960,00    | 3,200    | M   | 3 072,00            |
| 261615OA0                                                     | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM, vč. dodávky zavrtávací tyče | 2 850,00  | 16,000   | M   | 45 600,00           |
| 272324OA0                                                     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                                    | 5 100,00  | 16,320   | M3  | 83 232,00           |
| 272365OA0                                                     | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                                                  | 43 000,00 | 1,152    | T   | 49 536,00           |
| 272366OA0                                                     | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                           | 34 800,00 | 0,056    | T   | 1 959,94            |
| 281611OA0                                                     | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU                                | 19 500,00 | 1,130    | M3  | 22 042,80           |
| 285392OA0                                                     | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ                      | 365,00    | 16,000   | KUS | 5 840,00            |
| 289410OA0                                                     | TORKRETOVÝ PLÁŠŤ Z AKTIVOVANÉ MALTY                                                  | 37 240,00 | 3,576    | M3  | 133 170,24          |
| 317325OA0                                                     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                                | 14 022,00 | 3,240    | M3  | 45 431,28           |
| 317365OA0                                                     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B                                                     | 43 000,00 | 0,389    | T   | 16 718,40           |
| 327213OA0                                                     | OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE                                          | 10 200,00 | 10,800   | M3  | 110 160,00          |
| 327325OA0                                                     | ZDÍ OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)                   | 7 820,00  | 36,000   | M3  | 281 520,00          |
| 327365OA0                                                     | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505                             | 43 000,00 | 6,120    | T   | 263 160,00          |
| 462510OA0                                                     | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE, vč. prolití betonem C16/20                                  | 1 230,00  | 85,000   | M3  | 104 550,00          |
| 561100OA0                                                     | PODKLADNÍ BETON                                                                      | 3 540,00  | 2,100    | M3  | 7 434,00            |
| 563340OA0                                                     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                                          | 200,00    | 24,000   | M2  | 4 800,00            |
| 574A43OA0                                                     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM                                   | 520,00    | 24,000   | M2  | 12 480,00           |
| 574C66OA0                                                     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM                               | 650,00    | 24,000   | M2  | 15 600,00           |
| 627470OA0                                                     | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠŤ MALTOU                                                | 1 650,00  | 22,400   | M2  | 36 960,00           |
| 711111OA0                                                     | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY                   | 126,00    | 43,200   | M2  | 5 443,20            |
| 9113B2OA0                                                     | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)     | 212,00    | 16,000   | M   | 3 392,00            |
| 9113B3OA0                                                     | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                 | 180,00    | 36,000   | M   | 6 480,00            |
| 9117C1OA0                                                     | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                | 7 850,00  | 9,000    | M   | 70 650,00           |
| 917710OA0                                                     | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                                   | 504,00    | 9,000    | M   | 4 536,00            |
| 919112OA0                                                     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                         | 165,00    | 16,000   | M   | 2 640,00            |
| 938441OA0                                                     | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ                                 | 280,00    | 22,400   | M2  | 6 272,00            |
| <b>Celkem:</b>                                                |                                                                                      |           |          |     | <b>1 648 032,71</b> |

| Značka                                                        | Název                                                                                                         | JC        | Množství | MJ   | Cena [Kč]         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-------------------|
| <b>Objekt: 05 - SO - silnice III/4537, Buková (u č.p. 92)</b> |                                                                                                               |           |          |      | <b>787 617,99</b> |
| 014101OA0                                                     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                           | 710,00    | 5,250    | M3   | 3 727,50          |
| 029200A0                                                      | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                                               | 12 000,00 | 1,000    | KPL  | 12 000,00         |
| 029400A0                                                      | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                   | 6 500,00  | 1,000    | KPL  | 6 500,00          |
| 029440A0                                                      | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                                  | 16 000,00 | 1,000    | KPL  | 16 000,00         |
| 033500A0                                                      | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY                                                      | 40 000,00 | 1,000    | KPL  | 40 000,00         |
| 035700A0                                                      | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - ČERPADLA                                                                            | 8 000,00  | 3,000    | KPL  | 24 000,00         |
| 115120A0                                                      | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN                                                                                    | 164,00    | 40,000   | HOD  | 6 560,00          |
| 129600A0                                                      | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ                                                                  | 2 230,00  | 10,500   | M3   | 23 415,00         |
| 177800A0                                                      | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                         | 410,00    | 30,000   | M3   | 12 300,00         |
| 261312OA0                                                     | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM                                                       | 960,00    | 14,000   | M    | 13 440,00         |
| 261615OA0                                                     | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM, vč. dodávky zavrtávací tyče                          | 2 850,00  | 70,000   | M    | 199 500,00        |
| 272324OA0                                                     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                                                             | 5 100,00  | 20,950   | M3   | 106 845,00        |
| 272366OA0                                                     | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                                                    | 34 800,00 | 0,339    | T    | 11 790,24         |
| 281611OA0                                                     | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU                                                         | 19 500,00 | 4,946    | M3   | 96 437,25         |
| 285392OA0                                                     | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ                                               | 365,00    | 70,000   | KUS  | 25 550,00         |
| 462510A0                                                      | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE, vč. prolití betonem C16/20                                                           | 1 230,00  | 9,600    | M3   | 11 808,00         |
| 561100A0                                                      | PODKLADNÍ BETON                                                                                               | 3 540,00  | 2,100    | M3   | 7 434,00          |
| 569330A0                                                      | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                   | 310,00    | 4,800    | M2   | 1 488,00          |
| 626112OA0                                                     | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM                                         | 1 049,00  | 45,500   | M2   | 47 729,50         |
| 627470A0                                                      | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU                                                                         | 1 650,00  | 7,600    | M2   | 12 540,00         |
| 919135OA0                                                     | ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 250MM                                                                      | 1 050,00  | 39,500   | M    | 41 475,00         |
| 931333OA0                                                     | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2                                              | 119,00    | 10,000   | M    | 1 190,00          |
| 938441OA0                                                     | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ                                                          | 280,00    | 76,000   | M2   | 21 280,00         |
| 941900A0                                                      | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA                                                                              | 65,00     | 68,400   | M3OP | 4 446,00          |
| 966156OA0                                                     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM                                                           | 4 410,00  | 5,250    | M3   | 23 152,50         |
| R9113B1OA0                                                    | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DEMONTÁŽ A MONTÁŽ, pouze výměna spojovacího materiálu a hrnců | 486,00    | 35,000   | M    | 17 010,00         |
| <b>Celkem:</b>                                                |                                                                                                               |           |          |      | <b>787 617,99</b> |


| Značka                                                         | Název                                                                                | JC        | Množství | MJ   | Cena [Kč]         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-------------------|
| <b>Objekt: 06 - SO - silnice III/4537, Buková (u č.p. 106)</b> |                                                                                      |           |          |      | <b>704 274,51</b> |
| 029200A0                                                       | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                      | 12 000,00 | 1,000    | KPL  | 12 000,00         |
| 029400A0                                                       | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                          | 6 500,00  | 1,000    | KPL  | 6 500,00          |
| 029440A0                                                       | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                         | 16 000,00 | 1,000    | KPL  | 16 000,00         |
| 033500A0                                                       | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY                             | 40 000,00 | 1,000    | KPL  | 40 000,00         |
| 035700A0                                                       | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - ČERPADLA                                                   | 8 000,00  | 2,000    | KPL  | 16 000,00         |
| 115120A0                                                       | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN                                                           | 164,00    | 20,000   | HOD  | 3 280,00          |
| 122930A0                                                       | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - BEZ DOPRAVY                                  | 590,00    | 9,000    | M3   | 5 310,00          |
| 129600A0                                                       | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ                                         | 2 230,00  | 10,000   | M3   | 22 300,00         |
| 132830A0                                                       | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY                              | 1 190,00  | 3,840    | M3   | 4 569,60          |
| 177800A0                                                       | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                | 410,00    | 21,000   | M3   | 8 610,00          |
| 2613120A0                                                      | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM                              | 960,00    | 9,600    | M    | 9 216,00          |
| 2616150A0                                                      | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM, vč. dodávky zavrtávací tyče | 2 850,00  | 48,000   | M    | 136 800,00        |
| 2616150A0                                                      | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM                              | 2 560,00  | 33,480   | M    | 85 708,80         |
| 2723240A0                                                      | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                                    | 5 100,00  | 2,880    | M3   | 14 688,00         |
| 2723660A0                                                      | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                                           | 34 800,00 | 0,169    | T    | 5 879,81          |
| 2816110A0                                                      | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU                                | 19 500,00 | 4,185    | M3   | 81 607,50         |
| 2816110A0                                                      | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU                                | 19 500,00 | 3,391    | M3   | 66 128,40         |
| 2853920A0                                                      | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ                      | 365,00    | 48,000   | KUS  | 17 520,00         |
| 3272120A0                                                      | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                | 9 500,00  | 9,000    | M3   | 85 500,00         |
| 561100A0                                                       | PODKLADNÍ BETON                                                                      | 3 540,00  | 0,960    | M3   | 3 398,40          |
| 627470A0                                                       | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU                                                | 1 650,00  | 23,400   | M2   | 38 610,00         |
| 9384410A0                                                      | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ                                 | 280,00    | 78,000   | M2   | 21 840,00         |
| 941900A0                                                       | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA                                                     | 65,00     | 43,200   | M3OP | 2 808,00          |
| <b>Celkem:</b>                                                 |                                                                                      |           |          |      | <b>704 274,51</b> |

Harmonogram postupu prací

Akce: "III/4537 opěrné zdi (6 úseků)"

Druh stavebních prací

- Úsek č.1 dl. 5 m, Bernartice č.p. 302
- Úsek č.2 dl. 100 m, Bernartice č.p. 291
- Úsek č.3 dl. 80 m, Bernartice č.p. 296
- Úsek č.4 dl. 106 m, Buková č.p. 91
- Úsek č.5 dl. 38 m, Buková č.p. 92
- Úsek č.6 dl. 24 m, Buková č.p. 106

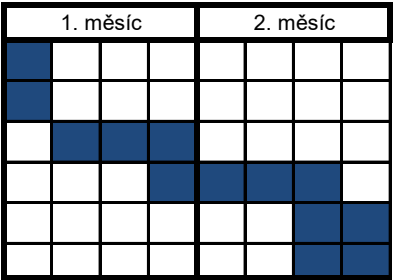

4 226 200,00 Kč 1 600 000,00 Kč 2 626 200,00 Kč  
bez DPH

Termín realizace: červenec - říjen 2025  
Doba realizace: 60 kalendářních dnů

V Šumperku dne 29.5.2025

Za SART - stavby a rekonstrukce a.s.  
Ing. Gustav Hodek - člen představenstva
