

## SMLOUVA O DÍLO

### VN Farský rybník – aktualizace PD; č. S954/2025/147/Eli

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Vltavy, na  
základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted] ST,

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a**

#### Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka 1930

zastoupená: [redacted] divize 06 na základě plné moci ze dne

5.1.2021

kontaktní osoba: [redacted] České Budějovice,

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**I.**  
**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:

Aktualizace původní dokumentace pro povolení a provedení stavby, změna SO 1.2.  
- uložení sedimentu  
(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“),

a to vše pro stavbu: „VN Farský rybník“

na vodním toku: bezejmenný tok, číslo hydrologického pořadí: 1-06-02-040,  
IDVT: 10273224, katastrální území: Dlouhá Stropnice,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „dilo“).

2. Projektová činnost bude provedena dle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a rovněž dle ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon).
3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením § 158 stavebního zákona a dále vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, vše ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby [dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů].
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy).
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právníckými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro provádění stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu:
  - 6 ks vyhotovení,
  - a 2 x v elektronické podobě** (1 x needitovatelné – formát .pdf opatřené elektronickým autorizačním razítkem, 1 x editovatelné - formát .docx, .xlsx, .dwg adgn).

## II.

### Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: **28. 7. 2025.**
2. Zhotovitel je povinen odevzdat vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě **k odsouhlasení a posouzení shody** s požadavky objednatele nejpozději do **10 dnů před termínem konání dokumentační komise**. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. **Jednání dokumentační komise** proběhne v termínu minimálně **8 dnů před termínem odevzdání projektové dokumentace**.
3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.
4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **30. 4. 2026**. Zhotovitel se dále zavazuje odevzdat objednateli níže uvedená dílčí plnění:
  1. etapa prací – geodetické doměření lokality + aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby  
**Dokončení 1. etapy prací do 31. 12. 2025.**
  2. etapa prací – Inženýring  
**Dokončení 2. etapy prací do 30. 4. 2026.**

Tyto lhůty se prodlužují o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její část/dílčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dílčí plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dílčí plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezpracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje provést/zpracovat změny/úpravy v projektové dokumentaci vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy objednatelem. Cena těchto změn/úprav je zahrnuta v ceně za dílo.

### **III.**

#### **Cena za dílo a platební podmínky**

1. Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1 smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **95 000,-- Kč (slovy: devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH.**
  - 1.1. Z celkové ceny projektové dokumentace činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy:

1. etapa prací	<b>65 000,-- Kč bez DPH</b>
2. etapa prací	<b>30 000,-- Kč bez DPH</b>
  - 1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace (dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem.
  - 1.3. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
  - 1.4. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).
2. Zálohy nebudou poskytovány.

3. Cena za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace (jednotlivých dílčích plnění) a jejím převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli ve 3 vyhotoveních elektronicky na email: [REDAKCE] nebo v listinné podobě na adresu: LČR s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy potvrzení (protokol) o kontrole ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsaný oběma smluvními stranami, z něž bude vyplývat, že je projektová dokumentace (dílčí plnění) bez vad.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
  - c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) protokol dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami stvrzující, že je projektová dokumentace (vyúčtované dílčí plnění) bez vad či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem.

#### **IV.**

##### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství [REDAKCE], č. ČKAIT [REDAKCE], tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou předány samostatně, mimo projektovou dokumentaci.
3. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude

uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

- 3.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
- 3.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze/dokumentu provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.
4. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (smlouvy). Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ.
5. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou projektovou dokumentaci v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace objednateli.
6. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.
7. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby realizované na základě projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.
8. Projektová dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

9. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
11. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.
12. Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout objednateli součinnost při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace).
13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užití (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu s účelem, pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

## V.

### **Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost**

1. Místem odevzdání projektové dokumentace (každého z dílčích plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 5 smlouvy.
3. O předání a převzetí projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová dokumentace (dílní plnění) vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílního plnění) se specifikací zjištěných

- vad; v takovém případě platí, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla předána a ani objednatelem převzata.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem, popř. na dobu 5 let od převzetí stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, objednatelem od zhotovitele stavby, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy objednatelem .
  5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla).
  6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení.
  8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy.

## **VI.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

- ve výši 0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci (z ceny dílčího plnění, s nímž je zhotovitel v prodlení) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci (z ceny dílčího plnění, u něhož se ocitl v prodlení s odstraněním vady) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
  3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
    - a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.
    - b) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.
  4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
  5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním projektové dokumentace (byť i jen jednoho z dílčích plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce,
  - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatel, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
  - a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli v dodatečně přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy,
  - b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci (dílčí plnění), popř. za autorský dozor, o dobu delší než 1 měsíc.

## **VIII.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona ZZVZ, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

## **IX.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

V Benešově, dne

V Praze, dne

*dle elektronického podpisu*

*dle elektronického podpisu*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted]í ST OP Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
[redacted]d  
[redacted]  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.  
Správa toků – oblast povodí Vltavy  
Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace

**Název akce: VN Farský rybník – aktualizace PD, AD**

Stupeň projektové dokumentace:

***Aktualizace původní dokumentace pro povolení a provedení stavby, změna SO 1.2. -  
uložení sedimentu***

Místo: Obec Horní Stropnice

Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny

Kraj: Jihočeský

Katastrální území: Dlouhá Stropnice

Název toku: Bezejmenný tok

ČHP.: 1-06-02-040

IDVT: 10273224

Druh prací: rekonstrukce vodních nádrží

Charakter akce: Aktualizace původní PD z 09/2020, změna SO 1.2. – Uložení sedimentu

**Popis stávajícího stavu:**

V 09/2020 byla dokončena jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby. Součástí PD je stavební objekt SO 1.2. – Uložení sedimentu, který není zahrnut do vydaného platného stavebního povolení a který měl být předmětem samostatného řízení.

Z důvodu nepřijatelných nároků vlastníka komunikace (SÚS) dotčené plánovanou rekonstrukcí vodní nádrže byly prověřovány další možné varianty ukládání sedimentu. Na základě předběžného souhlasu vlastníka zemědělských pozemků v blízkosti zátopy VN [REDAKCE] je přistoupeno k aktualizaci PD z roku 2020 a změně SO 1.2.

**Popis návrhu a požadavků investora:**

V rámci aktualizace projektové dokumentace bude provedeno:

- I. Geodetické doměření potřebné pro provedení změny v PD
- II. Aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby:
- III. Inženýring

Předpoklad financování stavby z dotačního programu 129 490 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3.etapa“, dále jen DVT

**Podklady poskytnuté objednatelem:**

Rozbory zemín, které objednatel zajistí na vlastní náklady dle zadání, zadání bude projednáno se zhotovitelem na výrobním výboru.

**Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 7 000 tis. Kč**

Investice	4 000 tis. Kč
Oprava:	3 000 tis. Kč

## Postup (fáze) zpracování PD:

### **I. etapa – geodetické doměření lokality + aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby**

- **Geodetické doměření** pro následné zpracování změny projektové dokumentace stavby bude na podkladu katastrální mapy v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv). Geodetické doměření bude zpracováno dle platných právních předpisů a bude předáno objednateli v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf, editovatelné – formát dwg). Součástí geodetických prací bude i zajištění (zřízení) pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu (min. bude proveden 1 výškový bod umístěný tak, aby zůstal objednateli k dispozici i v rámci provádění stavby, tj. mimo rušené konstrukce),
- **Aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby**

Aktualizace bude provedena v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. v podrobnosti pro provádění stavby.

Předmět aktualizace:

- a) SO 1. Odbahnění - přepracování situačních výkresů a textové zprávy z důvodu změny pozemků určených k uložení sedimentů (Ing. Blíženec),
- b) SO 2. – SO 4. - Aktualizace návrhu technického řešení pro sjezd do nádrže LB zavázání a kompletní změna vnitrostaveništní dopravy - výkresová dokumentace a textová zpráva,
- c) Změna způsobu odvodnění staveniště vzhledem ke změně přístupu.
- d) Úprava kácení dřevin (výkres, tabulka, text) včetně nového Rozhodnutí o povolení kácení dřevin.
- e) Kompletní nový výkaz výměr a rozpočet.
  - výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
  - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
  - v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelům odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,

### **2. etapa – Inženýring**

- a) Projednání aktualizované PD s dotčenými orgány státní správy a místní samosprávy, správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a dalšími subjekty v závislosti na poměrech v lokalitě.
- b) Podklady, projednání a obstarání Rozhodnutí o uložení sedimentu na ZPF, příp. na povrch terénu pro účely zlepšení vlastností zemědělské půdy, eventuálně na povrch terénu (předpoklad cca 7 500 tis m<sup>3</sup> sedimentu) v souladu s příslušnými vyhláškami a zákony.
- c) Podklady, projednání a obstarání Rozhodnutí o kácení dřevin v souvislosti se změnou rozsahu kácení.

- d) Projednání a obstarání souhlasu obce s dotčením komunikací v jejím majetku po dobu realizace stavby.

*Pozn.: Samotná rekonstrukce vodního díla včetně přístupové komunikace a místa pro uložení sedimentů se nachází na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR. Nepředpokládá se dotčení pozemků cizích vlastníků.*


Aktualizace projektové dokumentace bude vyhotovena a předána v 6-ti samostatných tištěných paré + 1x v elektronické (digitální) podobě (needitovatelná verze – ve formátu pdf bude opatřena elektronickým autorizačním razítkem dle § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., editovatelná verze bude ve formátech doc, xlsx, dwg a dgn).

#### **Ostatní požadavky:**


- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVL),
- způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek – zejména vyhláška č. 273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),
- zhotovitel projedná návrh aktualizovaného technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou, předpokládá se konání 2 VV – vstupního a závěrečného,
- zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelům) budou objednateli předány samostatně v deskách mimo projektovou dokumentaci, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelům,
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD,
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty

a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Zpracoval: Ir  
Podpis:



Za objednatele schválil:



Zhotovitel:

Dne:

Přílohy:

# NABÍDKA SLUŽEB

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Divize 06



## **VN Farský – aktualizace PD a podklady pro rozhodnutí o změně nakládání se sedimentem**

**Aktualizace dokumentace pro stavební povolení, resp. Pro povolení  
záměru**

červenec | 2025



## NABÍDKA SLUŽEB

### KLIENT:

**Název společnosti:** Lesy České republiky s.p. – Správa toků oblasti povodí Vltavy  
**Sídlo společnosti:** Tyršova 1902, Benešov 256 01  
**Kontaktní osoba:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED]  
**IČO:**  
**DIČ:**

### ZPRACOVATEL:

**Název společnosti:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
**Sídlo společnosti:** Nábřeží 90/4, 150 00, Praha 5 – Smíchov  
**Statutární orgán:** Představenstvo společnosti  
**Zastoupený:** Ing. Jiří Valdhan, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva  
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jan Plechatý, člen představenstva

**Smluvní zástupce:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED]  
**Kontaktní osoba:** [REDACTED] České Budějovice  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED] 5

*Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930*

### BANKOVNÍ ÚDAJE:


**IČ:** 47116901  
**DIČ:** CZ47116901  
**Plátce DPH:** ANO  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 19-1583390227/0100

V Praze, dne 10.7.2025

Platnost nabídky do: 10.8.2025

## Předmět nabídky

Předmětem nabídky je aktualizace projektové dokumentace: "VN Farský rybník". Hlavní částí aktualizace je změna místa a způsobu vyvážení a ukládání sedimentu. Ten bude ukládán na ZPF v blízkosti nádrže na pozemky mimo vlastnictví investora. Výrazné zásahy do ostatních stavebních objektů se nepředpokládají. Předpokládá se nové řešení sjezdu do nádrže a jeho ponechání pro budoucí využití.

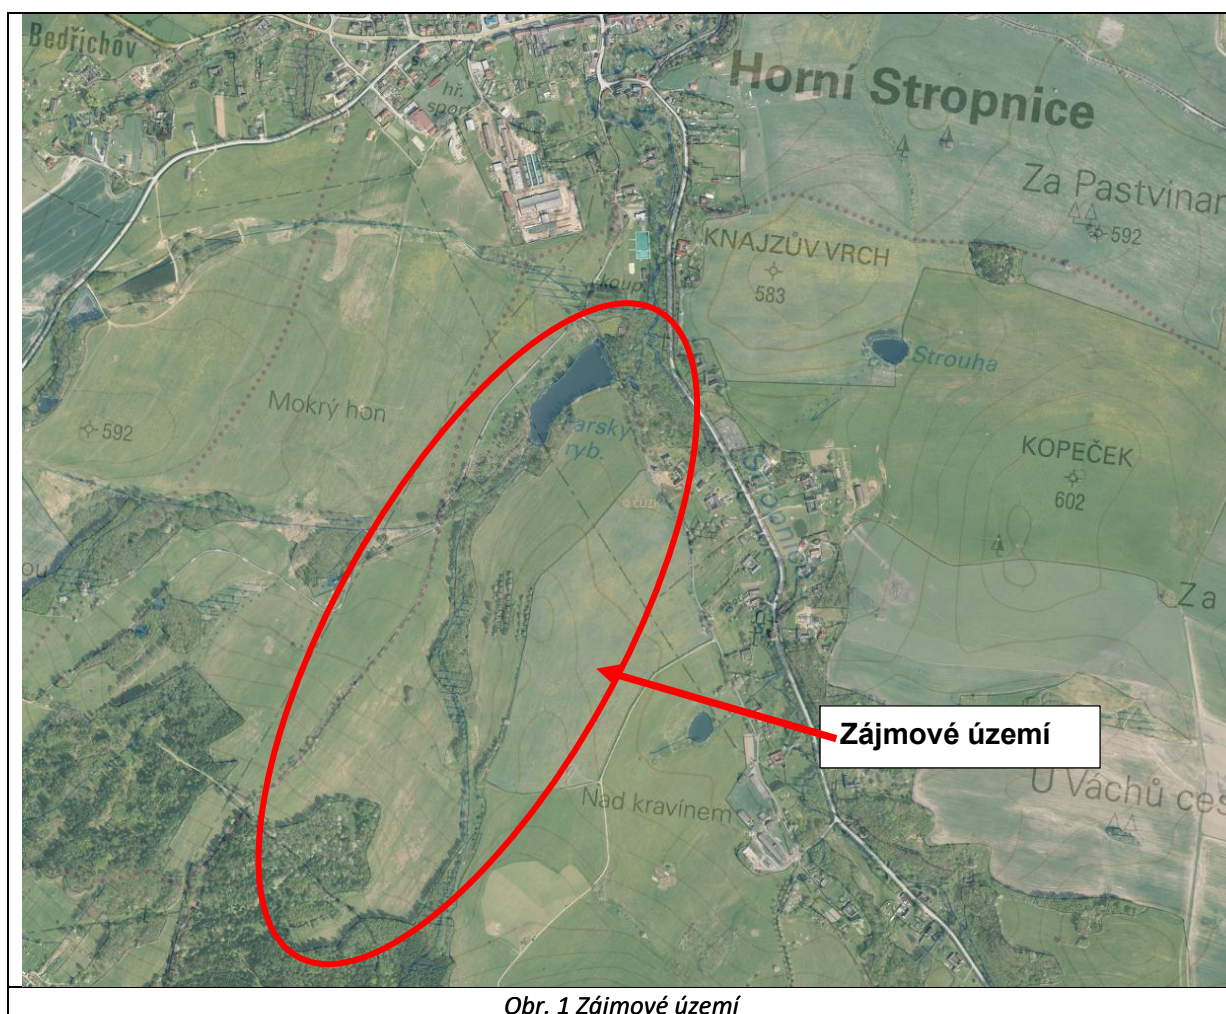

Obr. 1 Zájmové území

Položka	Detailní popis
1)	<b>Podklady a průzkumy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geodetické zaměření</li> </ul>
2)	<b>Aktualizace dokumentace pro stavební povolení, resp. Povolení záměru a podklady pro vydání rozhodnutí o uložení sedimentu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb v podrobnosti pro provádění stavby. Součástí dokumentace bude výkaz výměr a oceněný výkaz výměr v cenové soustavě URS.</li> </ul> <p>Předmětem nabídky je návrh řešení a jeho úprava na základě projednání s investorem, případné další úpravy budou předmětem víceprací na základě dohody s investorem.</p> <p>Pro povolení úpravy nakládání se sedimentem budou vypracovány podklady pro podání žádost o rozhodnutí o nakládání se sedimentem</p> <p>Jmenovitě se jedná o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletní přepracování situačních výkresů s ohledem na změnu pozemků, na které se ukládá.</li> <li>• Návrh řešení, výkresová dokumentace a textová zpráva pro sjezd do nádrže v levém závězu a kompletní změna způsobu vnitro staveništní dopravy</li> <li>• Změna způsobu odvodnění staveniště vzhledem ke změně přístupu</li> <li>• Změna způsobu ukládání sedimentu (návrh, výkresy, text)</li> <li>• Opuštění spodní přístupové komunikace včetně s tím související úpravy v kácení</li> <li>• Nové výkazy výměr</li> </ul>
3)	<b>Inženýring:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a dalšími subjekty v závislosti na poměrech v lokalitě *</li> <li>• Podklady a projednání pro žádost o rozhodnutí změně uložení sedimentu</li> <li>• Nové povolení kácení v souvislosti se změnou rozsahu kácení</li> <li>• Projednání a získání souhlasu obce s využitím komunikací v jejím majetku</li> <li>• Podání žádosti o povolení záměru a zajištění vydání povolení</li> </ul>

\*) Součástí plnění nejsou správní poplatky za podání žádosti o vydání společného povolení.

Dokumentaci předá zhotovitel objednateli v 5 - ti vyhotoveních v tištěné formě, 1 x v digitální formě na CD. Na základě zvláštní objednávky objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele další požadovaná vyhotovení dokumentace.

## Nabídková cena

1 - Podklady průzkumy	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%	Termín
Geodetické zaměření	15 000	18 150	do 30 dnů od SoD
<b>1. Etapa celkem</b>	<b>15 000</b>	<b>18 150</b>	<b>do 60 dnů od SoD</b>

Podklady pro souhlas s uložením sedimentu	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%	Termín
Situační výkresy, souhlasové situace, řezy komunikací, určení plochy rozprostření, možná DMT?, Kácení + elaborát	50 000	60 500	do 150 dnů od SoD
<b>2. Etapa celkem</b>	<b>50 000</b>	<b>60 500</b>	<b>do 150 dnů od SoD</b>

3 - Inženýring	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%	Termín
Inženýrská činnost potřebná pro zajištění vydání souhlasu s kácením a souhlasu s uložením sedimentu	30 000	36 300	do 240 dnů od SoD
<b>3. Etapa celkem</b>	<b>30 000</b>	<b>36 300</b>	<b>do 240 dnů od SoD</b>

Souhrn:	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%	Termín
<b>Projektová dokumentace a IČ celkem</b>	<b>95 000</b>	<b>114 950</b>	<b>do 240 dnů od SoD</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (PD + AD):</b>	<b>95 000</b>	<b>114 950</b>	<b>do 240 dnů od SoD</b>

*Cena je uvedena bez DPH a zahrnuje všechny náklady zpracovatele.*

## Profil společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři-fyzickými osobami. Tato akciová společnost je řízena představenstvem a dozorčí radou a výkonným managementem v čele s ředitelem společnosti.

Společnost nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou ani provozní firmu a hájí výhradně zájmy svých zákazníků. Nemá žádné závazky vůči státu, ani z běžného obchodního styku.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. má u České pojišťovny a.s. uzavřenu pojistnou smlouvu č. 899-14157-19 o pojištění odpovědnosti do výše 25 mil. Kč.

Společnost je organizačně členěna na 5 divizí, sídlo společnosti se nachází v Praze. Další stálá pracoviště jsou v Brně, v Českých Budějovicích, České Lípě, Ústí nad Labem, Liberci, Olomouci, Hranicích a ve Vysokém Mýtě. Na místech velkých zakázek vznikají dočasná pracoviště.

**PODROBNÉ POPISY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NALEZNETE V BROŽUŘE O SPOLEČNOSTI NEBO NA NAŠEM WEBU [vrv.cz](http://vrv.cz).**



[Brožura o společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.](#)



[Web společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.](#)
