

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: SMLD-1201/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STATICITY s.r.o.

se sídlem: Měšická 721/1, Praha 9 - Prosek, 190 00

IČO: 01920162

DIČ: CZ01920162

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284508

zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem (jednatel) a Ing. Petrem Duníkem (jednatel)

č. smlouvy: -

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají zejména v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o poskytnutí služeb

(dále jen „**Smlouva**“):

**Článek 1.
Úvodní ustanovení**

- 1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem: „**III/1161 Žilina. Most ev.č. 1161-1 přes potok - PD**“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „**SFDI**“), Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů.
- 1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že SFDI je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

- 1.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 2.

Předmět Smlouvy

- 2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést dílo – služby, které jsou specifikovány dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu.
- 2.2. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění díla dle Smlouvy pokyny Objednatele. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran dle §§ 2594-2595 občanského zákoníku.
- 2.3. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro záměr „**III/1161 Žilina. Most ev.č. 1161-1 přes potok**“, a související činnosti stanovené v Technické specifikaci, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „**Technická specifikace**“). Podrobnosti stanoví Technická specifikace.
- 2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby, nezbytné k řádnému poskytování služeb, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě první tohoto odstavce nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb.
- 2.5. Během zpracování projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolávány pravidelné výrobní výbory dle potřeby, avšak min. jednou za 3 měsíce. Poskytovatel dále bude zasílat objednateli zprávu o postupu prací (el. formou), a to vždy jednou za měsíc.
- 2.6. Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda nemovitosti dotčené záměrem nejsou předmětem ochrany dle zvláštního právního předpisu. Poskytovatel je povinen při zjištění této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

Článek 3.

Cena za poskytování služeb

- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb Smlouvy cenu díla. Celková cena díla činí 864.000,00 Kč bez DPH, 1.045.440,00 Kč s DPH.
- 3.2. Cena díla je stanovena následujícím způsobem:
 - a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací (dále jen „**Soupis prací**“), vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatel dle odst. 8.9 Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.

- b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v Soupisu prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.
- 3.3. K cenám stanoveným dle čl. 3.2 Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.4. Ceny stanovené dle čl. 3.2 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen dle čl. 3.2 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.
- 3.5. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 4.

Předání výsledků poskytnutých služeb

- 4.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle Smlouvy proběhne v souladu s pokyny Objednatele.
- 4.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v originále v digitální podobě na flash disku, a dále v prosté kopii v následujícím počtu výtisků:
 - 1x Průzkumy a zaměření
 - 1x Dokumentace pro povolení záměru
 - 3x Dokumentace pro provádění stavby
 - 1x Dokladová část
 - 1x Pravomocné povolení záměru včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace pro povolení stavby
- 4.3. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

Článek 5.

Dodatečné služby

- 5.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele.
- 5.2. Při snížení rozsahu služeb bude cena díla odpovídajícím způsobem snížena.
- 5.3. Při zvýšení rozsahu služeb je Poskytovatel bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané ve Smlouvě s tím, že:
 - a) cena v nabídce Poskytovatele bude stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,
 - b) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou Smluvních stran,
- 5.4. Snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem ke Smlouvě.

Článek 6.

Vyhrazené změny závazku

- 6.1. Smluvní strany ujednávají v souladu s § 100 ZZVZ následující případy vyhrazených změn závazku:
- a) Lhůtu pro plnění lze prodloužit, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele.

Článek 7.

Termíny plnění

- 7.1. Závazné lhůty pro plnění částí Díla:
1. Činnosti podle bodu č. 1 Soupisu prací – současně s převzetím čístopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem;
 - 2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby – do 5 měsíců ode dne nabytí platnosti smlouvy;
 - 2b. Předložení čístopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu, a to včetně dokladové části – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu;
 3. Předložení plánu BOZP – současně s předložením čístopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu;
 4. Podání žádosti o povolení záměru v souladu se stavebním zákonem – do 2 měsíců od doručení čístopisu Objednateli;
 5. Předložení projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací a rozpočtu – do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru stavby;
 6. Aktualizace rozpočtu – do 2 týdnů od písemné výzvy Objednatele;
 7. Činnost autorského dozoru – od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru do kolaudace záměru.
 8. Technická pomoc Objednateli – na výzvu Objednatele.

Článek 8.

Platební podmínky

- 8.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „**faktura**“), vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací.
- 8.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 8.3. Cena za služby dle bodu č. 1 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čístopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem.
- 8.4. Cena za služby dle bodu č. 2 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čístopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem.
- 8.5. Cena za služby dle bodu č. 3 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čístopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem.
- 8.6. Cena za služby dle bodu 4 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována následovně:
- 8.6.1. 60 % ceny části Díla bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o povolení záměru k příslušnému stavebnímu úřadu;

- 8.6.2. 40 % ceny části Díla bude Poskytovatelem vyúčtováno po nabytí právní moci povolení záměru. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí povolení záměru s vyznačenou doložkou právní moci.
- 8.7. Cena za služby dle bodu č. 5 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu dokumentace pro provádění stavby.
- 8.8. Cena za služby dle bodu č. 6 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována do 10 dní od schválení aktualizovaného rozpočtu Objednatelem.
- 8.9. Cena za služby dle bodu 7 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byla činnost realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 8.10. Cena za služby dle bodu 8 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byla činnost realizována. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 8.11. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu dle čl. 8.12. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.
- 8.12. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmxx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.
- 8.13. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad a nedodělků.

Článek 9.

Zástupce smluvních stran a komunikace

- 9.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Miroslav Dostál
Funkce: vedoucí úseku mosty
Email: [REDACTED]

K rukám: Ing. Lenka Netáhlová
Funkce: projektový manažer
Email: [REDACTED]
Datová schránka: a6ejgmx

Při doručování Poskytovateli: K rukám: Ing. Dušan Drahoš
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

- 9.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 9.1 je smluvní strana, jíž se změna týká, povinná písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

- 9.3. Realizační tým.

HIP (Hlavní inženýr projektu): Jméno: Ing. Dušan Drahoš
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

Odpovědný projektant: Jméno: Ing. Petr Duník
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Poskytovatel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 9.1 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních dnů od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatel.

Článek 10.

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

- 10.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 11.

Odpovědnost za vady z díla

- 11.1. Odpovědnost za vady z díla na poskytnuté služby činí **60 měsíců**. Doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této Smlouvy.

- 11.2. Vady zjištěné během této doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech stanovených Objednatel s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.
- 11.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatel bez vad a nedodělků.

Článek 12.

Smluvní pokuty

- 12.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle čl. 7 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. 3.1, maximálně však 10 % celkové ceny díla. Částí služeb se rozumí dílčí plnění, vymezené v článku 7.1 Smlouvy.
- 12.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělků, stanoví v zápise o předání a převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 12.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení.
- 12.4. Smluvní pokuta je splatná doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu díla.
- 12.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.
- 12.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 12.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

Článek 13.

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci

- 13.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

- 13.2. Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.
- 13.3. Poskytovatel není oprávněn poskytnout výsledky služeb ani jejich části třetím osobám s výjimkou činností realizovaných za účelem plnění Smlouvy.

Článek 14.

Pojištění

- 14.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy.
- 14.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy.
- 14.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této Smlouvy.

Článek 15.

Odstoupení od Smlouvy

- 15.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání povolení stavby apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy.
- 15.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

- a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;
 - b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;
 - c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;
 - d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.
- 15.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 15.4 V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.
- 15.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 15.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek 16.


Ostatní ujednání

- 16.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům v rozsahu větším než 10 % (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.
- 16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
- 16.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 16.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 16.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.
- 16.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 16.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 16.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/nebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

- 16.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami.
- 16.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 16.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 16.13. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace
 - Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb
 - Příloha č. 3 - Plná moc
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace




STATICITY s.r.o.
Ing. Dušan Drahoš Ing. Petr Duník
jednatel jednatel

Technická specifikace

1. Název akce: „III/1161 Žilina. Most ev. č. 1161-1 přes potok“ - PD

2. Mapa:

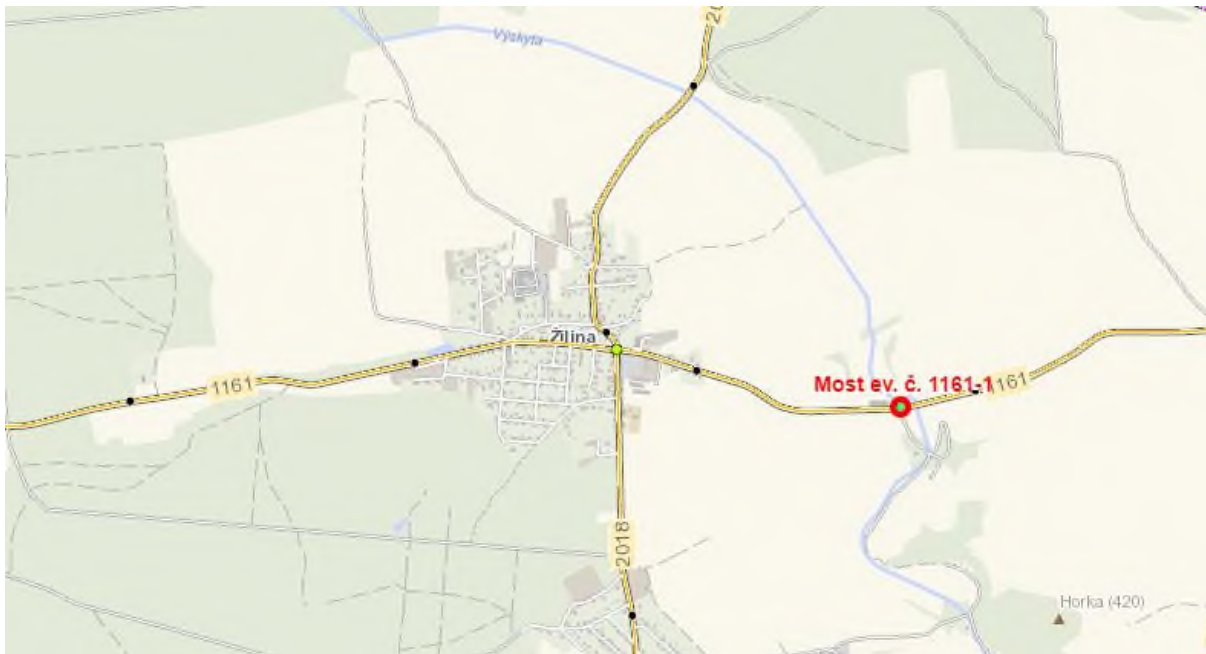

3. Provozní staničení a místo realizace:

silnice č. III/1161, staničení 3,744 km, Středočeský kraj, okres Kladno

4. Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

5. Předpokládané stavební náklady:

11 200 000 Kč bez DPH; tj. 13 552 000 Kč s DPH

6. Odůvodnění:

Most je nyní v nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu s klasifikací V – špatný. Nosnou konstrukci tvoří ocelové mostiny, které jsou v havarijním stavu. U opěr a křídel dochází k degradaci zdiva a vyskytují se trhliny. Vozovka je zvlněná, římsy vykazují trhliny a povrchovou degradaci. Podrobněji je stav mostu a jeho závady popsány v HPM.

Dle závěrů z poslední hlavní prohlídky je nutno zahájit přípravu opravy mostu. Návrh a rozsah opravných prací bude stanoven na základě výsledku provedených průzkumných prací. Součástí zakázky bude i projednání s DOSS, řešení přeložek IS a majetkoprávní vypořádání. Záměr se shoduje s územním plánem obce. Most bude mít v cílovém stavu plnou zatížitelnost a normové šířkové upořádání. Osazením normového záchytného systému bude zajištěna bezpečnost silničního provozu.

7. Další požadavky Objednatele:

- Zhotovitel vypracuje návrh dopravně inženýrského opatření, včetně jeho projednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy.
- Návrh oprav objízdných tras bude jako samostatná položka součástí rozpočtu stavby.
- V projekční přípravě bude záměr projednán s Odborem veřejné mobility Středočeského kraje a v případě nutnosti (a dle vyjádření Odboru veřejné mobility), budou zapracovány návaznosti na cyklistickou infrastrukturu Středočeského kraje.
- Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.
- V případě nutnosti přeložení inženýrských sítí (ČEZ, CETIN atd.) bude inženýrská činnost prováděna až do doby zajištění uzavření realizačních smluv (ne pouze Smluv o smlouvách budoucích), včetně kontroly realizace přeložek a připravenosti akce k předání do realizace.

8. Předmět díla:

1. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro záměr „III/1161 Žilina. Most ev.č. 1161-1 přes potok“ – PD.

Souvisejícími činnostmi se rozumí:

1. Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací
2. Zajištění povolení záměru
3. Výkon související inženýrské činnosti
4. Kompletní řešení odvodnění
5. Zajištění přeložek inženýrských sítí včetně řešení související smluvní agendy
6. Majetkoprávní vypořádání stavby
7. Vypracování soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu v platné cenové soustavě URS/OTSKP
8. Jednorázová aktualizace rozpočtu
9. Návrh řešení oprav objízdných tras v rozsahu určeném Objednatelem
10. Zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření
11. Vypracování plánu BOZP
12. Provádění dozoru projektanta

Zpracování Mostního listu a Hlavní mostní prohlídky bude součástí soupisu prací (výkazu výměr) v rámci zadání realizace stavebních prací.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Další práva a povinnosti týkající se projektových dokumentací:

9.1.1. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) a dále zejména:

- ☒ vyhlášku ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2;
- ☒ vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
- ☐ směrnici Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na [<https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>](https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/);
- ☒ Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, dostupné z [<https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>](https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/);

příčemž bude zejména obsahovat veškeré části, které výše uvedené předpisy a podmínky předpokládají s ohledem na povahu záměru, a to v kvalitě odpovídající účelu záměru.

9.1.2. Projektová dokumentace musí zohlednit související záměry.

9.1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán Poskytovatel stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

9.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována tak, aby odpovídala projektové dokumentaci pro povolení stavby, schválené v rámci řízení o povolení příslušného záměru.

9.1.5. Technické specifikace v rámci projektových dokumentací:

- musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelům zamýšlen;
- nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže;
- musí být stanoveny odkazem na relevantní právní a technické předpisy a normy.

9.1.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

9.1.7. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a

průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou DWG a formátu PDF.

- 9.1.8. Návrh projektové dokumentace záměru bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zaříděním PAU, provedené v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Diagnostiku vozovky se zaříděním PAU provede zhotovitel projektové dokumentace na své náklady. KSÚS jako zadavatel dále si vyhrazuje právo, aby byl její zástupce přítomen u diagnostiky vozovky.

9.2. Další práva a povinnosti týkající se soupisu prací, výkazu výměr a rozpočtu:

- 9.2.1. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet budou vypracovány k datu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby.
- 9.2.2. Soupis prací s výkazem výměr bude Objednateli předán ve formátu XML, XLSX/XLS a PDF.
- 9.2.3. Soupis prací s výkazem výměr bude rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude uvedena jejich jednotková cena, množství a celková cena za položku.
- 9.2.4. Rozpočet bude aktualizován v souladu s pokyny Objednatele.

9.3. Další práva a povinnosti týkající se průzkumů a zaměření:

- 9.3.1. Průzkumy a zaměření budou zhotoveny s ohledem na aktuální znění směrnice Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na <https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>.
- 9.3.2. Součástí zaměření je i zakresl inženýrských sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

9.4. Další práva a povinnosti týkající se výkonu dozoru projektanta:

- 9.4.1. Dozor projektanta bude vykonáván v souladu s přílohou č. 5 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitola 1, Všeobecné, dostupné z <https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>.
- 9.4.2. Dozor projektanta bude vykonáván jako občasný.
- 9.4.3. Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon dozoru projektanta, zejména oznámí Poskytovateli jako osobu vykonávající dozor projektanta Poskytovateli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
- 9.4.4. Zjistí-li vykonavatel dozoru projektanta při výkonu činnosti nesoulad s projektovou dokumentací k provedení stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu Objednatele a zapíše tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či v případě nebezpečí vzniku škody.
- 9.4.5. Dozor projektanta nebude vykonáván osobou, která připravovala nebo se podílela na přípravě realizační dokumentace pro zhotovitele stavby.

9.5. Další práva a povinnosti týkající se inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání záměru:

9.5.1. Výkonem související inženýrské činnosti se rozumí zejména:

- všechna právní jednání potřebná k zajištění povolení záměru;
- zajištění prodloužení platnosti povolení záměru v případě ne zahájení stavby v termínu platnosti povolení záměru, a to v dostatečném předstihu;

9.5.2. Majetkoprávní vypořádání

- bude prováděno v souladu s platným *Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje*, schváleným Zastupitelstvem kraje a instrukcemi ze strany Objednatele,
- může probíhat i po dokončení realizace stavby,
- v případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti,
- nezahrnuje zajištění podkladů pro vyvlastnění.

9.6. Další práva a povinnosti týkající se žádosti o povolení záměru:

9.6.1. Žádost o povolení záměru bude obsahovat všechny náležitosti dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, tedy zejména:

- dokumentaci pro povolení stavby,
- plánovací smlouvu, je-li uzavřena,
- souhlasy všech dotčených vlastníků,
- souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení,
- vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zákonem, nebo náležitosti žádosti podle § 177 stavebního zákona, nejsou-li vyjádření nebo závazná stanoviska součástí žádosti,
- vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě,
- závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán,
- specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká.

9.7. Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele:

9.7.1. Poskytovatel je povinen na příkaz Objednatele provést etapizaci záměru. Zároveň je povinen provést rozdělení rozpočtů na jednotlivé etapy. Etapizace projektu není důvodem ke zvýšení ceny.

9.7.2. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Poskytovatele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Poskytovatele opravovány.

10. Termíny pro předkládání projektové dokumentace:

1. Činnosti podle bodu č. 1 Soupisu prací: Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací	současně s převzetím čístopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatелеm
2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
2b. Předložení čístopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatеле ke konceptu	do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek Objednatеле ke konceptu se zapracovanými připomínkami
3. Plán BOZP	Současně s předložením čístopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatеле ke konceptu
4. Podání žádosti o povolení záměru v souladu se stavebním zákonem*	do 2 měsíců od doručení čístopisu Objednateli
5. Čístopis dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a položkový rozpočet	do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru stavby
6. Aktualizace rozpočtu	do 2 týdnů od písemné výzvy Objednatеле
7. Činnost dozoru projektanta	od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti dozoru projektanta do kolaudace záměru
8. Technická pomoc Objednateli	na výzvu Objednatеле

*Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje objednatel, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována.

11. Kontakty:

Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. Milan Jeřábek, projektový manažer staveb, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

12. Zpracoval:

Ing. Lenka Netáhlová, projektový manažer, e-mail: [REDACTED]

13. Fotodokumentace:



SOUPIS PRACÍ

III/1161 Žilina. Most ev.č. 1161-1 přes potok - PD

Zajištění projekční přípravy

žlutě ocení účastník	
popis položky	
1. Průzkumy a podklady	
Geodetické zaměření vč. polohopisného a výškopisného plánu	60 000,00 Kč
Vytyčení inženýrských sítí	12 000,00 Kč
Záborový elaborát	12 000,00 Kč
Geologický a geotechnický průzkum - odběr půdních vzorků, posouzení geotechnických vlastností, stanovení hladiny spodní vody	80 000,00 Kč
Hydrotechnický průzkum (posouzení a stanovení průtoků pod mostem, projednání se správcem toku, návrh vyhovující světlosti)	24 000,00 Kč
Diagnostika vozovky vč. posouzení PAU	24 000,00 Kč
Stavebně technické posouzení	12 000,00 Kč
Dendrologický průzkum	12 000,00 Kč
Havarijní plán - analýza rizik	12 000,00 Kč
Majetkoprávní elaborát	12 000,00 Kč
Koordinace s ostatními subjekty	12 000,00 Kč
<i>Průzkumy a podklady celkem</i>	272 000,00 Kč
2. Dokumentace pro povolení stavby	
Koncept dokumentace pro povolení stavby	200 000,00 Kč
Čistopis dokumentace pro povolení stavby	60 000,00 Kč
Dokladová část	12 000,00 Kč
<i>Dokumentace pro povolení záměru celkem</i>	272 000,00 Kč
<i>Celkem 1. a 2.</i>	544 000,00 Kč
3. Plán BOZP	
Plán BOZP	12 000,00 Kč
<i>Plán BOZP celkem</i>	12 000,00 Kč
4. IČ - zajištění vydání povolení záměru	
Projednání dokumentace vč.potřebných jednání a místních šetření	40 000,00 Kč
Podání žádosti, vč. poplatků	40 000,00 Kč
<i>IČ celkem</i>	80 000,00 Kč
5. Dokumentace pro provádění stavby	
Čistopis dokumentace pro provádění stavby	120 000,00 Kč
<i>Dokumentace pro provádění stavby celkem</i>	120 000,00 Kč
<i>Celkem 1. + 2. + 3. + 4. + 5.</i>	756 000,00 Kč
6. Aktualizace rozpočtu	
Aktualizace rozpočtu	12 000,00 Kč
<i>Aktualizace rozpočtu celkem</i>	12 000,00 Kč
7. Dozor projektanta	
Předpokládaný počet hodin	100
Hodinová sazba	800,00 Kč
<i>Dozor projektanta celkem</i>	80 000,00 Kč
8. Technická pomoc Objednateli	
Předpokládaný počet hodin - doplní objednatel	20
Hodinová sazba	800,00 Kč
<i>Technická pomoc celkem</i>	16 000,00 Kč
Celkem bez DPH	864 000,00 Kč
DPH	21%
Celkem s DPH	1 045 440,00 Kč

2a.
2b.
2b.

P l n á m o c

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti

STATICITY s.r.o.

se sídlem Měšická 721/1, Praha 9 - Prosek, 190 00

IČO: 01920162

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 284508

jednající Ing. Dušan Drahoš (jednatel) a Ing. Petr Duník (jednatel)

(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

„III/1161 Žilina. Most ev.č. 1161-1 přes potok“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

a) Ve vztahu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení,
- uskutečňování všech nezbytných jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 283/2021 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a

rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí,

- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným zábořem, zřízením služebnosti atp.

b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na odvolání do těchto rozhodnutí.

Zmocněnec bude právní jednání, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé, nebo prostřednictvím třetích osob, které k řešení těchto právních jednání využívá na základě obchodně právního vztahu. Zmocněnec je oprávněn udělit k jednotlivým jednáním plnou moc a zmocnit takovou třetí osobu s předchozím souhlasem zmocnitele.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

SEZNAM PODDODAVATELŮ								
Č.	NÁZEV PODDODAVATELE	SÍDLO	IČO	EMAILOVÁ ADRESA ¹	TELEFONNÍ KONTAKT ²	IDENTIFIKACE ČÁSTI ZAKÁZKY, KTEROU BUDE PLNIT	PODÍL V % (PŘÍPADNĚ FINANČNÍ HODNOTOU V KČ BEZ DPH)	PODDODAVATEL PROKAZUJE ČÁST KVALIFIKACE
1.	VISIONPLAN-3D s.r.o.	Sokolovská 784/41, Severní Předměstí, 32300 Plzeň	9565884			geodetické zaměření	60.000 Kč	NE
2.	GTS Geotechnika s.r.o.	Trnková č.ev. 437, 25245 Ohrobec	7191901			geologický a geotechnický průzkum	80.000 Kč	NE
3.	poddodavatel zatím nevybrán					hydrotechnický průzkum	24.000 Kč	NE
4.	Silniční inženýrská společnost, s.r.o.	Žižkova 1778/54, 301 00 Plzeň	46885315			diagnostika vozovky	24.000 Kč	NE
5.	poddodavatel zatím nevybrán					dendrologický průzkum	12.000 Kč	NE
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
