

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ a zák.o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb.(GDPR)
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
(dále jen jako „Smlouva“)

uzavřená mezi

SIKO KOUPELNY a.s.

Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9 – Kyje

IČO: 260 65 801, DIČ: CZ69905837, ID: hvagaag

zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9124

Korespondenční adresa: Čimelice 330, 398 04 Čimelice

Zastoupený Jaroslavem Kovářem na základě vedoucí pracovní pozice v souladu s fir.směrnicí US501

Kontaktní, odpovědná osoba: Pavel Žukovský, Tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

a

Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČO: 00277177, DIČ: CZ00277177 ID: w87brph

Zastoupená Jaroslavem Martinů, starostou

Kontaktní, odpovědná osoba: Romana Findejsová, DiS. Tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička

(dále jen „Objednatel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

OBSAH

1.	VÝCHOZÍ ÚDAJE	4
2.	OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN	4
3.	DÍLO	4
4.	PROVEDENÍ DÍLA	4
5.	LHŮTA PRO ZHOTOVENÍ DÍLA	5
6.	CENA DÍLA, SPLATNOST, FAKTURACE	5
7.	POVINNOSTI A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE	6
8.	POVINNOSTI ZHOTOVITELE	6
9.	DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PŘEDÁVACÍ PROTOKOL	6
10.	VLASTNICKÁ PRÁVA, RIZIKO ŠKODY	7
11.	ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY	7
12.	POJIŠTĚNÍ	7
13.	VYŠŠÍ MOC	8
14.	SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ	8
15.	UKONČENÍ SMLOUVY	8
16.	ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY A SOUDY	10
17.	JAZYK A KORESPONDENCE	10
18.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	10
19.	PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY	11
PŘÍLOHA Č. 1	MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	12
PŘÍLOHA Č. 2	DÍLO	13
PŘÍLOHA Č. 3	SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ	14
PŘÍLOHA Č. 4	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	15
PŘÍLOHA Č. 5	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	16

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1 Pro účel této smlouvy jsou dále uvedené pojmy definovány takto:

„den“	znamená kalendářní den, není-li uvedeno jinak. Lhůta určená dny počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
„díličí dílo“	část díla, blíže popsaná v čl. 3.1.
„dílo“	má význam uvedený v čl. 3.1.
„klientské změny“	změny v parametrech dodávky materiálů či montážních prací, vyžádaných objednatelem.
„materiál“	znamená veškerý nezbytný materiál pro řádné provedení díla, jako zařizovací předměty s příslušenstvím a jiné takové položky vč. stavebních prefabrikátů, které zhotovitel dodá objednateli.
„měsíc“	znamená kalendářní měsíc. Konec lhůty určené měsíci připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá. Není-li takový den v měsíci, ve kterém lhůta končí, připadne konec lhůty na poslední den tohoto měsíce.
„místo zhotovení díla“	znamená místo zhotovení díla uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
„náklady“	náklady na dopravu a náklady na suroviny.
„náklady na dopravu“	náklady Zhotovitele na mezinárodní kamionovou a kontejnerovou dopravu z nichž vychází kalkulace jednotkových cen materiálů.
„náklady na suroviny“	náklady Zhotovitele na dodávku materiálů, z nichž vychází kalkulace jednotkových cen materiálů.
„občanský zákoník“	znamená zákon č. 89/2012 Sb., NOZ, ve znění pozdějších předpisů.
„práce“ resp. „montážní práce“	znamenají nezbytné práce jako součást díla.
„pracovní den“	znamená každý den jiný než sobotu a neděli a státem uznaný svátek.
„prostoje“	znamená dobu, po kterou Zhotovitel nemůže fakticky či jinak provádět dílo v důsledku překážky spočívající v: (i) nikoli řádném předání staveniště Zhotoviteli Objednatelem dle čl. 4.6; (ii) porušení jiné povinnosti Objednatele, v důsledku, které je Zhotoviteli znemožněno či neumožněno provádění díla; nebo (iii) jiné překážky nastalé nezávisle na vůli Zhotovitele objektivně bránící Zhotoviteli v provádění díla dle této Smlouvy počínající dnem, kdy nastala okolnost a končící den po dni odstranění takové překážky.
„projektová dokumentace“	znamená projektovou dokumentaci k dílu poskytnutou Objednatelem Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy, o níž Objednatel prohlašuje, že je úplná a dostatečná pro řádné zhotovení díla, která je přílohou č. 5 této Smlouvy.
„předmět díla“	znamená kuchyně o rozsahu vymezeném v příloze č. 2.
„Smlouva o dílo“ nebo „Smlouva“	znamená tato Smlouva, nevyplyvá-li z kontextu, že se odkazuje na jinou
„staveniště“	znamená místo, kde bude prováděno dílo, ve stavu stavební připravenosti a ke kterému má Objednatel vlastnické či užívací právo a které předal Zhotoviteli jako pracoviště.

„stavební připravenost“	znamená připravenost staveniště k okamžitému zhotovení díla Zhotovitelem dle této Smlouvy včetně zajištění všech stavebních a jiných povolení, blíže specifikovaná v příloze č. 4 této Smlouvy.
„týden“	znamená kalendářní týden. Konec lhůty určené týdny připadá na den, který se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.
„vícepráce“	má význam uvedení v čl. 3.4.
„zboží“	znamená veškeré zařízení a materiály, které je zhotovitel povinen dodat Objednateli podle této Smlouvy.
„zvýšení nákladů“	zvýšení nákladů na dopravu nebo zvýšení nákladů na suroviny.
„zvýšení nákladů na dopravu“	zvýšení nákladů Zhotovitele na dopravu materiálu od výrobce o 10 % (včetně) a více oproti výši nákladů na dopravu materiálu ke dni uzavření této Smlouvy nebo ke dni předchozího zvýšení nákladů, nastalé po uzavření této Smlouvy nebo jejím prodloužení.
„zvýšení nákladů na suroviny“	zvýšení nákladů Zhotovitele na materiál placených výrobcí o 10 % (včetně) a více oproti výši nákladů ke dni uzavření této Smlouvy nebo jejího prodloužení, nastalé po uzavření této Smlouvy nebo prodloužení.

- 1.2 Pokud je kdekoli ve Smlouvě stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoliv sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení, musí být takové sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení písemné a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a stejně tak musí být vykládána slova sdělit, schválit nebo potvrdit, pokud není výslovně stanoveno jinak. Jakýkoli souhlas, schválení nebo potvrzení nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno.
- 1.3 Pokud není uvedeno jinak, jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:
- (i) jakoukoliv „**Smluvní stranu**“ se vykládá tak, že zahrnuje jejich právní nástupce, postupníky a nabyvatele povolené v souladu s touto Smlouvou;
 - (ii) „**nástupce**“ zahrnuje postupníka nebo právního nástupce jakékoli smluvní strany a jakoukoli osobu, která v souladu s právem státu, kterým se řídí příslušné postoupení nebo nabytí, převzala práva a povinnosti jakékoli Smluvní strany nebo na kterou byla jakákoli práva a povinnosti v souladu s takovým právem převedena;
 - (iii) článek, stranu nebo přílohu je odkazem na článek, stranu nebo přílohu v, nebo k, této Smlouvě;
 - (iv) dokument zahrnuje jeho dodatky nebo doplňky nebo nahrazení nebo novaci takového dokumentu;
 - (v) zákon nebo právní předpis nebo české technické normy odkaz na takový zákon, právní předpis nebo českou technickou normu v jeho platném a účinném znění;
 - (vi) výraz uvedený v množném čísle zahrnuje i odkaz na výraz uvedený v jednotném čísle a naopak.

1. VÝCHOZÍ ÚDAJE

1.1 Název investice: **Kuchyně Polička blok A**

1.2 Místo zhotovení díla je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy.

2. OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Touto Smlouvou se Objednatel zavazuje:

- (i) poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro realizaci díla;
- (ii) předat Zhotoviteli staveniště ve stavu stavební připravenosti;
- (iii) převzít od Zhotovitele předmět díla;
- (iv) zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla;
- (v) převzít na sebe vlastnická a jiná práva k dílu a nebezpečí škody na díle za podmínek dále uvedených v této Smlouvě.

2.2 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje

- (i) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, při náležité stavební připravenosti a vhodných technologických podmínkách; a
- (ii) převést na Objednatele vlastnické právo k jím dodávanému materiálu.

3. DÍLO

3.1 Dílem se rozumí provedení či zajištění provedení veškerých prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 a dílčím dílem ucelená dodávka části díla, tj. materiálu a s tím spojených montážních prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 2.

3.2 Součástí díla je i dodání materiálu potřebného ke zhotovení díla a zajištění jeho přepravy.

Klientské změny

3.3 Objednatel je oprávněn, dle své volby, provádět klientské změny. V takovém případě je povinen zaslat Zhotoviteli návrh dodatku ke Smlouvě (být ve formě objednávky) a v dalším strany postupují dle čl. 3.4.

Změny rozsahu díla

3.4 Pokud se v průběhu zhotovování díla ukáže potřeba dalších dodávek prací či materiálů (např. v důsledku Objednatelem požadovaných klientských změn, zjištěné nedostatečné stavební připravenosti apod.), je Zhotovitel oprávněn pozastavit další zhotovování díla až do dne následujícího po dni, v němž se Smluvní strany dohodnou na ceně víceprací či bude odstraněna překážka, kvůli níž bylo provádění díla pozastaveno.

4. PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel provede dílo ve lhůtě a kvalitě podle této Smlouvy.

4.2 Dílo musí odpovídat projektové dokumentaci, a příslušným právním normám. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění díla nemožnost nebo nevhodnost dalšího provádění díla podle projektové dokumentace, je povinen o tomto informovat písemně Objednatele a je oprávněn zastavit další provádění díla (e-mailem).

4.3 Zhotovitel je povinen provádět dílo vlastními silami nebo s využitím subdodavatelů.

4.4 Zhotovitel je oprávněn po předchozím písemném upozornění Objednatele pozastavit provádění díla, neprovedl-li či nezajistil-li Objednatel úhradu jakékoli splatné, ale nesplacené částky dle této Smlouvy Zhotoviteli a toto prodlení trvá déle než čtrnáct (14) dní. Doba, po kterou bylo provádění díla nebo dílčího díla pozastaveno je prostojem a je řešeno sankcí dle této Smlouvy.

Staveniště

4.5 Objednatel na své náklady zřídí staveniště.

4.6 Podmínkou zahájení zhotovování díla je předání staveniště ve stavu stavební připravenosti.

- 4.7 O předání staveniště bude sepsán písemný záznam formou samostatného předávacího protokolu. Budou-li zjištěny nedostatky, zapíší se do záznamu a Zhotovitel je oprávněn odmítnout staveniště převzít. Objednatel je povinen poté zajistit odstranění nedostatků na staveništi.
- 4.8 Vůči Zhotoviteli nese odpovědnost za staveniště Objednatel.
- 4.9 Odpovědnost za škodu vzniklou na staveništi nese Objednatel, ledaže ke škodě dojde v důsledku činnosti či porušení povinnosti Zhotovitele.
- 4.10 Objednatel bude provádění díla kontrolovat dle dohody se Zhotovitelem (Příloha 5.)

5. LHŮTA PRO ZHOTOVENÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a odevzdat dílo ve lhůtě do 12ti kalendářních týdnů ode dne předání staveniště ve stavu stavební připravenosti a úhrady platby dle první faktury (zálohy).
- 5.2 Objednatel se zavazuje v uvedené lhůtě dílo převzít.
- 5.3 Lhůta pro zhotovení díla se prodlužuje o dobu prostoje. Od dob, kdy Zhotovitel informoval písemně Objednatele (e-mailem) o skutečnosti, která mu brání v další činnosti podle této Smlouvy. Strany si poskytnou vzájemnou součinnost tak, aby bylo možné co nejdříve pokračovat v činnosti Zhotovitele.
- 5.4 Jestliže v průběhu prací vyvstanou překážky, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel při uzavření této Smlouvy předpokládat, zavazují se obě Smluvní strany, že dohodnou v duchu této Smlouvy další postup, zejm. co se týká lhůt a cen, a to písemným dodatkem k této Smlouvě.
- 5.5 Pokud nebude dohodnuto jinak, není pracovní doba ze strany Objednatele omezena.

6. CENA DÍLA, SPLATNOST, FAKTURACE

- 6.1 Cena díla a její splatnost jsou uvedeny ve splátkovém kalendáři, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Splátkový kalendář může obsahovat zálohy na cenu díla či průběžné placení díla po jednotlivých částech díla. Cena díla uvedená v Příloze č. 3 byla stanovena s ohledem na výši nákladů Zhotovitele ke dni uzavření této Smlouvy. Pro případ zvýšení nákladů před předáním díla se cena díla zvyšuje nejvýše o: (a) 5 % v případě zvýšení nákladů na dopravu; a/nebo (b) 10 % v případě zvýšení nákladů na suroviny. Pokud kdykoli během doby dle této Smlouvy dojde k zvýšení základů, Zhotovitel to oznámí Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co se o zvýšení nákladů dozví.
- 6.2 Ceny podle této Smlouvy nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH). DPH bude Zhotovitelem uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.3 Cenu díla je možné překročit zejména v případě, že dojde:
- (i) ke změně daňových předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkových cen, z nichž vychází kalkulace ceny díla, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH (v takovém případě může dojít ke zvýšení ceny díla nejvýše o částku odpovídající změně daňových předpisů.);
 - (ii) v případě mimořádných makroekonomických změn, tj. posílení kurzu EUR či USD vůči české koruně o více než 5 % v průběhu posledních dvanácti měsíců o 5 %, přičemž pro případ změn opačného vlivu, tj. posílení kurzu koruny vůči EUR či USD o více než 5 % v průběhu posledních dvanácti měsíců, je Zhotovitel připraven jednat o snížení prodejních cen Objednateli;
 - (iii) zvýšení nákladů;
 - (iv) změně rozsahu díla; nebo
 - (v) dodávce víceprací.
- 6.4 Případné vícepráce budou Zhotovitelem ve výši 100 % vyfakturovány samostatnou fakturou po potvrzení dokončení víceprací na předávacím protokolu. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu až do výše 100% z ceny vícepráce a provést vícepráce teprve po obdržení zálohy dle jím vystavené zálohové faktury.
- 6.5 Všechny platby ve prospěch Zhotovitele budou provedeny bankovním převodem z účtu Objednatele na účet zhotovitele, nedohodnou-li se strany jinak.

- 6.6 Vystavené faktury musí mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění účetního případu a náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.
- 6.7 V případě, že předmětem fakturace budou stavební a montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH, uvede zhotovitel na faktuře spolu s číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA i upozornění, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel jako plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
- 6.8 Případnou-li termíny podle tohoto čl. 6 na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín na nejbližší pracovní den.

7. POVINNOSTI A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 7.1 V rámci svého spolupůsobení se Objednatel zavazuje, že poskytne Zhotoviteli na písemné vyzvání a bez zbytečného odkladu spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek či součinnosti třetích osob, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění díla.
- 7.2 Ověření shody Objednatelem předaných podkladů a projektové dokumentace se skutečností je povinností Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami v průběhu realizace díla písemně dohodnuto jinak.
- 7.3 Objednatel se zavazuje poskytnout média a energie k provedení díla a umožní Zhotoviteli zhotovení díla na staveništi při dodržování příslušných předpisů a zákonů České republiky.
- 7.4 Objednatel umožňuje touto Smlouvou Zhotoviteli a jeho subdodavatelům bezúplatné užívání staveniště, 3 parkovacích míst, zdrojů energií a komunikačních zařízení a vyvstane-li kdykoli později potřeba uzavření zvláštní smlouvy na zajištění takového užívání, zavazuje se, že ji k výzvě Zhotovitele neprodleně uzavře.
- 7.5 Objednatel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek a umožní Zhotoviteli bezpečné uložení výrobků a montážního zařízení na staveništi.
- 7.6 Objednatel prohlašuje, že zajistil veškeré potřebné podklady a rozhodnutí, která jsou nutná pro zhotovení díla podle této Smlouvy.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil zhotovení díla v souladu s touto Smlouvou.
- 8.2 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a za zachování pořádku na výlučně jím užívaném staveništi. Dodávky zboží a poskytnutí služeb smí Zhotovitel zajistit za pomoci subdodavatelů.
- 8.3 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na staveništi.
- 8.4 Zhotovitel po předání díla vyklidí a odstraní ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod., které nebudou dále potřebné pro odstraňování vad, nedodělků, provádění víceprací a dokončování díla.
- 8.5 Zhotovitel bude na své náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností, nebude-li dohodnuto jinak.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky stanovené pro oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany, prevence závažné havárie, přepravy nebezpečných věcí, ochrany areálu a ochrany životního prostředí.

9. DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

- 9.1 O předání díla, dílčího díla nebo jeho dokončené části bude vyhotoven a oběma Smluvními stranami podepsán samostatný předávací protokol. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k převzetí a Objednatel je povinen převzít dokončené části díla nebo dílčího díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, dílčího díla ani jeho dokončených částí pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 9.2 Případné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla, dílčího díla či jeho dokončené části, budou sepsány v předávacím protokolu s uvedením termínu jejich odstranění.

- 9.3 Protokol bude vyhotoven v den předání. Den předání může být stanoven dohodou Smluvních stran a nebude-li taková dohoda učiněna je jím den určený dle čl. 9.4 nebo zpravidla poslední den lhůty pro předání díla.
- 9.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla, dílčího díla nebo jeho dokončené části výzvou zaslanou objednateli e-mailem. Zhotovitel stanoví den předání tak, aby tento nastal nejdříve tři pracovní dny ode dne, kdy odeslal výzvu Objednateli, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.5 Dodrží-li Zhotovitel své povinnosti dle tohoto článku a nevykazuje-li předávané dílo či jeho část vady či nedodělky, které by podstatným způsobem bránily jeho užívání, má se za to, že dílo či jeho část je předané v určený plánovaný den předání, i když se Objednatel k převzetí díla či jeho části nedostaví nebo odmítne-li podepsat předávací protokol.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA, RIZIKO ŠKODY

- 10.1 Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem zabudování jednotlivých dílů nebo částí do předmětu díla.
- 10.2 Zhotovitel je odpovědný za jakékoli ztráty a škody na předmětu díla způsobené jeho činností, a to až do předání díla. Za škody a ztráty, které prokazatelně způsobí Objednatel, nebo které nastanou nezávisle na Zhotoviteli, odpovídá Objednatel.
- 10.3 Nebezpečí škody na věcech dodaných Zhotovitelem a zabudovaných do předmětu díla přechází na Objednatele dnem zabudování takového předmětu do díla.

11. ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Odpovědnost za vady

- 11.1 Zhotovitel odpovídá až do uplynutí záruční lhůty za kvalitu dodaného materiálu, zařízení a jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu materiálů, použitých na předmětu díla, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného zařízení.

Záruční lhůty

- 11.2 Záruční lhůty dle čl. 11.3 se počítají ode dne předání díla dle čl. 9.
- 11.3 Zhotovitel poskytuje na každý dílčí předmět díla od data jeho předání a převzetí následující záruky:
- | | | |
|------|---|------------|
| (i) | dodávka materiálu a technologie | 24 měsíců, |
| (ii) | montážní práce, stavební část, vč. stavebních prací | 24 měsíců, |

Reklamace

- 11.4 Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby vady díla, vytkne je bez zbytečného odkladu písemným oznámením doručeným Zhotoviteli (reklamace), nejpozději však do 5-ti dnů po uplynutí záruční doby, za předpokladu, že vada existovala před uplynutím záruční doby. Vada musí být v reklamaci dostatečně a nezaměnitelně popsána.
- 11.5 Zhotovitel potvrdí Objednateli do 3(tří) dnů obdržení reklamace přijetí a sdělí své stanovisko k reklamaci, příp. požádá o prohlídku tak, aby se s vytknutou vadou mohl seznámit. Objednatel je povinen takovou prohlídku umožnit, jinak ztratí nároky z vad nebo ze záruky.
- 11.6 Zhotovitel je povinen jím uznanou vadu odstranit, a to buď opravou, nebo výměnou vadného materiálu, a to na vlastní náklady.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za újmy způsobené Objednateli nebo třetí osobě v důsledku provádění díla v rozporu s právními předpisy či touto Smlouvou. V případě vzniku újmy, způsobené zhotovitelem při provádění díla podle tohoto odstavce, nese náklady na odstranění nebo uvedení do původního stavu Zhotovitel. O újmách bude Zhotovitel Objednatele informovat a provede opatření k odstranění vzniklé újmy bez zbytečného odkladu.

12.2 Objednatel odpovídá za škodu vzniklou Zhotoviteli na staveništi, kterou si Zhotovitel nezpůsobil sám (např. krádež materiálu). Objednatel prohlašuje, že uzavřel pojistnou smlouvu, která kryje takovou případnou škodu, a to na pojistnou částku ve výši odpovídající nejméně ceně díla.

12.3 Objednatel se zavazuje udržovat pojištění dle čl. 12.2 této Smlouvy v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a na výzvu Objednatele je povinen prokázat, že pojištění odpovědnosti za škodu je platné a účinné.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1 Žádná Smluvní strana není odpovědna za jakékoliv nesplnění závazku dle této Smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a bránila jí ve splnění její povinnosti a jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

13.2 Za okolnosti vyšší moci se považují zejména takové neodvratitelné události, které ta Smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání Smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, zákaz výkonu činnosti v důsledku rozhodnutí veřejnoprávní autority apod.

13.3 Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do 3 (tří) dnů druhou Smluvní stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou Smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

13.4 Doba trvání zásahu či okolnosti vyšší moci se nepovažuje za prostoje a o tuto dobu se prodlužuje lhůta k předání díla.

13.5 V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 4 (čtyři) měsíce, má druhá Smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy dle čl. 15.

14. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

Smluvní pokuty za nedodržení dodacích lhůt

14.1 Pro případ prodlení se zhotovením díla z důvodů na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla.

14.2 Zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy zbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu a Objednatele práva na náhradu takové škody, kterou Objednateli nesplněním svého závazku způsobí.

14.3 Je-li dle této Smlouvy porušení povinností Zhotovitelem postižitelné dle dvou různých ustanovení zakotvujících právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu, je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu pouze dle jednoho z takových ustanovení za jedno identické porušení. Dopustí-li se Zhotovitel stejného porušení znovu či opakovaně je Objednatel oprávněn uplatnit další smluvní pokutu za každé jedno takové porušení.

14.4 Celková výše uplatněných smluvních pokut uplatněných vůči Zhotoviteli nepřekročí 10% ceny díla.

14.5 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury či zálohové faktury Zhotovitele, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Náhrada za prostoje

14.6 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli částku ve výši 5.000,- Kč za každého jednoho zaměstnance a každý jeden den prostoje. Za prostoje trvající více dnů je Objednatel povinen zaplatit částku v plné výši, pokud k prostoji dojde v době do 10:00 hod. daného dne. Dojde-li k počátku prostoje kdykoli později v daném dnu, je Objednatel povinen zaplatit 50% uvedené částky.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od Smlouvy.

- 15.2 Objednatel nebo Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než čtyři měsíce (odt.13.5 výše).
- 15.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže došlo ze strany Zhotovitele k podstatnému porušení smluvních povinností. Za takové porušení se považuje, pokud Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá výlučně on sám, způsobí nesplnění termínu dokončení díla o více jak 120 (sto dvacet) dnů.
- 15.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou faktury více než 15 kalendářních dnů.
- 15.5 Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
- 15.6 Při odstoupení od Smlouvy dle čl. 15.3 je každá Smluvní strana povinna druhé Smluvní straně v rozsahu odstoupení vrátit plnění, které obdržela na základě Smlouvy, přičemž bude postupováno podle pravidel stanovených touto Smlouvou a právními předpisy.
- 15.7 Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy též v případě, že
- (i) druhá Smluvní strana podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“);
 - (ii) insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na druhou Smluvní stranu do 3 měsíců od zahájení insolvenčního řízení ať již se jedná o návrh podaný stranou jako dlužník nebo návrh podaný jinou osobou;
 - (iii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku druhé Smluvní strany ve smyslu § 136 insolvenčního zákona;
 - (iv) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek druhé Smluvní strany; nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení druhé Smluvní strany (vyjma případů přeměn společnosti).
- Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 253 odst. 2 insolvenčního zákona a platí, že od této Smlouvy lze odstoupit i během lhůty 30 dnů od prohlášení konkurzu na majetek druhé Smluvní strany.
- 15.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.
- 15.9 Platnost a účinnost Smlouvy může být ukončena též písemnou dohodou.

Práva a povinnosti Smluvních stran po ukončení Smlouvy

- 15.10 Smluvní strany se dohodly, že ukončením této Smlouvy z důvodu odstoupení zanikají veškerá práva povinnosti z ní vyplývající s účinky *ex nunc* (ode dne odstoupení), s výjimkou práv a povinností:
- (i) nároků Smluvní strany na náhradu jakékoli škody a všech přiměřených a vzniklých nákladů, které způsobila událost, která byla důvodem k odstoupení od této Smlouvy;
 - (ii) splatných, ale neuhrazených částek dle splátkového kalendáře nebo faktur vystavených do dne odstoupení od Smlouvy; a
 - (iii) splatných, ale neuhrazených smluvních pokut, úroků z prodlení aj. uplatněných do dne odstoupení od Smlouvy.
- 15.11 Po ukončení Smlouvy Smluvní strany zjistí hodnotu všech provedených prací a dodávek materiálu díla pomocí znaleckého posudku, přičemž znalec bude vycházet především ze skutečně odvedené práce, dodaného materiálu a cen sjednaných pole této Smlouvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany na osobě znalce, může každá Smluvní strana nechat vypracovat znalecký posudek jí pověřeným znalcem za dodržení podmínek stanovených tímto odstavcem. Objednatel je v takovém případě povinen umožnit znalci pověřenému Zhotovitelem fyzickou prohlídku všech předmětů díla a pořízení fotodokumentace či filmového záznamu.
- 15.12 Nedohodnou-li se Smluvní strany na výši vzájemného vypořádání, rozhodne o tomto soud. Náklady spojené s vypořádáním vzájemných vztahů uhradí ta Smluvní strana, která nebude ve sporu úspěšná, příp. podle poměru úspěchu.

16. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY A SOUDY

- 16.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.2 Jakékoliv spory z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se Smluvní strany budou snažit řešit především vzájemnou dohodou.

17. JAZYK A KORESPONDENCE

- 17.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu díla budou provedeny v českém jazyce.
- 17.2 Jakákoli komunikace, která se má uskutečnit podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude učiněna písemně a pokud není uvedeno jinak, tak dopisem na výše uvedenou kontaktní adresu, e-mailem, nebo datovou schránkou.
- 17.3 Jakákoli sdělení nebo dokumenty zaslané nebo doručované jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní
- (i) dopisem se považují za doručené v okamžiku, kdy byl dopis doručen nebo pět (5) pracovních dnů poté, co byl odeslán na příslušnou adresu;
 - (ii) datovou schránkou se považují za doručené v okamžiku, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky adresáta; a
 - (iii) e-mailem se považují za doručené v okamžiku, kdy bylo doručení potvrzeno příjemcem, či jinak průkazně doručeno do dané e-mailové schránky;

příčemž v případě, kdy se dle této Smlouvy vyžaduje, aby bylo doručeno výše uvedené kontaktní osobě, musí být dopis, datová schránka nebo e-mail odeslán i k pozornosti této osoby.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Dnem uzavření Smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání Smluvních stran vztahující se k dílu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 18.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že se ustanovení § 557 Občanského zákoníku, o výkladu k tíži Zhotovitele ve vztahu k Zhotoviteli, nepoužijí.
- 18.3 Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 2609 o svémocném prodeji díla na smluvní vztah založený touto Smlouvou nepoužije.
- 18.4 Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.
- 18.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či týkající se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 18.6 Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
- 18.7 Smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší Smluvní stranu v porovnání s druhou Smluvní stranou a že měly možnost seznámit se s textem a obsahem Smlouvy, obsahu rozumí, chtějí jím být vázány a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly.
- 18.8 Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele postoupit jakoukoli pohledávku nebo práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.
- 18.9 Ustanovení této Smlouvy odkazující na projektovou dokumentaci se použijí pouze v případě, že projektová dokumentace skutečně existuje a byla Zhotoviteli předána.
- 18.10 Jakékoli nároky Smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za datum uplatnění nároku zaslání dopisem platí datum razítka podacího poštovního úřadu. Datum uplatnění nároku zaslání do datové schránky se řídí příslušným právním předpisem.

- 18.11 Je-li anebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nicotným, nevymahatelným či neúčinným, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost, nicotnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost jiného ustanovení této smlouvy za předpokladu, že je toto ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Strany se zavazují neplatné, nicotné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení této Smlouvy nahradit ustanovením svým obsahem a účelem nejbližším takovému neplatnému, nicotnému, nevymahatelnému nebo neúčinnému ustanovení. Do doby nahrazení podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.
- 18.12 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech neveřejného charakteru, o kterých se v rámci plnění díla o druhé Smluvní straně dozvěděly. Smluvní strany se zavazují nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků či jinak informace, na jejichž utajení má dotčená Smluvní strana zájem a které jakkoli souvisí s plněním díla. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zajistit plnění této povinnosti i stran všech subdodavatelů.
- 18.13 Smlouva je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
- 18.14 Nedílnou součástí Smlouvy jsou 4. přílohy:
- č. 1 Místo zhotovení díla a stavební připravenost
 - č. 2 Dílo
 - č. 3 Splátkový kalendář
 - č. 4 Projektová dokumentace
 - č. 5 Stavební připravenost

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 18.15 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
- 18.16 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 25. 8. 2025 číslem usnesení 374 b/.

[PODPISY NÁSLEDUJÍ ZA PŘÍLOHAMÍ]

PŘÍLOHA Č. 1 MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA

Bytové domy na adrese: A. Lidmilové 505, Polička 572 01


Dodávka kuchyní vč. spotřebičů a dalšího nábytku do bytových jednotek č.: [A11, A12, A21, A31, A32]

PŘÍLOHA Č. 2 DÍLO


Dílo


Dodávka materiálu včetně s tím souvisejících montážních prací v místě provádění díla tj. kuchyně vč. spotřebičů, do 5 ti bytů do bytového domu na adrese: A. Lidmilové 505, Polička - 572 01

o rozsahu blíže specifikovaných v níže uvedeném položkovém ceníku:

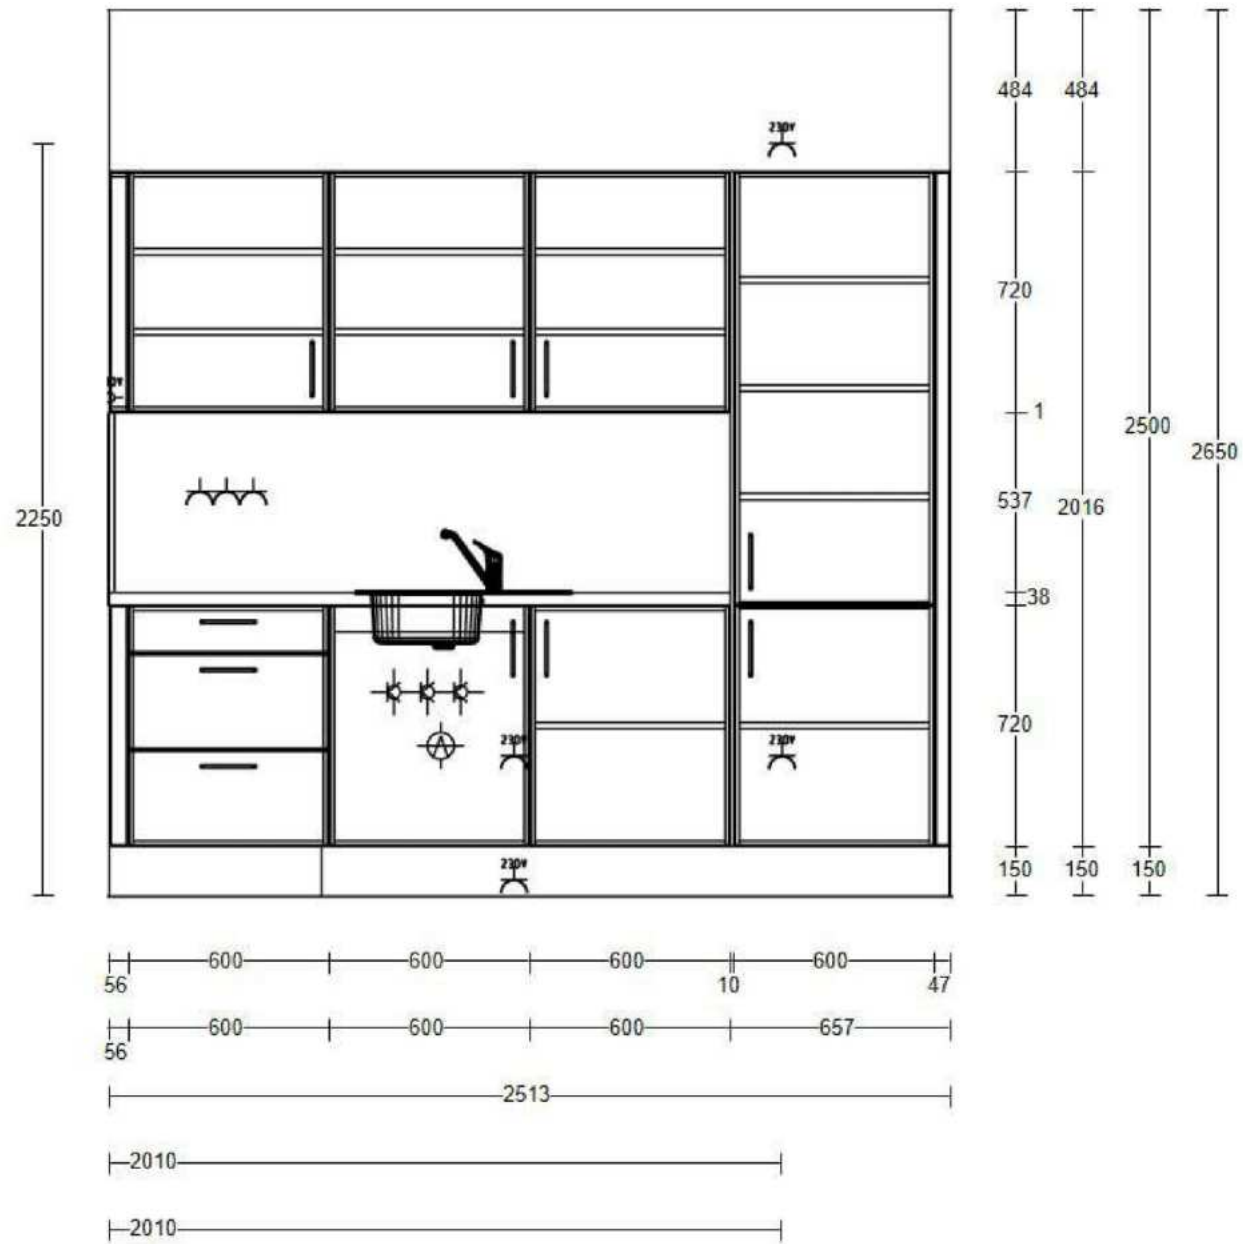



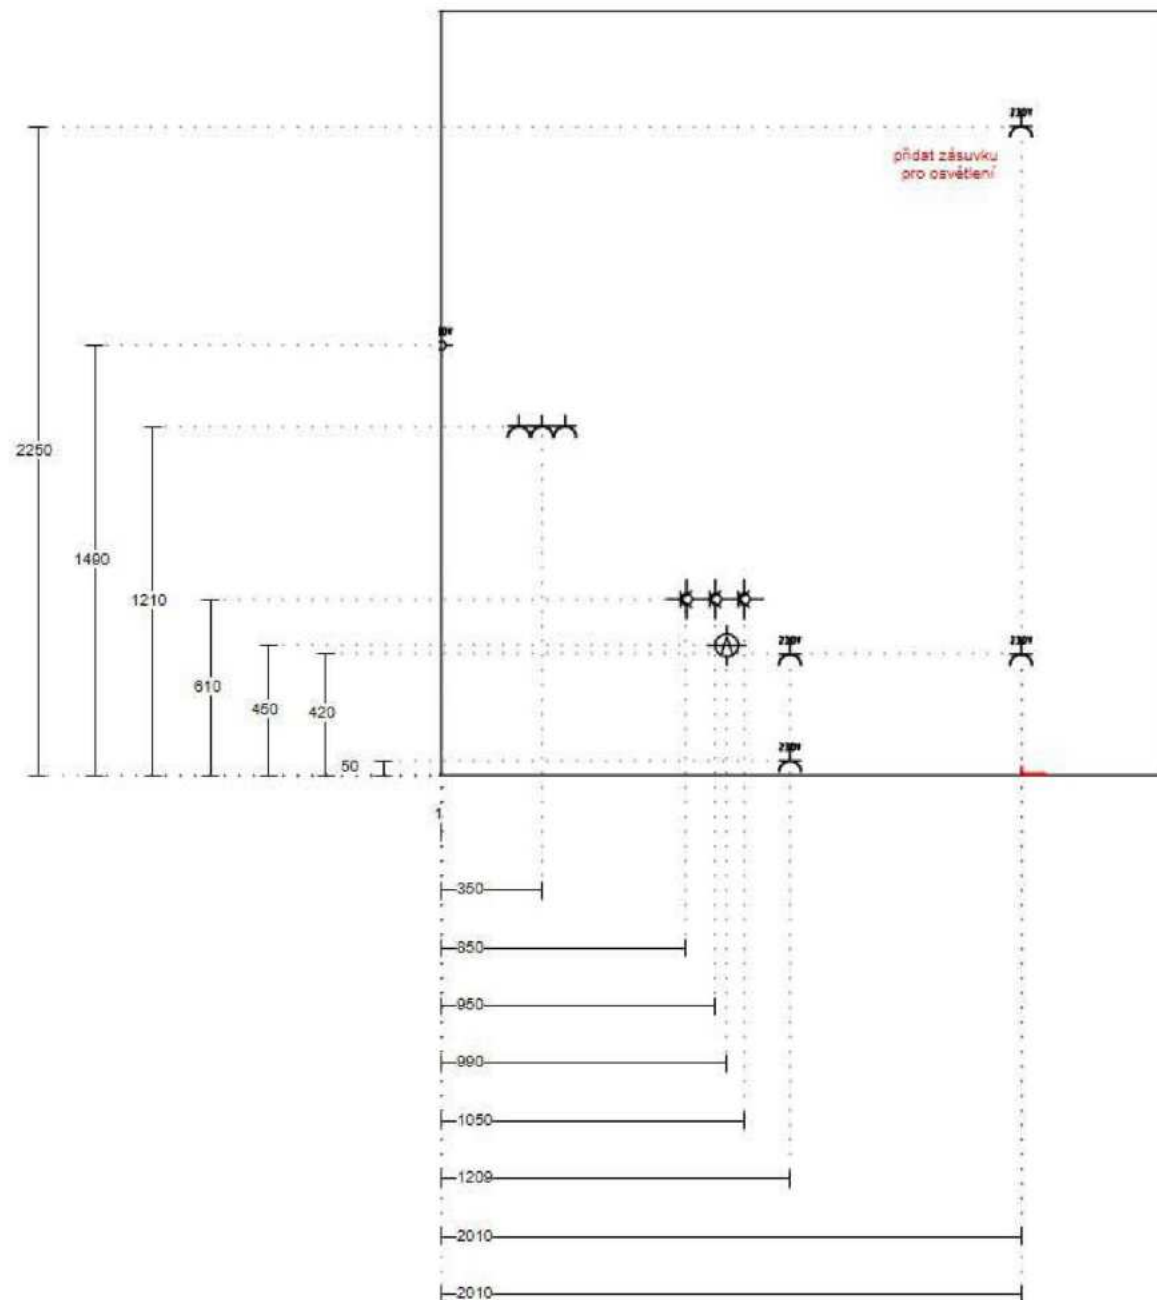

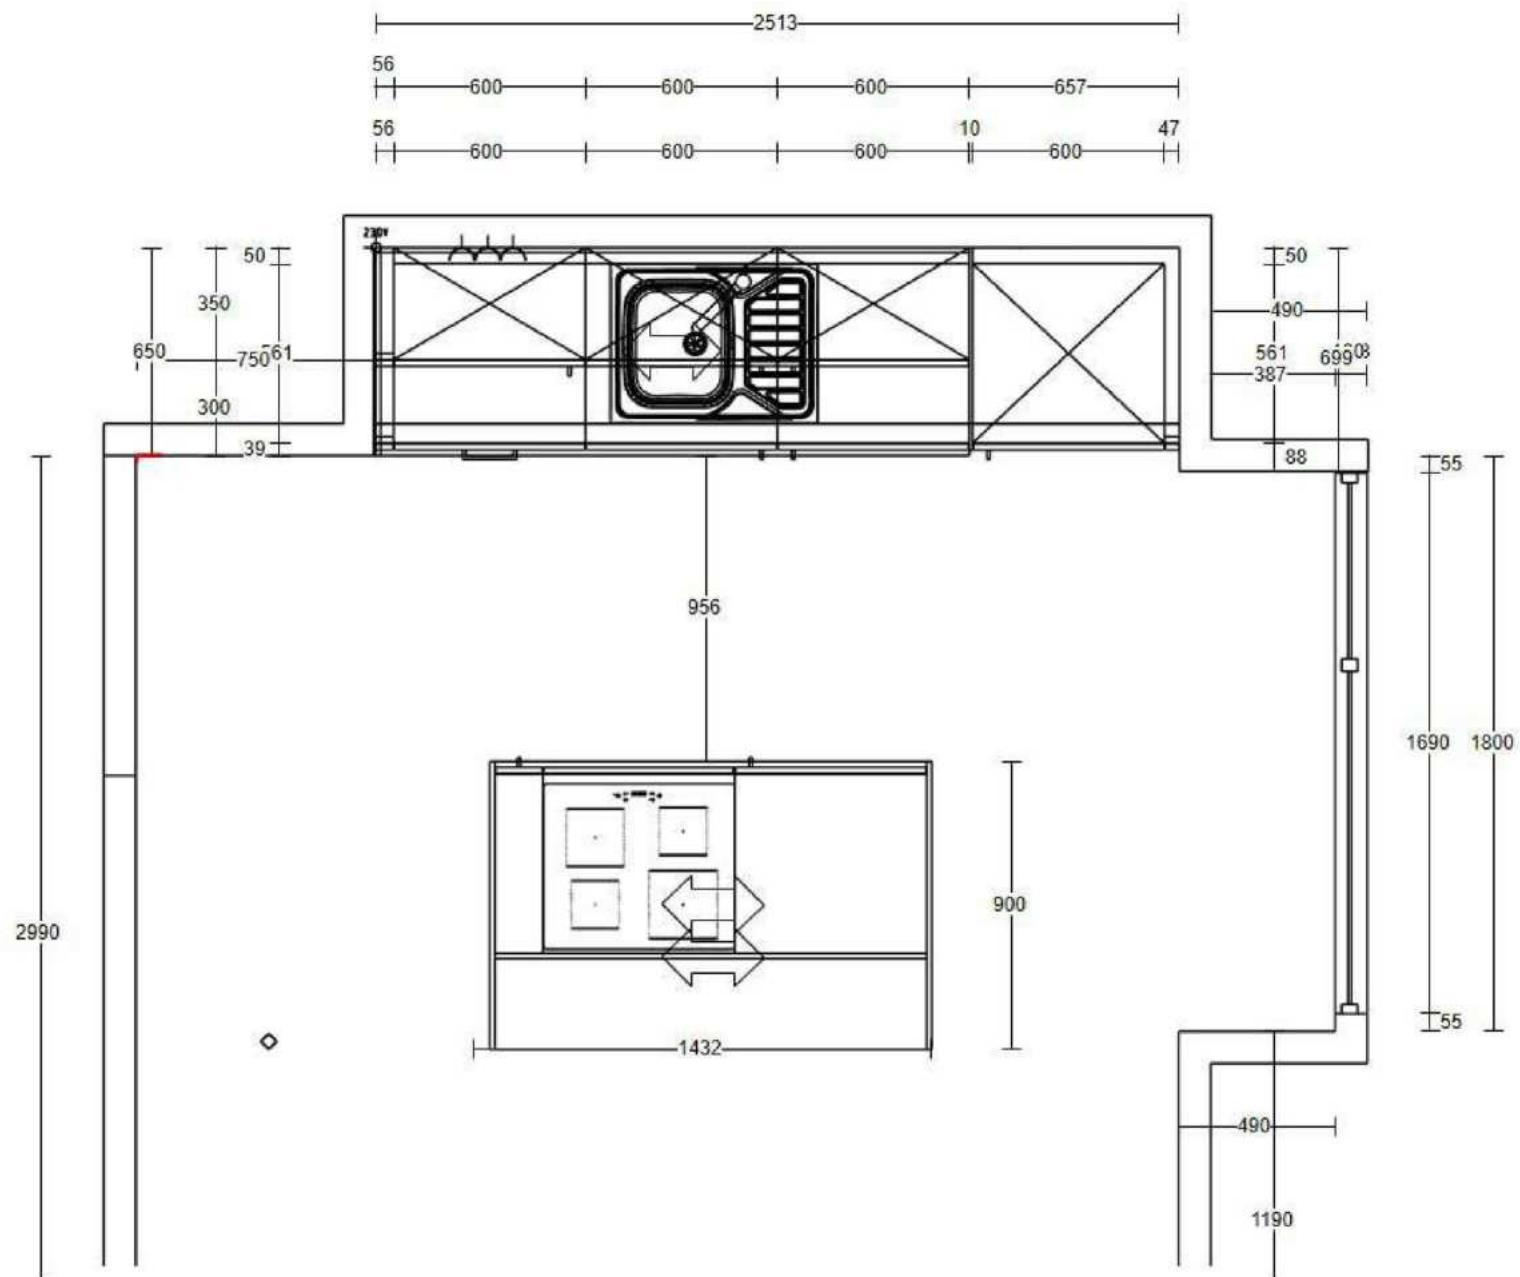



Dodavatel

SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9, Kyje

IČ: 26065801
DIČ: CZ699005837

Pobočka

SIKO Čimelice
Tel.: +420 222300400
E-mail: shop@siko.cz
Banka: Československá obchodní banka, a.s.
712711863/0300

O stavu Vaší zakázky se můžete informovat na <http://www.siko.cz/zakazka>

Odběratel

Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička

IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177

45477

Datum vystavení: 25.7.2025
Datum splatnosti: 25.7.2025
Platí od: 25.7.2025
Platí do: 25.7.2026
Forma úhrady: Hotově (k datu faktury)
Č. objednávky: A11 var.2


Č.zboží	Název	Množství MJ	Ceník.cena s DPH	Cena DPH bez DPH	%	Cena s DPH	Celkem DPH
	STV GROUP a.s._2838_Byt - A.11 - var - 2				0		
KLISA	Kuchyně Living,LAMINÁT MAT DEKOR	1,000 KS	100 883,00	54 492,42	0	54 492,42	54 492,42
MONKUCHYNE	Montáž kuchyně	3,900 M	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	9 360,00
SOUVSLUZ1	Související služby 1	1,000 KS	2 902,00	2 902,00	2 902,00		2 902,00
KUCHZAMERENI	Zaměření kuchyně	1,000 KS	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
DOPRAVAKUCH	Doprava Kuchyně	1,000 KS	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00
BALMON	Balíček příslušenství k montáži kuchyně		599,00	495,06	0	495,06	495,06
1325.00	FRANKE sifon 6/4" s odbočkou na myčku	1,000 KS					
CS7	CS7 tmel akryl bílý 280ml	1,000 KS					
CS9	CS9 silikon san. 280ml transparent	1,000 KS					
MANZ4050	Manžeta gum.40/50	1,000 KS					
T6430MF38CR	T 64/300 MF 3/8x3/8 NEREZ	2,000 KS					
CT40500	HTEM trubka 40-500	1,000 KS					
CK44000	HTB koleno 40/45	1,000 KS					
CK48000	HTB koleno 40/87	1,000 KS					
PATTEXOFA	lepidlo montážní All For One bílá, 440 g spotřebiče	2,000 KS	189,00	156,20	0	156,20	312,40
VT231GX	23 MORA vestavná trouba	1,000 KS	4 990,00	4 123,97	0	4 123,97	4 123,97
HII64400MT	20 Indukční deska	1,000 KS	4 849,00	4 252,89	0	4 252,89	4 252,89
SIKOBSLPRO282	dřezová baterie stojánková páková	1,000 KS	499,00	412,40	0	412,40	412,40
KEVIN116SATIN	Dřez Quadron KEVIN116 satin	1,000 KS	1 065,00	880,17	0	880,17	880,17
OO963X	26 Gorenje Ostrůvkový odsavač par 90cm, osvětlení	1,000 KS	11 990,00	9 909,09	0	9 909,09	9 909,09
ML03	LED světlo 16W,délka 100cm 4000K 24V	1,000 KS	2 064,00	1 705,79	0	1 705,79	1 705,79
ML023	Dotykový stmívač	1,000 KS	201,00	166,12	166,12		166,12
ML032	Napájecí zdroj 24V, 24 W	1,000 KS	601,00	496,69	496,69		496,69


UŠETŘILI JSTE


Celkem před slevou	122 891,00
Typ slevy	Sleva
Zákaznická sleva (H)	28 882,00
Sleva celkem	28 882,00

DPH 0 % ze základu 94 009,00 0,00
Celkem k úhradě CZK 94 009,00

Vystavil:
Pavel Žukovský

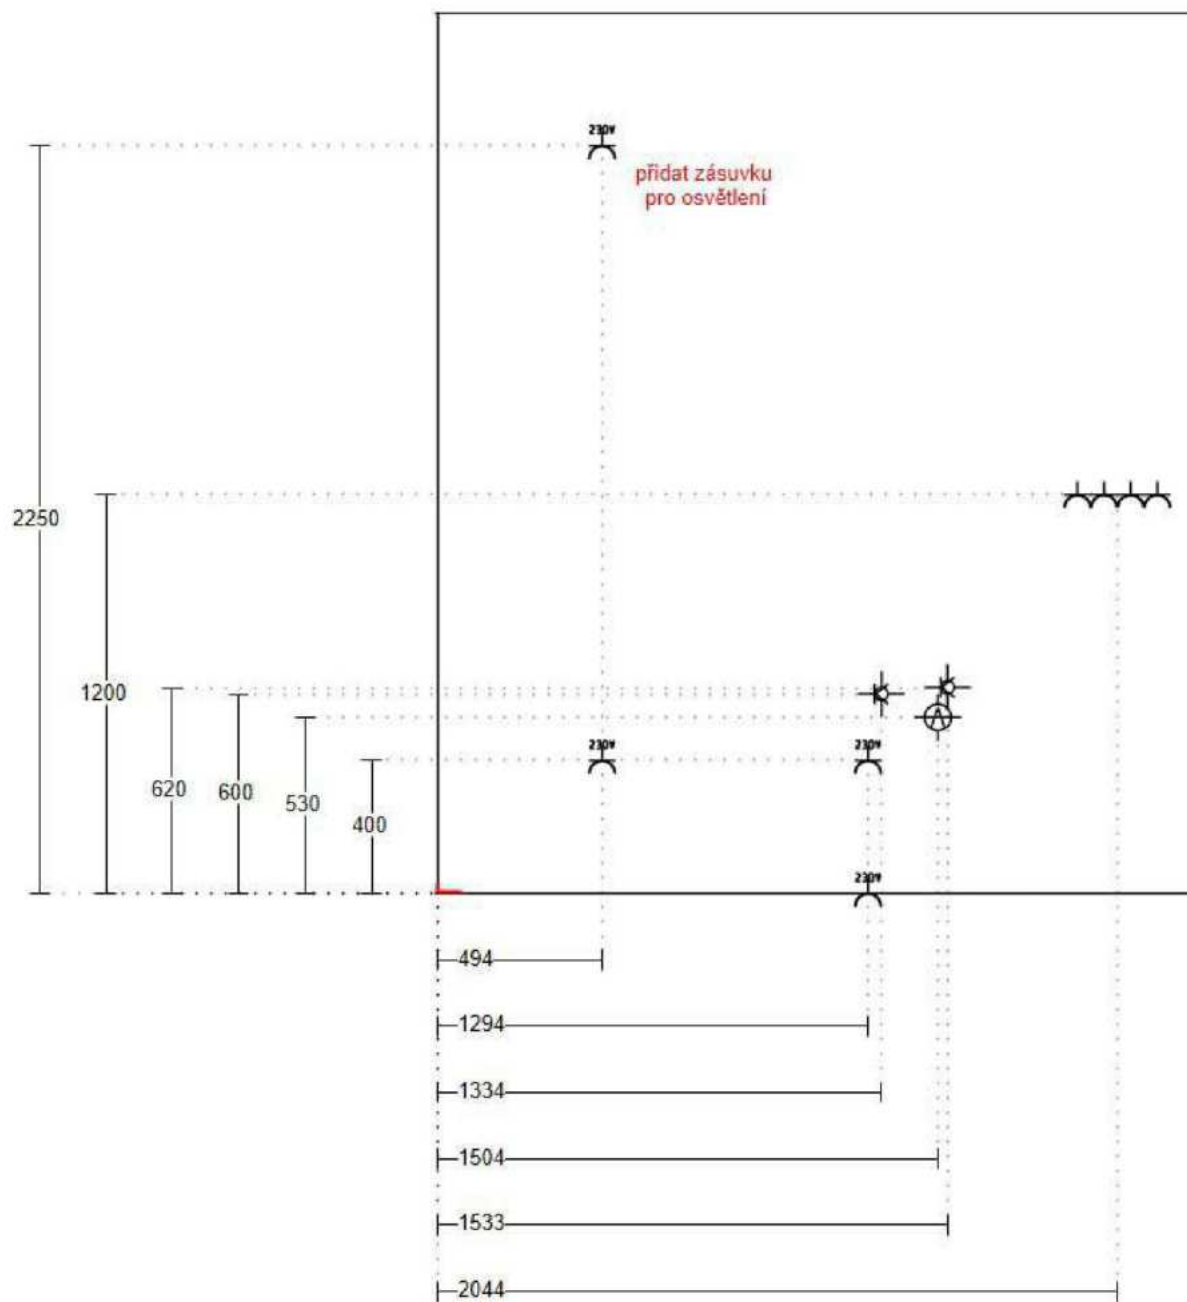

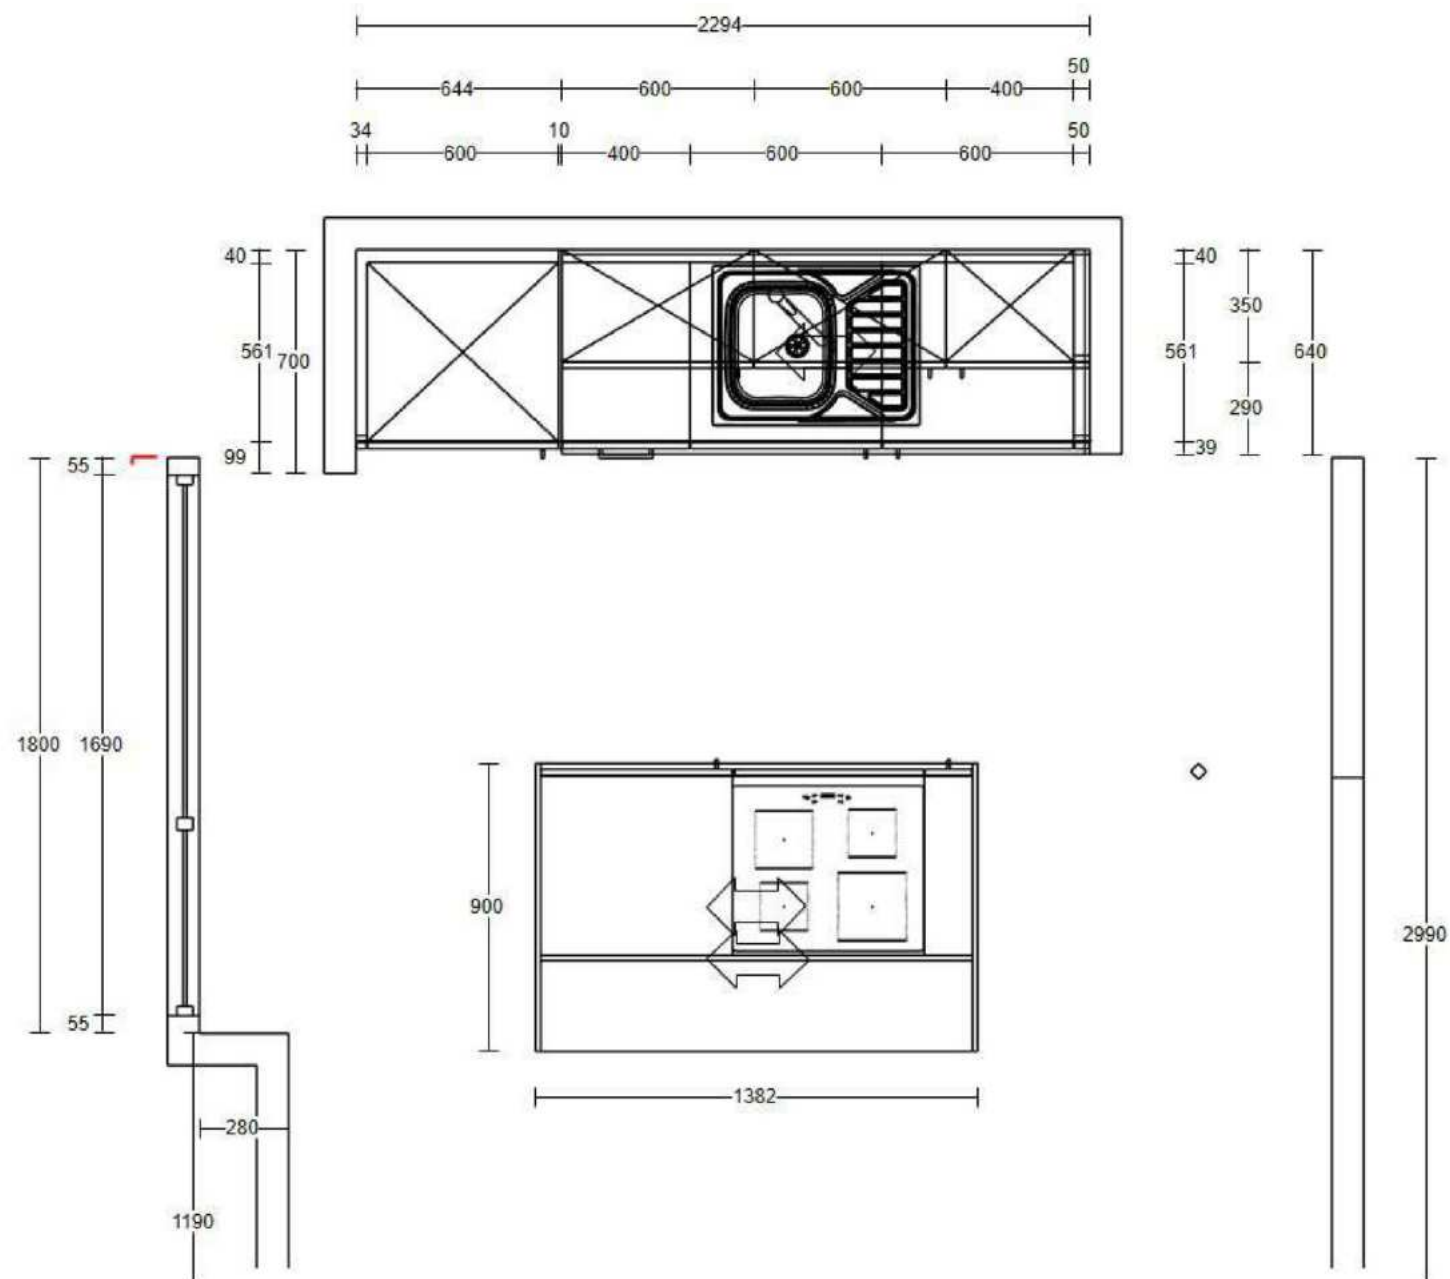

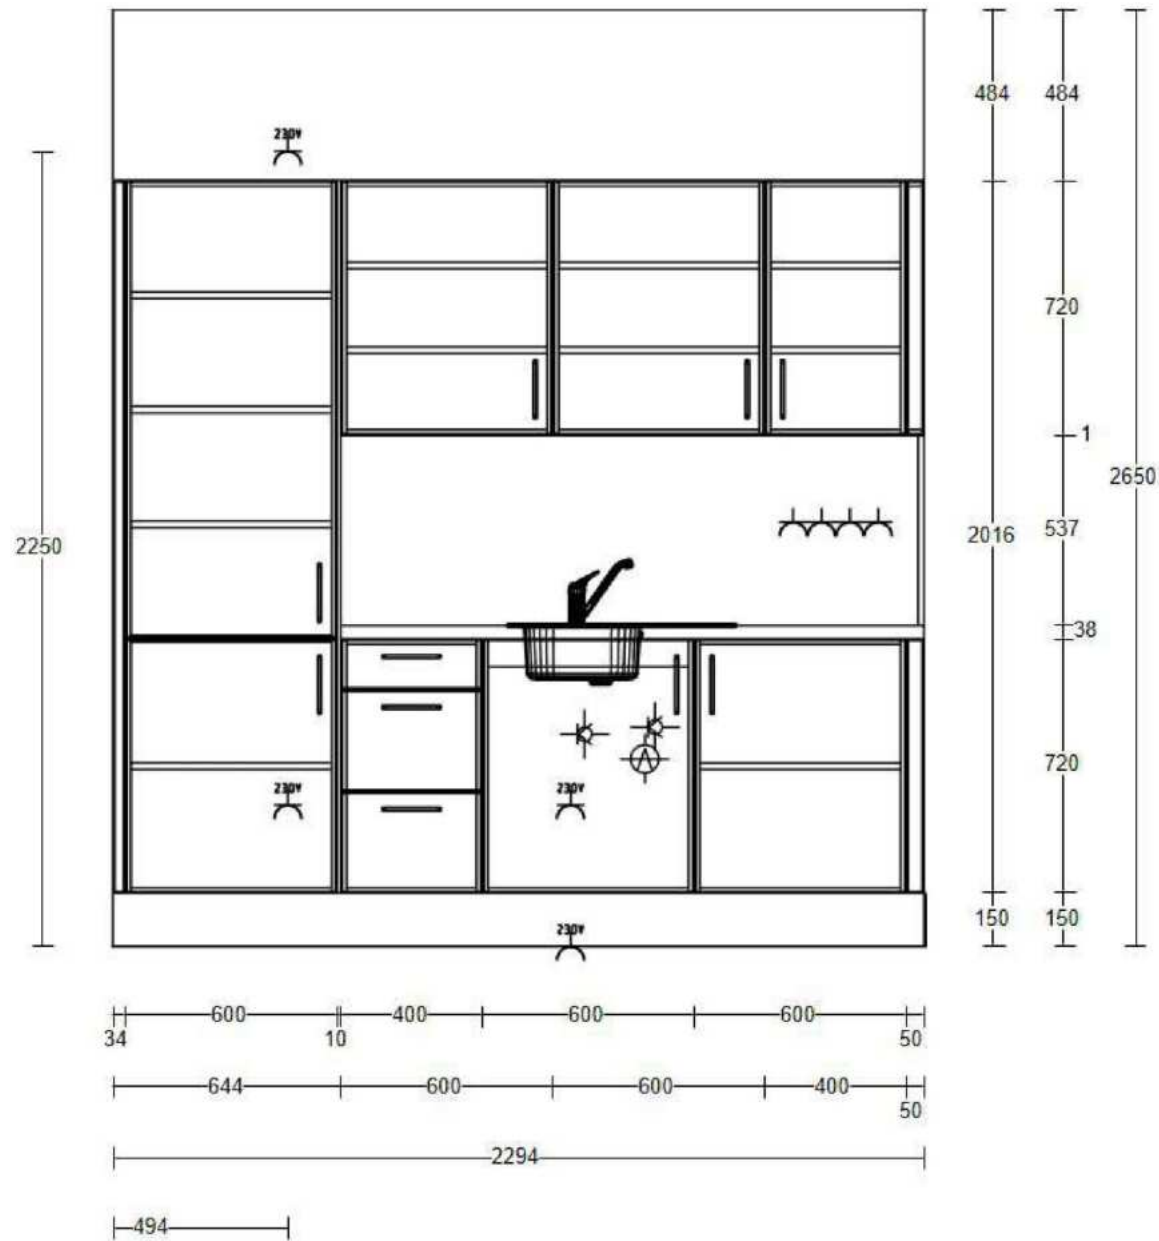





Dodavatel

SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9, Kyje

IČ: 26065801
DIČ: CZ699005837

Pobočka

SIKO Čimelice
Tel.: +420 222300400
E-mail: shop@siko.cz
Banka: Československá obchodní banka, a.s.
712711863/0300

O stavu Vaší zakázky se můžete informovat na <http://www.siko.cz/zakazka>

Odběratel

Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička

IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177

45477

Datum vystavení: 25.7.2025
Datum splatnosti: 25.7.2025
Platí od: 25.7.2025
Platí do: 25.7.2026
Forma úhrady: Hotově (k datu faktury)
Č. objednávky: A12 var.2


Č.zboží	Název	Množství MJ	Ceník.cena s DPH	Cena DPH bez DPH	%	Cena s DPH	Celkem DPH
	STV GROUP a.s._2842_Byt - A.12 - var - 2				0		
KLISA	Kuchyně Living,LAMINÁT MAT DEKOR	1,000 KS	98 365,00	53 073,43	0	53 073,43	53 073,43
MONKUCHYNE	Montáž kuchyně	3,700 M	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	8 880,00
SOUVSLUZ1	Související služby 1	1,000 KS	2 902,00	2 902,00	2 902,00		2 902,00
KUCHZAMERENI	Zaměření kuchyně	1,000 KS	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
DOPRAVAKUCH	Doprava Kuchyně	1,000 KS	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00
BALMON	Balíček příslušenství k montáži kuchyně		599,00	495,04	0	495,04	495,04
1325.00	FRANKE sifon 6/4" s odbočkou na myčku	1,000 KS					
CS7	CS7 tmel akryl bílý 280ml	1,000 KS					
CS9	CS9 silikon san. 280ml transparent	1,000 KS					
MANZ4050	Manžeta gum.40/50	1,000 KS					
T6430MF38CR	T 64/300 MF 3/8x3/8 NEREZ	2,000 KS					
CT40500	HTEM trubka 40-500	1,000 KS					
CK44000	HTB koleno 40/45	1,000 KS					
CK48000	HTB koleno 40/87	1,000 KS					
PATTEXOFA	lepidlo montážní All For One bílá, 440 g spotřebiče	2,000 KS	189,00	156,20	0	156,20	312,40
VT231GX	23 MORA vestavná trouba	1,000 KS	4 990,00	4 123,97	0	4 123,97	4 123,97
HII64400MT	20 Indukční deska	1,000 KS	4 849,00	4 252,89	0	4 252,89	4 252,89
SIKOBSLPRO282	dřezová baterie stojánková páková	1,000 KS	499,00	412,40	0	412,40	412,40
KEVIN116SATIN	Dřez Quadron KEVIN116 satin	1,000 KS	1 065,00	880,17	0	880,17	880,17
OO963X	26 Gorenje Ostrůvkový odsavač par 90cm, osvětlení	1,000 KS	11 990,00	9 909,10	0	9 909,10	9 909,10
ML03	LED světlo 16W,délka 100cm 4000K 24V	1,000 KS	2 064,00	1 705,79	0	1 705,79	1 705,79
ML023	Dotykový stmívač	1,000 KS	201,00	166,12	166,12		166,12
ML032	Napájecí zdroj 24V, 24 W	1,000 KS	601,00	496,69	496,69		496,69

UŠETŘILI JSTE


Celkem před slevou	120 330,00
Typ slevy	Sleva
Zákaznická sleva (H)	28 220,00
Sleva celkem	28 220,00


DPH 0 % ze základu 92 110,00 0,00
Celkem k úhradě CZK 92 110,00

Vystavil:
Pavel Žukovský

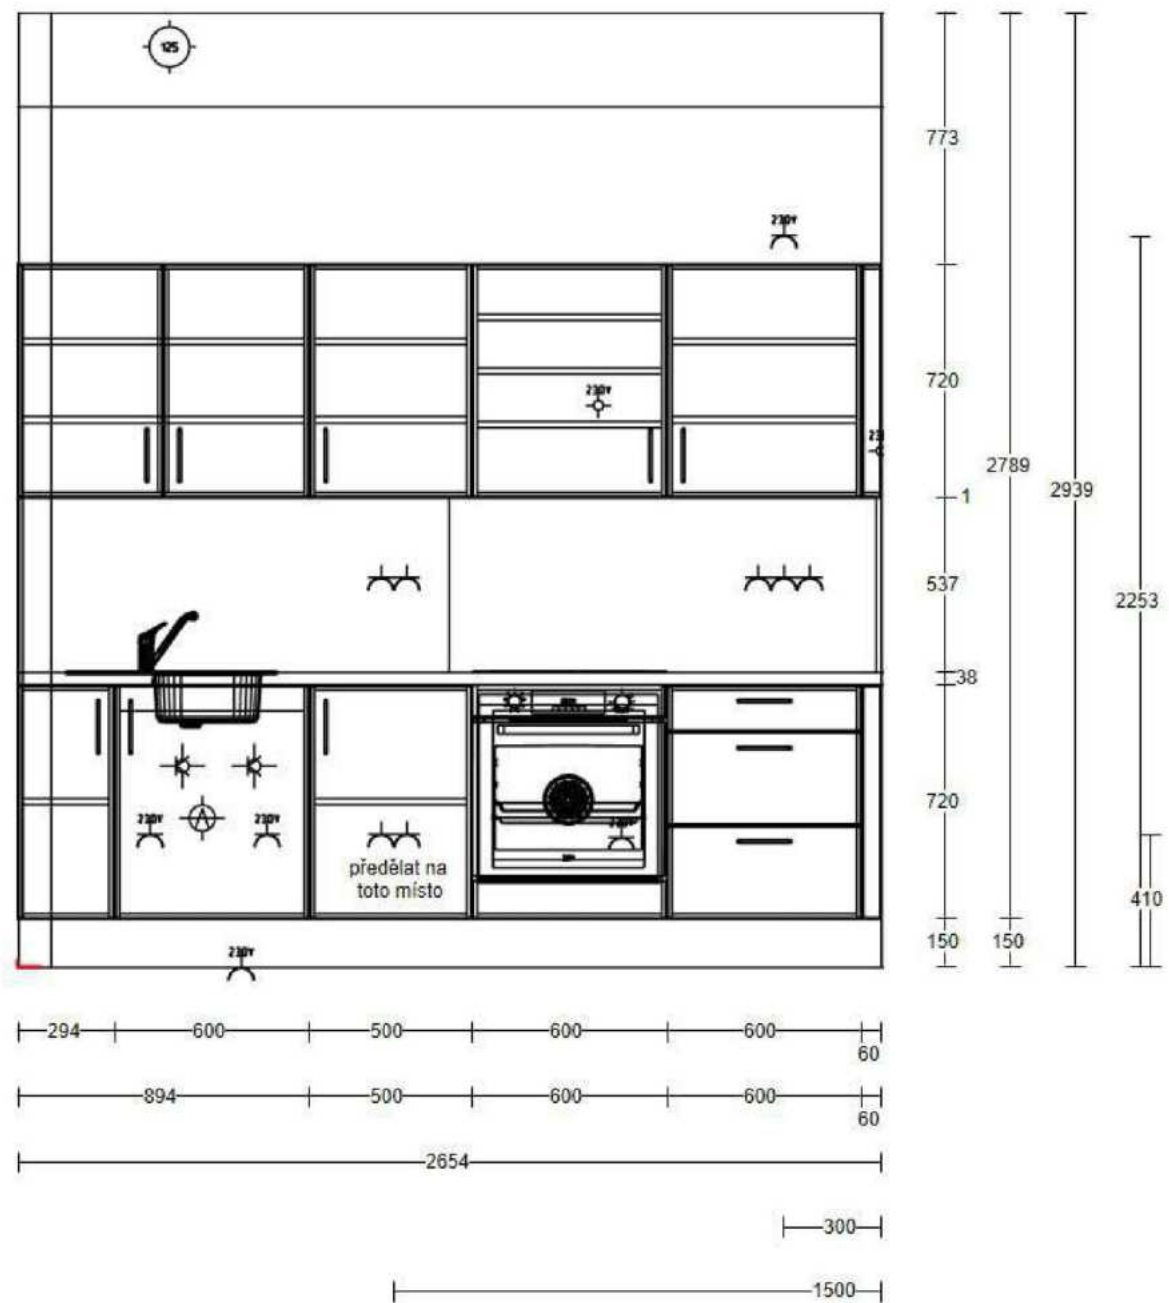



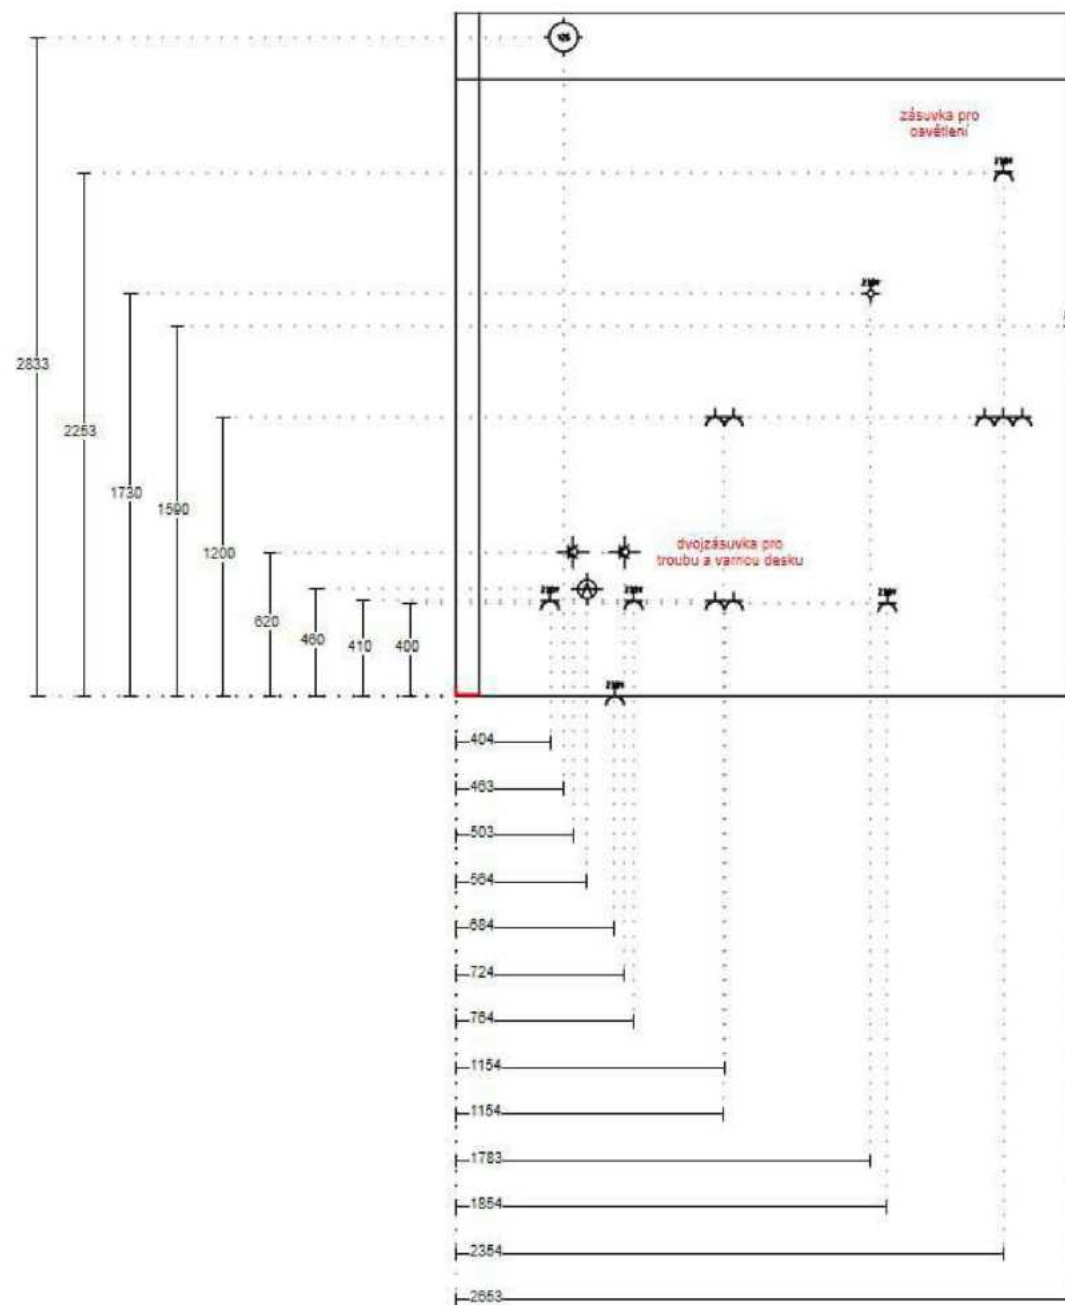

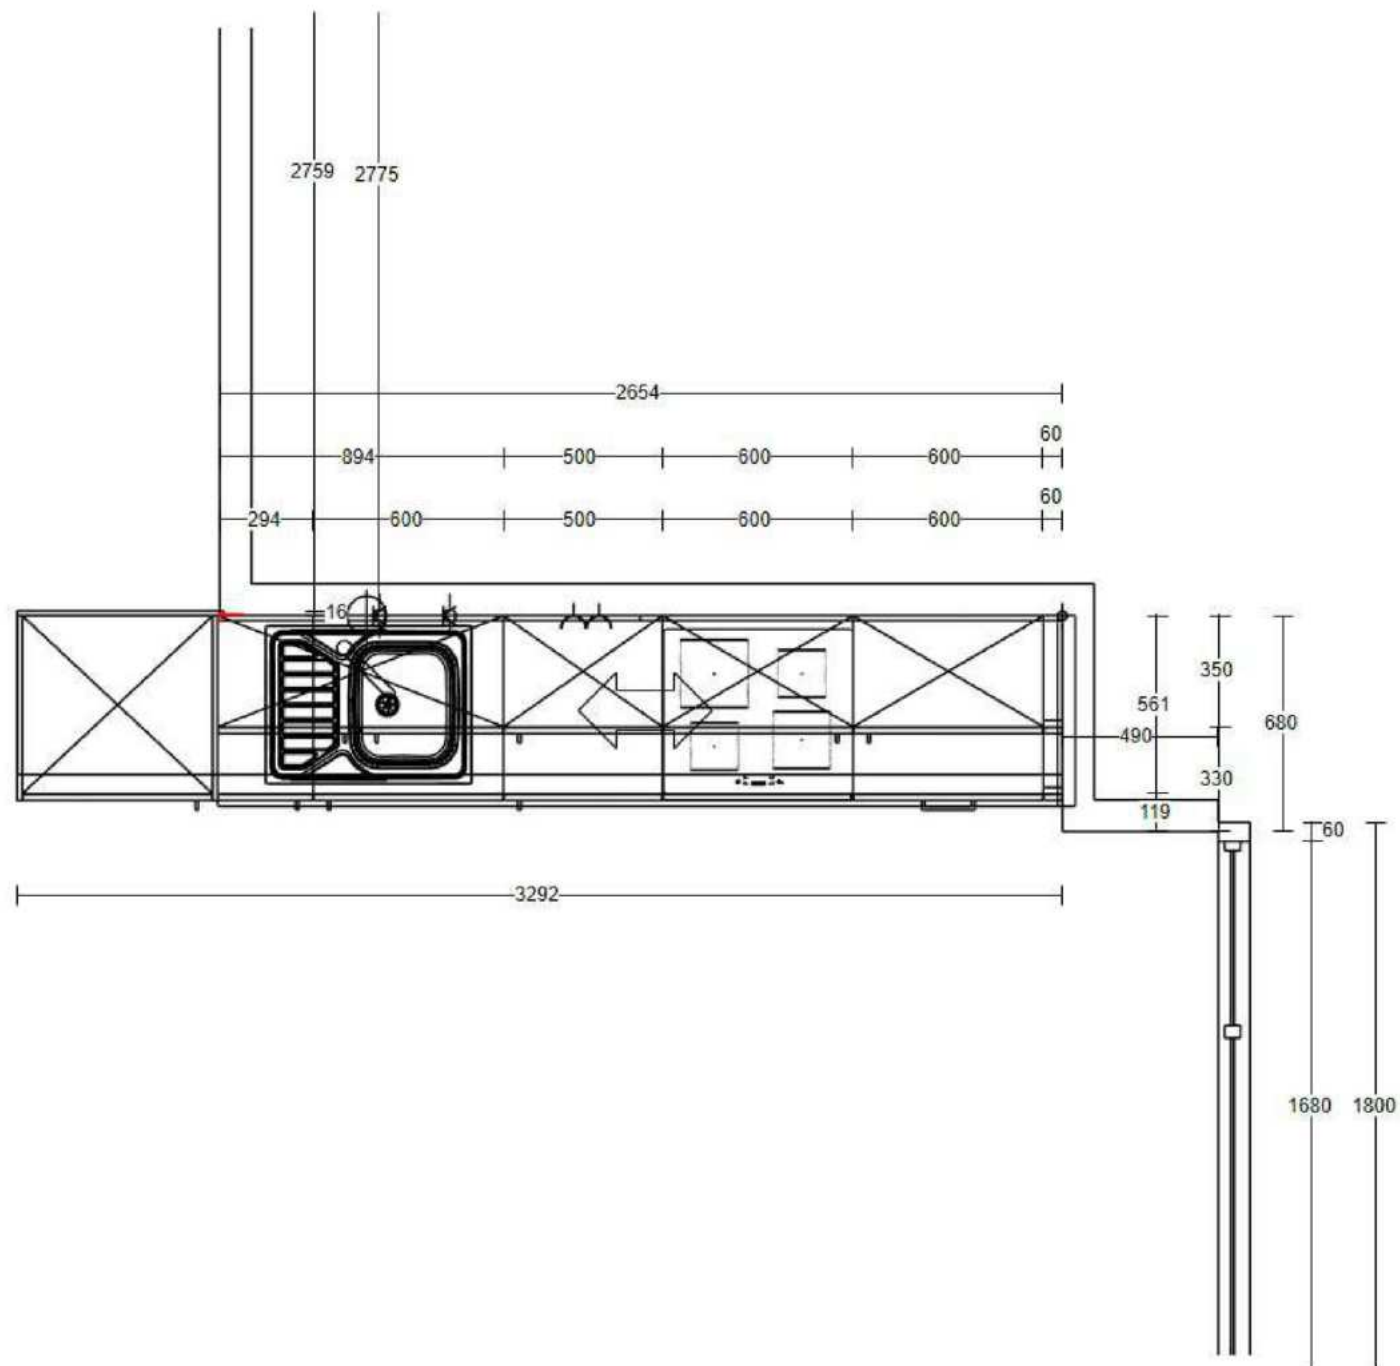

**Dodavatel**

SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9, Kyje

IČ: 26065801
DIČ: CZ699005837

Pobočka

SIKO Čimelice
Tel.: +420 222300400
E-mail: shop@siko.cz
Banka: Československá obchodní banka, a.s.
712711863/0300

O stavu Vaší zakázky se můžete informovat na <http://www.siko.cz/zakazka>

Odběratel

45477

Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička

IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177

Datum vystavení: 25.7.2025
Datum splatnosti: 25.7.2025
Platí od: 25.7.2025
Platí do: 25.7.2026
Forma úhrady: Hotově (k datu faktury)
Č. objednávky: A21 var.2


Č.zboží	Název	Množství MJ	Ceník.cena s DPH	Cena DPH bez DPH	%	Cena s DPH	Celkem DPH
	STV GROUP a.s._2839_Byt - A.21 - var - 2				0		
KLISA	Kuchyně Living,LAMINÁT MAT DEKOR	1,000 KS	94 030,00	50 278,97	0	50 278,97	50 278,97
MONKUCHYNE	Montáž kuchyně	3,300 M	2 400,01	2 400,01	0	2 400,01	7 920,03
SOUVSLUZ1	Související služby 1	1,000 KS	2 902,01	2 902,01	2 902,01		2 902,01
KUCHZAMERENI	Zaměření kuchyně	1,000 KS	1 500,01	1 500,01	0	1 500,01	1 500,01
DOPRAVAKUCH	Doprava Kuchyně	1,000 KS	3 000,01	3 000,01	0	3 000,01	3 000,01
BALMON	Balíček příslušenství k montáži kuchyně		599,00	495,04	0	495,04	495,04
1325.00	FRANKE sifon 6/4" s odbočkou na myčku	1,000 KS					
CS7	CS7 tmel akryl bílý 280ml	1,000 KS					
CS9	CS9 silikon san. 280ml transparent	1,000 KS					
MANZ4050	Manžeta gum.40/50	1,000 KS					
T6430MF38CR	T 64/300 MF 3/8x3/8 NEREZ	2,000 KS					
CT40500	HTEM trubka 40-500	1,000 KS					
CK44000	HTB koleno 40/45	1,000 KS					
CK48000	HTB koleno 40/87	1,000 KS					
PATTEXOFA	lepidlo montážní All For One bílá, 440 g	2,000 KS	189,00	156,20	0	156,20	312,40
ALFLX12525	33 vzduchové potrubí 250 cm, spotřebiče	1,000 KS	425,00	351,24	0	351,24	351,24
					0		
VT231GX	23 MORA vestavná trouba	1,000 KS	4 990,00	4 123,99	0	4 123,99	4 123,99
HII64400MT	20 Indukční deska	1,000 KS	4 849,00	4 252,91	0	4 252,91	4 252,91
DIN34320	19 Vestavná myčka 60 cm	1,000 KS	6 440,00	5 275,23	0	5 275,23	5 275,23
SIKOBSLPRO282	dřezová baterie stojánková páková	1,000 KS	499,00	412,40	0	412,40	412,40
PRF0142633	28 Elica digestoř ERA GR/A/52	1,000 KS	2 691,00	1 974,98	0	1 974,98	1 974,98
KEVIN116SATIN	Dřez Quadron KEVIN116 satin osvětlení	1,000 KS	1 065,00	880,17	0	880,17	880,17
					0		
ML03	LED světlo 16W,délka 100cm 4000K 24V	1,000 KS	2 064,00	1 705,80	0	1 705,80	1 705,80
ML023	Dotykový stmívač	1,000 KS	201,00	166,12	166,12		166,12
ML032	Napájecí zdroj 24V, 24 W	1,000 KS	601,00	496,69	496,69		496,69


UŠETŘILI JSTE	
Celkem před slevou	113 729,00
Typ slevy	Sleva
Zákaznická sleva (H)	27 681,00
Sleva celkem	27 681,00

DPH	0 % ze základu	86 048,00	0,00
Celkem k úhradě	CZK		86 048,00


Vystavil:
Pavel Žukovský


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9124

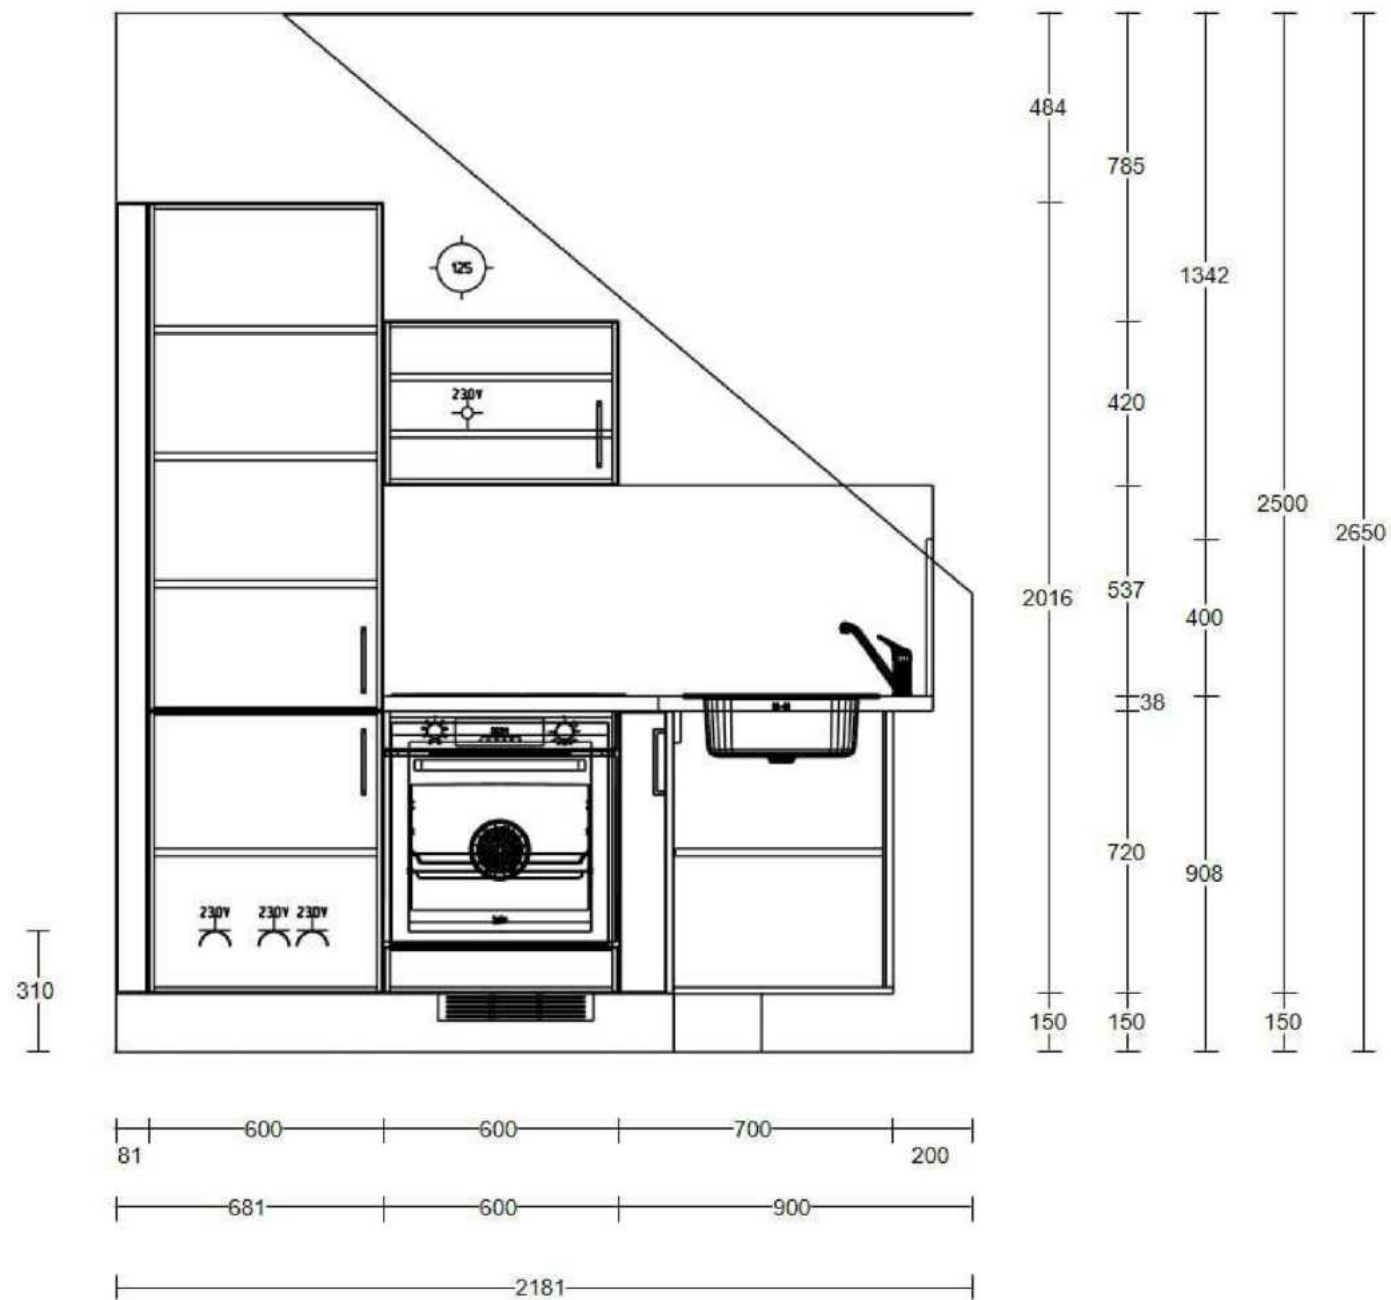

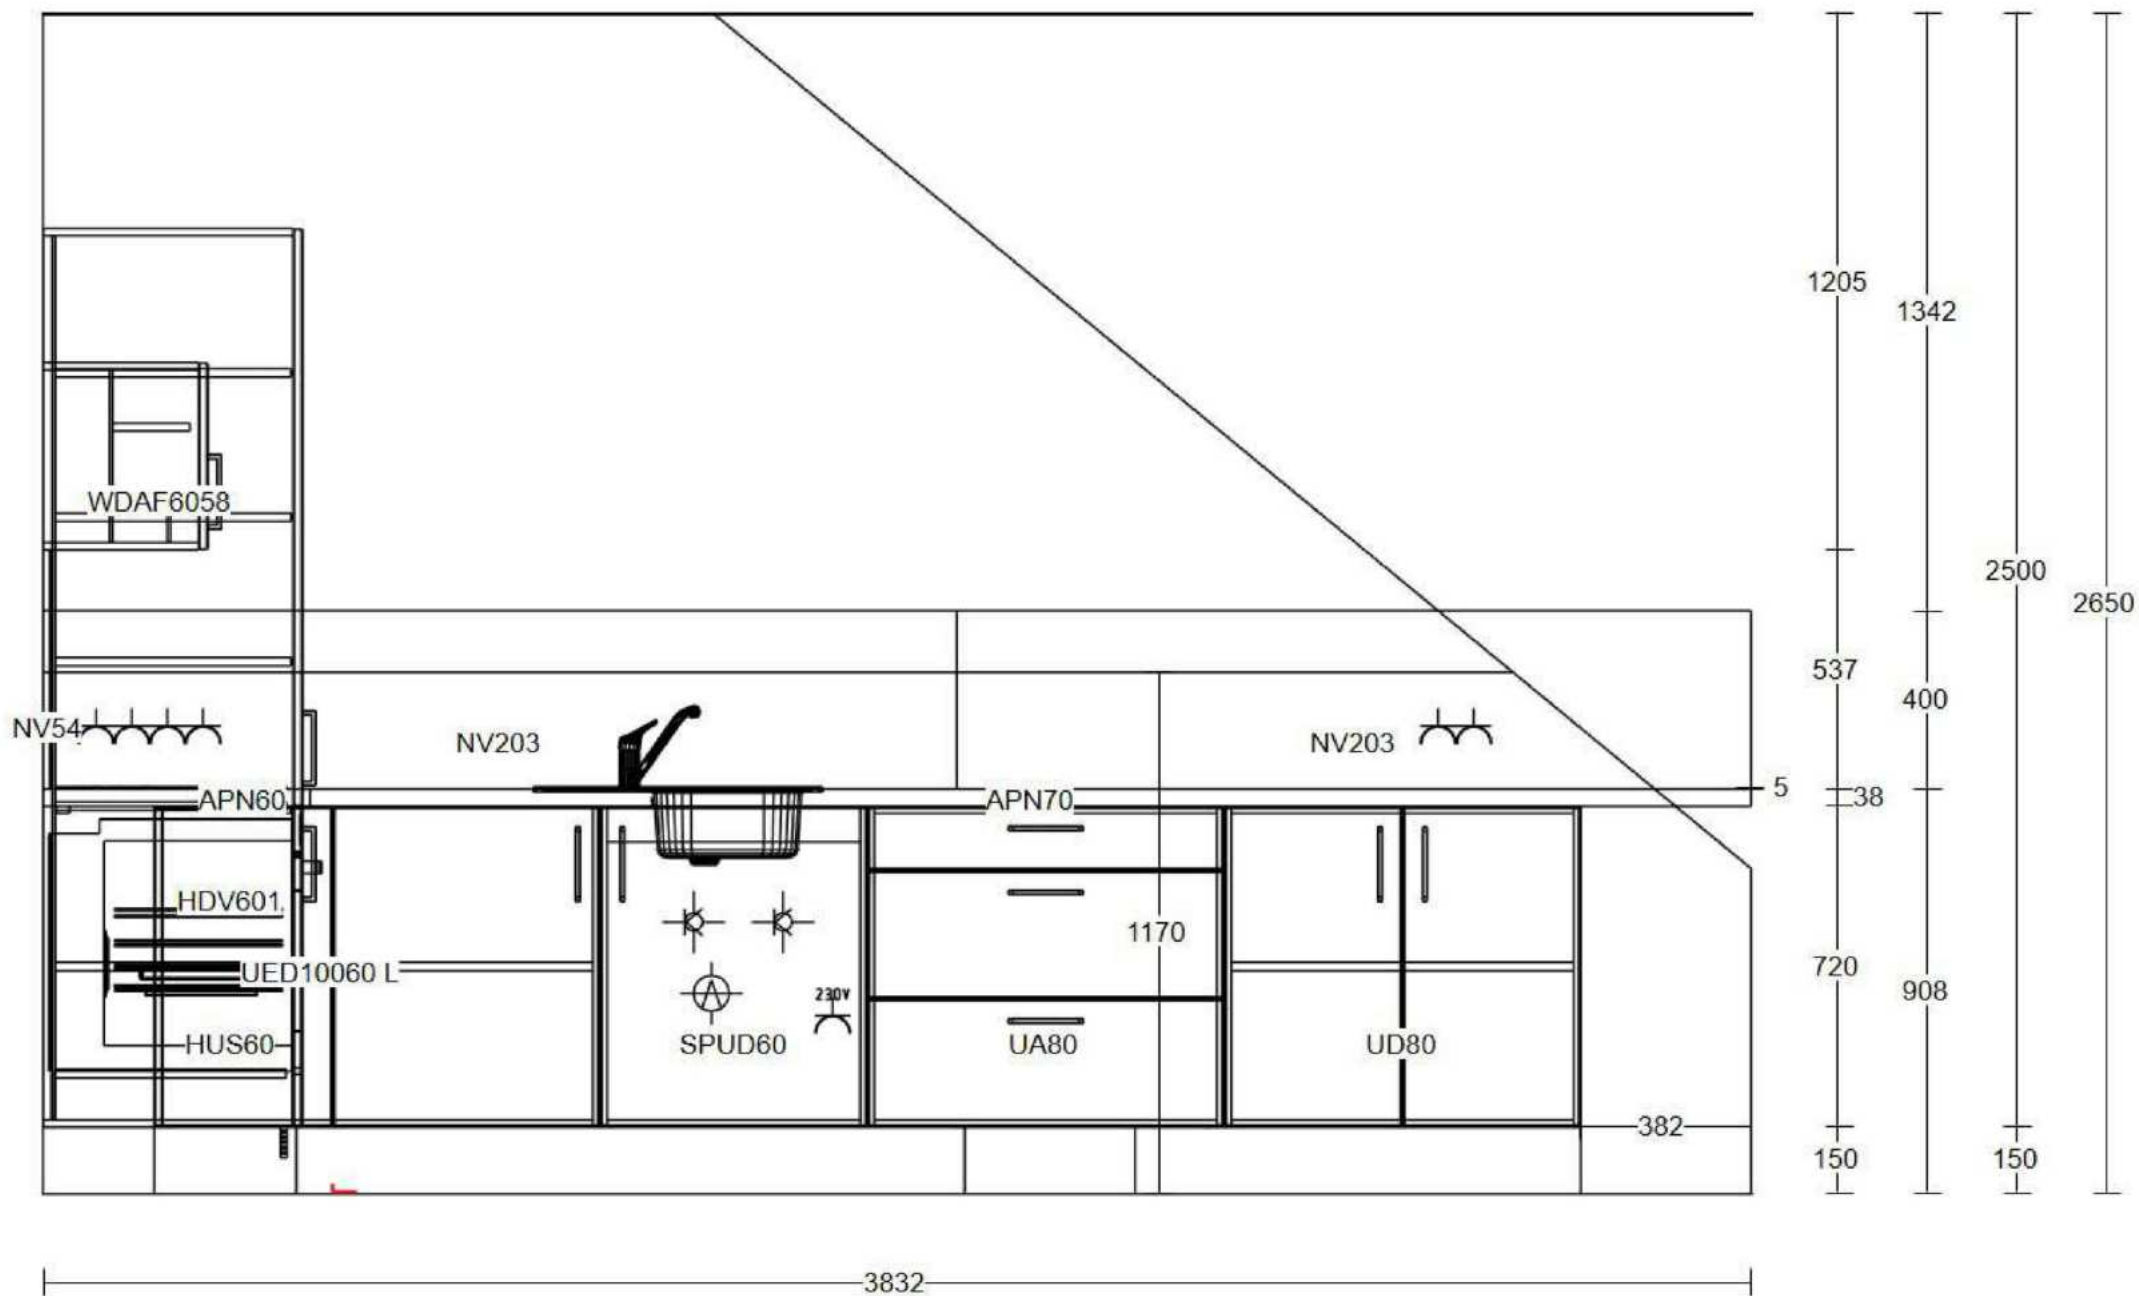



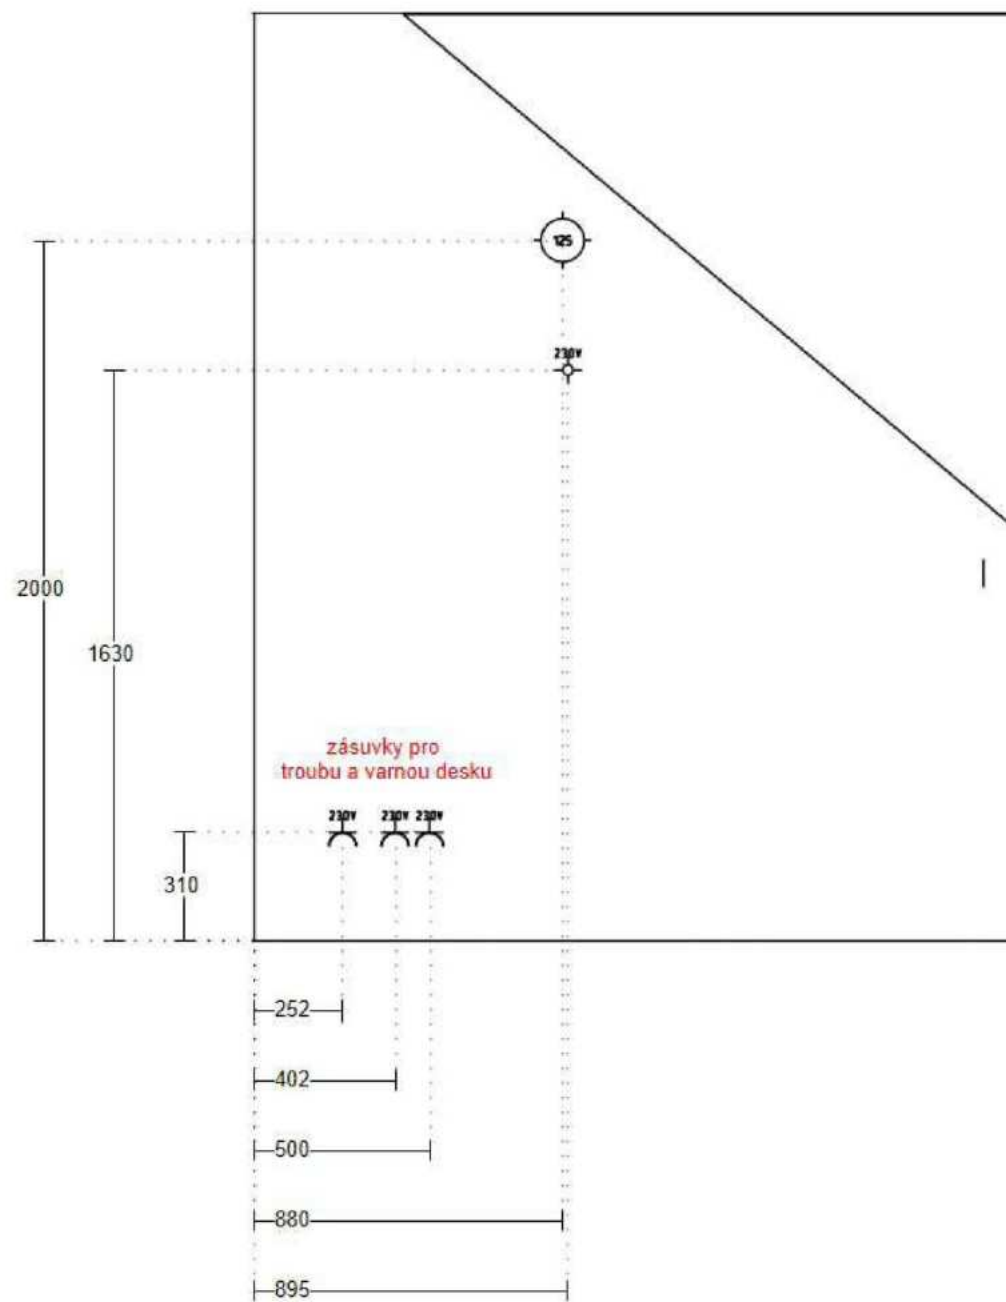

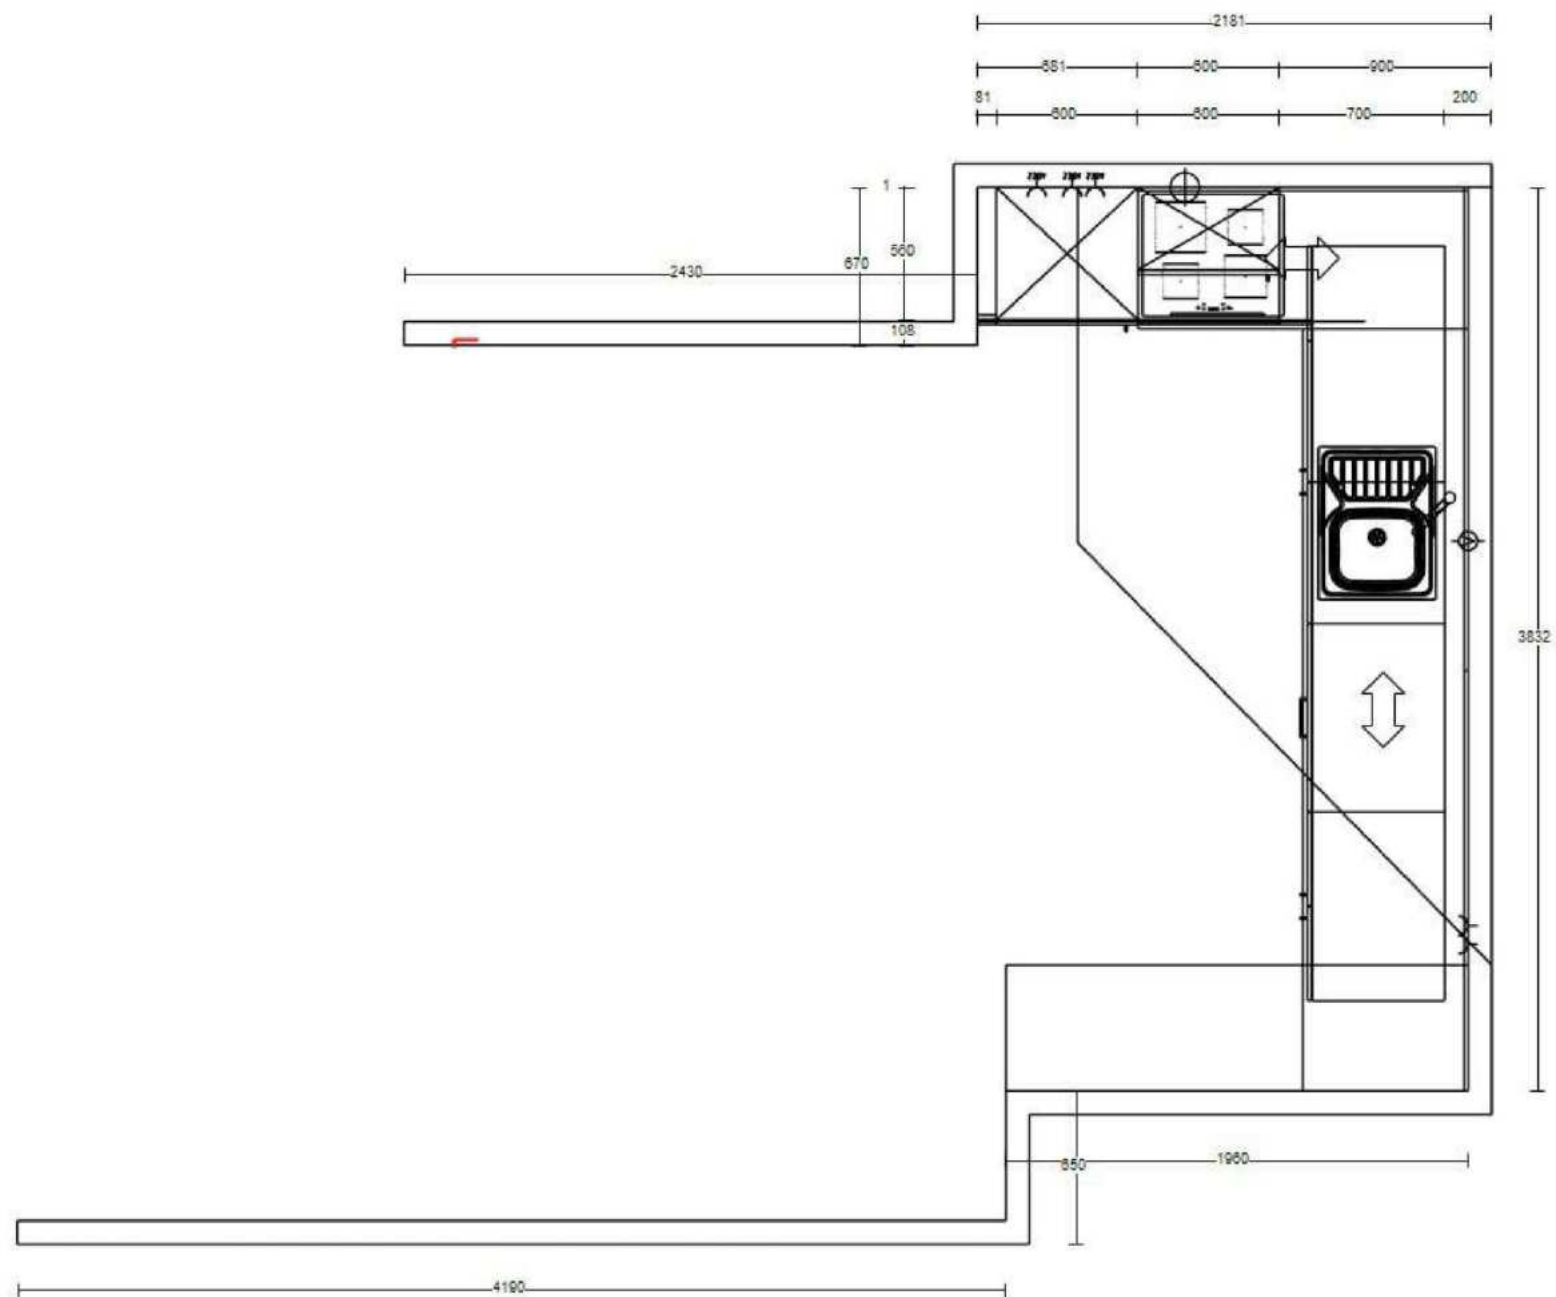



Dodavatel

SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9, Kyje

IČ: 26065801
DIČ: CZ699005837

Pobočka

SIKO Čimelice
Tel.: +420 222300400
E-mail: shop@siko.cz
Banka: Československá obchodní banka, a.s.
712711863/0300

O stavu Vaší zakázky se můžete informovat na <http://www.siko.cz/zakazka>

Odběratel

Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička

IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177

45477

Datum vystavení: 25.7.2025
Datum splatnosti: 25.7.2025
Platí od: 25.7.2025
Platí do: 25.7.2026
Forma úhrady: Hotově (k datu faktury)
Č. objednávky: A31 var.4


Č.zboží	Název	Množství MJ	Ceník.cena s DPH	Cena DPH bez DPH	Cena s DPH	Celkem DPH
	STV GROUP a.s._2884_Byt - A.31 - var 4				0	
KLISA	Kuchyně Living,LAMINÁT MAT DEKOR	1,000 KS	93 254,00	52 559,13	0	52 559,13
MONKUCHYNE	Montáž kuchyně	5 M	2 399,99	2 399,99	0	2 399,99
SOUVSLUZ1	Související služby 1	1,000 KS	2 901,98	2 901,98	2 901,98	2 901,98
KUCHZAMERENI	Zaměření kuchyně	1,000 KS	1 499,99	1 499,99	0	1 499,99
DOPRAVAKUCH	Doprava Kuchyně	1,000 KS	2 999,98	2 999,98	0	2 999,98
BALMON	Balíček příslušenství k montáži kuchyně		599,00	495,04	0	495,04
1325.00	FRANKE sifon 6/4" s odbočkou na myčku	1,000 KS				
CS7	CS7 tmel akryl bílý 280ml	1,000 KS				
CS9	CS9 silikon san. 280ml transparent	1,000 KS				
MANZ4050	Manžeta gum.40/50	1,000 KS				
T6430MF38CR	T 64/300 MF 3/8x3/8 NEREZ	2,000 KS				
CT40500	HTEM trubka 40-500	1,000 KS				
CK44000	HTB koleno 40/45	1,000 KS				
CK48000	HTB koleno 40/87	1,000 KS				
PATTEXOFA	lepidlo montážní All For One bílá, 440 g	3,000 KS	189,00	156,20	0	156,20
	spotřebiče				0	
VT231GX	23 MORA vestavná trouba	1,000 KS	4 990,00	4 123,95	0	4 123,95
HII64400MT	20 Indukční deska	1,000 KS	4 849,00	4 252,87	0	4 252,87
SIKOBSLPRO282	dřezová baterie stojánková páková	1,000 KS	499,00	412,40	0	412,40
PRF0142633	28 Elica digestoř ERA GR/A/52	1,000 KS	2 691,00	1 974,96	0	1 974,96
KEVIN116SATIN	Dřez Quadron KEVIN116 satin	1,000 KS	1 065,00	880,17	0	880,17


UŠETŘILI JSTE

Celkem před slevou	109 328,00
Typ slevy	Sleva
Zákaznická sleva (H)	24 759,00
Sleva celkem	24 759,00


DPH 0 % ze základu 84 569,00 0,00
Celkem k úhradě CZK 84 569,00


Vystavil:
Pavel Žukovský

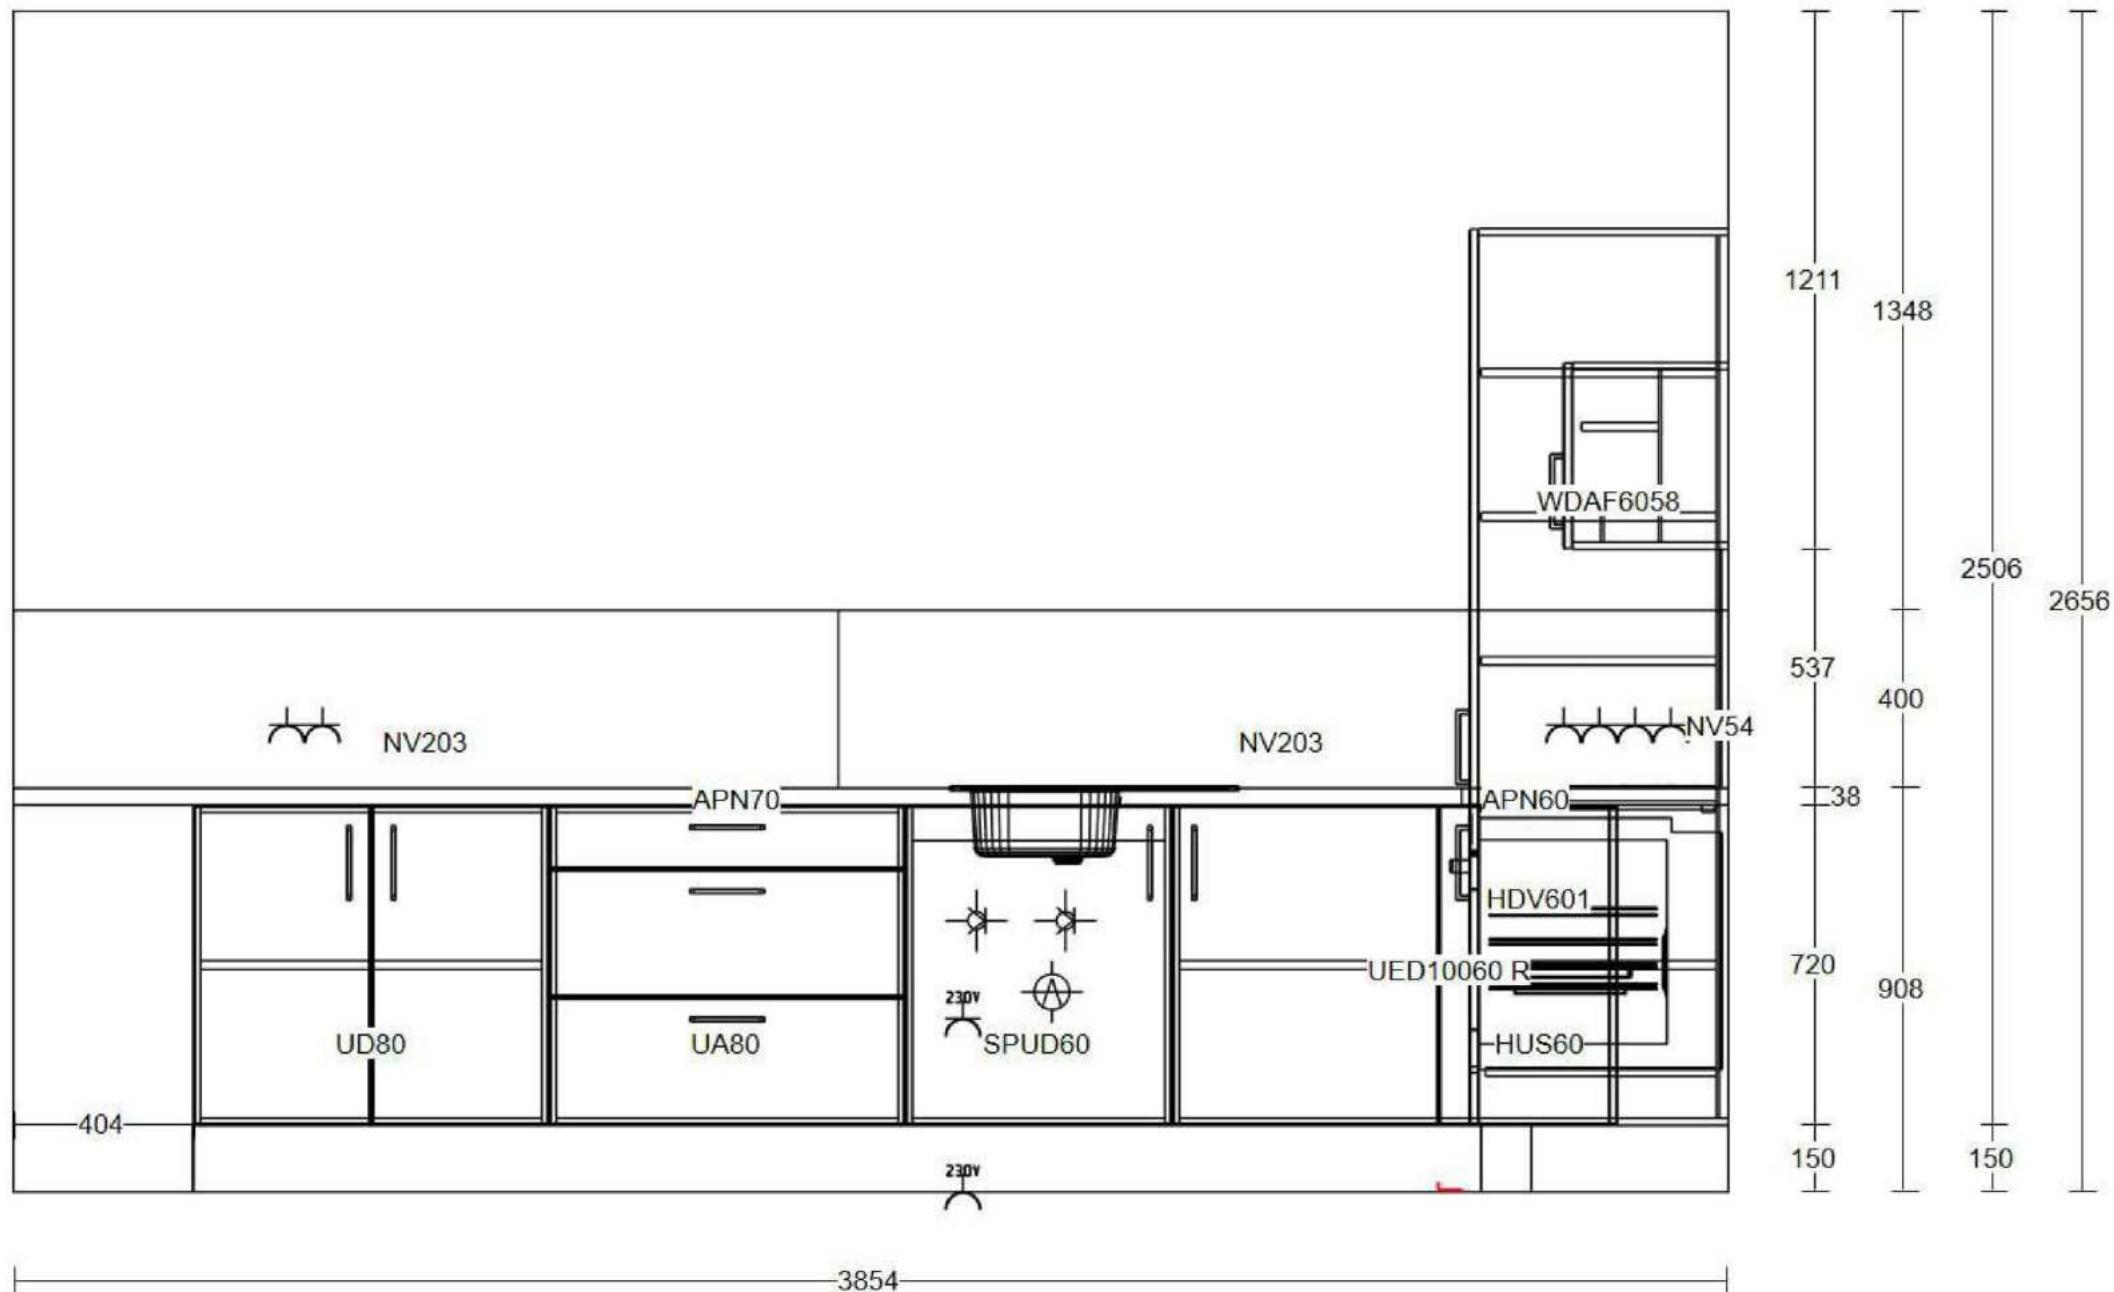

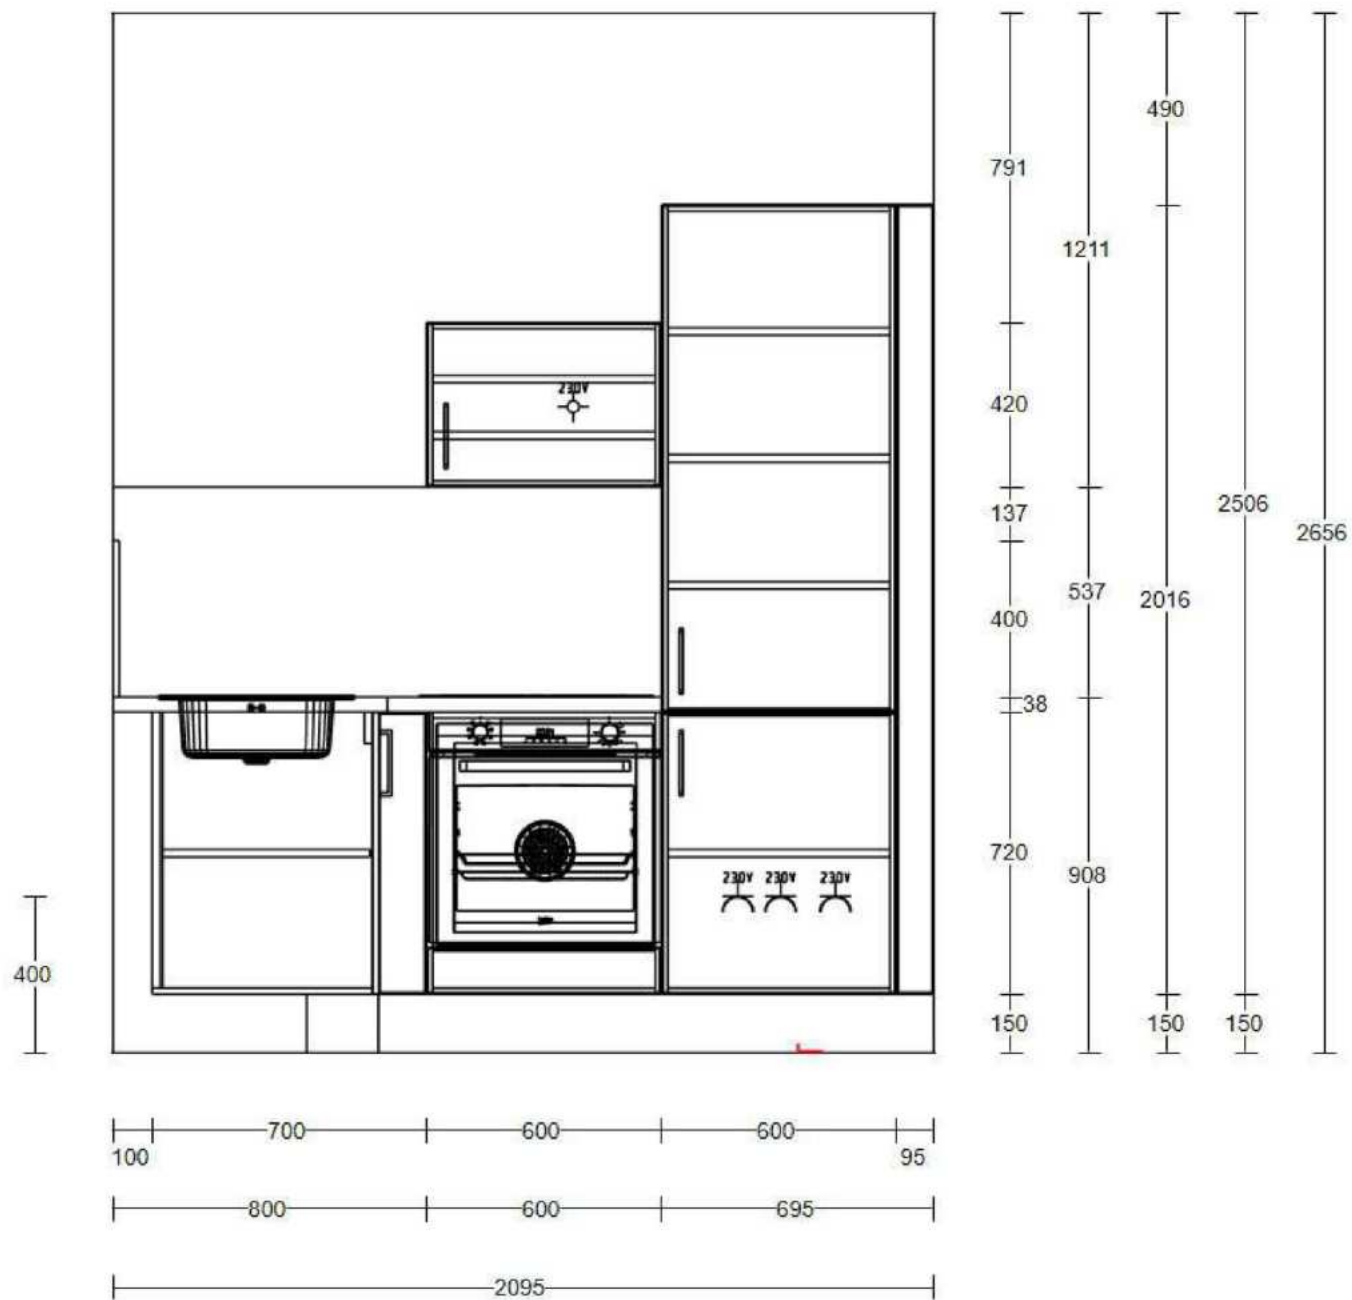



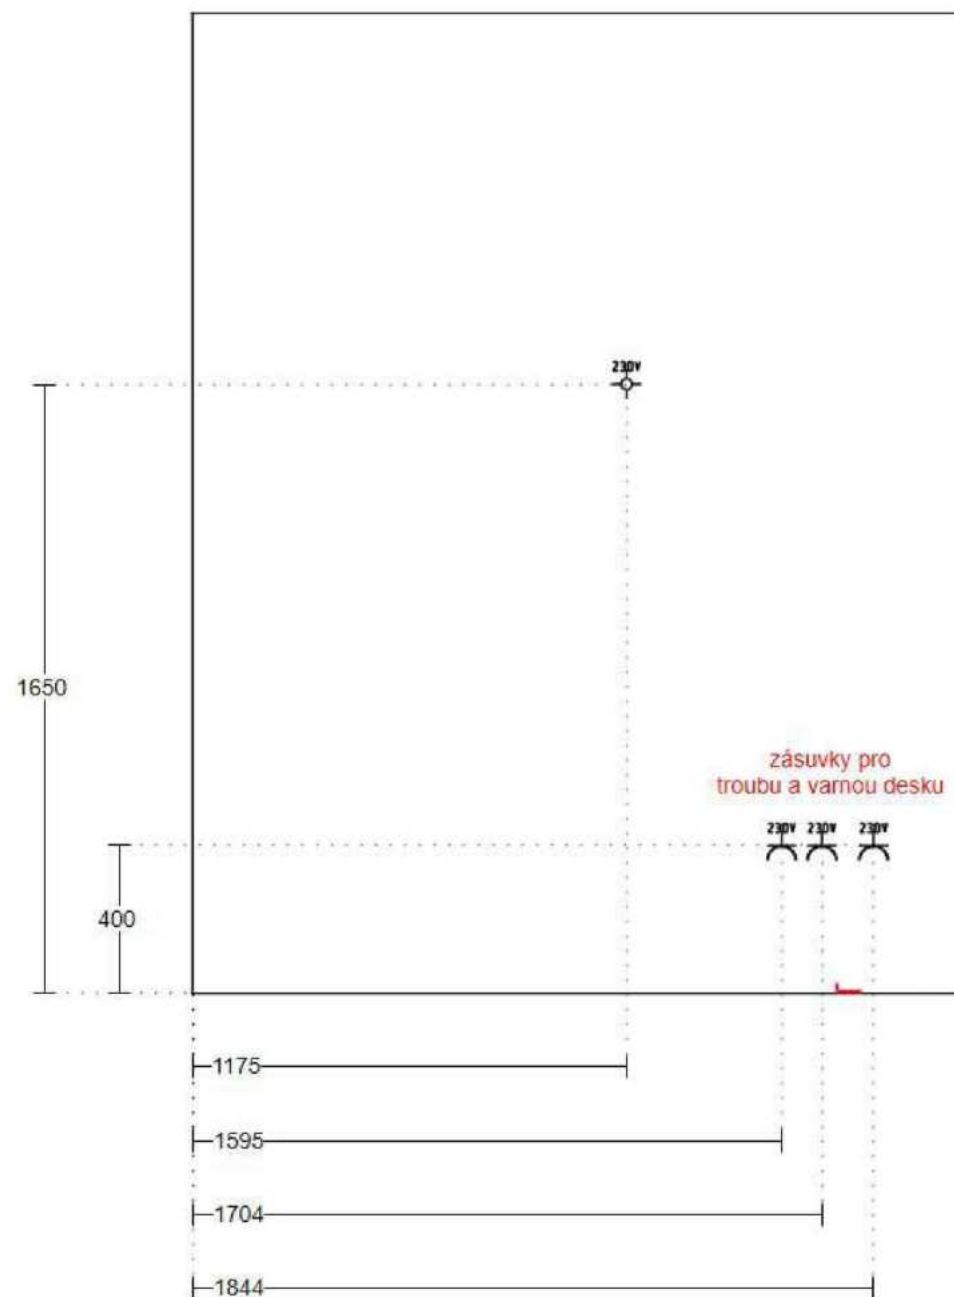

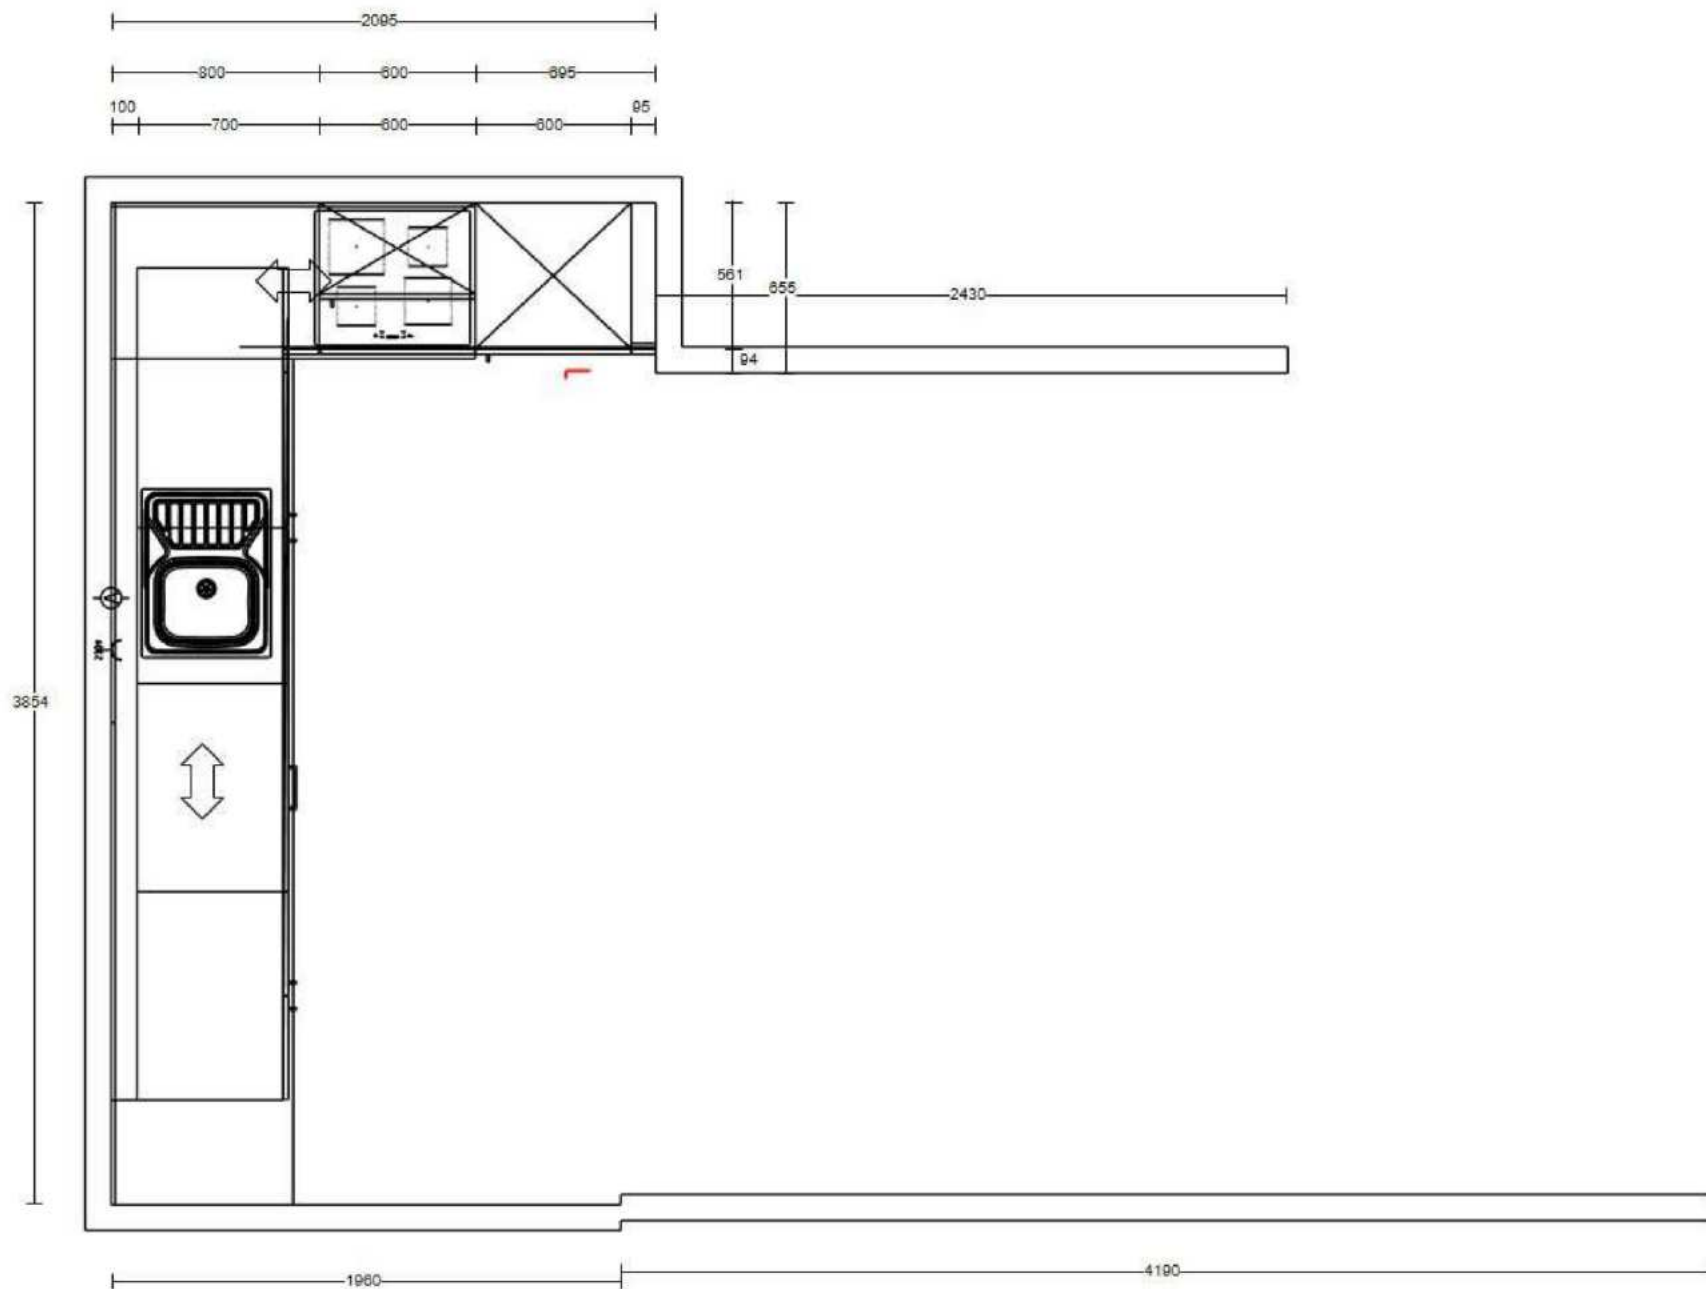

**Dodavatel**

SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9, Kyje

IČ: 26065801
DIČ: CZ699005837

Pobočka

SIKO Čimelice
Tel.: +420 222300400
E-mail: shop@siko.cz
Banka: Československá obchodní banka, a.s.
712711863/0300

O stavu Vaší zakázky se můžete informovat na <http://www.siko.cz/zakazka>

Odběratel

Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička

IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177

45477

Datum vystavení: 25.7.2025
Datum splatnosti: 25.7.2025
Platí od: 25.7.2025
Platí do: 25.7.2026
Forma úhrady: Hotově (k datu faktury)
Č. objednávky: A32 var.4

Č.zboží	Název	Množství MJ	Ceník.cena s DPH	Cena DPH bez DPH	Cena s DPH	Celkem DPH
	STV GROUP a.s._2883_Byt - A.32 - var 4				0	
KLISA	Kuchyně Living,LAMINÁT MAT DEKOR	1,000 KS	93 254,00	52 560,13	0	52 560,13
MONKUCHYNE	Montáž kuchyně	5 M	2 399,99	2 399,99	0	2 399,99
SOUVSLUZ1	Související služby 1	1,000 KS	2 901,98	2 901,98	2 901,98	2 901,98
KUCHZAMERENI	Zaměření kuchyně	1,000 KS	1 499,99	1 499,99	0	1 499,99
DOPRAVAKUCH	Doprava Kuchyně	1,000 KS	2 999,98	2 999,98	0	2 999,98
BALMON	Balíček příslušenství k montáži kuchyně		599,00	495,04	0	495,04
1325.00	FRANKE sifon 6/4" s odbočkou na myčku	1,000 KS				
CS7	CS7 tmel akryl bílý 280ml	1,000 KS				
CS9	CS9 silikon san. 280ml transparent	1,000 KS				
MANZ4050	Manžeta gum.40/50	1,000 KS				
T6430MF38CR	T 64/300 MF 3/8x3/8 NEREZ	2,000 KS				
CT40500	HTEM trubka 40-500	1,000 KS				
CK44000	HTB koleno 40/45	1,000 KS				
CK48000	HTB koleno 40/87	1,000 KS				
PATTEXOFA	lepidlo montážní All For One bílá, 440 g spotřebiče	3,000 KS	189,00	156,20	0	156,20
VT231GX	23 MORA vestavná trouba	1,000 KS	4 990,00	4 123,95	0	4 123,95
HII64400MT	20 Indukční deska	1,000 KS	4 849,00	4 252,87	0	4 252,87
SIKOBSPRO282	dřezová baterie stojánková páková	1,000 KS	499,00	412,40	0	412,40
PRF0142633	28 Elica digestoř ERA GR/A/52	1,000 KS	2 691,00	1 975,96	0	1 975,96
KEVIN116SATIN	Dřez Quadron KEVIN116 satin	1,000 KS	1 065,00	880,17	0	880,17

UŠETŘILI JSTE

Celkem před slevou	109 328,00
Typ slevy	Sleva
Zákaznická sleva (H)	24 757,00
Sleva celkem	24 757,00

DPH 0 % ze základu 84 571,00 0,00
Celkem k úhradě CZK 84 571,00

Vystavil:
Pavel Žukovský

PŘÍLOHA Č. 3 SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Platby budou provedeny na základě faktur, vystavených Zhotovitelem dle následujícího splátkového kalendáře:

Pro dodávku kuchyní:

Faktura	Předmět fakturace	Fakturovaná částka bez DPH	Nejdřívější termín pro vystavení faktury Zhotovitelem
1.	Zálohová faktura z celkové ceny díla	50% z celkové ceny díla	V den uzavření Smlouvy.
2.až 6	Dodávka dílčího díla	50% doplatek z ceny dílčího díla	V předání každého jednoho dílčího díla. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní od předání daného dílčího díla
CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH:		441.308,-	

Celková cena díla se může lišit např. v závislosti na objednání klientských změn, více prací a jiných důvodů sjednaných ve Smlouvě.

PŘÍLOHA Č. 4 - PODMÍNKY STAVEBNĚ – TECHNICKÉ PŘIPRAVENOSTI MÍSTA DODÁNÍ

Zákazník předá Dodavateli místo dodání pro realizaci Díla ve stavu, který splňuje dole uvedené parametry. Pro účely dodávky a provedení Díla bude zajištěno:

- vhodné volné místo pro parkování nákladního / dodávkového vozidla (v závislosti na objemu materiálu dodávaného pro realizaci Díla) v nejbližším okolí budovy, ve které bude Dílo realizováno, a to po celou dobu realizace, návozu zboží a materiálu.
- svislá staveništní doprava prvků stavebního materiálu, dlažby, obkladů, koupelnového zařízení a vybavení, nábytku a nářadí na místo realizace Díla, místo pro uložení odpadů (vč. obalů).
- čistý, uklizený a osvětlený prostor koupelny s teplotou nikoli nižší než 15°C a konstantní vlhkostí v rozmezí 25 - 65% a dostatečně velký prostor pro montáž a úpravu vybavení a nábytku.
- důkladná ochrana zabudovaných konstrukcí nábytku před prachem i možným poškozením až do dokončení a převzetí Díla Zákazníkem.
- napojení na odběr vody a dodávka všech potřebných médií (vč. elektrická přípojka 230 V).
- funkční WC a pitná voda v době montáže a přítomnosti pracovníků.
- krytý a uzamykatelný prostor na uskladnění materiálu a nářadí.
- nosnost příček, které zaručují bezpečnou nosnost obkladů, zavěšených skříněk a dalšího vybavení.

Závěsný koupelnový nábytek nelze zavěsit na příčky nenosných konstrukcí, jako jsou např. příčky z Ytongu, sádkartonové příčky atd. (nutné vyztužení = výdřeva za celou plochou nábytku a hustější rastr podkonstrukce)

- všechny stěny, na které mají být umístěny obklady, nábytek či jiné vybavení, musí být rovně opracovány a musí být v kolmé pozici k podlaze. Podlaha musí být vodorovná a rovně opracovaná; - vyhovující a funkční elektroinstalace, vodoinstalace a plynoinstalace dle poskytnutého výkresu instalací a technických podmínek pro zapojení spotřebičů; veškeré instalace musí být zasekány, nesmějí být vedeny na povrchu stěn, v opačném případě nemůže být montáž provedena.

Zákazník výslovně prohlašuje, že elektroinstalace, vodoinstalace a plynoinstalace bude odpovídat v termínu realizace platným právním předpisům a ČSN. Dodavatel není povinen zjišťovat, zda popsané instalace a skutečnosti odpovídají závazku Zákazníka a nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením tohoto požadavku Zákazníkem.

- veškeré instalační rozvody musí být vždy zakončeny příslušným elementem pro připojení spotřebičů (tj. koncovka 230V/380V na kabelu a zásuvka 230V/380V na zdi, volné kabely musí být chráněny svorkovnicí). Rozvody vody pro připojení vodovodní baterie musí být osazeny rohovými ventily, přívod vody pro pračku musí být osazen pračkovým ventilem, odpad musí mít gumovou těsnicí vložku. Přívodní plynové potrubí musí být zakončeno plynovým ventilem a flexibilní hadicí pro připojení.

Před začátkem vlastní realizace instalačních vývodů je nutné se seznámit s členěním a požadavky koupelnového vybavení.


- všechny rozměry uvedené na nákresech instalací jsou myšleny od opracovaného líce podlahy. Pokud je v době pokládání sítí stávající podlaha ještě neopracovaná, je nutné připočítat tloušťku dlažby (podlahové krytiny) a poté teprve měřit umístění instalací. Hlavní trasa instalací vč. elektro kabelů je vedena cca 15 cm nad horní hranou montovaného nábytku. Sestupné trasy vedení musí být vedeny mimo prostor upevňovacích bodů jednotlivých skříněk nábytku!

Před provedením či opravou omítek se doporučuje provést dokumentaci s kótami a fotodokumentaci provedených instalací, aby se předešlo pochybnostem a komplikacím při montáži nábytku. Tuto dokumentaci předloží Zákazník Dodavateli před Termínem dodání.

Konečné řešení stavební připravenosti se zohledněním půdorysu místa realizace Díla musí realizovat a kompletovat odborně způsobilá firma Zákazníka.


POZNÁMKY

- VELKÉ PROSTUPY V ŽELEZOBETONOVÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PŘI BETONÁŽI OSAZENY SYSTÉMOVÝMI BLOKY Z LEHČENÉHO BETONU (viz SKŘ), DO KTERÝCH SE VYVRTAJÍ PŘESNÉ PROSTUPY DLE POTŘEB INSTALACÍ
- VŠECHNY ŠACHTY Z SDK BUDOU V PROTIPOŽÁRNÍM PŘÍPOJENÍ min. EI30
- VEŠKERÉ KOUPELNY VČETNĚ PŘESNÉHO OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A KONCOVÝCH PRVKŮ VŠECH INSTALACÍ PROVÁDĚT DLE PODROBNÝCH SPÁROŘEZŮ V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE
- PRO VEŠKERÉ KUCHYŇSKÉ LINKY MUSÍ ZPRACOVATEL ZAJISTIT U SVÉHO SUBDODAVATELE KUCHYNÍ OSAZOVACÍ PLÁNY VŠECH INSTALACÍ NA ZÁKLADĚ PODROBNÉ SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE
- BEZ TĚTO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE NELZE ZAČÍT PROVÁDĚT INSTALACE V MÍSTĚ KUCHYŇSKÝCH LINEK
- VEŠKERÉ VODOROVNÉ I SVISLÉ SKLADBY PLOCHŮ VČETNĚ SDK PROVÁDĚT DLE TABULEK SKLADBE KONSTRUKCÍ, PLOCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST PODLE PODROBNÉ SPECIFIKACE V ČÁSTI STANDARDY PŘÍPOJENÍ STAVBY
- VEŠKERÉ MÍRY STAVBY CHARAKTERISTICKÉ PRO ZABUDOVÁVACÍ PRVKY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ PŘED OBJEDNÁNÍM DANÝCH PRVKŮ
- BAREVNOST BUDE NAVRŽENA PODROBNĚJI V PROJEKTU INTERIÉRU A UPŘESNĚNA BĚHEM STAVBY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

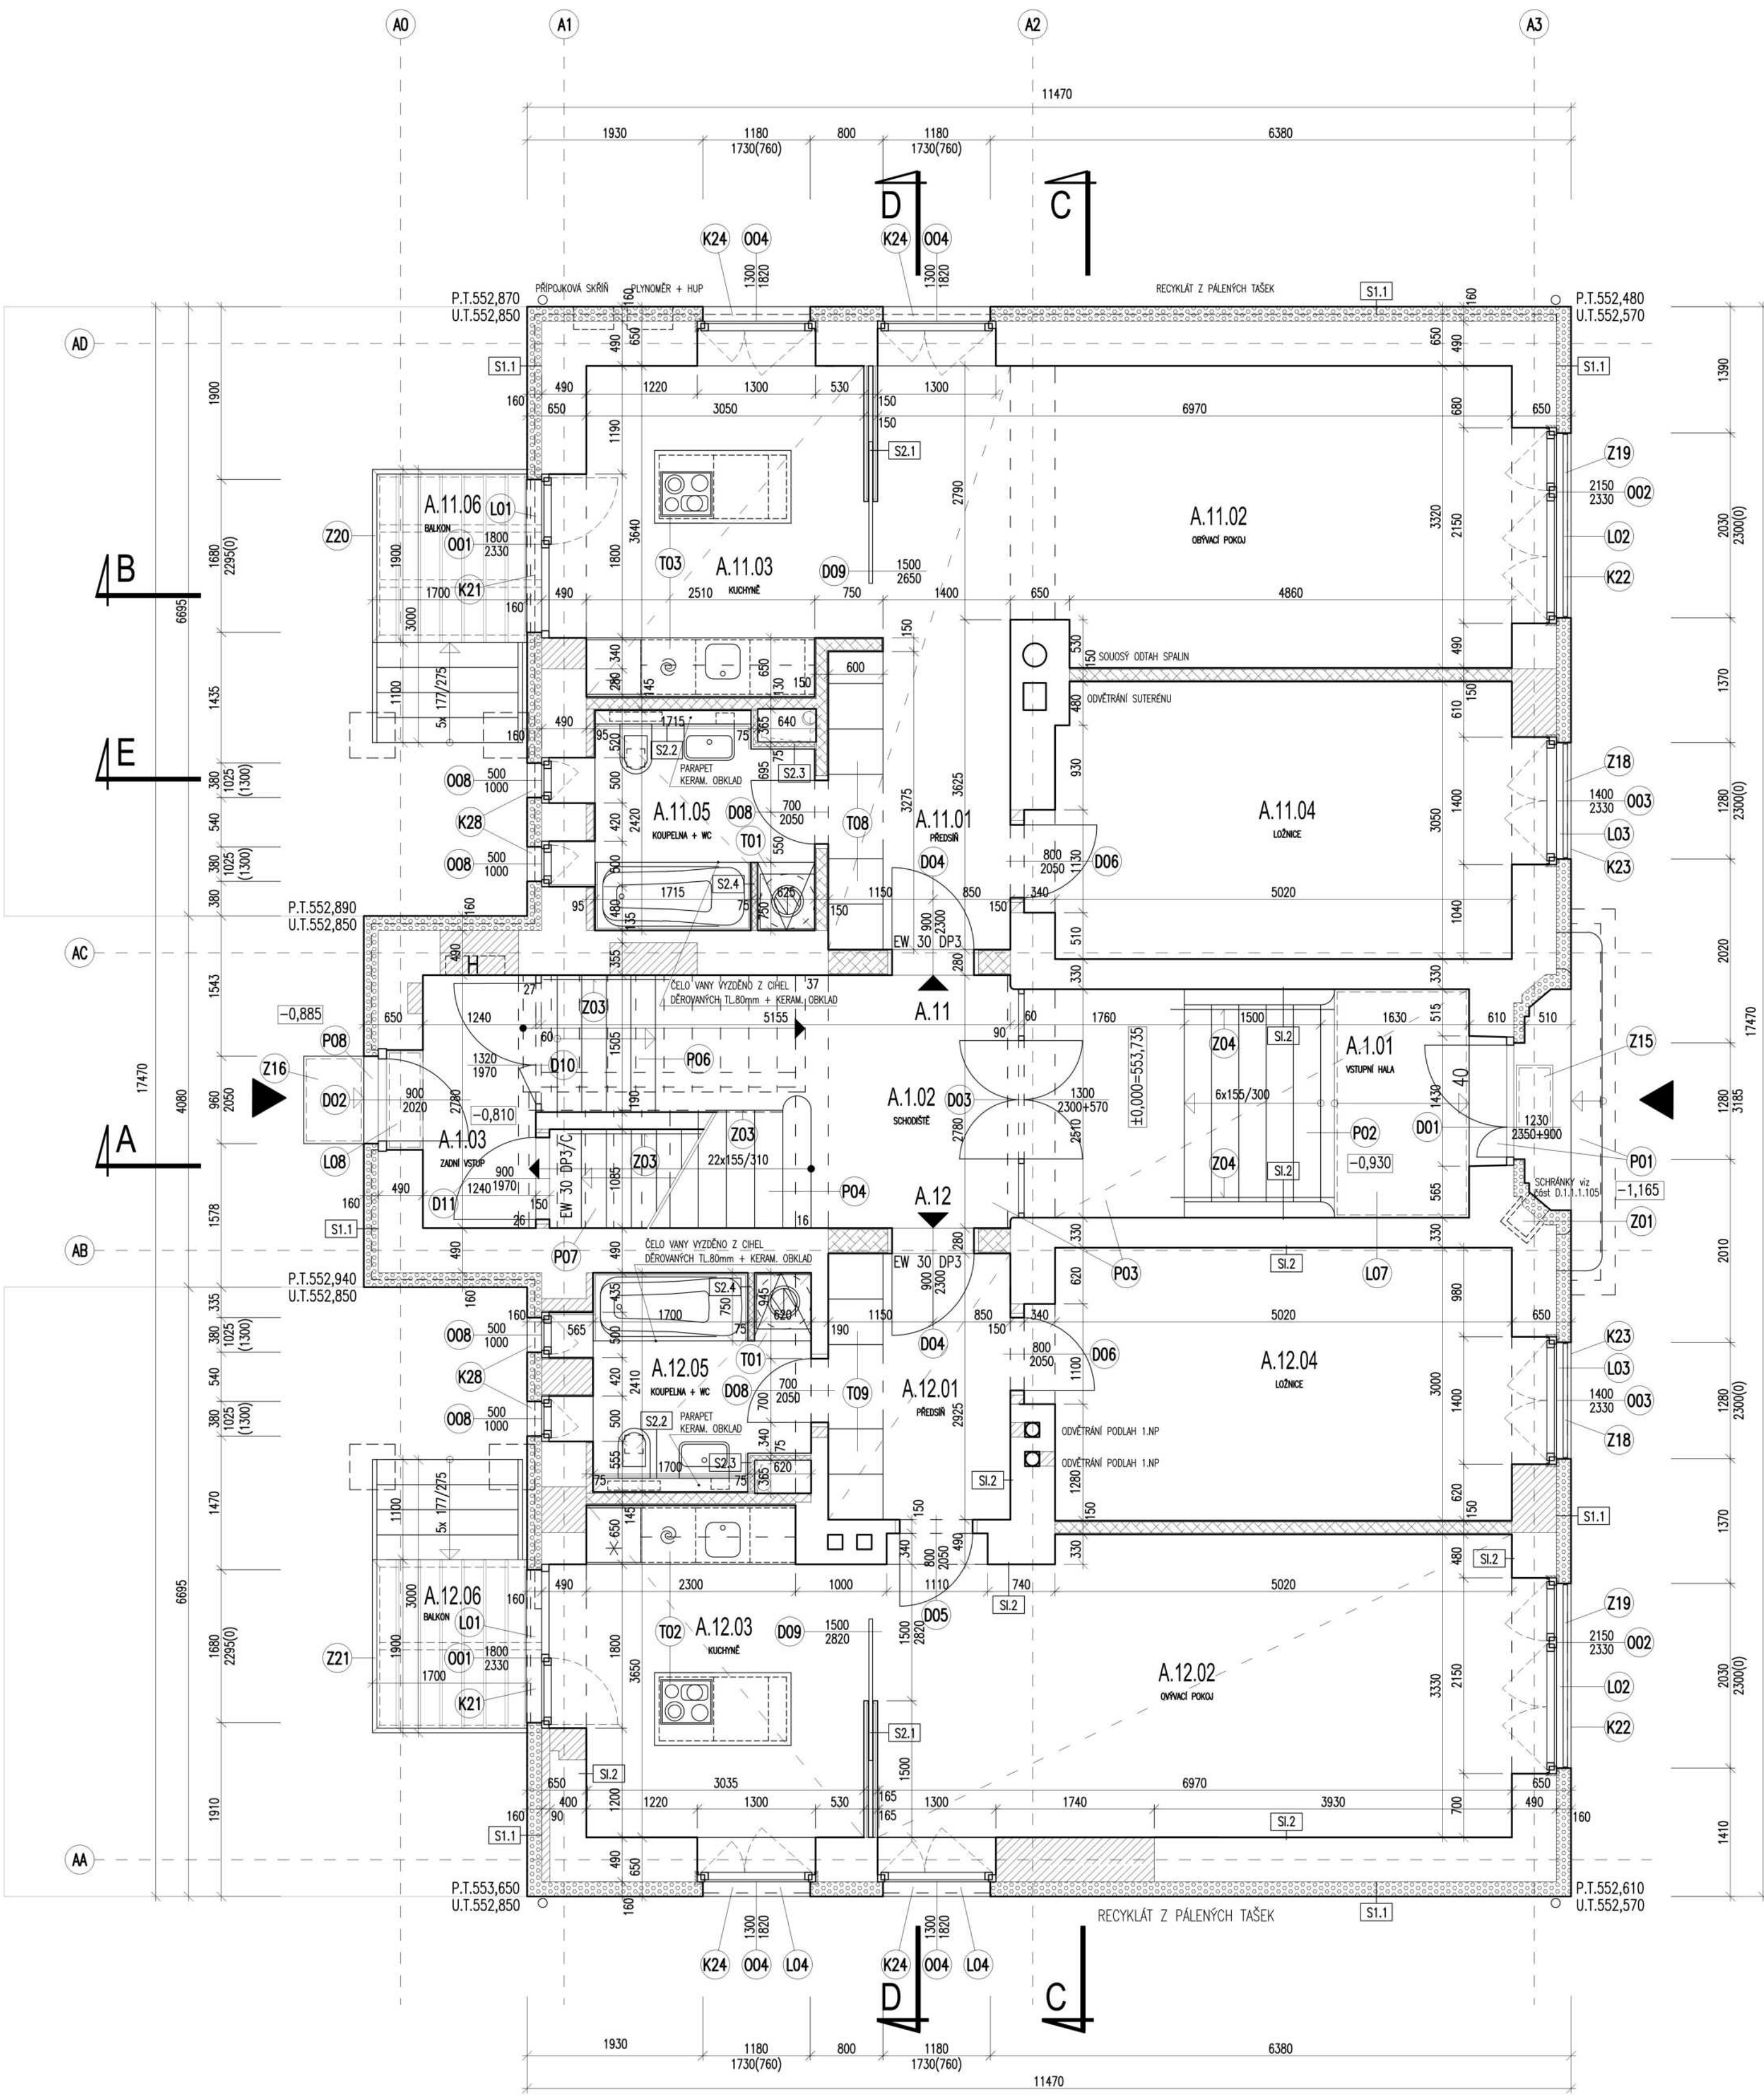

POZNÁMKY

- VELKÉ PROSTUPY V ŽELEZOBETONOVÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PŘI BETONÁŽI OSAZENY SYSTÉMOVÝMI BLOKY Z LEHČENÉHO BETONU (viz SKŘ), DO KTERÝCH SE VYVRTAJÍ PŘESNÉ PROSTUPY DLE POTŘEB INSTALACÍ
- VŠECHNY ŠACHTY Z SDK BUDOU V PROTIPOŽÁRNÍM PŘEVODENÍ min. EI30
- VEŠKERÉ KOUPELNY VČETNĚ PŘESNÉHO OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A KONCOVÝCH PRVKŮ VŠECH INSTALACÍ PROVÁDĚT DLE PODROBNÝCH SPÁROREZŮ V SAMOSTATNĚ ČÁSTI DOKUMENTACE
- PRO VEŠKERÉ KUCHYŇSKÉ LINKY MUSÍ ZPRACOVATEL ZAJISTIT U SVÉHO SUBDODAVATELE KUCHYŇNÍ OSAZOVACÍ PLÁNY VŠECH INSTALACÍ NA ZÁKLADĚ PODROBNÉ SPECIFIKACE V SAMOSTATNĚ ČÁSTI DOKUMENTACE
- BEZ TĚTO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE NELZE ZAČÍT PROVÁDĚT INSTALACE V MÍSTĚ KUCHYŇSKÝCH LINEK
- VEŠKERÉ VODOROVNĚ I SVISLÉ SKLADBY PLOVRCHŮ VČETNĚ SDK PROVÁDĚT DLE TABULEK SKLADEB KONSTRUKCÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST PODLE PODROBNÉ SPECIFIKACE V ČÁSTI STANDARDY PŘEVODENÍ STAVBY
- VEŠKERÉ MÍRY STAVBY CHARAKTERISTICKÉ PRO ZABUDOVÁVÁNÍ PRVKŮ JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ PŘED OBJEDNÁNÍM DANÝCH PRVKŮ
- BAREVNOST BUDE NAVRŽENA PODROBNĚJI V PROJEKTU INTERIÉRU A UPŘESNĚNA BĚHEM STAVBY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

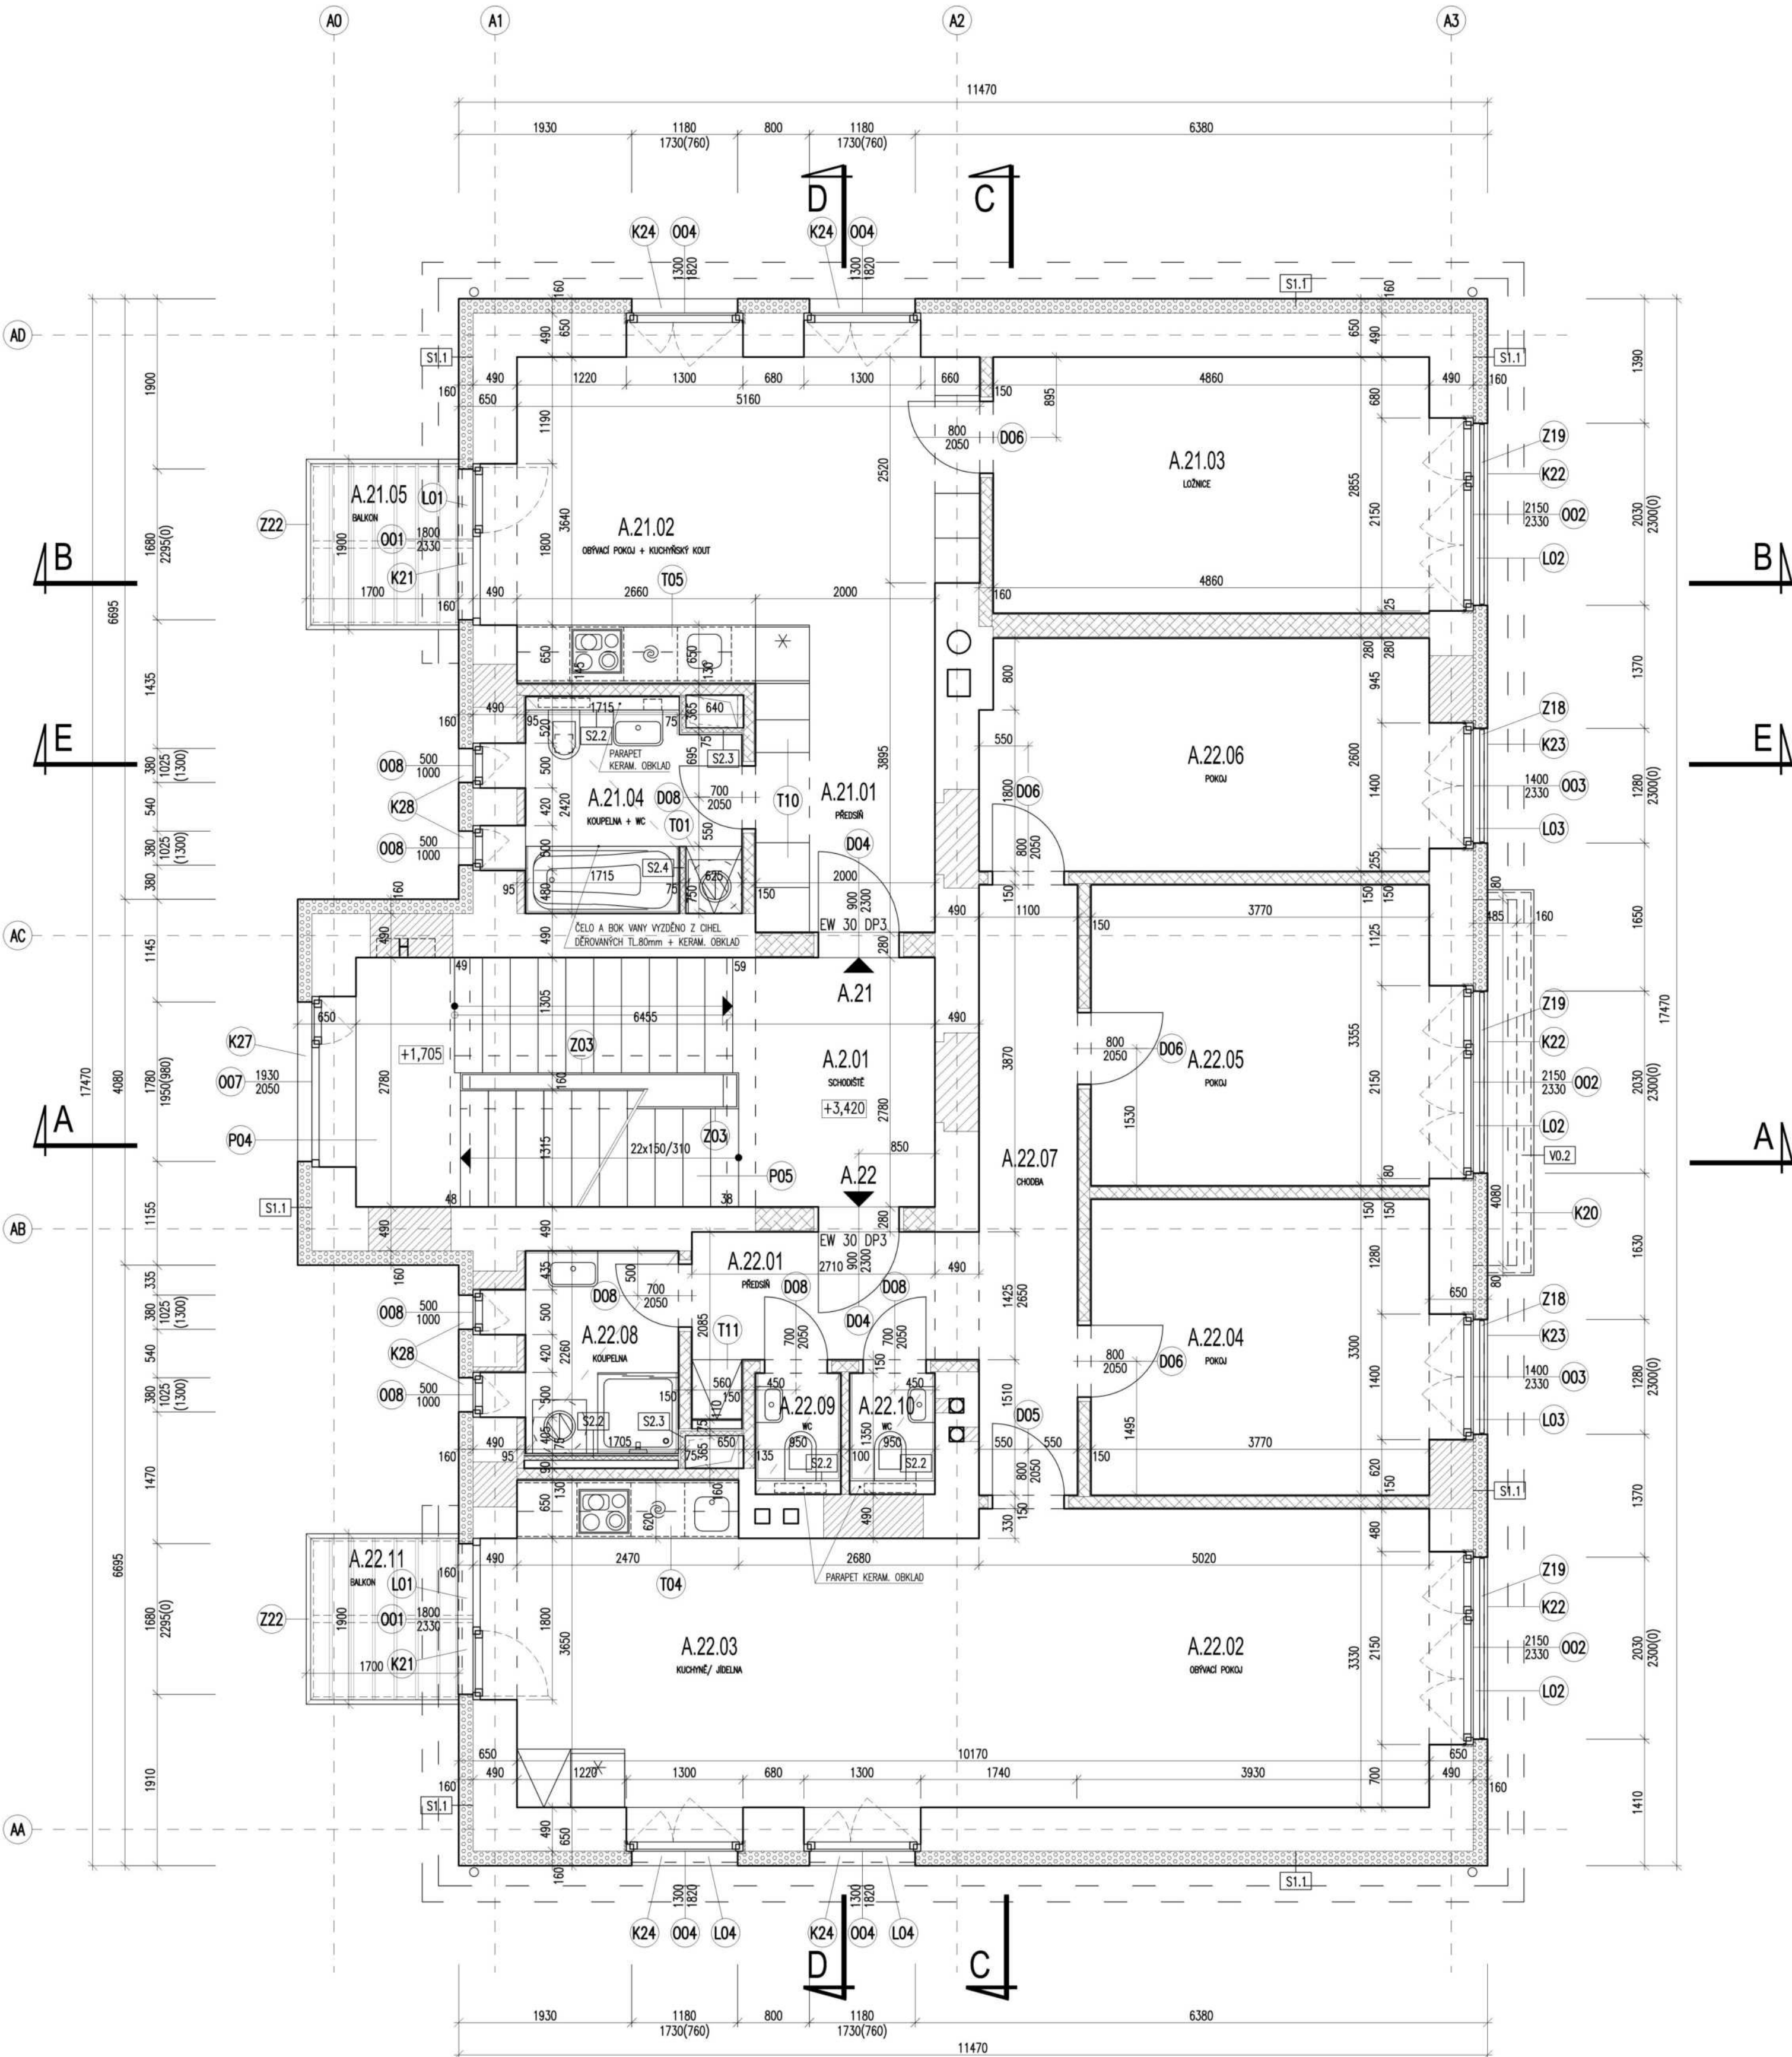

- ČISTÉ OMITKY V MÍSTNOSTECH S PODHLEDY VYTAHNOUT cca 100mm NAD PŘEDPOKLADANOU ÚROVŇÍ PODHLEDU
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY URČENÉ K ZABUDOVÁNÍ PODLE PROJEKTU SKŘ BUDOU PŘED ZABUDOVÁNÍM OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ ČÁSTI ZABUDOVANÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDOU VYPLNĚNY CÍHLAMI VLOŽENÝMI DO PROFILŮ I MEZI PROFILY A OMIKNUTY NA PLETIVU V TL. 10–20mm A MIN. ŠÍŘCE 200mmPŘES STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- VEŠKERÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY HLOUBKOVĚ TLAKOVĚ IMPREGNOVAT PROTI ŠKŮDCŮM
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV JE PROJEKT SANACÍ ZDIVA Z HLEDISKA VLHKOSTI
- VEŠKERÉ PROSTUPY HYDROIZOLACEM, KTERÉ SLOUŽÍ I JAKO PROTIRADONOVÁ CLONA MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UTĚSNĚNY SYSTÉMOVÝMI TĚSNÍCÍMI MANŽETAMI
- ROZVODNÁ POTRUBÍ K ROZVODU NEHOŘLAVÝCH LÁTEK PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ MOHOU PROSTUPOVAT POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI DO SVĚTLÉHO PRŮŘEZU 0,04m² BEZ DALŠÍCH OPATŘENÍ, POKUD BUDE POTRUBÍ PŘEVODENO Z HMOTNOSTI REAKCE NA OHĚN B–F (STUPNĚ HOŘLAVOSTI B–C3, TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ MUSÍ BÝT V PŘEVODENÍ EI
- VEŠKERÉ PROSTUPY VNITŘNÍCH ROZVODŮ A INSTALACÍ, ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI (KANALIZAČNÍ DO SVĚTLÉHO PRŮŘEZOVÉ PLOCHY 8000mm², VODOVODNÍ DO SVĚTLÉHO PRŮŘEZOVÉ PLOCHY 15000mm²), VZT ROZVODŮ DO 12000mm², ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ (SVAZEK VODICŮ PROSTUPUJÍCÍ JEDNÝM OTVOREM S IZOLACÍ ŠÍŘÍCI POŽÁR, JEJICHŽ CELKOVÁ HMOTNOST NENÍ VĚTŠÍ NEŽ 1,0kg/m²) MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY
- MONTÁŽNÍ OTVORY PRO POTRUBÍ VYNECHANÉ BĚHEM STAVBY VE ZDĚNĚ, BETONOVĚ, SENDVIČOVĚ ČI JINĚ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI MUSÍ BÝT PO INSTALACI POTRUBÍ DOZDĚNÝ, DOBETONOVÁNÝ ČI JINAK ZAPLNĚNÝ VÝROBKEM TŘÍDY REAKCE NA OHĚN A1 NEBO A2 A TO AŽ K POTRUBÍ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA CELISTVOST KONSTRUKCE A JEJÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST AŽ K VNĚJŠÍMU POVRCHU POTRUBÍ
- PROSTUPY VĚTŠÍCH PRŮŘEZOVÝCH PLOCH POŽÁRNĚ ODOLNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY V PŘEVODENÍ EI, POMOCÍ POŽÁRNÍCH UCPAVEK, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ URČENOU DLE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- PROSTUPY POŽÁRNĚ ODOLNÝMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT ZŘETELNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM S INFORMACEMI
- VŠECHNY VNITŘNÍ VODOROVNĚ I SVISLÉ VNITŘNÍ ROHY OBKLADŮ A DLÁŽDY, OSAZENÍ SANITÁRNÍCH PŘEDMĚTŮ A VŠECHNA NÁPOJENÍ NA DVEŘE VYTMLIT SILIKONOVÝM TRVALE PRUŽNÝM TMЕLEM V BARVĚ SPÁROVÁNÍ
- VYSTUPLÉ ROHY OBKLADŮ BUDOU OSAZENY BÍLÝM LAKOVANÝM HLINÍKOVÝM L PROFILEM
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY A DVEŘE V NÁPOJENÍ NA OMITKU OČISTIT A DOTMELIT PŘETŘÍTELNÝM TMЕLEM
- INSTALAČNÍ ARMATURY V OBKLADĚCH ZAKRYT POMOCÍ DLÁŽDICE S NÁLEPENÝMI MAGNETY (PODLE VELIKOSTI PŘÍPADNĚ SPOJIT VÍCE DLÁŽDIC), OBVOD ZASPÁROVAT SILIKONOVÝM TMЕLEM V BARVĚ SPÁROVÁNÍ
- VEŠKERÁ SVISLÁ I VODOROVNÁ OMIČANÁ NÁROŽÍ PROVÁDĚT S OSAZENÍM PODOMÍTKOVÉ ROHOVÉ LIŠTY

OBJEKT A - TABULKA MÍSTNOSTÍ - PATRA (2.NP)

M.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA / SOKL	POVRCH STĚN	STROP	
A.2.01	SCHODIŠTĚ	6,70 9,60	V5.2 V5.3	BRUSLOVÝ BETON STÁVAJÍCÍ TERAKO	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN SOKL v. 200mm BEZBARV. IMPREGNACE	POHLEDÝVÝ BETON
A.2	SPOLÉCNÉ PROSTORY CELKEM	16,30				
A.21.01	PŘEDSÍŇ	5,65	V4.3	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	POHLEDÝVÝ BETON
A.21.02	OBYVACÍ POKOJ+KUCH. KOUT	18,20	V4.5	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN OBKLAD SOUČÁSTI KUCHYŇSKÉ LINKY	POHLEDÝVÝ BETON
A.21.03	LOŽNICE	14,85	V4.4	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	POHLEDÝVÝ BETON
A.21.04	KOUPELNA + WC	5,25	V3.3	KERAMICKÁ DLÁŽBA SOKL v. 200mm KERAM. DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1200/2000mm OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	V1.2 SOKL PODLE S.H. 2400mm MALBA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
A.21	BYT 2+KK CELKEM	43,95				
A.21.05	BALKON	3,50	V4.10	THERMOWOOD JASAN	ETICS – MALBA ŠEDÝ ODSŮN	
A.22.01	PŘEDSÍŇ	5,10	V4.3	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	POHLEDÝVÝ BETON
A.22.02	OBYVACÍ POKOJ	17,70	V4.6	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	POHLEDÝVÝ BETON
A.22.03	KUCHYŇNĚ/ JIDELNA	17,75	V4.6	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN OBKLAD SOUČÁSTI KUCHYŇSKÉ LINKY	POHLEDÝVÝ BETON
A.22.04	POKOJ	13,00	V4.4	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	POHLEDÝVÝ BETON
A.22.05	POKOJ	13,50	V4.3	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	POHLEDÝVÝ BETON
A.22.06	POKOJ	13,50	V4.4	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	POHLEDÝVÝ BETON
A.22.07	CHODBA	3,50 4,35	V4.3 V4.4	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	POHLEDÝVÝ BETON
A.22.08	KOUPELNA	3,85	V3.3	KERAMICKÁ DLÁŽBA SOKL v. 200mm KERAM. DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1200/2000mm OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	V1.2 SOKL PODLE S.H. 2400mm MALBA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
A.22.09	WC	1,25	V3.3	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1200mm OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	V1.2 SOKL PODLE S.H. 2400mm MALBA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
A.22.10	WC	1,20	V3.3	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1200mm OMITKA – MALBA SVĚTLÝ ODSŮN	V1.2 SOKL PODLE S.H. 2400mm MALBA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
A.22	BYT 4+1 CELKEM	94,70				
A.22.11	BALKON	3,50	V4.10	THERMOWOOD JASAN	ETICS – MALBA ŠEDÝ ODSŮN	

Objekt A ±0.000 = 553.735 m.n.m. BpV
Objekt B ±0.000 = 553.000 m.n.m. BpV
Objekt C ±0.000 = 552.600 m.n.m. BpV

PROJEKT:
MĚSTSKÉ BYDLENÍ POLIČKA

ul. A. LIDMILOVÉ a REVOLUČNÍ, 572 01 POLIČKA
parcela: 1278/2, st. 1244

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO PŘEVODENÍ STAVBY (DPS)

LEGENDA:

- KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU
- DOZDÍVKY A PRÍZDÍVKY Z CÍHEL PÁLENÝCH PLNÝCH P
NA MALTU VÁPENCEMENTOVOU M1C
- ZDIVO Z CÍHELNÝCH DĚROVANÝCH BLOKŮ PEVNOSTI DLE SKŘ
např. PTH 24 P+D, VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OMIČEK 15 mm
- ZDIVO Z CÍHELNÝCH DĚROVANÝCH BLOKŮ PEVNOSTI DLE SKŘ
např. PTH 25 AKU SYM, VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OMIČEK 15 mm
- ZDIVO Z CÍHEL DĚROVANÝCH 115 mm nebo 80 mm, PEVNOSTI DLE SKŘ
např. PTH 11,5 ev. 8 P+D VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OMIČEK 15 mm
- PRÍČKY, PŘEDSTĚNY A PODHLEDY SDK
- AKUSTICKÁ (PROTILUKOVÁ) IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S PŘÍMÍŠÍ GRAFITU

OBJEKT:

D.1.1.1. OBJEKT A - REKONSTRUKCE

ČÁST:

D.1.1.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:


PŮDORYS 2.NP (1.PATRO)

MĚRÍTKO: 1:50
FORMÁT: A4
ČÁST: D.1.1.1.
ČÍSLO VÝKRESU:

DATUM: 05/2022
REVIZE: 1 - 08/2022
INDEX: i02

POZNÁMKY

- VELKÉ PROSTUPY V ŽELEZOBETONOVÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PŘI BETONÁŽI OSAZENY SYSTÉMOVÝMI BLOKY Z LEHČENÉHO BETONU (viz SKŘ), DO KTERÝCH SE VYVRTAJÍ PŘESNÉ PROSTUPY DLE POTŘEB INSTALACÍ
- VŠECHNY SÁCHTY Z SDK BUDOU V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ min. EI30
- VEŠKERÉ KOUPELNY VČETNĚ PŘESNÉHO OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A KONCOVÝCH PRVKŮ VŠECH INSTALACÍ PROVÁDĚT DLE PODROBNÝCH SPÁROŘEZŮ V SAMOSTATNĚ ČÁSTI DOKUMENTACE
- PRO VEŠKERÉ KUCHYŇSKÉ LINKY MUSÍ ZPRACOVATEL ZAJISTIT U SVÉHO SUBDODAVATELE KUCHYNÍ OSAZOVACÍ PLÁNY VŠECH INSTALACÍ NA ZÁKLADĚ PODROBNÉ SPECIFIKACE V SAMOSTATNĚ ČÁSTI DOKUMENTACE
- BEZ TĚTO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE NELZE ZAČÍT PROVÁDĚT INSTALACE V MÍSTĚ KUCHYŇSKÝCH LINEK
- VEŠKERÉ VODOROVNĚ I SVISLÉ SKLADBY PLOVRCHŮ VČETNĚ SDK PROVÁDĚT DLE TABULEK SKLADEB KONSTRUKCÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST PODLE PODROBNÉ SPECIFIKACE V ČÁSTI STANDARDY PROVEDENÍ STAVBY
- VEŠKERÉ MÍRY STAVBY CHARAKTERISTICKÉ PRO ZABUDOVÁVÁNÉ PRVKY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ PŘED OBJEDNÁNÍM DANÝCH PRVKŮ
- BAREVNOST BUDE NAVRŽENA PODROBNĚJI V PROJEKTU INTERIÉRU A UPŘESNĚNA BĚHEM STAVBY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

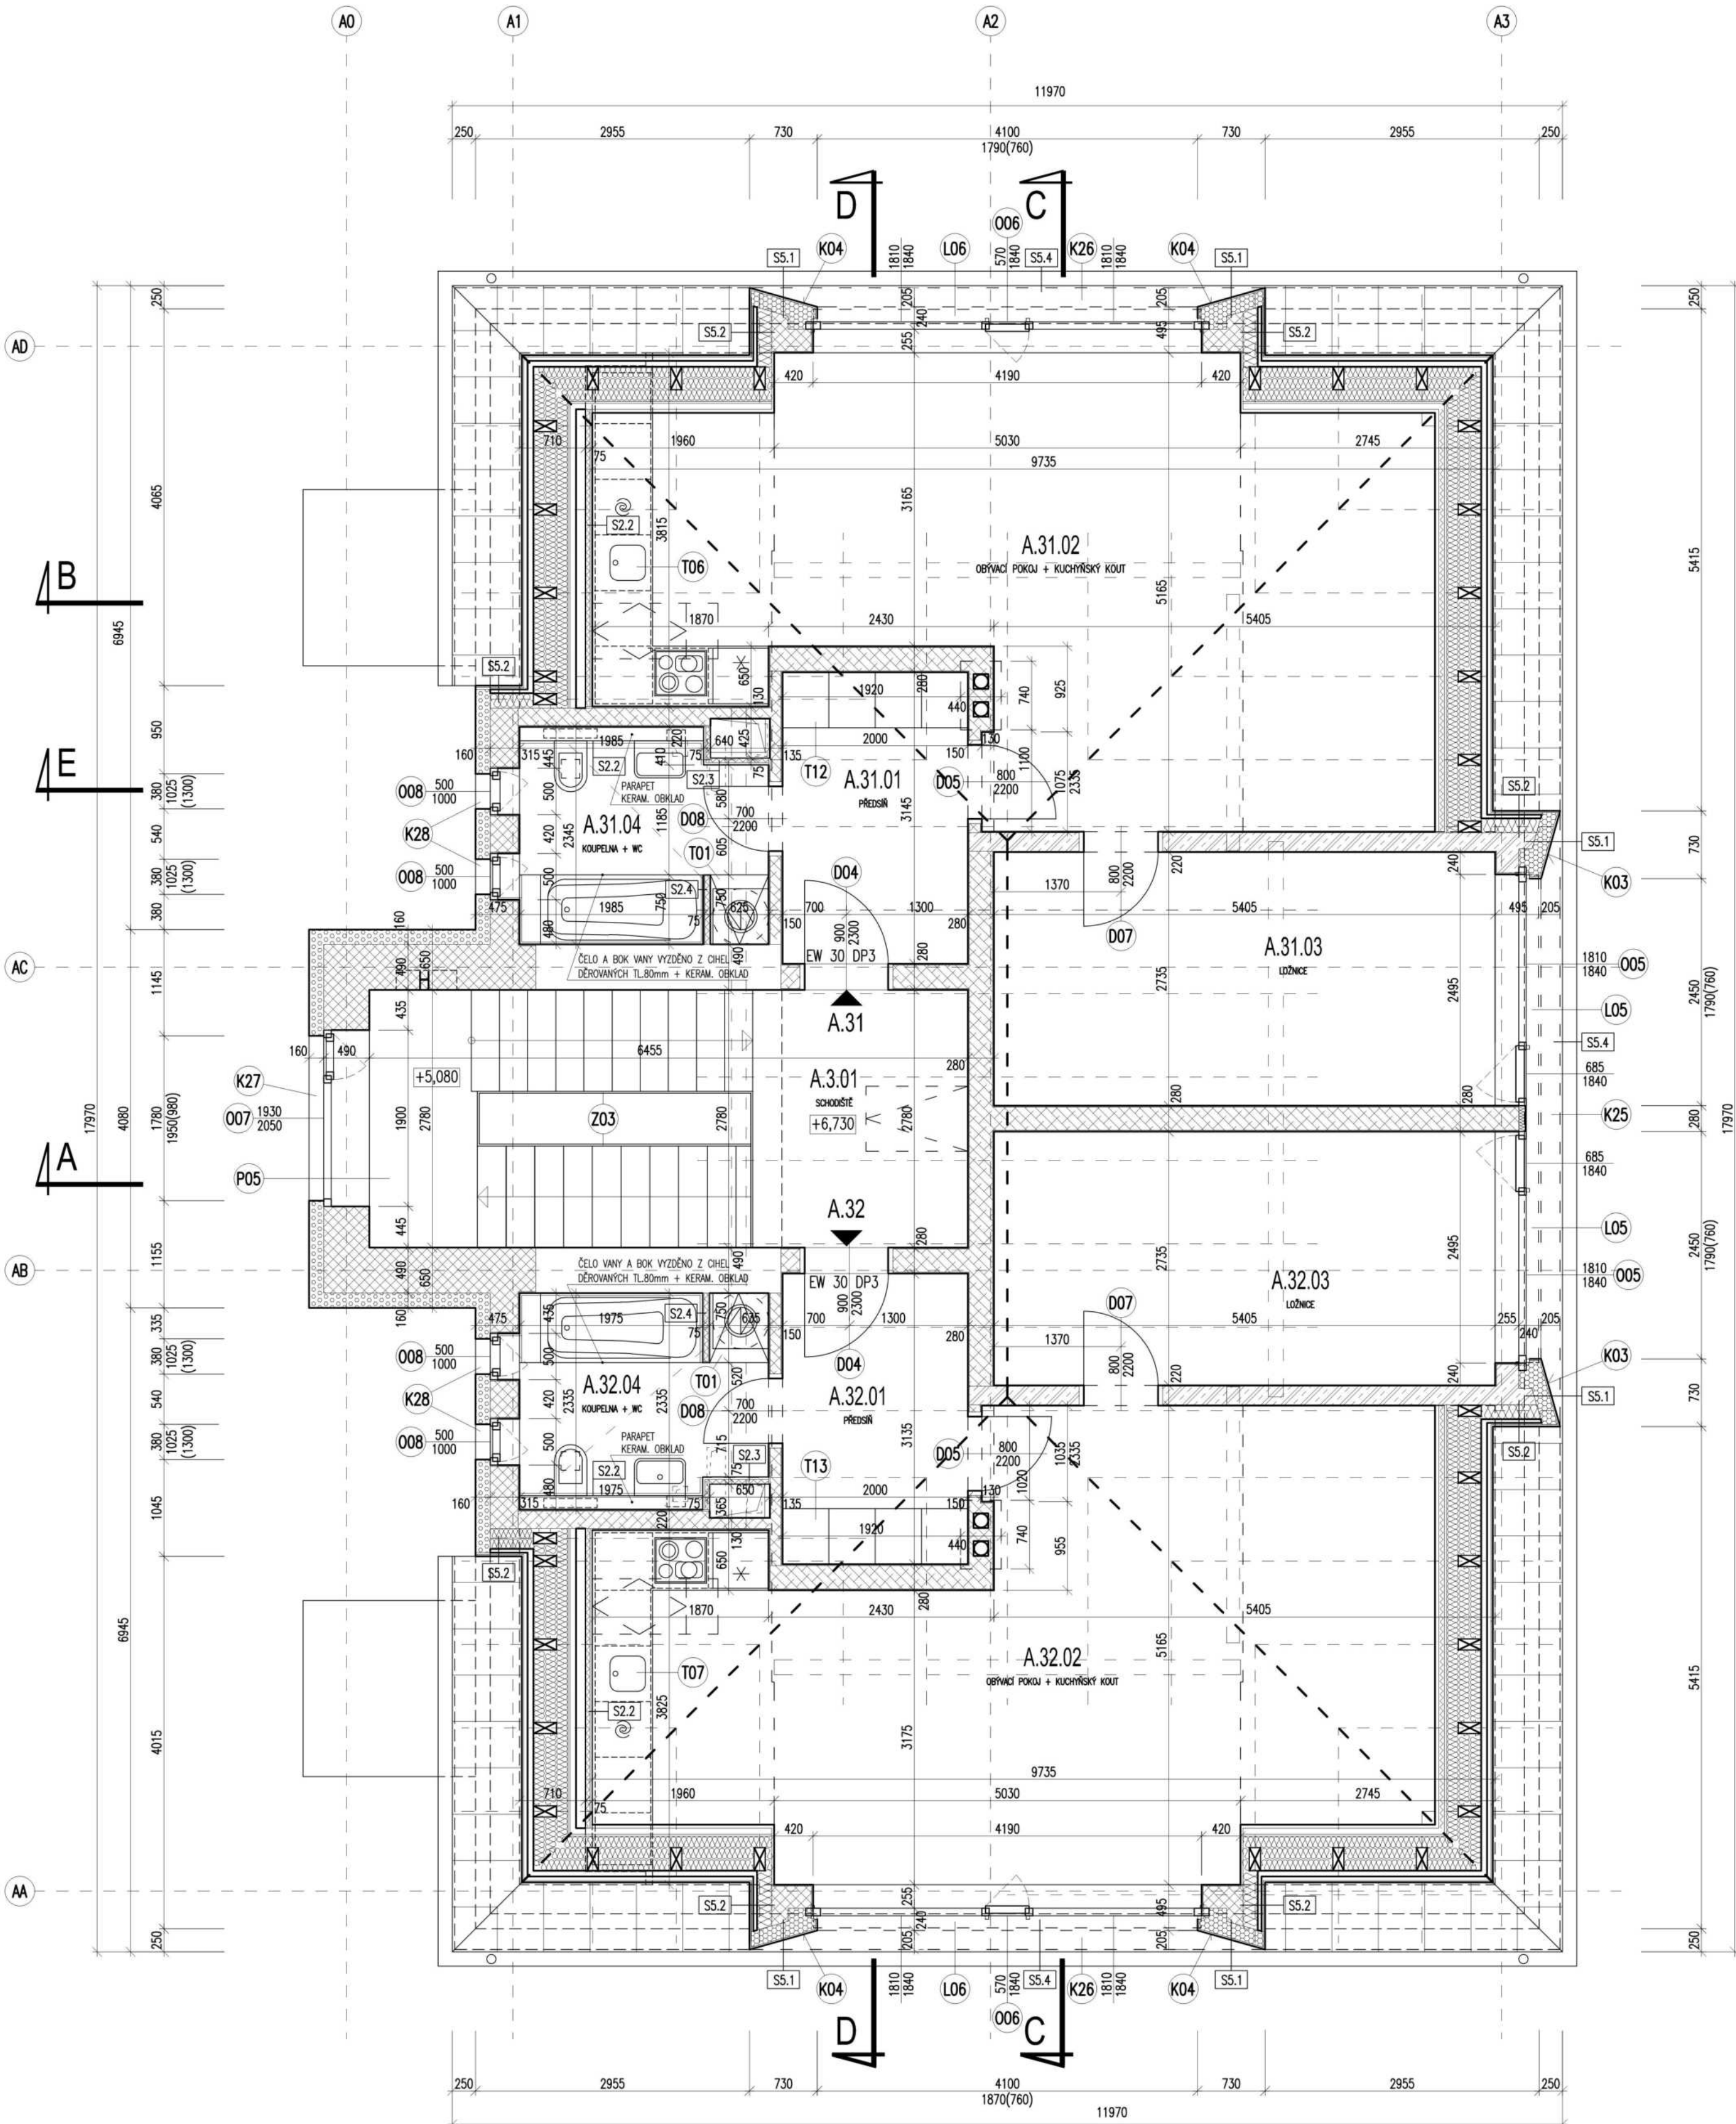

- ČISTÉ OMÍTKY V MÍSTNOSTECH S PODHLEDY VYTÁHNOUT cca 100mm NAD PŘEDPOKLÁDANOU ÚROVEŇ PODHLEDU
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY URČENÉ K ZABUDOVÁNÍ PODLE PROJEKTU SKŘ BUDOU PŘED ZABUDOVÁNÍM OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ ČÁSTI ZABUDOVYŇNÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDOU VYPLNĚNY CHILAMI VLOŽENÝMI DO PROFILŮ I MEZI PROFILY A OMÍTNUTY NA PLETIVU V TL. 10-20mm A MIN. ŠÍŘCE 200mmPŘES STAVAJÍCÍ ZDVO
- VEŠKERÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY HLOUBKOVĚ TLAKOVĚ IMPREGNOVAT PROTI ŠKŮDCŮM
- NEDILNOU SOUČÁSTI STAVEBNÍCH ŮPRAV JE PROJEKT SANACÍ ZDIVA Z HLEDISKA VLHKOSTI
- VEŠKERÉ PROSTUPY HYDROIZOLACEMI, KTERÉ SLOUŽÍ I JAKO PROTIRADONOVÁ CLONA MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UTĚSNĚNY SYSTÉMOVÝMI TĚSNÍCÍMI MANŽETAMI
- ROZVODNÁ POTRUBÍ K ROZVODU NEHOŘLAVÝCH LÁTEK PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ MOHOU PROSTUPOVAT POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONTRUKCÍ DO SVĚTLÉHO PRŮŘEZU 0,04m² BEZ DALŠÍCH OPATŘENÍ, POKUD BUDE POTRUBÍ PROVEDENO Z HMOT TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ B-F (STUPNĚ HOŘLAVOSTI B-C3, TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ EI
- VEŠKERÉ PROSTUPY VNITŘNÍCH ROZVODŮ A INSTALACÍ, ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONTRUKCEMI (KANALIZAČNÍ DO SVĚTLÉ PRŮŘEZOVÉ PLOCHY 8000mm², VODOVODNÍ DO SVĚTLÉ PRŮŘEZOVÉ PLOCHY 15000mm²), VZT ROZVODŮ DO 12000mm², ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ (SVAZEK VODIČŮ PROSTUPUJÍCÍ JEDNÍM OTVOREM S IZOLACÍ ŠÍŘICÍ POŽÁŘ, JEJICHŽ CELKOVÁ HMOTNOST NENÍ VĚTŠÍ NEŽ 1,0kg/m²) MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY
- MONTÁŽNÍ OTVORY PRO POTRUBÍ VYNECHANÉ BĚHEM STAVBY VE ZDĚNĚ, BETONOVĚ, SENDVIČOVĚ ČI JINĚ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI MUSÍ BÝT PO INSTALACI POTRUBÍ DOZDĚNY, DOBETONOVÁNY ČI JINAK ZAPLNĚNY VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ A2 A TO AŽ K POTRUBÍ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA CELISTVOST KONSTRUKCE A JEJÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST AŽ K VNĚJŠÍMU POVRCHU POTRUBÍ
- PROSTUPY VĚTŠÍCH PRŮŘEZOVÝCH PLOCH POŽÁRNĚ ODOLNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY V PROVEDENÍ EI, POMOCÍ POŽÁRNÍCH UCPAVEK, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ URČENOU DLE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- PROSTUPY POŽÁRNĚ ODOLNÝMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT ZŘETELNĚ OZNAČENY ŠTÍTKEM S INFORMACEMI
- VŠECHNY VNITŘNÍ VODOROVNĚ I SVISLÉ VNITŘNÍ ROHY OKLADŮ A DLAŽBY, OSAZENÍ SANITÁRNÍCH PŘEDMĚTŮ A VŠECHNA NÁPOJENÍ NA DVEŘE VYTMELT SILIKONOVÝM TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVÁNÍ
- VYSTOUPLÉ ROHY OKLADŮ BUDOU OSAZENY BÍLÝM LAKOVANÝM HLINÍKOVÝM L PROFILEM
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY A DVEŘE V NÁPOJENÍ NA OMÍTKU OČISTIT A DOTMELT PŘETÍRATELNÝM TMELEM
- INSTALAČNÍ ARMATURY V OKLADĚCH ZAKRÝT POMOCÍ DLAŽDICE S NÁLEPENÝMI MAGNETY (PODLE VELIKOSTI PŘÍPADNĚ SPOJIT VÍCE DLAŽDIC), OBVOD ZASPÁROVAT SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVÁNÍ
- VEŠKERÁ SVISLÁ I VODOROVNÁ OMÍTANÁ NÁROŽÍ PROVÁDĚT S OSAZENÍM PODOMÍTKOVÉ ROHOVÉ LÍŠTY

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

M.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA / SOKL	POVRCH STĚN	STROP
A.3.01	SCHODIŠTĚ	7,20	V5.2	BROUŠENÝ BETON SOKL v. 200mm BEZBARV. NÁTĚR	OMÍTKA - MALBA SVĚTLÝ OČISTN
A.3	SPOLÉCNÉ PROSTORY CELKEM	7,20			POHLEDOVÝ BETON
A.31.01	PŘEDSÍŇ	6,50	V4.2	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁVNĚSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMÍTKA - MALBA SVĚTLÝ OČISTN
A.31.02	OBÝVACÍ POKOJ+KUCH. KOUT	43,05	V4.2	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁVNĚSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMÍTKA, SOK - MALBA SVĚTLÝ OČISTN OKLAD SOUČÁSTI KUCHYŇSKÉ LINKY
A.31.03	LOŽNICE	14,80	V4.2	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁVNĚSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMÍTKA - MALBA SVĚTLÝ OČISTN
A.31.04	KOUPELNA + WC	5,65	V3.2	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL v. 200mm KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD V. 1200/2000mm OMÍTKA - MALBA SVĚTLÝ OČISTN
A.31	BYT 2+KK CELKEM	70,00			V1.2 SOK PODHLED S.H. 2400mm MALBA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
A.32.01	PŘEDSÍŇ	6,50	V4.2	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁVNĚSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMÍTKA - MALBA SVĚTLÝ OČISTN
A.32.02	OBÝVACÍ POKOJ+KUCH. KOUT	43,05	V4.2	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁVNĚSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMÍTKA, SOK - MALBA SVĚTLÝ OČISTN OKLAD SOUČÁSTI KUCHYŇSKÉ LINKY
A.32.03	LOŽNICE	14,80	V4.2	DŘEVĚNÉ VLKSY TRÁVNĚSNÉ SOKL MASIVNÍ DUBOVÁ LÍŠTA	OMÍTKA - MALBA SVĚTLÝ OČISTN
A.32.04	KOUPELNA + WC	5,65	V3.2	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL v. 200mm KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD V. 1200/2000mm OMÍTKA - MALBA SVĚTLÝ OČISTN
A.32	BYT 2+KK CELKEM	70,00			V1.2 SOK PODHLED S.H. 2400mm MALBA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Objekt A ±0.000 = 553.735 m.n.m. BpV
Objekt B ±0.000 = 553.000 m.n.m. BpV
Objekt C ±0.000 = 552.600 m.n.m. BpV

PROJEKT:
MĚSTSKÉ BYDLENÍ POLIČKA
ul. A. LIDIMLOVÉ A REVOLUČNÍ, 572 01 POLIČKA
parcels: 1278/2, st. 1244

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

LEGENDA:

- KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU
- DOZDÍVKY A PŘÍZDÍVKY Z CHIEL PÁLENÝCH PLNÝCH P NA MALTU VÁPNOCEMENTOVOU MVC
- ZDIVO Z CHIELNÝCH DĚROVANÝCH BLOKŮ PEVNOSTI DLE SKŘ např. PTH 24 P+D, VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OMÍTEK 15 mm
- ZDIVO Z CHIELNÝCH DĚROVANÝCH BLOKŮ PEVNOSTI DLE SKŘ např. PTH 25 AKU SYM ev. PTH 19 AKU, VČETNĚ SYSTÉMU OMÍTEK 15 mm
- ZDIVO Z CHIEL DĚROVANÝCH 115 mm nebo 80 mm, PEVNOSTI DLE SKŘ např. PTH 11,5 ev. 8 P+D VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OMÍTEK 15 mm
- PRÍČKY, PŘEDSTĚNY A PODHLEDY SDK
- AKUSTICKÁ (PROTILUKOVÁ) IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S PŘÍMÍŠÍ GRAFITU

OBJEKT:			
D.1.1.1. OBJEKT A - REKONSTRUKCE			
ČÁST:			
D.1.1.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
VÝKRES:			
PŮDORYS 3.NP (PODKROVÍ)			
MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	ČÁST:	ČÍSLO VÝKRESU:
1:50	6 A4	D.1.1.1.	
DATUM:	REVIZE:	INDEX:	
05/2022	1 - 08/2022	i02	

Svým podpisem obě Smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uznávají ji na základě svobodné vůle.

V dne.....

V Poličce dne

.....
za SIKO KOUPELNY a.s., Zhotovitel

Jaroslav Kovář, manažer prodeje

.....
Město Polička, Objednatel

Jaroslav Martinů, starosta
