

Smlouva o dílo
č. j. KRPB-148644-34/ČJ-2025-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO: 75151499

DIČ: CZ75151499

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 135034881/0710

kontaktní osoba:

e-mail:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma: **D – Develop, spol. s r.o.**

sídlo: Košínova 3139/19a, 612 00 Brno

zastoupená:

IČO: 26972760

DIČ: CZ26972760

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2053642399/0800

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 49120

kontaktní osoba:

e-mail:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, tuto

smlouvu o dílo

Čl. II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je realizace stavebních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení stavební akce **KŘP JmK – vybudování místnosti**.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností ELSAFE s.r.o., se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, vyhotovené v 05/2025, určující dílo v technických podrobnostech (dále jen „PD“).
3. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby a předání povinné související dokumentace k dílu např. předávací protokoly, povinné revize.
- 4.



Podrobný rozsah stavebních prací je zpracován v PD.

5. Součástí předmětu plnění (díla) je:
 - a) veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
 - b) vybudování zařízení staveniště v nezbytném rozsahu,
 - c) zajištění veškerých prací, demontáží, odvozu a recyklace, příp. zneškodnění odpadu a úhrada případných správních poplatků,
 - d) provedení stavebních, montážních prací a dodávek, splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,
 - e) dodání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestů a provozních návodů a předpisů v českém jazyce,
 - f) zhotovení dokumentace pro provedení stavby, se zakreslením změn dle skutečnosti (dokumentace skutečného provedení), bude objednateli předána 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech.

6. Digitální podoba dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována ve formátech: Výkresová část (CAD)

Může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN (Bentley Micro Station), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).

Veškeré výkresy nutno dodat také v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva

Bude dodána ve formátech DOC (Microsoft Word) a PDF (Adobe Acrobat).

7. Další požadavky k předmětu plnění:

- Zhotovitel je povinen respektovat provozní řád objektu PČR.
- Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů přeložky, rozvodů, vedení, s určenými pracovníky Policie ČR.
- Zhotovitel je povinen zajistit dodavatelskou dokumentaci v nezbytném rozsahu a průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla.

Technické podmínky

Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny

nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel platnými certifikáty a atesty na jakost v průběhu provádění prací na vyžádání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla. Objednatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů.

8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, a že je schopen dílo v tomto rozsahu zhotovit.

Čl. III.

Cena

- Předmět plnění patří do klasifikace produkce CZ-CPA č. 41 a 43. Zhotovitel je povinen použít režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**
- Celková cena za vymezený předmět díla je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.9.2025 viz příloha č. 1 této smlouvy a činí:
Celková cena: **bez DPH 1.347.918,69 Kč.**
Slovy: miliontřistačtyřicetsedmtisícdevětsetosmnáctkorunčeskýchšedesátdevěthaléřů.
Celková cena za předmět díla je nejvýše přípustná.
- Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla vč. všech rizik a vlivů během provádění prací. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla.**
- Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze na základě smlouvy nebo při změně sazby DPH.
- Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit (změnový list) písemný položkový soupis včetně ceny víceprací a odůvodnění jejich nezbytnosti, případně s tím související návrh úpravy termínu dokončení díla o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto víceprací, následně musí tyto změny bezodkladně předložit objednateli k odsouhlasení včetně aktualizovaného věcného a časového harmonogramu s případnou úpravou termínu pro dokončení díla.
Ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu (příloha této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy, budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírůstek na podíl vedlejších rozpočtových nákladů. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce HZS takto: pro montážní práce 400,- Kč/ hod bez DPH

k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů

V případě **odsouhlasení** soupisu víceprací a aktualizovaného harmonogramu objednatel budou tyto změny předmětu díla, ceny, doby plnění a termínu dokončení díla upraveny **dodatkem k této smlouvě o dílo**.

6. V případě, že do uzavření dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nesouvisí s vícepracemi. Teprve po uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu.
7. V případě, že by došlo k přerušení provádění díla z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).
8. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovádění některých prací (**méněpráce**), původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel povinen provést písemný soupis (změnový list) těchto méněprací včetně ceny a odůvodnění jejich neprovádění, případně s tím související návrh na úpravu termínu dokončení díla a bezodkladně jej předložit objednateli k odsouhlasení, včetně aktualizovaného věcného a časového harmonogramu s případnou úpravou termínu pro dokončení díla. Jednotkové ceny méněprací budou odpovídat cenám v oceněném soupisu prací (příloha smlouvy). Méněpráce budou objednatel schváleny pouze tehdy, pokud jejich neprovedení nebude mít za následek nesplnění cílů a parametrů projektu.
V případě **odsouhlasení** méněprací a zhotovitelem předloženého aktualizovaného harmonogramu objednatel, budou tyto změny předmětu díla, ceny, doby plnění a termínu dokončení díla upraveny **dodatkem ke smlouvě o dílo**.
9. Za nepředvídatelné práce se nepovažují práce a plnění, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s PD a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou zahrnuty v předmětu této smlouvy o dílo.

Čl. IV.

Místo a doba plnění

1. Doba plnění

Zahájení: **09/2025.**

(Skutečný termín zahájení díla bude uveden do stavebního deníku).

Ukončení: **do 28.11.2025.**

2. Veškeré práce budou probíhat za provozu v souladu s věcným a časovým harmonogramem stavebních prací (dále jen „harmonogram“) vypracovaným zhotovitelem. Zhotovitel je povinen harmonogram konzultovat a předložit k odsouhlasení objednatel, udržovat jeho aktuálnost s ohledem na vývoj stavebních prací a aktuální verzi přiložit ke stavebnímu deníku. Harmonogram bude předložen k odsouhlasení v den předání staveniště zhotoviteli.
3. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel neprodleně písemně objednateli a zapíše tuto skutečnost do stavebního deníku, jinak toto přerušení a následné prodloužení lhůty nebude objednatel uznáno.

4. Lhůta provádění prací může být přiměřeně prodloužena:
 - a) jestliže překážky v práci byly způsobeny prokazatelně objednatelem,
 - b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (průmyslové a přírodní pohromy) nicméně zhotovitel je povinen prokazatelně vykonávat vše, aby nastalé vlivy eliminoval,
 - c) jestliže objednatel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti dle čl. VIII. odst. b) této smlouvy o dílo (neposkytnutí součinnosti k předání staveniště),
 - d) jestliže došlo k posunutí termínu z důvodu dle čl. III. odst. 5. až 9. této smlouvy o dílo (vícepráce, méněpráce).
5. Dojde-li k přerušení prací ze shora uvedených důvodů, zhotovitel učiní vše, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek zahájí práce ihned a uvědomí objednatele písemně zápisem do stavebního deníku.
6. **Místo plnění:** Objekt PČR Brno.

Čl. V.

Platební podmínky

1. Fakturace bude provedena zpětně za kalendářní měsíc formou samostatných dílčích daňových dokladů a konečným daňovým dokladem vystavených zhotovitelem.
2. Podkladem pro platbu budou dílčí daňové doklady vystavené zpětně za kalendářní měsíc za skutečně provedené práce oceněné jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy této smlouvy a v souladu s PD a které budou předloženy objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce.
3. Přílohou každého daňového dokladu bude zástupcem objednatele odsouhlasený soupis skutečně provedených prací (zjišťovací protokol) oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy této smlouvy o dílo a v souladu s PD včetně dílčího daňového dokladu. Bez odsouhlaseného soupisu je daňový doklad neplatný.
4. Objednatel uhradí daňové doklady zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejich doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňové doklady do 30 dnů po jejich doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5. **Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.**
6. V případě výskytu drobných vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli daňové doklady za provedené práce max. do výše 90% sjednané ceny, zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí do 30 dnů po oboustranném podpisu zápisu o odstranění vad a nedodělků.
7. Objednatel v specifikovaný movitý majetek uvedený v položkovém rozpočtu bude uhrazen na základě zhotovitelem samostatně vystaveného daňového dokladu, odsouhlaseného zástupcem objednatele pro věci technické na vystaveném zjišťovacím protokolu o provedených stavebních a montážních pracích se splatností do 30 dnů od jeho doručení.
8. Všechny daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje, tj. označení a číslo daňového dokladu, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky), předmět plnění, cenu díla k úhradě a **výslovně název veřejné zakázky vč. uvedení čísla jednacího ze SoD.**
9. **Konečný daňový doklad zhotovitele kromě náležitostí daňového dokladu musí obsahovat:**
 - a) výslovně název „konečný daňový doklad“,
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- c) soupis všech předchozích uhrazených daňových dokladů (faktur),
 - d) soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností,
 - e) částku zbývajících k úhradě,
10. Zhotovitel je povinen veškeré daňové doklady zaslat elektronicky ve formátu PDF z e-mailu zhotovitele [REDACTED] na e-mail [REDACTED] objednatel [REDACTED] nebo pomocí datové schránky jydai6g.
11. Objednatel umožňuje předložení daňových dokladů ve dvou originálních výtiscích k rukám kontaktní osoby na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
[REDACTED]
Kounicova 24
611 00 Brno
pouze za předpokladu, že bude splněno jejich doručení elektronickou formou.
12. Elektronické faktury vystavené zhotovitelem ve strukturovaném datovém formátu (ISDOC/ISDOCX, CII, UBL) dle evropského standardu ve smyslu ustanovení § 221 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, lze zasílat pouze na e-mailovou adresu centrální podatelny zadavatele: [REDACTED]

Čl. VI.

Podmínky provádění díla

- a) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- b) Zhotovitel je povinen předložit vzorky rozhodujících materiálů k odsouhlasení objednateli.
- c) Dílo bude realizováno za nepřerušného provozu budovy. V pracovní dny budou práce probíhat od 7:00 do 15:00 hodin. Práce mimo uvedenou dobu, tedy o sobotách, nedělích a svátcích, bude možné provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatel. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR.
- d) Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla.
- e) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem, nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- f) Před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli písemně ve stavebním deníku (i telefonicky) nejméně dva pracovní dny předem plánovaný den kontroly. Objednatel má právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že dílo vykazuje

nedostatky, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O prověření sepíše objednatel zápis do stavebního deníku.

- g) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.
- h) Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně přerušit provádění díla z důvodů na straně objednatele anebo z objektivních důvodů (např. upřesnění technologie, provozní překážky aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit práce objednatel oznámí písemně zhotoviteli. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo. O dobu přerušení provádění díla se prodlouží doba realizace díla.
- i) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat a odpovídá objednateli jako by tuto část předmětu díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
- j) Zhotovitel je povinen provádět průběžnou fotodokumentaci stavby s prokazatelným označením data zhotovení fotografie a s uvedením předmětu fotografie, průběžně ji zasílat na email technického dozoru objednatele a po dokončení díla ji s řádně označenými fotografiemi předat na CD (DVD), příp. flash, objednateli.
- k) Kontrolní dny budou probíhat jednou týdně v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat i mimořádné kontrolní dny. Stavbyvedoucí je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a zaujímat stanoviska k řešeným problémům. Z každého kontrolního dne bude zhotovitelem pořízen písemný zápis, který bude zaslán všem účastníkům kontrolního dne.
- l) Zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby.
- m) Pracovníci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou pro pohyb a areálu PČR viditelně označení reflexní vestou s označením názvu firmy zhotovitele.

Čl. VII.

Práva a povinnosti

- a) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, povahou a místem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- b) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas s vynaložením odborné péče.
- c) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování BOZP a PO. Po dokončení opravy bude předložen stavební deník, příslušné revizní zprávy či jiné dokumenty zaručující bezpečné a spolehlivé provozování dokončeného díla.
- d) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom zápis.
- e) **Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody, el. energie.**

- f) Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na vlastní náklady.

Čl. VIII.

Staveniště

- a) Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.
- b) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel je povinen staveniště převzít ke dni zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoli omylu ze strany zhotovitele.
- d) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- e) Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
- f) Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění díla, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského průkazu. Při vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na recepci občanským průkazem.
- g) Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Po dokončení díla provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.
- h) Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců).
- i) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.
- j) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla vyklidit staveniště, odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního stavu.
- k) Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

Čl. IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník v originálu se dvěma průpisy a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy, a to zejména:
- údaje o časovém průběhu prací,
 - záznamy o přerušení nebo zastavení práce,
 - veškeré odchylky od této smlouvy.

2. Stavební deník je zhotovitel povinen vést ode dne zahájení stavebních prací do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu od předání stavby.
3. Ve stavebním **deníku musí být uvedeno mimo jiné:**
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
 - název a místo stavby dle smlouvy o dílo
 - jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby vykonávajících technický dozor stavebníka
 - zápisy o všech provedených zkouškách,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků.
4. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický dozor, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen a dostupný na stavbě.

Čl. X.

Předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve které zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady této smlouvy, aby mohl sepsat protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem, popř. zápisem do stavebního deníku. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami v souladu se smlouvou, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
- b) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. U drobných vad, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, se bude postupovat v souladu s Občanským zákoníkem.
- c) O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, uvedených v této smlouvě, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v této smlouvě. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu se smlouvou, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
- d) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. U drobných vad, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, objednatel postupuje v souladu s Občanským zákoníkem.
- e) Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení zejména:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení,
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,
- dokumentaci skutečného provedení díla (2x v tištěné podobě jako součást předávací dokumentace a 1x v elektronické verzi na CD) s barevným zakreslením veškerých změn a odchylek od PD,
- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- předání všech dokladů vztahujících se k požární bezpečnosti (např. doklady potvrzující třídu reakce na oheň), případně další doklady vyžádané objednatelem,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě CD),
- seznam dodavatelů technologických zařízení včetně kontaktů, data uvedení do provozu a periodicity servisních prohlídek.
- seznam činností a servisních úkonů, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy, včetně kontaktních údajů, příp. návrhu servisní smlouvy.
- doklady o provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- f) Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví osoby, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a současně je přitom i písemně upozorní na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.
- g) Zhotovitel je povinen předložit u převjímacího řízení všechny potřebné výše uvedené doklady, a to včetně projektové dokumentace zhotovitele ve třech tištěných kopiích a v elektronické podobě na záznamovém nosiči, v českém jazyce a v samostatném šanonu opatřeném přehledným krycím seznamem předávaných dokladů, přičemž v elektronické podobě bude tento krycí seznam u jednotlivých názvů položek spárován funkcí tzv. hypertextového propojení (Microsoft Excel/ záložka vložení/ hypertextový odkaz) s jednotlivě přiloženými doklady pro rychlé vyhledání patřičného dokumentu. Projektovou dokumentaci zpracovanou zhotovitelem předá zhotovitel také elektronicky v editovatelných tj. přepisovatelných formátech (.dwg, .xls, .doc, aj.) a prohlížečím formátu (.pdf).

Čl. XI.

Odpovědnost za vady, záruky

1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.
2. Záruční lhůta na stavební a montážní práce činí 60 měsíců ode dne předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na zařízení a dodávky bude poskytnuta v délce určené výrobcem, minimálně v délce 24 měsíců.
3. Podmínkou záruky je užívání díla k určenému účelu předpokládaným projektem a jeho běžná údržba.

4. Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednavatele uznává a vady odstraní v termínu do 10 dnů od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. Po odstranění vad vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s touto smlouvou od odstranění reklamované vady.
8. V případě havárií a závažných poruch zařízení nastoupí zhotovitel k odstranění vady nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady a odstraní ji do 24 hodin.
9. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

Čl. XII.


Sankce a pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) Za nedodržení termínu zahájení stavebních prací ve lhůtě dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši [REDACTED] za každý i započatý den prodlení.
 - b) Za prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši [REDACTED] za každý i započatý den prodlení.
 - c) Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši [REDACTED] za každý i započatý den prodlení.
 - d) Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši [REDACTED] za každý i započatý den prodlení, v případě vady bránící řádnému užívání díla nebo hrozby další škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každý i započatý den prodlení.
 - e) V případě porušení povinností k zajištění BOZP a PO dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] a to za každý prokazatelně zjištěný případ porušení povinností. Za prokazatelné porušení se považuje případ zapsaný do stavebního deníku a podepsaný zástupci zhotovitele a objednatele.
 - f) v případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši [REDACTED] za každý zjištěný případ.
 - g) Za nevyklizení stanoviště v termínu v souladu s touto smlouvou má objednatel právo uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každý i započatý den prodlení, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

- h) Při prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) má zhotovitel právo úroky z prodlení ve výši  z fakturované ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - i) Pro případ odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodu na straně zhotovitele se stanovuje kompenzační úhrada ve výši  ze sjednané ceny díla bez DPH.
2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

Čl. XIII.

Povinnost mlčenlivosti



Čl. XIV.

Odstoupení od smlouvy


1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 30 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
 - b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
 - c) nezahájí-li zhotovitel plnění předmětu díla, resp. nepřevzme staveniště ani do 20 dní po sjednaném termínu zahájení díla,
 - d) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dní,
 - e) jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé odstoupením od smlouvy,
 - f) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,

- g) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, pokyny objednatele, používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů,
- h) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.
- i) zjištění, že zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

Čl. XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
3. K zániku smlouvy může dojít:
 - a) dohodou smluvních stran,
 - b) odstoupením jednou ze smluvních stran.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.
7. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu objednatel.
9. Tato smlouva o dílo obsahuje 13 (slovy: třináct) stran textu a jednu přílohu o 27 (slovy: dvaceti sedmi) stranách textu.

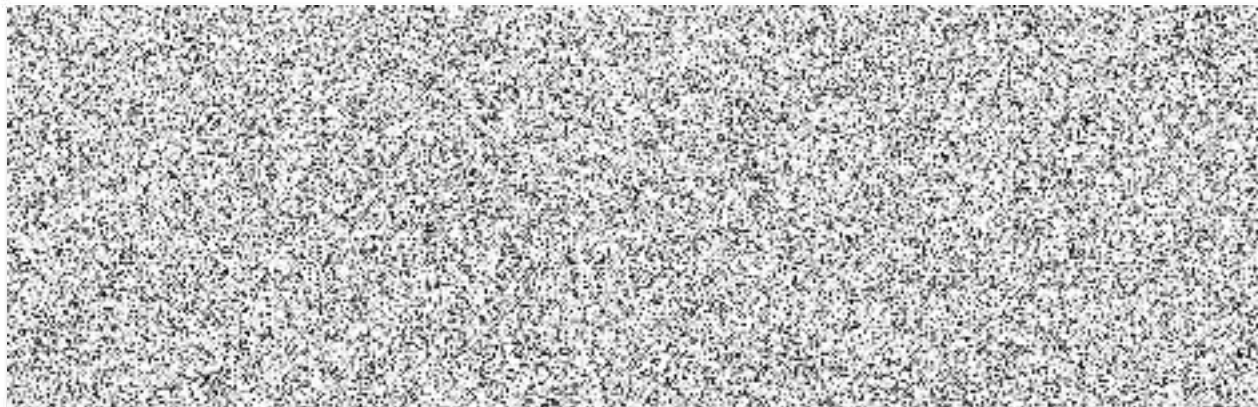

Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „KŘP Jmk – vybudování  místnosti“

A. Identifikační údaje dodavatele:

právní osoba:

Obchodní firma nebo název: D - Develop, spol. s r.o.	
Sídlo: Košínova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno	
Právní forma: Společnost s ručením omezeným	
IČO: 26972760	
DIČ: CZ26972760	
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.	číslo účtu: 2053642399/0800
	

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	Cena bez DPH v Kč
KŘP Jmk – vybudování  místnosti	1 347 918,69-

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Cenová nabídka předložená dodavatelem nesmí být zaokrouhlена – bude dodržen výpočet na dvě desetinná místa.

Cena musí být uvedena včetně dopravy a veškerých souvisejících nákladů na splnění veřejné zakázky.

C. Záruční lhůta:


	Zadavatelem požadovaná minimální délka záruční doby:	Dodavatelem nabídnutá délka záruční doby:
Stavební a montážní práce	minimálně 60 měsíců od předání díla	60 měsíců od předání díla

Prohlášení dodavatele:



Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodá v souladu se všemi podmínkami, které jsou uvedeny v této výzvě, předmět plnění dodá dle specifikace a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

datum

razítko



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

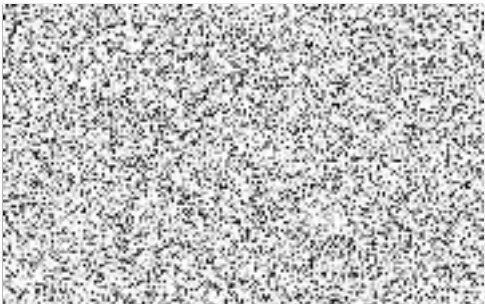Stavba:	2025/16		
Zadavatel	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje	IČO: 75151499	
	Kounicova 687/24	DIČ: CZ75151499	
	60200 Brno-Veverí		
Zhotovitel:	D - Develop, spol. s r.o.	IČO: 26972760	
	Košinova 3139/19a	DIČ: CZ26972760	
	61200 Brno		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 347 918,69
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	1 347 918,69 CZK	
Základní DPH	21 %	283 062,92 CZK	
Zaokrouhlení		0,39 CZK	
Cena celkem s DPH			1 630 982,00 CZK
 dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady					
2516_00	Vedlejší a ostatní náklady					
	Stavební objekt					
01	D 1.1 - Stavební část					
2516_01	D 1.1 - Stavební část					
02	D.1.4.5 - Zařízení pro ochlazování staveb a VZT					
2516_02	D.1.4.5- Zařízení pro ochlazování staveb a VZT					
03	D.1.4.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky					
2516_03	D.1.4.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky					
Celkem za stavbu		0,00	1 347 918,69	283 062,92	1 630 981,61	100

Popis stavby: 2025/16 -

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 2516_00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - D 1.1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2516_01 - D 1.1 - Stavební část

Popis objektu: 02 - D.1.4.5 - Zařízení pro ochlazování staveb a VZT


Popis rozpočtu: 2516_02 - D.1.4.5- Zařízení pro ochlazování staveb a VZT

Popis objektu: 03 - D.1.4.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Popis rozpočtu: 2516_03 - D.1.4.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1						
_2						
0						
416						
61						
62						
63						
64						
9						
94						
95						
96						
99						
725						
735						
763						
764						
766						
767						
775						

776						
777						
781						
783						
784						
786						
787						
D96						
VN						
ON						
Cena celkem					1 347 918,69	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/16	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2516_00	Vedlejší a ostatní náklady



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

A dense, grainy, black and white texture, possibly a close-up of a surface or a heavily degraded image. The texture is uniform across the entire frame, with no discernible patterns or objects. It appears to be a high-contrast, noisy image, perhaps a scan of a physical surface or a corrupted digital image.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	01	D 1.1 - Stavební část
R:	2516_01	D 1.1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	02	D.1.4.5 - Zařízení pro ochlazování staveb a VZT
R:	2516_02	D.1.4.5- Zařízení pro ochlazování staveb a VZT


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	02	D.1.4.5 - Zařízení pro ochlazování staveb a VZT
R:	2516_02	D.1.4.5- Zařízení pro ochlazování staveb a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	03	D.1.4.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
R:	2516_03	D.1.4.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	03	D.1.4.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
R:	2516_03	D.1.4.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/16	
O:	03	D.1.4.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
R:	2516_03	D.1.4.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
