
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPIC/MS/2025/00160**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Zábřeh

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Valentýnou Stachovou, specialistou pro výstavbu sítě – překládky SEK

(„**CETIN**“)

a

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO: 00303640

DIČ: CZ 00303640

ID DS: hk9bq2f

zastoupená RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

(„**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích tuto

**Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(„Smlouva“)**

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky, která je přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Zábřeh na Moravě spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „Stavební úpravy komunikace v lokalitě "Na Skokance" v Zábřehu, k. ú. Zábřeh na Moravě“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelety;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne 4.1.2023 vydané pod č.j. 2246/23, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích.

- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v Projektu.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
- a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích, vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a Zákona o elektronických komunikacích nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5. Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
- a) před realizací Překládky:
 - (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;

- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:

- a) zajistit rozhodnutí o povolení záměru o umístění stavby Překládky, přičemž stavba Překládky bude v žádosti o vydání povolení označena jako stavební objekt „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- b) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
- c) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“)

Práva a povinnosti z rozhodnutí o povolení záměru vydané Městským úřadem Zábřeh, odbor správní – rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUZB/36195/2021/OD ze dne 14.7.2021, pravomocného dne 20.8.2021 („**Rozhodnutí**“), které je Přílohou č. 2 Smlouvy, a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny, svědčí ode dne právní moci Rozhodnutí společnosti CETIN.

4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

- a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1. písm. a) Smlouvy;
- c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.

4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

4.7. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **387.978,- Kč** (slovy: tři sta osmdesát sedm tisíc devět set sedmdesát osm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech vyčíslených v odst. 5.2 Smlouvy.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
 - b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - f) náklady na identifikaci parcel,
 - g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, a které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,
 - i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - j) náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.4. Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2. a/nebo odst. 5.5. Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- a) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou po ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: posta@muzabreh.cz. Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečně vzniklé škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]
- 8.2. Za Stavebníka:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: referentka Odboru rozvoje a územního plánování
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDAKCE]
funkce: vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování
e-mail: [REDAKCE]

- 8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smlouvu lze zrušit:

(a) písemnou dohodou Smluvních stran;
(b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:

a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4. Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1. Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva.
- 10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu

stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.

- 10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona o registru smluv. Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto

principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.

- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
 - b) § 1767 odst. 2;
 - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
 - d) § 1743;
 - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převládá text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv a základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
- Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.13. Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.
- 12.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Rozhodnutí

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2025/00160
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP: 8030006297
Registr smluv: ANO

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Zábřeh na schůzi č. 54 dne 09.09.2025 pod číslem usnesení 25/RM/54/ORÚP/7024.

V Ostravě dne 30.10.2025

✓ Zábřehu dne 4.11.2025

Za CETIN:

Za Stavebníka:

Valentýna Stachová
specialista pro výstavbu sítě – překládky
SEK
CETIN a.s.



RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta
město Zábřeh



VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace

Titulní list

PROJEKT STAVBY

Objednatel:	CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9
Číslo stavby objednatele:	11010-085976
Dodavatel stavby:	
Zpracovatel projektové dokumentace:	
Projektant:	
Datum:	leden 2023
Počet výtisků:	3

**OBSAH:**

- A. **Identifikační údaje**
- B. **Průvodní zpráva**
- C. **Technická zpráva**
- D. **Rozpočtová část**
- E. **Výkresová část**
 - E.1 *Situace stavby (1 : 500)*
 - E.2 *Situace stavby v kat. mapě (1 : 500)*
 - E.3 *Schéma ochranných trubek*
 - E.4 *Schéma trubiček*
 - E.5 *Schéma optického kabelu*
 - E.6 *Schéma optických vláken*
 - E.7 *Schéma CU páru*
 - E.8 *HOST*

A. Identifikační a kontaktní údaje

Stavba:	VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace
Číslo SAP:	11010-085976
Kraj:	Olomoucký
Obec:	Zábřeh
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě
Stavební úřad:	Zábřeh
Odvětví:	Telekomunikace
Charakter stavby:	Nová liniová stavba

Objednatel:	CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9
--------------------	---

Zhotovitel:



Projektant:



Dozor investora:



B. Průvodní zpráva

B.1 Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Akce řeší přeložku telefonních kabelů mezi ulicemi Morávková a Malá Strana v Zábřehu. V dané lokalitě dojde k výstavbě nových komunikací a parkovišť na stávajících kabelech společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví Město Zábřeh (paní Kupková) v rámci svého stavebního povolení na celou stavbu.

B.1.1 Údaje o projektovaných kapacitách

Celková délka trati	0,086 km
Délka párů v metalických kabelech	0,150 kmp
Délka metalických kabelů	0,025 km

B.1.2 Členění stavby

Stavba nebude rozdělena.

B.1.3 Navazující a související stavby

Stavba je podmiňující pro realizaci komunikace.

B.1.4 Přehled výchozích podkladů

- zadání stavby zpracované uživatelem stavby - CTN
- vstupní jednání s uživatelem, místní šetření a jednání s majiteli nemovitostí
- vyjádření jednotlivých správců sítí dotčených organizací
- mapové podklady poskytnuté správci inženýrských sítí, města
- digitální a katastrální mapy dané lokality a informace z katastru nemovitostí

B.1.5 Původ použitých map pro zhotovení PD

Polohopis poskytla technická dokumentace. Situaci nových povrchů poskytl projektant rekonstrukce komunikace.

B.1.6 Provedené průzkumy a odborná posouzení

Akce řeší přeložku telefonních kabelů mezi ulicemi Morávková a Malá Strana v Zábřehu.

B.1.7 Podmínky stanovené pro zpracování PD a realizaci stavby

Na tuto stavbu je vydáno územní rozhodnutí a uzavřeny smlouvy vbř. Stavba se nachází v místě s možnými archeologickými nálezy, investor uzavře v dostatečném předstihu před zahájením stavby smlouvu o podmínkách provedení archeologického průzkumu. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými vynálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost

záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění arch. výzkumů.

B.1.8 Škody na zem. a lesních kulturách a náhrada za omezení

Nebudou.

B.1.9 Délka platnosti projektu a vyjádření správců sítí a organizací

- Viz. dokladová část. Není součástí této PD. Dodá investor.

B.1.10 Časový plán výstavby

Předpokládaný termín zahájení výstavby je rok 2022.

B.2 Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění zemních prací. Míra ovlivnění závisí na dodržení všech připomínek a podmínek k PD a realizaci (viz. Územní rozhodnutí, dokladová část a příslušné oddíly TZ) vztahujících se k ochraně životního prostředí ze strany realizátora stavby.

B.3 Environmentální aspekty a dopady na zdraví a životní prostředí

Dle přílohy směrnice STAV 52.02, zpracované ve znění obecně platných zákonů a vyhlášek, je pro činnosti vyplývající z chodu organizace, tak pro činnosti vyplývající ze zakázek pro dodavatele zpracován registr environmentálních aspektů, kterého se dotýkají níže uvedené zákony a vyhlášky :

- OCHRANA OVZDUŠÍ zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
- ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ zákon 185/2001 Sb. o odpadech, zákon 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon 477/2001 Sb. o obalech, vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
- OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství
- OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU zákon č. 334/1992 Sb. a jeho úplné znění - č. 231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhláška č. 13/1994 o upravení podrobností o ochraně ZPF
- OCHRANA VODNÍCH TOKŮ zákon 254/2001 Sb. o vodách
- OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU zákon č. 289/1995 Sb. o lesích

Oblasti dopadů na zdraví a životní prostředí jsou dle registru :

OVZDUŠÍ Znečištění ovzduší, poškození ozónové vrstvy, zápach

VODA Znečištění povrchových a podzemních vod a ovlivnění odtokových poměrů na dotčené lokalitě

PŮDA Kontaminace půdy

ODPADY Ostatní a nebezpečné odpady

ZDROJE Využívání neobnovitelných zdrojů, spotřeba surovin spotřeba energie

JINÉ Prašnost prostředí, poškozování zdraví hlukem, vibracemi a radioaktivitou

Při realizaci zakázek mohou nastat mimořádné a havarijní nehody. Tyto jsou popsány v registru environmentálních aspektů i s možnými environmentálními dopady. Z tohoto důvodu bude požadováno po dodavateli zpracování havarijních plánů pro tyto možné mimořádné a

havarijní nehody. Jedná se např. o možný únik oleje a benzínu, poškození inženýrských sítí (elektrika, voda, plyn). Taky je nutné brát zřetel na ekologickou likvidaci materiálu (kabely, sloupy, spreje, barvy, apod.).

Environmentální aspekty, dopady na zdraví a životní prostředí včetně opatření pro jejich eliminaci k této stavbě jsou přílohou TZ.

B.4 Bezpečnostní rizika spojená s realizací stavby

Určeno dle směrnice STAV 52.01, příloha č.3

- 1 Silniční vozidla a pojízdné zdroje
- 2 Žebříky - žebříky přenosné
- 3 Stavební práce – staveniště
- 4 Stavební práce - práce ve výškách
- 5 Stavební práce - zemní práce – výkopy
- 6 Malá mechanizace - benzinové přenosné přístroje
- 7 Malá mechanizace - Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací
- 8 Malá mechanizace - Elektrická mechanizovaná nářadí
- 9 Malá mechanizace - Horkovzdušné pistole
- 10 Malá mechanizace - Elektrické vrtačky
- 11 Stavební stoje – elektrocentrály
- 12 Stavební stoje - kompresor PD200
- 13 Stavební stoje - vibrační pěchy , pěchovadla
- 14 Stavební stoje - kolová rýpadla, pásová rýpadla
- 15 Zdvihačí zařízení - Mobilní jeřáby - autojeřáby vlastní i pronajaté
- 16 Zdvihačí zařízení - Hydraulická ruka HR 3001
- 17 Zdvihačí zařízení - Pohyblivé pracovní plošiny na kolovém podvozku
- 18 Manipulace a skladování - ruční manipulace
- 19 Manipulace a skladování - nakládk a vykládka dopravních prostředků
- 20 Manipulace a skladování - Skladovací regály
- 21 Manipulace a skladování - Skladovací prostory
- 22 Elektrická zařízení - úraz el. Proudem
- 23 Elektrická zařízení - atmosférická elektřina – blesk
- 24 Psi

Nejdůležitější bezpečnostní rizika projektované stavby jsou podrobně rozepsána v příloze za technickou zprávou.

Při ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců musí zaměstnavatelé dbát zejména na ustanovení zákoníku práce:

1. Ustanovení § 132 odst. 2 ZP stanoví „povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti“.
2. Ustanovení § 132 odst. 4 ZP stanoví „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, **jsou zaměstnavatele povinni vzájemně se písemně informovat** o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen :
 - a. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a
 - b. spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Z těchto dvou ustanovení zákoníku práce vyplývá povinnost vedoucích pracovníků dodavatelské (realizační) firmy vyžadovat před započítím prací v prostorách cizí organizace, od této organizace rizika, která vyplývají z činnosti druhé organizace a z pohybu svých

zaměstnanců v prostorách této organizace a mohlo by při pohybu vlastních zaměstnanců v těchto prostorách dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví těchto zaměstnanců. **Zaměstnanci dodavatele nesmí na tomto pracovišti zahájit svou činnost, pokud nebudou obě ustanovení zákoníku práce splněna!!!!**

Tato ustanovení zákoníku práci platí i v případě, že dodavatel zadá část zakázky jinému subdodavateli (např. zemní práce).

B.5 Bezpečnost práce a PO

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy. Zaměstnavatel a osoby mu na roveň postavené (§ 12 a 13 zákona č. 309/2006 Sb. dále jen ZBOZP) mají povinnost prevence rizik spočívající zejména v plnění opatření stanovených právními a ostatními předpisy (§ 102 odst. 1 a 2 a § 349 ZP), přičemž právnické osoby jsou vždy povinny provádět opatření v prevenci rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (dále jen OZO PR), jak stanoví § 9 ZBOZP a jsou povinny součinností při ochraně života a zdraví dle § 9 odst. 6 ZBOZP. K těmto rizikům týkajících se práce a pracoviště je zaměstnavatel povinen podle potřeb (určí OZO PR) dát potřebné informace a pokyny zaměstnancům (§ 103 odst. 1 písm. f ZP) i zaměstnancům jiného zaměstnavatele (dtto písm. g ZP), o čemž je povinen vést dokumentaci (§ 103 odst. 1 poslední věta ZP).

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění, dle ustanovení § 101 odst. 3 ZP. Toto ustanovení platí pro zhotovitele stavby a zaměstnavatele, který není zhotovitelem stavby či poddodavatelem, ale přesto jeho zaměstnanci plní úkoly v prostoru staveniště, typickým příkladem je železniční dopravní cesta kontra staveniště, správa silnic kontra staveniště, výrobní závod kontra staveniště apod. V tomto případě **neúčastník výstavby** nepodléhá koordinaci BOZP koordinátorem, ale zhotovitel musí uzavřít písemnou dohodu o koordinaci BOZP v místě střetu staveniště a pracoviště dotčeného staveništěm.

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy **zákon č. 309/2006 Sb.**, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007.

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. V případech povinného ustanovení koordinátora BOZP na staveništi, dle zvláštního ustanovení ZBOZP, neplatí povinnost koordinace a písemné dohody mezi účastníky výstavby dle § 101 odst. 3 ZP, ale koordinace BOZP je dle § 15 ZBOZP směřována k plánu BOZP zajišťovaným zadavatelem stavby a činnost v oblasti prevence rizik je směřována zhotoviteli dle § 16 ke koordinátorovi BOZP. Zhotovitelé a poddodavatelé provádí prevenci rizik nadále prostřednictvím OZO PR, dokumentují své informace a pokyny týkající se práce a pracoviště s ohledem na rizika poskytované svým či jiným zaměstnancům a poskytují tak součinnost KOOBOZP dle § 16 ZBOZP a umožňují tak zadavateli zajistit plán BOZP v potřebném rozsahu, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, byla v něm uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a dle skutečného stavu a podstatných změn během realizace stavby, jak po něm vyžaduje § 15 odst. 2 ZBOZP.

Pro tvorbu plánu BOZP a jeho aktualizace dle postupu výstavby budou poddodavateli i zhotoviteli stavby předkládány technologické postupy (pokyny dle § 103 odst. 1 písm. f ZP) s podpisy odpovědného zástupce poddodavatele pro požadovanou živnost (činnost) pokud není požadován stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí s číslem jeho autorizace a oboru autorizace a jeho OZO PR s číslem osvědčení. Zhotovitel stavby každý technologický postup opatří stavbyvedoucím s číslem a oborem autorizace a jeho OZO PR s číslem osvědčení. Koordinátorem odsouhlasené postupy budou vkládány do plánu BOZP, jako jeho aktualizace k dosažení potřeby souladu opatření plánu BOZP ke skutečnému průběhu prací v potřebném rozsahu a podrobnostech, jak po zadavateli stavby vyžaduje § 15 odst. 1 ZBOZP.

Nezbytnými podrobnostmi je i určování osob s kvalifikací či oprávněními požadovanými právními předpisy, jak ukládá stavebnímu podnikateli § 31 živnostenského zákona, a to prostřednictvím odpovědného zástupce pro živnost provádění staveb, jejich změna odstraňování v rozsahu určeném § 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona, což se týká zejména:

- stavbyvedoucích s patřičným oborem autorizace dle z. 360/1992 Sb.
- odborně způsobilých osob pro doč. stav. Konst. dle § 4 NV 362/2005 Sb., část VII přílohy
- dalších osob pro přebírání bednění, závěsných košů atd.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1.1.2007, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví pod. ochr. zdraví při práci, účinnost 1.1.2008

Požadavky

- na pracoviště a pracovní prostředí,
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a náradí,
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit,
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a
- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a

hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance

stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.:

- **NV č. 362/2005 Sb.**, o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- **NV č. 101/2005 Sb.**, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- **NV č. 378/2001 Sb.**, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí
- **NV č. 28/2002 Sb.**, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
- **NV č. 168/2002 Sb.**, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- **NV č. 11/2002 Sb.**, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb.
- **NV č. 272/2011 Sb.**, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- **NV č. 495/2001 Sb.**, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
- **NV č. 201/2010 Sb.**, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- **Z č. 266/2006 Sb.**, o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost od 1.1.2017 s výjimkou §92 Převod zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a §93 Povinnosti zaměstnavatele
- **V č. 79/2013 Sb.**, o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Komunikace, prostory, pohyb osob, doprava, oprava vozidel

Riziko: Sražení osoby vozidlem nebo stavebním strojem při pohybu po pracovišti.

Opatření:

- Maximální pozornost řidiče vozidla popř. obsluhy stavebního stroje při pohybu po pracovišti.
- Maximální pozornost pěších osob při chůzi po pracovišti.
- Seznámení řidičů vozidel, obsluh strojů a všech dotčených osob s přístupovou cestou a komunikací na pracovišti.
- Veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.
- Po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na staveništi, při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.
- Při každém pohybu vozidla a stavebního stroje (nejenom couvání) dá obsluha zvukové znamení před zahájením úkonu.
- Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy od stroje.

Riziko: Dopravní nehoda při výjezdu vozidel na provozovanou komunikaci ze staveniště.

Opatření:

- Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě.
- Používat jen schválené a vyznačené výjezdy
- Dlouhá vozidla (návěsy apod.) při výjezdu ze staveništní na veřejnou komunikaci zajistit výjezd vozidel pomocí náležitě a prokazatelně poučené osoby. Zaměstnanec – bezpečnostní hlídka – vždy používá reflexní vestu.

Pohyb po staveništi

Riziko: Uklouznutí, zakopnutí, následný pád se zraněním

Opatření:

- udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných bez překážek a bez zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením apod.
- vedení pohyblivých přívodů a el.kabelů mimo komunikace
- včasné odstraňování komunikačních překážek
- používání OOPP (vhodná pracovní obuv)
- čištění a údržba staveništních komunikací, chodníků a přístupových cest zejména v deštivém počasí a v zimním období

Doprava materiálu na staveniště, skladování, manipulace, provoz zdvihacích prostředků.

Riziko: Pád uskladněného materiálu na zaměstnance či jinou osobu při chůzi nebo jiné

manipulaci s ním - skladování

Opatření:

- Zajistit bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem stavebních prací.
- Sklady, skladiště a jednotlivá místa k uskladnění materiálu neumísťovat v prostorách trvale ohrožovaných dopravou břemen, na komunikacích, kde by bránily pohybu motorových vozidel nebo chodců.
- Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna stabilita a nedošlo k jeho znehodnocování.
- Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.
- Sypký materiál ukládat do jakékoliv výšky plně mechanizovaným způsobem za předpokladu, že odebírán bude stejným způsobem.
- Vytvoří-li se stěna, musí být odběr upraven tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 dovoleného dosahu nakládacího stroje.
- Při ručním ukládání a odebírání může být materiál navršen pouze do výšky 2 m.
- Při odběru z hromad vyšších než 2 m, musí být toto místo upraveno tak, aby nevznikaly převisy a výška stěn nepřesáhla 1,5 m.
- Sypké materiály v pytlích se skladují ručně do výšky 1,5 m, mechanizací do výšky 3 m.
- Kusový materiál pravidelných tvarů ručně jen do výšky 2 m, nepravidelných tvarů jen do výšky 1,5 m.
- Tekutý materiál skladovat v uzavřených nádobách tak, aby plnicí (vyprazdňovací) otvor byl vždy nahoře.
- Oblé předměty (plechovky) ukládat ručně do výšky max. 2m. Roury apod. musí být uloženy tak, aby nedošlo k sesutí.
- prvky a dílce pravidelných tvarů se mohou ukládat až do výšky 4 metrů při použití mechanizačních prostředků.

Výkopy stavebních rýh (pro kanalizaci, vodovod, plynovod apod.), stavební jámy apod.***Riziko: Výbuch při narušení a poškození plynových potrubí s následným únikem zemního plynu***

Opatření:

- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením zemních prací.
- omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí.
- dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek.

Riziko: Pád osob do výkopu

Opatření:

- K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutýčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu.

Riziko: sesutí stěn hlubších výkopu a zavalení pracovníku

Opatření:

- U všech výkopu zajistit stabilitu svahu – svahováním (sklon dle typu zeminy určuje projektant zemních prací) nebo pažením při kolmých stěnách (od hloubky 1,3 m v zastaveném území a od 1,5 m v nezastaveném území)
- Vyloučeny budou rovněž jakékoliv práce v prostoru smykových klínů výkopů, které by zatěžovaly smykový klín (např. pojezd mechanizace, manipulace s materiálem atd.). Smykové klíny sahají do vzdálenosti od okraje dna výkopu, rovnající se hloubce výkopu, nebude-li v projektu upřesněno jinak

Elektrická zařízení - úrazy elektrickým proudem

Riziko: Zasažení pracovníků elektrickým proudem (poškození vodičů, náhodný dotyk s fázovým vodičem, porušení izolace, nedodržení ochranných pásem elektro)

Opatření:

- Zákaz odstraňování ochranných krytů a zábran, otvírání přístupů k elektrickým částem zařízení a respektování bezpečnostních sdělení.
- Vyloučit činnosti při kterých by se pracovník mohl dostat do styku s napětím na vodivé kostře nebo se mohl přímo dotknout obnažených částí vodičů.
- Veškeré opravy a zasahování do elektrických zařízení smí jen osoba s odbornou způsobilostí v oboru elektro.
- Je nutné provádět řádné a pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení a odstraňování zjištěných závad.
- Zákaz omotávání prodlužovacích kabelů a jiných elektrických vedení kolem kovových konstrukcí (lešení apod.)
- Prodlužovací kabely vedoucí přes komunikace je nutné zabezpečit proti mechanickému poškození (např. vyvěšením, pomocí krytů apod.)
- Hlavní vypínač elektrického proudu je nutno zřetelně označit a kolem jeho umístění udržovat volný přístupový prostor.
- Požívat pouze odpovídající a neporušené pohyblivé přívody a přezkoušené ruční elektrické nářadí. Přívody a nářadí jevící poškození předat ihned do opravy.
- Důsledně dodržovat ochranná pásma elektrického vedení dle ustanovení platné legislativy. Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA).

B.6 Vliv na PO, CO a integrovaný záchranný systém

Z hlediska požární ochrany zákona č.67/2001 Sb. v platném znění o požární ochraně je stavba bez zvýšeného požárního rizika. Z hlediska PO a CO je potřeba případné překopy komunikací provádět po částech tak, aby byla zachována průjezdnost komunikace. Jinak realizací akce dojde k dalšímu zvýšení spolehlivosti a dosahu pevné telekomunikační sítě a tím i systému CO a PO.

B.7 Zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě s obecním úřadem. Přesné umístění, termín a poplatky je nutno dohodnout se zástupci obce před realizací stavby.

B.8 Vedení a předání stavby

Na stavbě bude veden stavební deník dle §157 stavebního zákona (příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákon.

Po dokončení stavby bude uživateli předáno zaměření.

C. Technická zpráva

C.1 Technické řešení

Akce řeší přeložku telefonních kabelů mezi ulicemi Morávková a Malá Strana v Zábřehu. V dané lokalitě dojde k výstavbě nových komunikací a parkovišť na stávajících kabelech společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví Město Zábřeh (paníKupková) v rámci svého stavebního povolení na celou stavbu.

Stavba bude koordinována se stavbou „VPIC Zábřeh, Sušilova 41,dům pro seniory.“

- V místě plánovaného parkoviště mezi par. č. 985/6 a par. č. 985/2 dojde k odkopání kabelu PPFLE 100XN 0,4 a k jeho ochránění pomocí trubky SYSPRO.
- V místě plánované opěrné stěny z gabionu u č.p. 1344 dojde ke zrušení stáv. trasy kabelu PPFLE 3XN 0,4 a k instalaci kabelové vložky pomocí kabelu PPFLE 3XN0,4. Kabely budou propojeny pomocí rovných spojek a v celé délce nové trasy bude kabel ochráněn pomocí PE110.
- V místě realizace nových povrchů před č.p. 33 budou stávající kabely PPFLE 3XN 0,4 odkopány a ochráněny pomocí SYSPRO. Souběžně bude uložena rezervní PE110 pro případné opravy na vedení.
- V místě plánovaného napojení nové komunikace na ulici Morávková bude vedení tří HDPE 40mm barev černá, oranžová (s OK 778 012 01 typu Samsung 24f+CU) a oranžová s bílým pruhem (s OK 549 012 01 typu Samsung 24f+CU) a kabel PPFLE 200XN0,6 vedoucí do ZABR59 odkopáno a v délce 12m a ochráněno pomocí SYSPRO. Souběžně bude uložena rezervní PE110 pro případné opravy na vedení. Délka SYSPRO je volena tak, aby vedení bylo ochráněno i pro realizaci stavby „VPIC Zábřeh, Sušilova 41,dům pro seniory“ v rámci které je plánováno napojení na ulici Morávková. V případě, že bude dříve realizována stavba "VPIC Zábřeh, Sušilova 41,dům pro seniory" bude vedení ochráněno v rámci této stavby.
- **Měření optických vláken**
 - U stranově přeložených kabelů dojde ke změření pouze vláken bez provozu a to před samotnou překládkou a po provedení překládky. Měření bude provedeno jednostranným měřením reflektometrem (OTDR) s vyhodnocením útlumu případných spojek a vyhodnocením měrných úseků jednotlivých úseků. Provádí se při vhodné délce impulsu podle charakteru a délky trasy v přenosovém okně 1625 nm. Touto metodou budou změřena vlákna 5-11 a 13-24 na OK 778 012 a vlákna 9-11 a 16-24 na OK 549 012.
- **Před záhozem po odkrytí vedení a po uložení vedení do SYSPRO je zhotovitel povinen přizvat správce sítě ke kontrole, se zápisem o povolení záhozu do SD.**

Investor:

Město Zábřeh,

Projektant –

C.2 Výkopy – kabelová trasa**C.2.1 Ochrana krajiny a přírody**

Při výstavbě nutno dodržet zákon č.100/2001 Sb. o pos. vlivů na životní prostředí příloha č.1čl. 10.15, zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon 44/1988 Sb.o ochraně a využití nerostného bohatství - (horní zákon) § 19.

C.2.2 Ochrana zemědělského půdního fondu

Při výstavbě nutno dodržet zákon č.334/1992 Sb. v úplném znění č.231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu § 7 odst.3, § 8, § 9 odnětí vyhláška č. 13/1994 o upravení podrobností o ochraně zemědělského půdního fondu § 6, § 7.

C.2.3 Ochrana vodních toků

Při realizaci akce nedojde ke křížení toku.

C.2.4 Ochrana lesního půdního fondu

Při realizaci akce nebude dotčen LPF.

C.2.5 Ochranná pásma

Při výstavbě je nutné dodržet ochranná pásma určená zákony č.458/2000 Sb. (energetika, plyn), č.13/1997 Sb.(silniční ochranná pásma), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a ČSN 755411, č.114/1992 Sb. zákon o ochraně přírody (památné stromy).

V situačních výkresech jsou zakresleny všechny zjištěné inženýrské sítě získané od správců inženýrských sítí a Městského úřadu.

- v lokalitě možnost neověřených soukromých inženýrských sítí

Veškeré existující inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Před započítáním realizace stavby budou na základě objednávky u správce dané sítě vytyčeny a vyznačeny v terénu. K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění jednotlivých sítí navzájem, musí být při křížení mezi potrubím, stokami, kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti, dále musí být dodrženy příslušné zákony, vyhlášky, normy a vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

C.2.6 Přechody a souběhy silnic, místních komunikací a vjezdů

Při výstavbě nutno dodržet zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích §77odst. (stanovení přechodné úpravy provozu), zákon 13/1997 Sb. pozemních komunikací §32, §36, vyhláška č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích §50.

C.2.7 Přechody vodních toků a meliorací

Při realizaci akce nedojde ke křížení toku.

C.2.8 Prostorové uspořádání vedení – inženýrské sítě

Při prostorovém umístění kabelu vůči ostatním podzemním sítím je nutno dodržet minimálně (pokud správci sítí ve vyjádřeních neuvádí jinak) vzdálenosti dané **ČSN 736005**, kde jsou určeny nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu a svislé vzdálenosti při křížení s podzemními sítěmi.

C.2.9 Krytí / hloubka uložení kabelu

Vedení bude ve výkopu uloženo ve většině případů do pískového lože, nad kterým bude v intravilánu uložena krycí deska, nebo do ochranných trubek průměru 110 mm. V extravilánu v poli bude projektované vedení uloženo do lože z prosáté zeminy. Výstražná fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženým kabelem, nejméně však do hloubky 0,2 m pod povrchem u kabelu s min. krytím 0,4 m. **Při přechodech přes komunikace nebo vjezdy budou kabely zataženy do ochranných trubek.**

C.2.10 Definitivní úpravy povrchů

Projekt obsahuje definitivní úpravy povrchů. Po skončení pokládky bude proveden zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách a bude provedena provizorní úprava povrchu kabelových rýh. Po uplynutí doby potřebné k sesednutí záhozu výkopů bude provedena definitivní úprava terénu. Tato úprava se předpokládá jen v zástavbě a týká se vozovek, komunikací, vjezdů a chodníků. V zelených pásích bude provedeno dorovnání terénu a poté osetí trávou. Před zahájením výkopových prací v místě zpevněných ploch nutno kontaktovat správce komunikací.

C.2.11 Hospodaření s ornici

Není.

C.3 Účastnická síť – použitý materiál a montáž

C.3.1 Kabely

Pro místní síť je použit telefonní kabel s měděným jádrem průměru 0,4 - 0,8mm typu PPFLE. Montáž kabelů bude provedena dle výkresů situací, schémat zapojení, předpisů pro podzemní sdělovací vedení a technických podmínek výrobce kabelů. Po montáži kabelových souborů budou provedena předepsaná měření elektrických parametrů.

C.3.2 Popis kabelových rozvaděčů a způsob ukončení kabelů

C.3.2.1 Rozvaděče

Všechny rozvaděče (dále jen UR) budou osazeny zářezovými moduly fy QUANTE typ SID-C. V UR bude přívodní kabel ukončen na modulech rozpojovacích, odchozí kabely (přípojky) na modulech připojovacích. Moduly na přívodním kabelu budou osazeny vložkami přepětové ochrany (dále jen VPO) s bleskojistkami (20%), u sloupových rozvaděčů (100%). Všechny rozvaděče nutno uzemnit CY vodičem 16 mm² s přechodem ve svorce na zemnicí pásek FeZn. Skříňové rozvaděče budou v průběhu realizace stavby osazeny provizorním zámkem pro skříň MICOS. Definitivní zámky si osadí pracovníci KPO před nebo po přejímce stavby.

C.3.3 Popis ukončení v traťovém rozvaděči

Nebude v rámci tohoto projektu.

C.3.4 Spojky

Budou použity na obou přepojovaných koncích.

C.3.5 Měření a vyrovnávání na kabelech

Účelem závěrečných měření metalických kabelů přístupové sítě je zjištění elektrických parametrů smontované kabelové sítě. Měření se provádějí po ukončení stavebně montážních prací. Všechna závěrečná měření provádět dle předpisu TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. **V rámci této stavby nebude nutno kabely kapacitně vyrovnávat.**

C.3.6 Útlumový plán

Míra hlasitosti přípojných vedení mezi ISDN ústřednou a koncovým bodem nesmí být větší než 7 dB, smyčkový odpor samotného kabelového vedení napojeného na analogový modul ISDN ústředny je limitován hodnotou $R = 1200 \Omega$ a celková provozní kapacita kabelového přípojného vedení nesmí překročit 0,5 μF .

$\varnothing$ mm Cu	odpor Ω/km	útlum dB/km	kapacita nF/km
0,4	300	1,8	49
0,6	130	1,2	49
0,8	74	0,84	49

Při výstavbě nutno dodržet Technický předpis TD000004 (Výstavba přístupových sítí, metalické kabely část I (TP69a), TNT 141).

C.3.7 Uzemnění rozvaděčů

Při uzemňování telekomunikačních zařízení je nutno dodržet předpisy TA 116 a normu ČSN 3320005-54. Všechny rozvaděče budou uzemněny na maximální zemní odpor 15 Ω . K uzemnění bude použit zemnicí pásek FeZn 30 x 4mm, pro dozemnění bude použita zemnicí tyč. Propojení zem. pásku FeZn a vodiče CY bude provedeno zemnicí svorkou. Vodič CY bude přiveden až do rozvaděče a propojen se zemnicí svorkovnicí nebo zemnicím modulem. Stínící fólie příchozího kabelu do rozvaděče se ukončí „V“ svorkou s vodičem CYA 2,5 mm² a připojí se na zemnicí svorku rozvaděče. Stínící fólie odchozích kabelů se ukončí „V“ svorkou a připojí se na zemnicí modul.

C.3.8 Ochr. kabelů před přepětím a nadproudem atmosferického původu

Dle Technických předpisů TM000058 a TM000059 a normy ČSN 341390, ČSN 334000 a ČSN 334010.

C.3.9 Ochrana kabelů před rušivými vlivy vedení vn, vvn, zvn

Stavba kabelu zajišťuje ochranu před elektrickými vlivy. Rozvaděče budou jištěnybleskojistkami a všechny zařízení sítě budou uzemněny. Ve spojkách bude stínění propojeno, ale nikdy uzemněno.

C.3.10 Ochrana kabelů při křížení a souběhy s jednotlivými inž. sítěmi

Při souběhu a křížení s jednotlivými inženýrskými sítěmi (zejména vedením nn, vn, zvn) budou dodržovány normy ČSN 332160, ČSN 342040, ČSN EN 50341-1.

C.3.11 Označení kabelové trasy

Nebudou použity.

C.4 HDPE pro optickou síť

Není.

C.5 Geodetické zaměření / doměření

Dodavatel provede geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů, detailů. Dodavatel stavebně montážních prací předá investorovi akce odpočtovou dokumentaci. Digitální souřadnice budou zpracovány programem MicroStation.

Použité směrnice :

- TD000002 *Směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb sítě*

C.6 Demontáž

Dojde k demontáži.

C.7 Existující kabely

Dojde k napojení na stávající vedení CETIN.

C.8 Bezpečnostní opatření a PO

V průběhu realizace stavby bude třeba v kabelizované části města zajistit a dodržet taková opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků provádějících stavbu, ani chodců a obyvatelů města. Osoby, které budou realizovat stavbu a následně pracovníci provádějící údržbu zařízení, musí být vyškoleni ve smyslu platných norem, směrnic a předpisů. Výkopy podél chodníků nebo v chodnících budou zajištěny ochranným zábradlím, přechody přes výkopy a přístup do domů a ostatních budov bude zajištěn provizorními lávkami. V místech vjezdů a slepých ulic musí být zajištěn průjezd vozidel do míst za překopem a zejména nesmí být omezen průjezd vozidel rychlé zdravotní služby, požárníků, policie a pohotovostních vozidel správců inženýrských sítí. Výkopy musí být co nejdříve zahrnuty a povrchy uvedeny do původního stavu. Na nedostatečně osvětlených místech bude zřízeno osvětlení výkopů. Budou rozmístěny dopravní značky, informující o prováděných pracích a o omezeních nebo úpravě provozu vozidel. Budou respektována všechna vyjádření v PD a podmínky v nich uvedené, v souvislosti s bezpečností práce, především plnit požadavky energetiky, plynárenství a dopravy.

- vyhláška č.48/1982 *základní požadavky k zjištění bezpečnosti práce na technických zařízeních + změna č.207/1991, TPP 2001-4A (TP69d) kap 10*

C.9 Likvidace odpadů

S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno dle zákona č.541/2020 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 381/2001.

Při realizaci stavby vzniknou odpady:

Číslo odpadu	Název odpadu	Původ	Kat.odpadu
17 01 01	Beton	Překopy zpevněných povrchů	O
17 03 02	Asfalt	Překopy zpevněných povrchů	O
17 04 11	Kabely	Zbytky kabelu při montáži	O
17 05 04	Zemina a kamení	Výkopy	O
20 01 01	Papír a lepenka	Obaly (rozvaděče, spojky, ...)	O

20 01 39	Plasty	Obaly (výstroj rozvaděčů, spojek, ...)	O
----------	--------	--	---


Původcem odpadu dle zákona č.541/2020 Sb. je realizační firma, která musí dodržet ustanovení tohoto zákona a vést evidenci odpadů dle vyhlášky č.383/2001 Sb. Přebytečná zemina a jiný odpad bude odvezen na sběrný dvůr.

C.10 Upozornění projektanta a stanovisko k dokladové části

Projektant zapracoval do PD veškeré připomínky jednotlivých organizací, správců inženýrských sítí, dotčených vlastníků nemovitostí a územního rozhodnutí. Projektová dokumentace je zpracována podle předpisů a norem platných v době zpracování projektu.

Při realizaci akce je nutno dodržet všechny podmínky územního rozhodnutí, vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a ostatních zainteresovaných vlastníků nemovitostí.



projektant

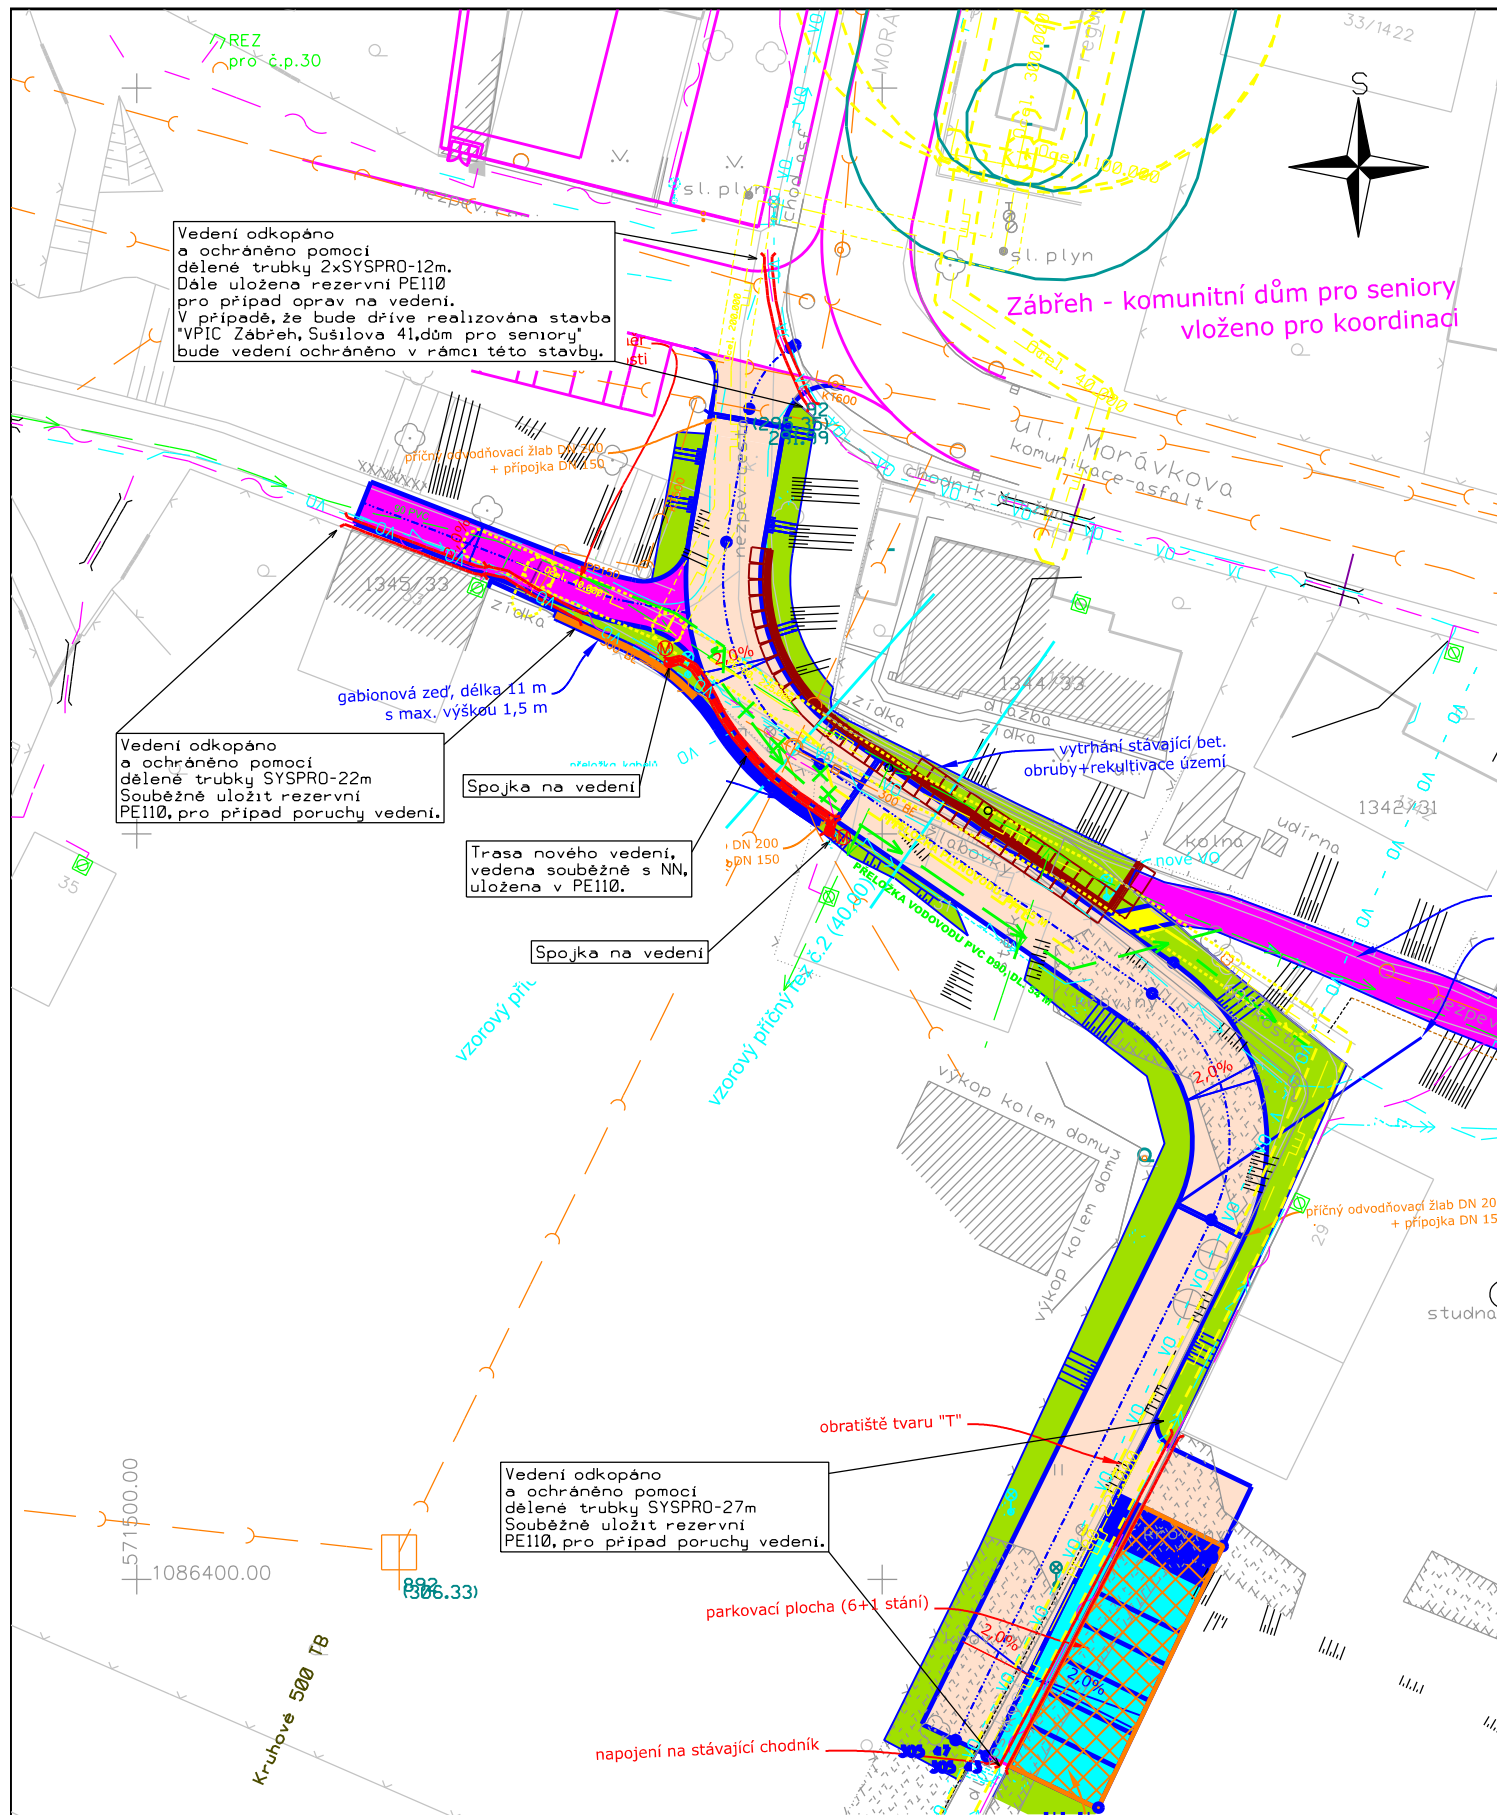


LEGENDA:

	PROJEKTOVANÁ TRASA
	SDĚLOVACÍ KABEL
	SILOVÉ KABELY NN
	SILOVÉ KABELY VN
	PLYNOVOD
	KANALIZACE
	VODOVOD
	TEPLOVOD

[Redacted]		ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2776/18
PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	DATUM: 01/2023
STAVBA: VPIČ Zábřeh, Na Skokance, komunikace		MĚŘÍTKO: 1 : 500
SITUACE STAVBY		C1
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		

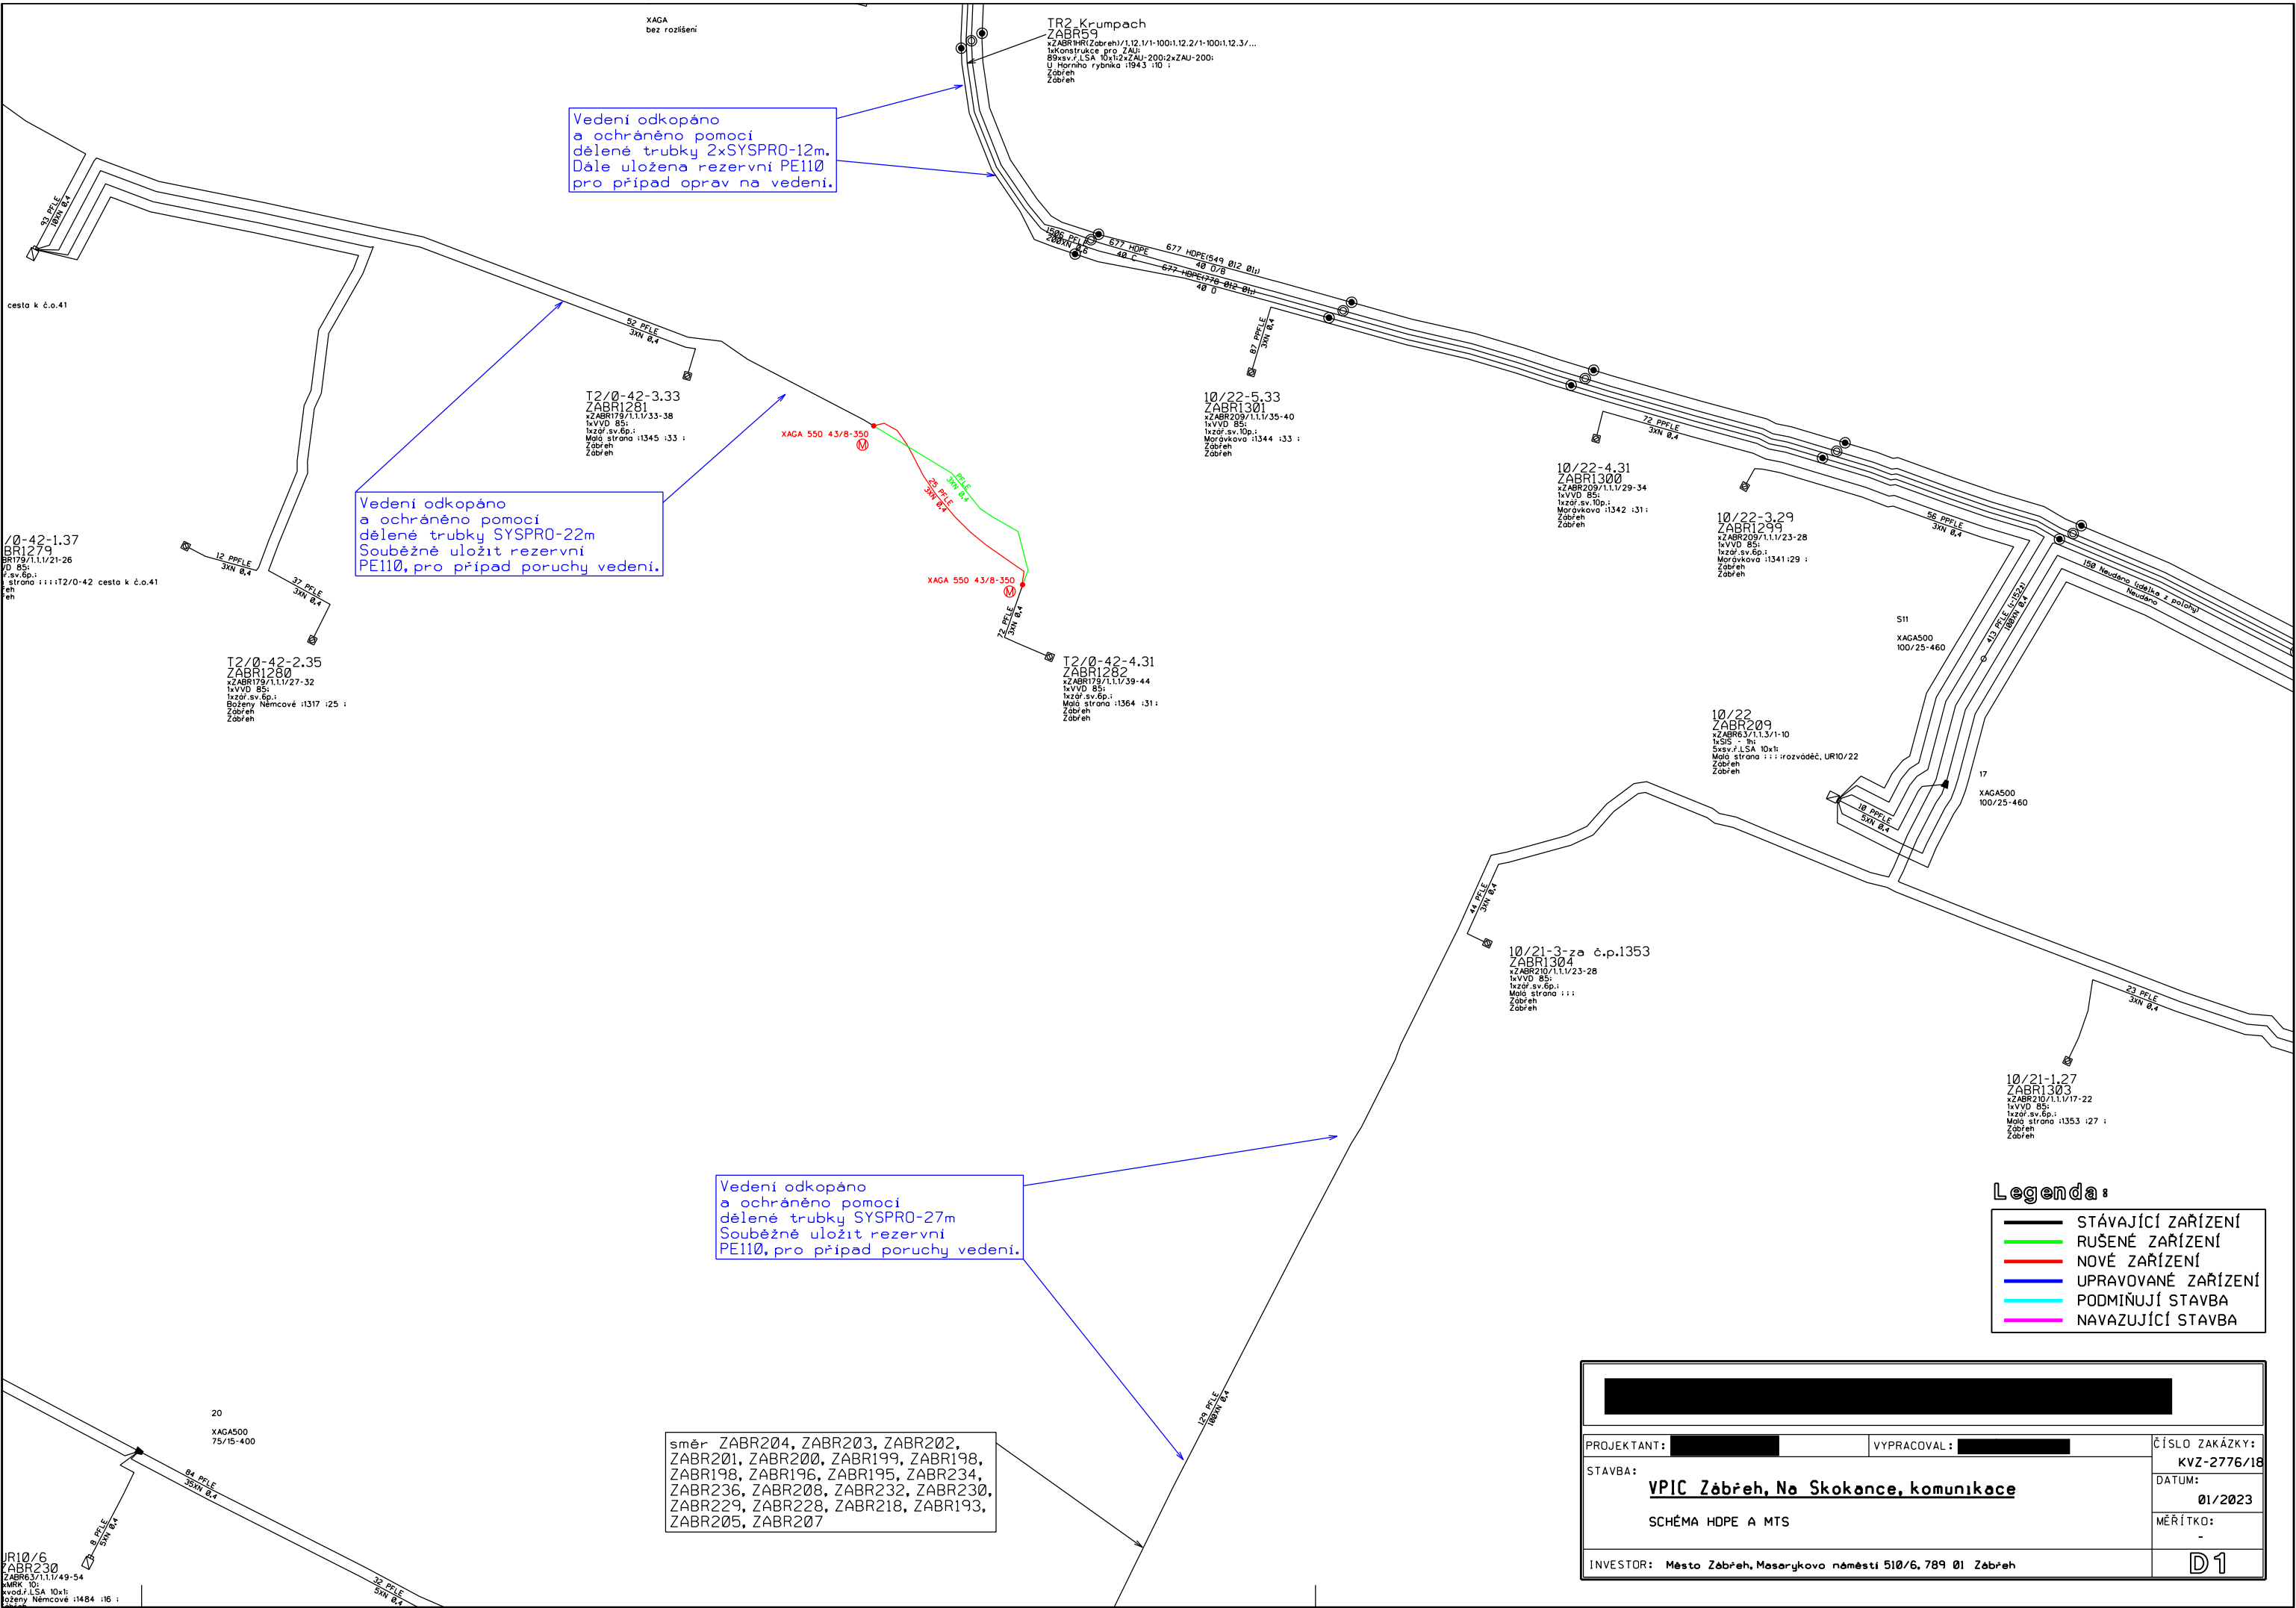

Kabel: 549 012 - DKO LANŠKROUN - ZÁBŘEH N.M. (ON:05.12.2014 08:22:39)
(LANS:BS:1 - ZABR:BS:1) Stránka: [K] Provozní

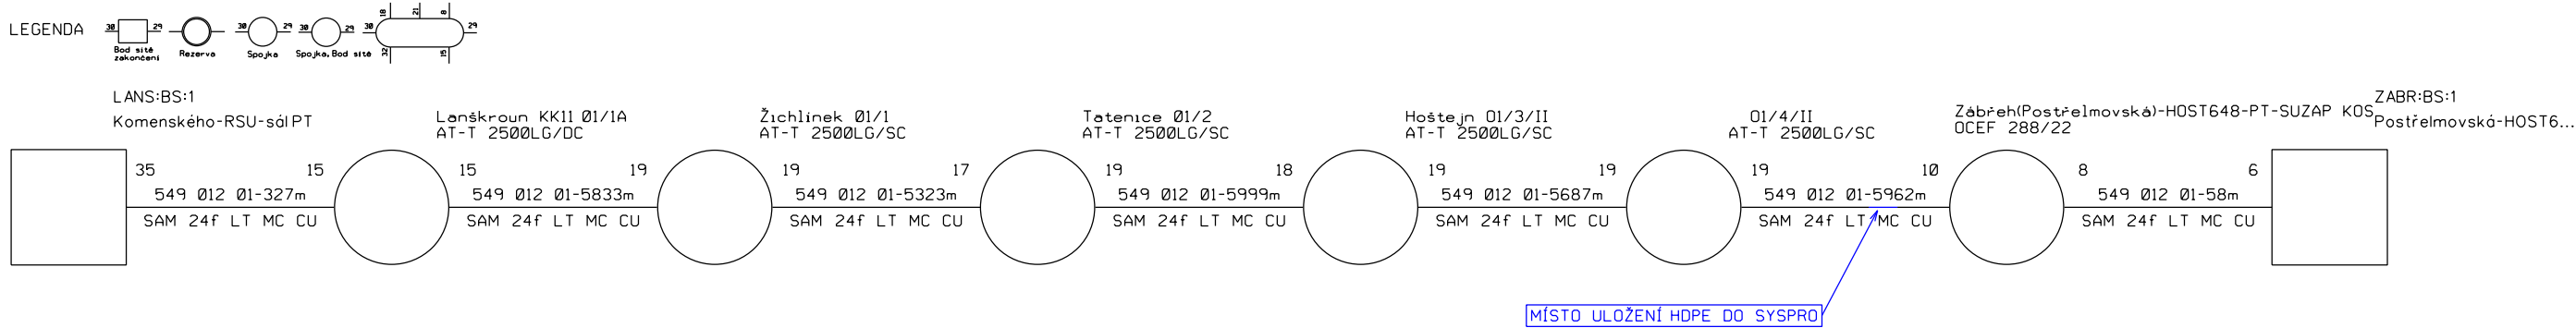



Legenda:

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ
- NOVÉ ZAŘÍZENÍ
- UPRAVOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- PODMIŇUJÍ STAVBA
- NAVAZUJÍCÍ STAVBA

[Redacted]		
PROJEKTANT: [Redacted]	VYPRACOVAL: [Redacted]	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2776/18
STAVBA: VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace		DATUM: 01/2023
SCHÉMA OK 549 012		MĚŘÍTKO: -
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		D2


Kabel: 778 012 - DOK ZABREH NA MORAVE-HOSTEJN (ON:28.02.2022 14:56:04)

(ZABR:BS:1 - HOSN:BS:1) Stránka: [K] Provozni

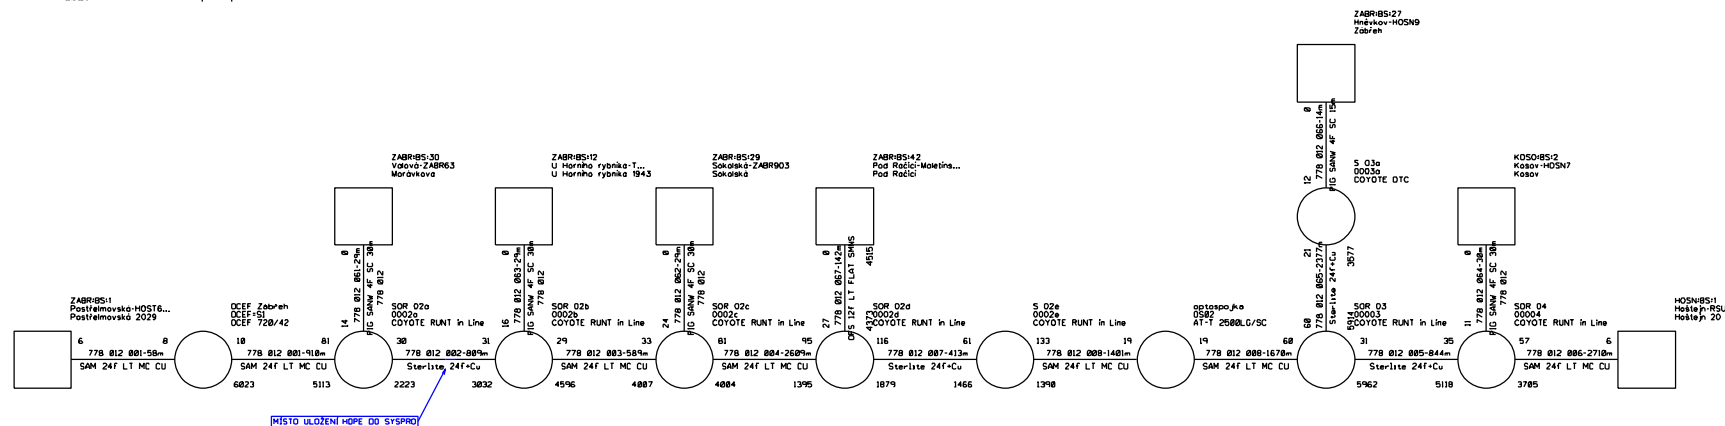


Kabel: 778 012 - DOK ZABREH NA MORAVE-HOSTEJN (ON:01.04.2021 12:54:24)

(ZABR:BS:1 - HOSN:BS:1) Stránka: [K] Provozni




Legenda:



[Redacted]		ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2776/18
PROJEKTANT:	VYPRACDVAL:	DATUM: 01/2023
STAVBA: VPIC Zabreh, Na Skokance, komunikače		MĚŘÍTKO: 1:1
SCHÉMA OK 778 012		
INVESTOR: Město Zabreh, Masarykova náměstí 518/6, 789 01 Zabreh		D3

Kabel: 549 012 - DKO LANŠKROUN - ZÁBŘEH N.M. (ON:05.12.2014 08:23:31)
(LANS:BS:1 - ZABR:BS:1) Stránka: [K] Provozní

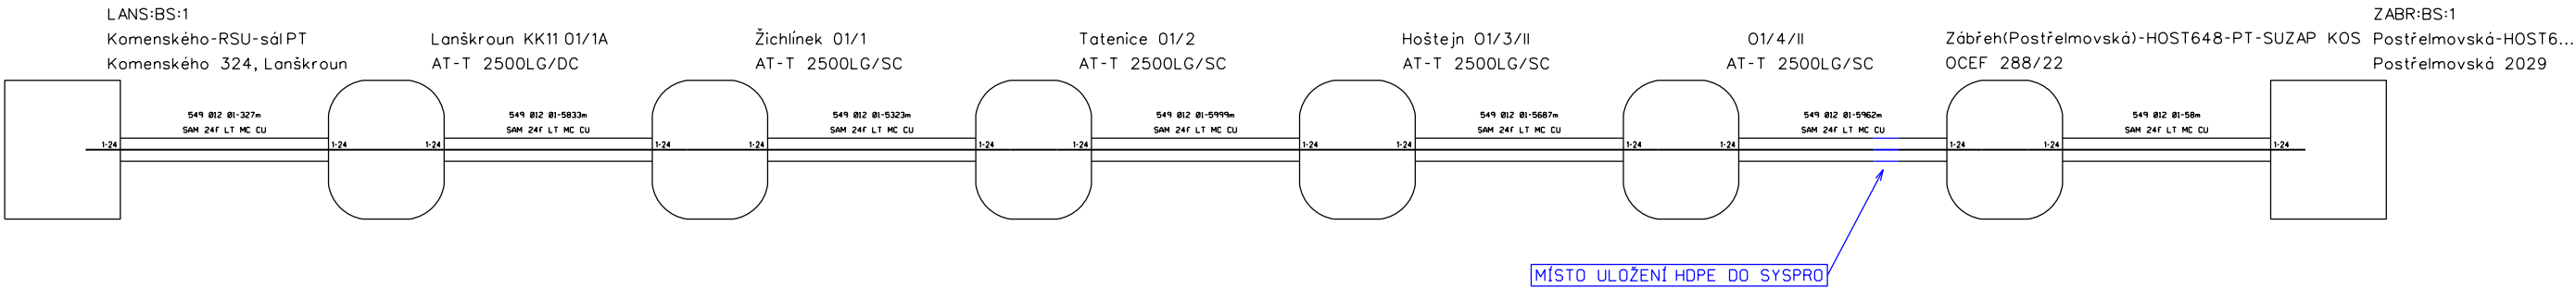


Legenda:

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ
- NOVÉ ZAŘÍZENÍ
- UPRAVOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- PODMIŇUJÍ STAVBA
- NAVAZUJÍCÍ STAVBA

[Redacted]		
PROJEKTANT: [Redacted]	VYPRACOVAL: [Redacted]	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2776/18
STAVBA: VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace		DATUM: 01/2023
BLOKOVÉ SCHÉMA VLÁKEN OK 549 012		MĚŘÍTKO: -
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		D 4


Kabel: 778 012 - DOK ZABREH NA MORAVE-HOSTEJN (ON:28.02.2022 14:57:28)
(ZABR:BS:1 - HOSN:BS:1) Stránka: [K] Provozní

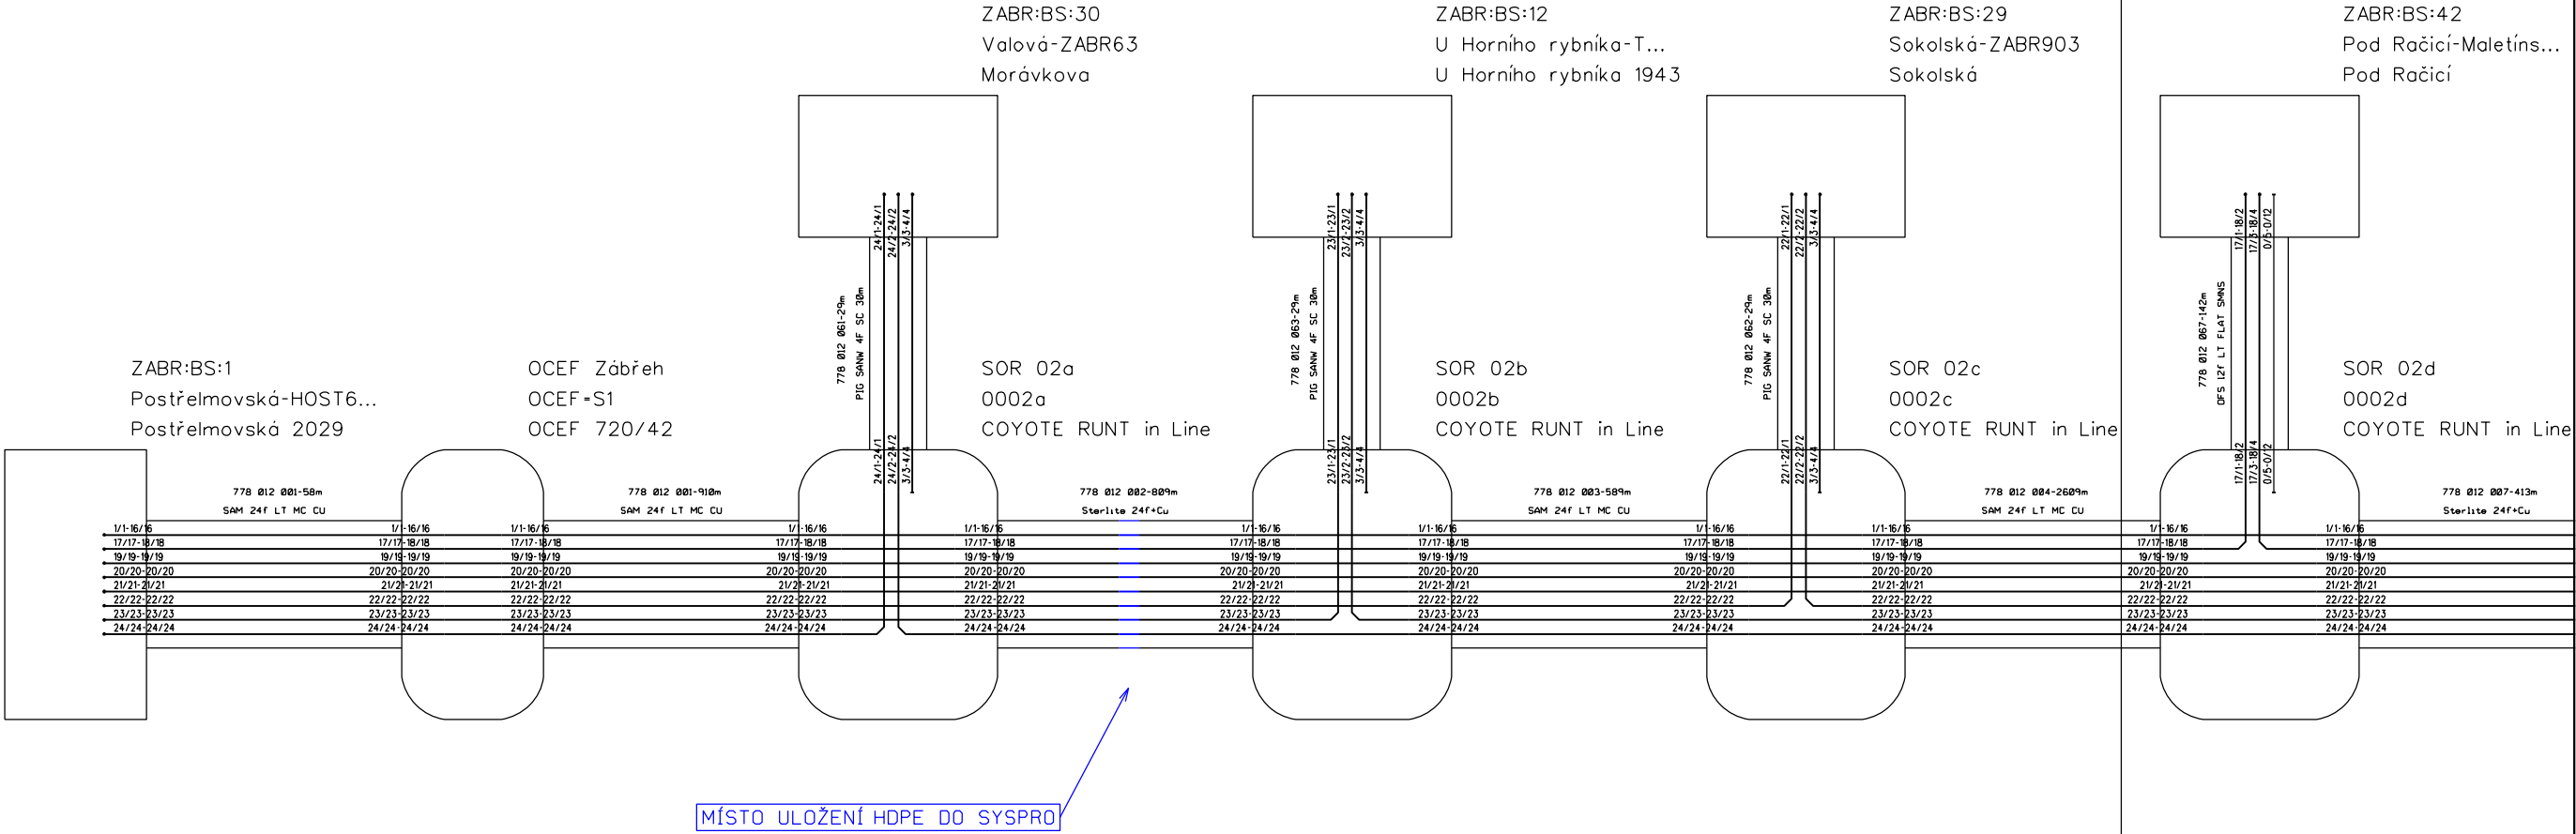

Legenda:

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ
- NOVÉ ZAŘÍZENÍ
- UPRAVOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- PODMÍNUJÍ STAVBA
- NAVAZUJÍCÍ STAVBA

[Redacted]		
PROJEKTANT: [Redacted]	VYPRACOVAL: [Redacted]	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2776/18
STAVBA: VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace		DATUM: 01/2023
BLOKOVÉ CHÉMA VLÁKEN OK 778 012		MĚŘÍTKO: -
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		D5-1

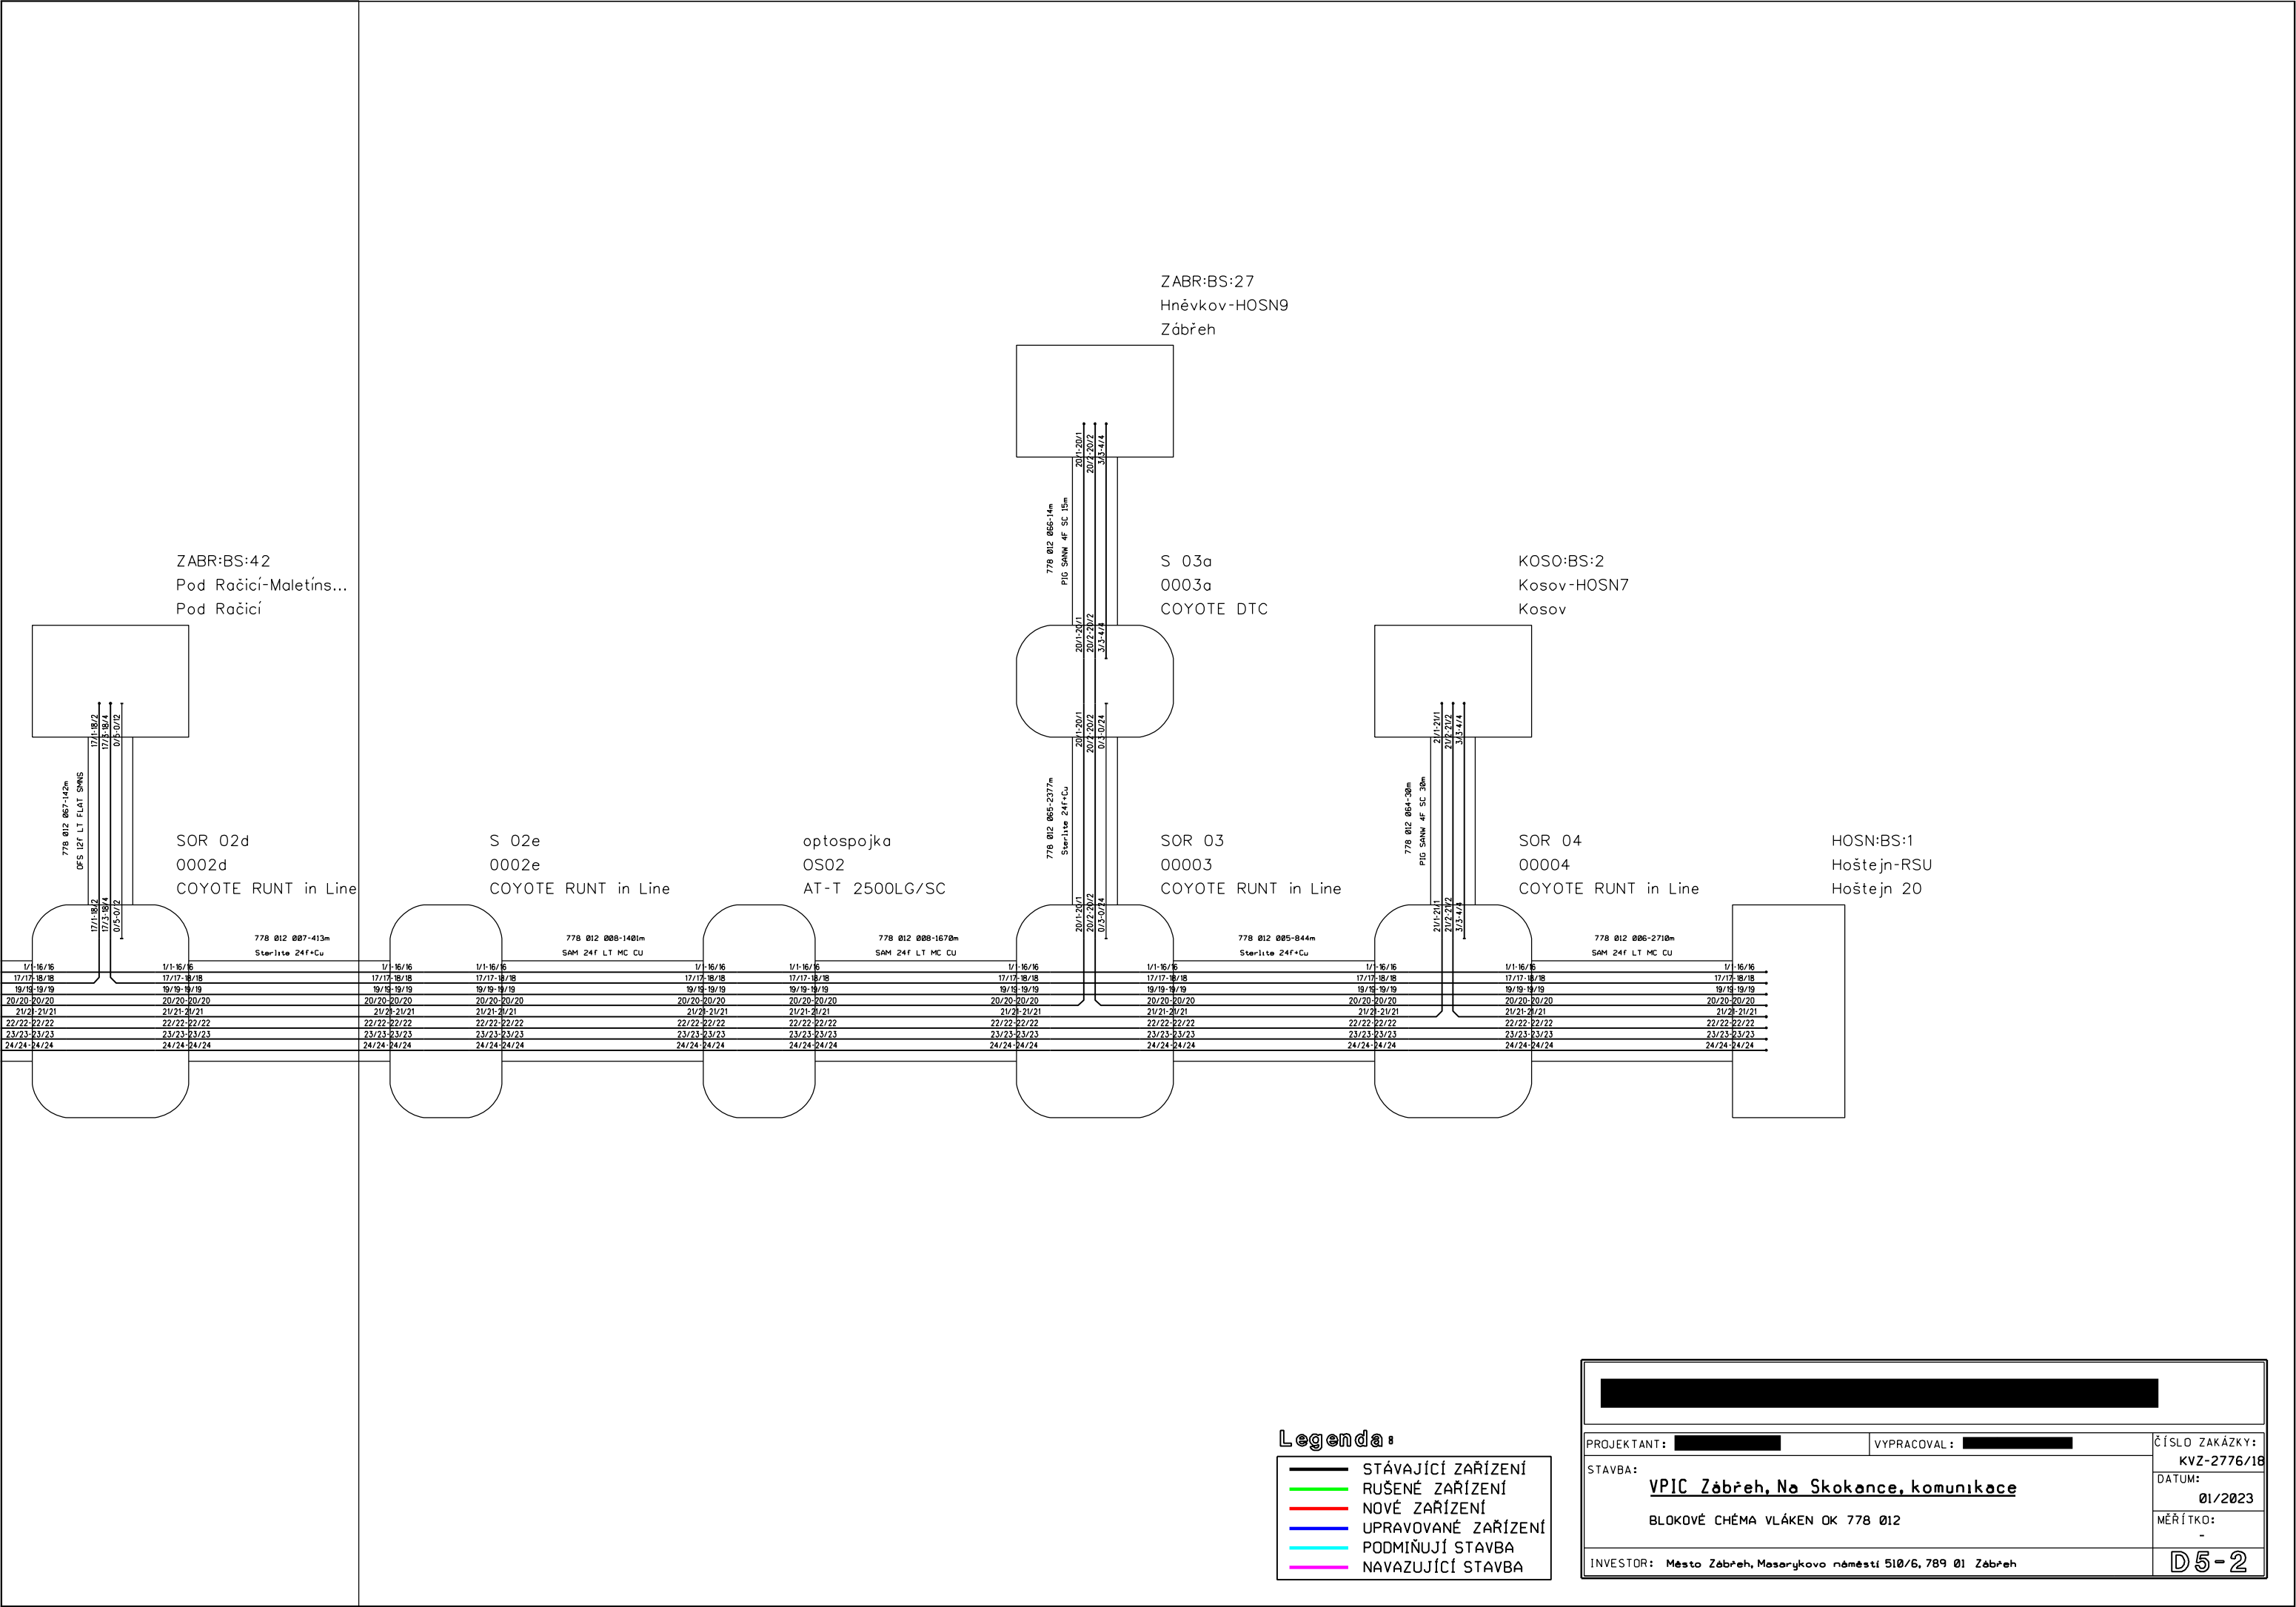


Legenda:

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ
- NOVÉ ZAŘÍZENÍ
- UPRAVOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- PODMIŇUJÍ STAVBA
- NAVAZUJÍCÍ STAVBA

[Redacted]		
PROJEKTANT: [Redacted]	VYPRACOVAL: [Redacted]	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2776/18
STAVBA: VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace		DATUM: 01/2023
BLOKOVÉ CHEMIA VLÁKEN OK 778 012		MĚŘÍTKO: -
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		D5-2


Inv.č:
Umístění: A0101A,U ZDI
Údržba: ZABR:BS:1

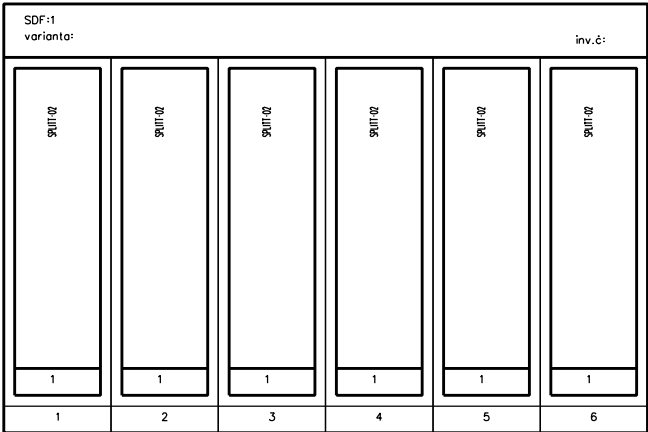


```

ODF LSC10-144/21 - 1
778.071,011
1 - 48 778 071 001
49 - 72 776 011 001
73 - 120 776 081 005
121 - 144 778 012 001
pozice kabel úsek směr
1 - 32 778 071 006 LUKE:BS:1
33 - 33 778 071 066 ZABR:BS:26
34 - 34 778 071 068 ZABR:BS:25
35 - 36 778 071 064 RJEC:BS:1
37 - 42 778 071 061 ZABR:BS:9
43 - 46 778 071 006 LUKE:BS:1
47 - 48 778 071 070 ZABR:BS:32
49 - 72 776 011 001 SUMP:BS:5
73 - 84 776 081 001 SUMP:BS:5
85 - 104 776 081 002 PLMV:BS:1
105 - 110 776 081 062 ZABR:BS:22
111 - 120 776 081 002 PLMV:BS:1
121 - 136 778 012 006 HOSN:BS:1
137 - 138 778 012 067 ZABR:BS:42
139 - 139 778 012 006 HOSN:BS:1
140 - 140 778 012 066 ZABR:BS:27
141 - 141 778 012 064 KOSO:BS:2
142 - 142 778 012 062 ZABR:BS:29
143 - 143 778 012 063 ZABR:BS:12
144 - 144 778 012 061 ZABR:BS:30


```

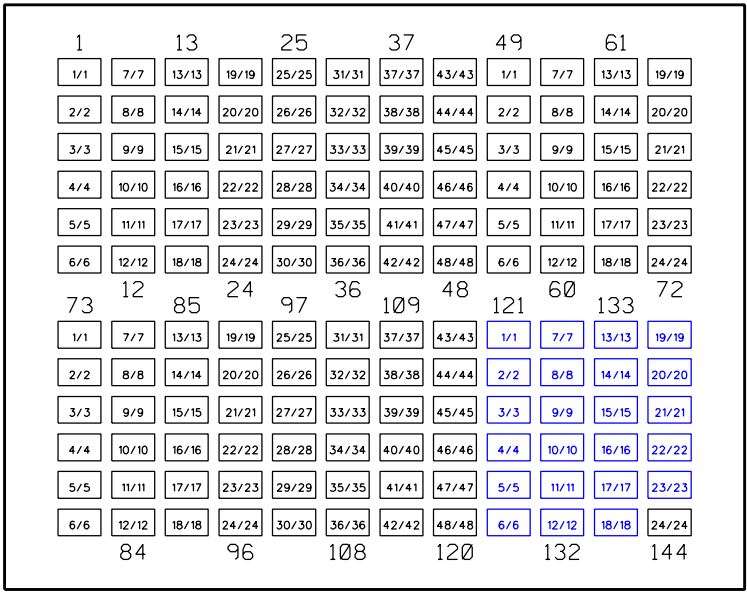

```
ODF LSC2U-024/5 - 2
549.012
1 - 24 549 012 001
pozice kabel úsek směr
1 - 24 549 012 001 LANS:BS:1
```

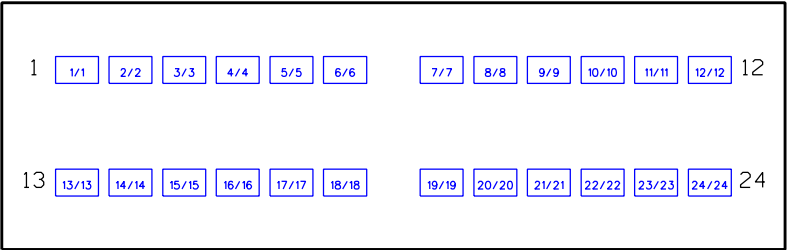


ODF OMTR 2U-48 - 3
778.BAG
1 - 24 778 BAG 001
pozice kabel úsek směr
1 - 24 778 BAG 001 ZABR:BS:4



```

ODF LSC2U-024/5 - 4
778.013
1 - 24 778 013 001
pozice kabel úsek směr
1 - 20 778 013 008 STIT:BS:1
21 - 21 778 013 062 ROVS:BS:1
22 - 22 778 013 066 HSTU:BS:2
23 - 23 778 013 008 STIT:BS:1
24 - 24 778 013 064 SVEB:BS:1

```



```

ODF LSC1U-072/12 - 5
778.011,778.AAA
1 - 24 778 011 001
25 - 48 778 AAA 001
49 - 60 778 BAA 001
pozice kabel úsek směr
1 - 24 778 011 003 LITL:BS:1
25 - 48 778 AAA 001 ZABR:BS:2
49 - 60 778 BAA 001 ZABR:BS:4

```

[REDACTED]		
PROJEKTANT: [REDACTED]	VYPRACOVAL: [REDACTED]	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2776/18
STAVBA: <u>VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace</u> HOST ZÁBŘEH - OBSAZENÍ STOJANU		DATUM: 01/2023
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		MĚŘÍTKO: - D 6

ODF LSTIU-144/9 - 1
549 041
pozice kabel úsek směr
1 - 24 549 041 03 CETR:BS:1
25 - 26 549 041 70 CETR:BS:34
27 - 34 549 041 03 CETR:BS:1
35 - 36 549 041 69 CETR:BS:31
37 - 42 549 041 61 CETR:BS:5
43 - 48 549 041 62 CETR:BS:22

ODF-72 E2000/APC - 2
549 RAB,RAJ
pozice kabel úsek směr
1 - 6 549 RAB 03 LANS:BS:5
7 - 12 549 RAB 62 LANS:BS:11
13 - 18 549 RAB 63 LANS:BS:9
19 - 28 549 RAB 65 LANS:BS:6
29 - 30 549 RAB 66 LANS:BS:16
31 - 32 549 RAB 67 LANS:BS:15
33 - 36 549 RAB 02 SOR0101
37 - 42 549 RAB 68 LANS:BS:16
43 - 48 549 RAB 65 LANS:PROSTORA:5
49 - 54 549 RAJ 01 LANS:BS:19

ODF144 E2000/APC - 3
549 016,014,015,012
pozice kabel úsek směr
1 - 24 549 016 01 DAMN:BS:1
25 - 48 549 014 05 TATE:BS:1
49 - 71 549 015 03 DCRM:BS:1
72 - 72 549 015 61 DCRM:BS:2
97 - 120 549 012 01 ZABR:BS:1

LANS BS 1 (LANS PROSTORA 2) Komenského / Lanškroun												Inv.č:
ETS6030-220 : 1												Umístění: A01A01
Vlastník: KCMMP2-H02												Údržba: KCMMP2-SCU4
1	13	25	37	49	61	73	85	97	109	121	133	
v1	13/13	25/25	37/37	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2/2	14/14	26/26	38/38	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3/3	15/15	27/27	39/39	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4/4	16/16	28/28	40/40	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5/5	17/17	29/29	41/41	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6/6	18/18	30/30	42/42	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7/7	19/19	31/31	43/43	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8/8	20/20	32/32	44/44	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9/9	21/21	33/33	45/45	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10/10	22/22	34/34	46/46	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11/11	23/23	35/35	47/47	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12/12	24/24	36/36	48/48	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67	
v1	7/7	13/13	19/19	25/25	31/31	37/37	43/43	v1	/	/	/	/
2/2	8/8	14/14	20/20	26/26	32/32	38/38	44/44	2/2	/	/	/	/
3/3	9/9	15/15	21/21	27/27	33/33	39/39	45/45	3/3	/	/	/	/
4/4	10/10	16/16	22/22	28/28	34/34	40/40	46/46	4/4	/	/	/	/
5/5	11/11	17/17	23/23	29/29	35/35	41/41	47/47	5/5	/	/	/	/
6/6	12/12	18/18	24/24	30/30	36/36	42/42	48/48	6/6	/	/	/	/
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67	
v1	7/7	13/13	19/19	v1	7/7	13/13	19/19	v1	7/7	13/13	19/19	
2/2	8/8	14/14	20/20	2/2	8/8	14/14	20/20	2/2	8/8	14/14	20/20	
3/3	9/9	15/15	21/21	3/3	9/9	15/15	21/21	3/3	9/9	15/15	21/21	
4/4	10/10	16/16	22/22	4/4	10/10	16/16	22/22	4/4	10/10	16/16	22/22	
5/5	11/11	17/17	23/23	5/5	11/11	17/17	23/23	5/5	11/11	17/17	23/23	
6/6	12/12	18/18	24/24	6/6	12/12	18/18	24/24	6/6	12/12	18/18	24/24	
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133	139	
/	/	/	/	/	v1	7/7	13/13	19/19	/	/	/	/
/	/	/	/	/	2/2	8/8	14/14	20/20	/	/	/	/
/	/	/	/	/	3/3	9/9	15/15	21/21	/	/	/	/
/	/	/	/	/	4/4	10/10	16/16	22/22	/	/	/	/
/	/	/	/	/	5/5	11/11	17/17	23/23	/	/	/	/
/	/	/	/	/	6/6	12/12	18/18	24/24	/	/	/	/
78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	

[REDACTED]		
PROJEKTANT: [REDACTED]	VYPRACOVAL: [REDACTED]	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVVZ-2776/18
STAVBA: VPIK Zábřeh, Na Skokance, komunikace		DATUM: 01/2023
RSU LANŠKROUN - OBSAZENÍ STOJANU		MĚŘÍTKO: -
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		D7

ODF panel 6xS1 - 1
778.012
1 - 4 778 012 064
pozice kabel úsek směr
1 - 1 778 012 001 ZABR:BS:1
2 - 2 778 012 006 HOSN:BS:1
3 - 4 778 012 064 SOR 04

KOSO BS 2 (KOSO TOBJ 17) / Kosov
SIS 9000 : 1
Vlastník:

Inv.č:
Umístění:
Údržba:

MA5818:1
varianta:

KOS02L-51
inv.č:

HEJČKA	HEJČKA			HEJČKA	HEJČKA	HEJČKA	
1	1			1	1	1	
0	1	2	3	4	5	6	

1

21/1

21/2

3/3

4/4

/

/

6

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2776/18
STAVBA: VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace RVDSL HOSN7 - OBSAZENÍ STOJANU		DATUM: 01/2023
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		MĚŘÍTKO: - D 9

ODF panel 6xS1 - 1
778.012
1 - 4 778 012 063
pozice kabel úsek směr
1 - 1 778 012 001 ZABR:BS:1
2 - 2 778 012 006 HOSN:BS:1
3 - 4 778 012 063 SOR 02b

ZABR BS 12 (ZABR OBJ 2255) U Horního rybníka / Zábřeh
nástavec : 1
Vlastník:

Inv.č:
Umístění:
Údržba:

MA581B-1
varianta:

ZABR12L-51
inv.č:

ODF 1 0	ODF 1 1	ODF 1 2	ODF 1 3	ODF 1 4	ODF 1 5	ODF 1 6	
--	--	--	--	--	--	--	--

1

23/1

23/2

3/3

4/4

/

/

6

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2776/18
STAVBA: <u>VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace</u> TR2, ZABR59 - OBSAZENÍ STOJANU		DATUM: 01/2023
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		MĚŘÍTKO: - D10

ODF panel 4xSC - 1
778.012
1 - 4 778 012 062
pozice kabel úsek směr
1 - 1 778 012 001 ZABR:BS:1
2 - 2 778 012 006 HOSN:BS:1
3 - 4 778 012 062 SOR 02c

ZABR BS 29 (ZABR TOBJ 279) Sokolská / Zábřeh
mOSLAM SIS 4 : 1
Vlastník:

Inv.č:
Umístění:
Údržba:

MA5818:1
varianta:

ZABR29L-51
inv.č:

REZERV	REZERV	REZERV	REZERV		REZERV	REZERV	
1	1	1	1		1	1	
0	1	2	3	4	5	6	

1

22/1

22/2

3/3

4/4

4

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ČÍSLO ZAKÁZKY:
STAVBA: VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace		KVZ-2776/18
RVDSL ZABR903 - OBSAZENÍ STOJANU		DATUM: 01/2023
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		MĚŘÍTKO: -
		D11

ODF panel 6xS1 - 1
778.012
1 - 4 778 012 061
pozice kabel úsek směr
1 - 1 778 012 001 ZABR:BS:1
2 - 2 778 012 006 HOSN:BS:1
3 - 4 778 012 061 SOR 02a

ZABR BS 30 (ZABR TOBU 31) Morávko / Zábřeh
SIS 9000 : 1
Vlastník:

Inv.č:
Umístění:
Údržba:

MA5818-1
varianta:

ZABR30L-51
inv.č:

1	1	1		1	1	1	
0	1	2	3	4	5	6	

1

24/1

24/2

3/3

4/4

/

/

6

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2776/18
STAVBA: <u>VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace</u> RVDSL ZABR63 - OBSAŽENÍ STOJANU		DATUM: 01/2023
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh		MĚŘÍTKO: -
		D12

Specifikace nákladů_VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ▫ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ▫ 2025.09

Položková databáze: 2025.09

Název stavby: VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace

Číslo SPP prvku: 11010-085976

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	130 327,03 Kč
MONTÁŽ	150 785,92 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	15 426,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	21 454,89 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	635,93 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	69 347,08 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 387 977,51 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 371 510,27 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 16 467,24 Kč


Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		42.00 m	1 275,96 Kč
952368 S	Pokládka žlabů TK2,T2N		73.00 m	9 338,16 Kč
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm		66.00 m	4 944,06 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		39.00 m	4 110,99 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		35.00 m	27 164,55 Kč
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		26.00 m	5 852,34 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		19.00 m	10 352,91 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		8.00 m	1 180,80 Kč
955572 S	Rýha ve vozovce kostky 50/100		32.00 m	62 818,56 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		86.00 m	1 333,00 Kč
954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkových		6.00 m	1 955,70 Kč
MONTÁŽ				
955010 S	Demontáž úložné trubky		39.00 m	594,75 Kč
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN		39.00 m	1 789,32 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN		44.00 m	1 163,80 Kč
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		83.00 m	5 849,84 Kč
958308 S	Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba		60.00 ks	13 505,40 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		4.00 ks	920,04 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby- další čtyřka		302.00 ks	16 009,02 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		2.00 ks	70,60 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		1.00 ks	123,37 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		1.00 ks	230,01 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		6.00 ks	211,80 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek		2.00 ks	3 348,06 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné		39.00 m	901,68 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		25.00 m	753,25 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window		1.00 ks	37 277,61 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti		1.00 ks	23 248,23 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou		17220.00 JV	17 220,00 Kč
rozpočtová rezerva				
958469 S	Uvedení stavby do provozu		7127.85 JV	7 127,85 Kč

kolaudace				
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks		1 571,94 Kč
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks		7 301,28 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks		3 921,24 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks		7 258,23 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	20.00 m		388,60 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	7713.33 JV		7 713,33 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks		7 713,33 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks		4 987,65 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1353.00 JV		1 353,00 Kč
náhrady vbř - odhadovaná				
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks		6 546,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/vymazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks		8 568,18 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
407578 S	Souprava čistící 4413L		1.00 ks	635,93 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		37.00 ks	1 650,94 Kč
319092 S	Díl ohybový Syspro 160/110		6.00 ks	2 052,18 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		81.00 m	339,39 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		54.00 m	258,66 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		25.00 m	494,50 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		2.00 ks	594,84 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		2.00 ks	53,96 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350		2.00 ks	1 747,04 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO		438.00 ks	15 987,00 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110		73.00 m	42 238,53 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		6.00 ks	3 325,68 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		10.00 m	553,00 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm		2.00 ks	51,36 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		1.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		1.00 ks	0,00 Kč

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1093/4
Obec:	Zábřeh [541354]
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě [789429]
Číslo LV:	3366
Výměra [m ²]:	4354
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

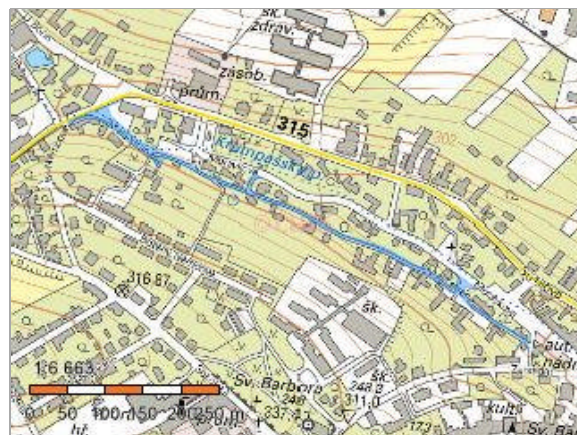

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno vedení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.01.2023 08:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1015
Obec:	Zábřeh [541354]
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě [789429]
Číslo LV:	3366
Výměra [m ²]:	5405
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.01.2023 08:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1114
Obec:	Zábřeh [541354]
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě [789429]
Číslo LV:	3358
Výměra [m ²]:	190
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada

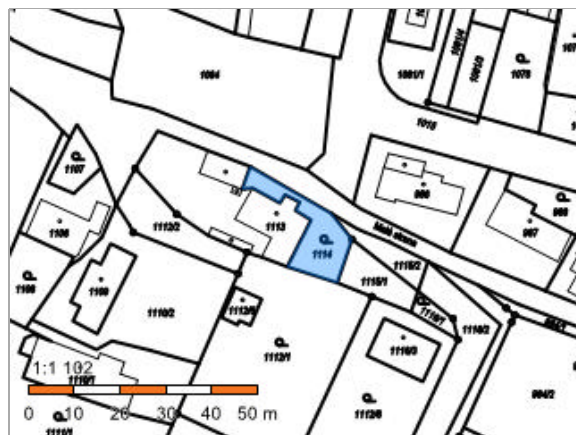

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Sklenářová Jana, Malá strana 1345/33, 78901 Zábřeh

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[54712](#) 190

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.01.2023 08:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1115/1
Obec:	Zábřeh [541354]
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě [789429]
Číslo LV:	3366
Výměra [m ²]:	128
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

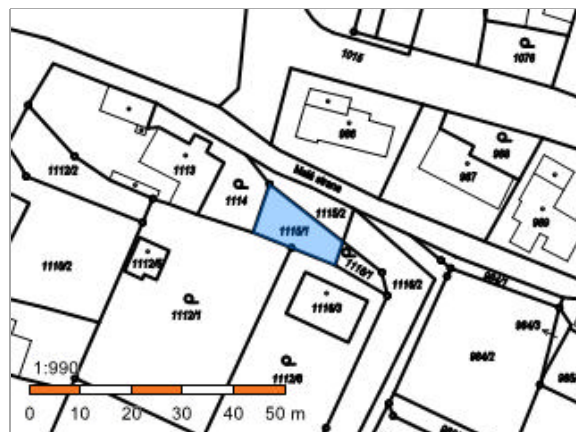

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.01.2023 08:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1115/2
Obec:	Zábřeh [541354]
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě [789429]
Číslo LV:	3366
Výměra [m ²]:	91
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

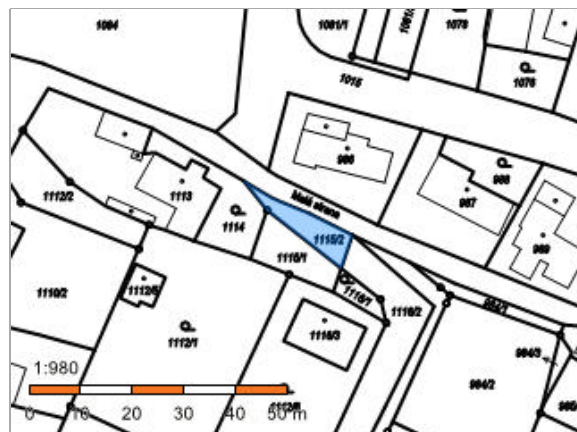

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno vedení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.01.2023 08:00.



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH



MUZB/36195/2021/OD

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh

Doporučeně/ DS/Elektronicky

ČÍSLO JEDN.:

MUZB/36195/2021/OD

SPIS. ZN.:

DO.3175/2020/Ju

Rozdělovník

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

posta@muzabreh.cz

DATUM:

14.07.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.05.2020 podalo

Město Zábřeh, IČO 00303640, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

**„Stavební úpravy komunikace v lokalitě "Na Skokance" v Zábřehu,
k.ú. Zábřeh na Moravě“**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 984/1 (ostatní plocha), parc. č. 985/1 (zahrada), parc. č. 985/2 (zahrada), parc. č. 985/6 (zahrada), parc. č. 986 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1015 (ostatní plocha), parc. č. 1084 (ostatní plocha), parc. č. 1093/4 (ostatní plocha), parc. č. 1114 (zahrada), parc. č. 1115/1 (ostatní plocha), parc. č. 1115/2 (ostatní plocha), parc. č. 1116/2 (zahrada) a parc. č. 1117 (ostatní plocha) v katastrálním území Zábřeh na Moravě.

Stavba obsahuje:

stavební úpravy stávající místní komunikace pro motorovou dopravu s ohledem na plánovanou výstavbu 3 rodinných domů. Komunikace bude ukončena obratištěm tvaru „T“. Na konci úseku bude 6 odstavných a parkovacích stání. Tato odstavná a parkovací místa jsou na soukromém pozemku (p. č. 985/2, 985/1) a tudíž místa nejsou určena pro veřejnost.

Místní komunikace bude napojena na parkoviště pro akci „Zábřeh – komunitní dům pro seniory“, má navrhovanou délku 114, 63 m a šířku 5,0 m.

Šířka je dle ČSN 73 6110 s přihlédnutím na intenzitu dopravy a snížení rychlosti 30 km/h. Lokalita bude označena zónou 30.

Odvodnění je řešeno pomocí příčných odvodňovacích žlabů DN 200, které jsou pomocí přípojek DN 150 napojeny do stávající jednotné kanalizace a do nové dešťové kanalizace, která bude povolena v rámci výstavby rodinných domů.

Komunikace bude oddělena pomocí gabionové zdi o délce 11 m a výšce 1,5 m a gabionové zdi o délce 12 m a výšce 2,0 m, jedná se o p. č. 1114 (Sklenářovi). Na druhé straně bude komunikace zabezpečena proti ujetí opěrnou zdí z prefabrikovaných dílců, jedná se o zabezpečení a ochranu nemovitosti p. č. st. 986.

Jelikož se jedná o komunikaci s napojením na chodníkové části a rekonstruované schodiště, bude veřejné osvětlení doplněno pro celou lokalitu. Stávající je v nevyhovujícím stavu.

Pod rekonstruovanou komunikací je velká četnost inženýrských sítí a nedostatečné krytí těchto inženýrských sítí. Z tohoto důvodu dojde k přeložkám inženýrských sítí. Přeložka telekomunikačního kabelu a dochránění jsou součástí tohoto řízení.

Stavba je členěna na objekty:

000 Objekty přípravy staveniště

SO 001 – příprava území, demolice

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)

100 Komunikace

SO 101 – komunikace č. 1

SO 102 – komunikace č. 2 – oprava povrchu

SO 103 – chodníky, zpevněné plochy pro vstup, stezka pro chodce se schodištěm

SO 104 – parkovací místa (odstavná a parkovací stání) pro rezidenty

200 Mostní objekty a zdi

SO 201 – gabionová zeď - zárubní

SO 202 – zeď z prefabrikovaných dílců - opěrná

400 Elektro a sdělovací objekty

SO 401 – rozvody veřejného osvětlení

SO 402 – směrová přeložka telekomunikačního kabelu (CETIN)

700 Objekty pozemních staveb

SO 701 (nad gabionovou zdí) – nové drátěné oplocení – délka - 33,0 m, výška drátěného oplocení 1500 mm, vzdálenost sloupků max. 2 500 mm.

SO 702 (nad prefabrikovanou zdí) – nové drátěné oplocení – délka - 29,0 m, výška drátěného oplocení 2000 mm, vzdálenost sloupků max. 2 500 mm.

800 Objekty úpravy území

SO 801 – sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Další podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace pro společné povolení, kterou vypracovali:

██████████
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ██████████

██████████
autorizovaný technik v oboru prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, ČKAIT
██████████

██████████
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ██████████

██████████ autorizoval ██████████
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická
zařízení

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 984/1, 985/1, 985/2, 985/6, 986, 1015, 1084, 1093/4, 1114, 1115/1, 1115/2, 1116/2, 1117 v katastrálním území Zábřeh na Moravě v souladu s ověřenou projektovou dokumentací. Souřadnice hlavních bodů obsahuje výkres D.1.1.2h.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
3. Při přípravě a provádění stavby budou dodrženy další povinnosti a odpovědnost osob tak, jak je uvedeno v § 152 až § 160 stavebního zákona.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět i změny v těchto skutečnostech - § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.
5. Stavba musí být na viditelném místě označena tabulí „Stavba povolena“ - § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona.
6. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací - § 152 odst. 4 stavebního zákona.

7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením speciálního stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů - § 160 stavebního zákona.
8. Na stavbě musí být veden stavební deník, který je povinen vést zhotovitel stavby. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi - § 157 stavebního zákona.
9. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., v platném znění.
10. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být požádáno u příslušného obecního úřadu. (Městský úřad Zábřeh, Odbor technické správy).
11. Zvláštní užívání místních komunikací dle § 25 odst. 6 písm. 2), 3) zákona o pozemních komunikacích i omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami dle § 24 zákona o pozemních komunikacích je možné na základě rozhodnutí, vydaného příslušným silničním správním úřadem (Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy) – žádá zhotovitel stavebních prací.
12. Dopravní značení provizorní (DIO) je možné umístit na základě stanovení přechodné úpravy provozu (vydá Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, na základě podané žádosti).
13. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Případné vstupy na soukromé pozemky budou včas a s dostatečným předstihem projednány s jejich vlastníky.
14. Před zahájením stavebních prací nutno požádat o vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou! O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku.
15. Všechna vyjádření a stanoviska správců technické a dopravní infrastruktury, která budou v době zahájení stavebních prací neplatná, budou aktualizována dle skutečného stavu.
Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.
16. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá ze situace projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývajících z přiložených situací
 - ČEZ Distribuce, a.s. – Vyjádření zn. 1108123831 ze dne 09.03.2020 a sdělení zn. 0101277233 ze dne 16.03.2020; **(přeložku sítí vyřizuje ČEZ a.s., musí být provedena před zahájením stavebních prací)**
 - GridServices s.r.o. – Stanovisko zn. 5002101302 ze dne 26.03.2020; **(přeložka plynu povolena územním rozhodnutím č.j. 2019/1259/SV-MUZB-8 ze dne 07.01.2020)**
 - Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. – Vyjádření zn. 041/03/2020 ze dne 02.04.2020; **(přeložka vodovodu povolena rozhodnutím č.j. 2019/317/ZP-MUZB-3 ze dne 14.06.2019)**
 - CETIN a.s. - Vyjádření č.j. 564198/20 ze dne 16.03.2020; **(přeložka řešena tímto rozhodnutím)**

- EKO servis Zábřeh, s.r.o. – Vyjádření č. 270320 ze dne 19.03.2020; **(doplnění stávajícího veřejného osvětlení řešeno tímto rozhodnutím)**

jenž jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány. Stavebník je povinen jim oznámit nejméně 15 dní předem započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací.

17. Budou splněny podmínky dotčených orgánů uvedené ve stanoviscích, sděleních, závazných stanoviscích a vyjádřeních:

- **Městského úřadu Zábřeh, Odboru správního stavebního a vyvlastňovacího úřadu uvedené v Koordinovaném závazném stanovisku č.j. 2020/427/SV-MUZB-2 ze dne 17.04.2020:**

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Upozornění:

Ochrana ovzduší

- Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, aby v průběhu realizace stavby bylo dbáno na eliminaci prašnosti - např. skrápěním, minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů atd.

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- S veškerými odpady, které vzniknou během akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy.
- Všechny odpady, které vzniknou při akci, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.
- Investor resp. prováděcí firma bude odpady vznikající při akci přednostně využívat v rámci této stavby, případně i při svých dalších aktivitách, nebo je nabízet k využití jiným osobám. Odpady musí být s výjimkou zeminy před dalším využitím recyklovány na schváleném zařízení.
- Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů budou nejprve vytríděny využitelné složky.
- Na úpravu terénu nebudou použity odpady.
- **Stavebník předloží u závěrečné kontrolní prohlídky stavby doklady o předání odpadů z realizace stavby** oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (doklady o předání odpadů

podle § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu její příl. č. 20 - v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, IČP, IČZ).

4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

6. Ochrana vod

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

7. Ochrana pozemních komunikací

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování

8. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

– **Policie ČR DI Šumperk uvedené ve stanovisku č.j. KRPM-29651-1/ČJ-2020-140906 ze dne 09.03.2020 :**

V rámci osvětlení dotčených ploch pozemních komunikací, požadujeme splnění požadavků, dle příslušných ČSN CEN TR/13201-1,2,3,4 a TKP kapitola 15 osvětlení pozemních komunikací + Dodatek č. 1 - Osvětlení pozemních komunikací vydaných MINISTERSTVEM DOPRAVY – Odboru pozemních komunikací spočívající v předložení dokladů o kvalitě a shodě zabudovaných výrobků podle č. 15.2.1 této kapitoly TKP;

– **Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí uvedené v závazném stanovisku č.j. 2019/289/ZP-MUZB-2 ze dne 13.03.2019 (souhlas s odnětím půdy ze ZPF parc.č. 985/1, 985/2 a 985/6 k.ú. Zábřeh na Moravě):**

V souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) orgán ochrany ZPPF stanovuje k zajištění ochrany ZPF podmínky odnětí půdy:

- 1) Před zahájením zemních prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic území, v němž dojde k odnětí půdy, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
- 2) V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a/ zákona zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy. Z plochy odnětí 0,0150 ha bude skryta ornice a podorničí o průměrné mocnosti 30 cm, v objemu cca 45 m³. Následně využije skrytou zeminu tak, že ji po dokončení stavby rozprostře na nezastavěné části

odnímaných pozemků.

Tento souhlas neopravňuje investora k zahájení stavby, resp. nezemědělské činnosti na výše uvedených pozemcích. Nezemědělská činnost může být zahájena až po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů, případně ve lhůtách v nich uvedených.

Za trvalé odnětí půdy ze ZPF se v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona odvod finanční částky nepředepisuje.

V případě, že výše uvedená komunikace nebude schválena a užívána jako místní, je investor povinen zaplatit odvod stanovený ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona podle přílohy k zákonu. Výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF se stanovuje základní sazbou 13,41 Kč/m² dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění. Na celé ploše odnětí je půda zařazena do BPEJ 51100. Zároveň je tato BPEJ podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany půdy v platném znění, zařazena do třídy ochrany I., k níž je přiřazen příslušný koeficient: 9. V případě, že se nebude jednat o místní komunikaci, orgán ochrany stanovil orientační výši odvodu za odnětí půdy ze ZPF vynásobením základní sazby, koeficientem a odnímanou plochou. Výše odvodu celkem: 13,41 x 9 x 150 = 18104 Kč.

Na celé ploše trvalého odnětí nebude negativně ovlivněn faktor životního prostředí uvedený v části „B“ přílohy zákona.

Investor (zde Olomoucký kraj) předloží orgánu ochrany ZPF pravomocné rozhodnutí, pro které je tento souhlas podkladem, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

Investor je povinen písemně oznámit zahájení realizace záměru nejpozději do 15 dnů před zahájením.

POKUD INVESTOR NEOZNÁMÍ ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU VE STANOVENÉ LHŮTĚ, DOPOUŠTÍ SE TÍM PŘESTUPKU DLE § 20A ODS. 1 PÍSM. K) ZÁKONA O ZPF, ZA KTERÝ LZE ULOŽIT POKUTU DLE § 20A ODS. 3 PÍSM. C) ZÁKONA O ZPF AŽ DO VÝŠE 500 000 Kč.

- **Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí uvedené v závazném stanovisku č.j. 2019/352/ZP-MUZB-2 ze dne 19.03.2019 (souhlas s odnětím půdy ze ZP parc.č. 1114 a 1116/2 k.ú. Zábřeh na Moravě):**

V souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) orgán ochrany ZPPF stanovuje k zajištění ochrany ZPF podmínky odnětí půdy:

- 1) Před zahájením zemních prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic území, v němž dojde k odnětí půdy, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
- 2) V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a/ zákona zajistí investor na vlastní náklad provedení skryvky kulturní vrstvy půdy. Z plochy odnětí 0,0041 ha bude skryta ornice a podorničí o průměrné mocnosti 20 cm, v objemu cca 8 m³. Následně využije skrytou zeminu tak, že ji po dokončení stavby rozprostře na nezastavěné části odnímaných pozemků.

Tento souhlas neopravňuje investora k zahájení stavby, resp. nezemědělské činnosti na výše uvedených pozemcích. Nezemědělská činnost může být zahájena až po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů, případně ve lhůtách v nich uvedených.

Za trvalé odnětí půdy ze ZPF se v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona odvod finanční částky nepředepisuje.

Investor (zde Město Zábřeh) předloží orgánu ochrany ZPF pravomocné rozhodnutí, pro které je tento souhlas podkladem, a to nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí právní moci.

- **Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, Stavební a vyvlastňovací úřad uvedené v závazném stanovisku č.j. 2020/426/SV-MUZB-2 ze dne 21.04.2020 (SO 401 – rozvody VO):**

Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací z října 2019, kterou vypracoval [redacted] autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby. Stavební objekt SO 401 – rozvody veřejného osvětlení – vypracoval [redacted] autorizace ČKAIT [redacted] autorizovaný technik v oboru prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.

- **Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, Stavební a vyvlastňovací úřad uvedené v závazném stanovisku č.j. 2020/1359/SV-MUZB-2 ze dne 10.08.2020 (SO – 402 směrová přeložka kabelu - CETIN a.s.):**

Při provádění výkopových prací, úpravách pozemků, stavbě vedené v souběhu, při křížení nebo ukládání nových rozvodů nad stávajícími inženýrskými sítěmi, bude dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V případech, kdy nebude možno tuto normu dodržet, budou navržena jiná řádná opatření k ochraně sítí (chráničky apod.)

21. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu 14 dnů předem tyto fáze výstavby pro zajištění kontrolní prohlídky stavby:


- Závěrečnou kontrolní prohlídku.


22. **Stavba bude dokončena do 9/2022.**

23. Po dokončení stavby je stavebník povinen podat u speciálního stavebního úřadu (Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy) žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou doloženy doklady v rozsahu části B, přílohy č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. **U stavby financované z veřejného rozpočtu bude k žádosti doloženo prohlášení autorského dozoru projektanta (případně hlavního projektanta) o tom, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací - § 152 odst. 4 stavebního zákona. Bez vydání kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh





Odůvodnění:

Dne 04.09.2020 vydal Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, rozhodnutí č.j. 2020/3175/DO-MUZB-5, proti kterému bylo podáno odvolání. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutím č.j. KUOK 14380/2021, Sp. Zn.: KÚOK/124018/2020/ODSH-SH/9065 ze dne 02.02.2021 (PM 18.02.2021) výše uvedené a odvoláním napadené rozhodnutí speciálního stavebního úřadu zrušil a věc mu vrátil k novému projednání.

V pokračování v řízení spis. Zn. DO.3175/2020/Ju v novém projednání věci speciální stavební úřad postupoval v souladu se zákony a jinými právními předpisy, jakož i s právním názorem odvolacího správního orgánu obsaženým v odůvodnění rozhodnutí KÚOK/124018/2020/ODSH-SH/9065 ze dne 02.02.2021 (PM 18.02.2021).

Výzvou č.j. 2020/3175/DO-MUZB-15 ze dne 01.04.2021 vyzval stavebníka, aby do 31.05.2021

1. **Upřesnil bod V podané žádosti**, ve kterém je uvedeno, že se jedná o stavbu novou ač samotný název stavby je specifikován jako „Stavební úpravy komunikace v lokalitě na Skokance v Zábřehu, k.ú. Zábřeh na Moravě“. (Dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu musí být z podání patrné, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje).
2. **Doložil projektovou dokumentaci pro daný druh stavby** (v případě, že se jedná o stavební úpravy stávající komunikace, bude z ní zřejmý její stávající stav a jednoznačně zakreslen stav nový).
3. Pokud dokumentace stavby dozná změn, **doložil požadované doklady a podklady k řádně doplněné projektové dokumentaci, to se týká i závazných stanovisek dotčených orgánů.**
4. **Stavebník na základě doplněné projektové dokumentace uvede do souladu bod 3** (Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba/změna stavby umísťuje) **a bod 4** (Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) **v části B podané žádosti.**

Zároveň stavebníka upozornil, že pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno a usnesením společné řízení do 31.05.2021 přerušil.

Dne 17.05.2021 stavebník požadované údaje a podklady doplnil. Vzhledem k tomu, že byla žádost opravena tak, že se ve skutečnosti jedná o stavební úpravy stávající místní komunikace (ověřeno dle platného pasportu místních komunikací, které vede město Zábřeh), nedošlo

ke změně projektové dokumentace, a proto nebyla požadována nová stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Do projektové dokumentace byl však doplněn dle požadavků Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství výkres situace pozemní komunikace č. D.1.1.2a, ve kterém je zvýrazněn stávající stav komunikace a jednoznačně zakreslen stav nový.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení v novém projednání pod č.j. MUZB/29750/2021/OD ze dne 03.06.2021 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům (doručováno v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona – řízení s velkým počtem účastníků). Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto.

Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr dle § 94o stavebního zákona - zda je záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcí vyhláškou, možnost napojení na dopravní infrastrukturu, posoudil soulad se závaznými stanovisky dotčených orgánů, ověřil úplnost a přehlednost projektové dokumentace a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě a ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Dle § 94p speciální stavební úřad schválil stavební záměr, vymezil pozemky pro jeho realizace a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru ve společném územním a stavebním řízení.

Doložené doklady:

1. Město Zábřeh – Žádost o vydání společného povolení ze dne 13.05.2020 + doplnění podkladů ze dne 17.05.2021
2. Souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona
[redacted] Olomoucký kraj - Nové Zámky, poskytovatel služeb, příspěvková organizace, [redacted]

Stanoviska, vyjádření a sdělení správců technické a dopravní infrastruktury:

3. ČEZ Distribuce, a.s. – Vyjádření zn. 1108123831 ze dne 09.03.2020 a sdělení zn. 0101277233 ze dne 16.03.2020. **Dojde ke střetu – přeložku sítí řeší ČEZ Distribuce, a.s.**
4. Telco Pro Services, a.s. – Sdělení zn. 0201043387 ze dne 16.03.2020
5. GridServices s.r.o. – Stanovisko zn. 5002101302 ze dne 26.03.2020, **v zájmovém území se nachází plynárenské zařízení – přeložka plynu č.j. 2019/1259/SV-MUZB-8 ze dne 07.01.2020**
6. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. – Vyjádření zn. 041/03/2020 ze dne 02.04.2020, **dojde ke styku s vodovodním řadem, nutná přeložka vodovodu č.j. 2019/317/ZP-MUZB-3 ze dne 14.06.2019**
7. CETIN a.s. - Vyjádření č.j. 564198/20 ze dne 16.03.2020, **dojde ke střetu, přeložku řeší PD**

8. České radiokomunikace – Vyjádření zn. UPTS/OS/241668/2020 ze dne 16.03.2020
9. T-Mobile Czech Republic a.s. – Vyjádření zn. E11975/20 ze dne 16.03.2020
10. Vodafone Czech Republic – Vyjádření zn. MW9910147019155921 ze dne 16.03.2020
11. EKO servis Zábřeh, s.r.o. – Vyjádření č. 270320 ze dne 19.03.2020,
dojde k dotčení, VO řeší PD
12. AQUA, a.s. – V dané lokalitě není žádné vedení AQUA, a.s. – (datum ani č.j. neuvedeno)
13. ČD Telematika a.s. Vyjádření č.j. 1201807285 ze dne 25.04.2018 – platnost vyjádření
prodloužena do 05.05.2022
14. HEDVA PRIMA, a.s. – vyjádření ze dne 25.04.2018
15. RPS optická s.r.o. – Vyjádření ze dne 18.03.2020

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:

16. KHS Olomouckého kraje – Vyjádření č.j. KHSOC/07185/2020/SU/HOK ze dne 16.03.2020
17. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, stavební a vyvlastňovací úřad – Koordinované závazné
stanovisko č.j. 2020/427/SV-MUZB-2 ze dne 17.04.2020, **podmínky**
18. HZS Olomouckého kraje – Závazné stanovisko č.j. HSOL-1380-2/2020 ze dne 17.03.2020
19. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy – Rozhodnutí č.j. 2020/2168/DO-MUZB-5
ze dne 21.04.2020 (úprava sjezdu) a Sdělení č.j. 2020/1694/DO-MUZB-2 ze dne
21.04.2020
20. Policie ČR DI Šumperk - Stanovisko č.j. KRPM-29651-1/ČJ-2020-140906 ze dne
09.03.2020
(podmínka)
21. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí – Závazné stanovisko
č.j. 2019/289/ZP-MUZB-2 ze dne 13.03.2019, **podmínky**
22. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí – Závazné stanovisko
č.j. 2019/352/ZP-MUZB-2 ze dne 19.03.2019 – souhlas s odnětím půdy ze ZPF, **podmínky**
23. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, Stavební a vyvlastňovací úřad – Závazné stanovisko
č.j. 2020/426/SV-MUZB-2 ze dne 21.04.2020 (SO 401 – rozvody VO), **podmínka**
24. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, Stavební a vyvlastňovací úřad – Závazné stanovisko
č.j. 2020/1359/SV-MUZB-2 ze dne 10.08.2020 (SO – 402 směrová přeložka kabelu -CETIN
a.s.), **podmínka**

Ostatní

25. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. - Stanovisko zn. 005190018 ze dne 09.02.2019

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkem společného řízení dle § 94k stavebního zákona je:

a) stavebník:

- Město Zábřeh

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

- Město Zábřeh

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

- není

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

- [redacted]
[redacted] Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s., [redacted] GridServices,
s.r.o., [redacted] Nové zámky - poskytovatel sociálních služeb, p.o., [redacted]
ČEZ Distribuce, a. s., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., CETIN a.s.,
EKO servis Zábřeh s.r.o.

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 983, 984/2, 984/3, 985/3, 985/4, 987, 989, 1082, 1083, 1112/1, 1112/6, 1113, 1116/3, 1116/4, 1125, 1126/1 v katastrálním území Zábřeh na Moravě

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Zábřeh č.p. 1353, č.p. 1342, č.p. 1341, č.p. 1375, č.p. 1345, č.p. 1481 a č.p. 1480

Pozn. Účastníky podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d).

- Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 14.06.2021 přišla nahlédnout do spisu paní [redacted] (účastník řízení), která do protokolu upozornila na havarijný stav zídky, pokračující devastaci oplocení a terénu, sesuv půdy a poškození kamenné zídky v těsné blízkosti jejího domu, což doložila fotodokumentací, která byla přiložena ke spisu.

Speciální stavební úřad ji seznámil s předloženou projektovou dokumentací a ujistil ji, že realizací stavby budou uvedené problémy vyřešeny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly podány

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení speciální stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Radovan Till
vedoucí oddělení dopravy

Oprávněná úřední osoba pro vyřizování:
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Rozdělovník

navrhovatelé (doručenky)

1. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

2. [REDACTED]

3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

4. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IDDS: qr2gxwu

5. [REDACTED]

6. [REDACTED]

7. [REDACTED]

8. [REDACTED]

9. [REDACTED]

10. [REDACTED]

11. [REDACTED]

12. [REDACTED]

13. Nové zámky - poskytovatel sociálních služeb, p.o., IDDS: r8ik6qa

14. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

15. [REDACTED]

16. [REDACTED]

17. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

18. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj

19. EKO servis Zábřeh s.r.o., IDDS: c7b29ja

20. [REDACTED]

21. [REDACTED]

ostatní účastníci (doručenky)

22. Městský úřad Zábřeh, Úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

dále obdrží

23. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk, IDDS: 7zyai4b

24. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufaa6d

25. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6

26. Městský úřad Zábřeh, OS, oddělení životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

27. Městský úřad Zábřeh, OS, oddělení stavební a vyvlastňovací úřad, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

na vědomí

28. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH



MUZB/43276/2021/OD

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh

Elektronicky

ČÍSLO JEDN.:

MUZB/43276/2021/OD

SPIS. ZN.:

DO.3175/2020/Ju

Rozdělovník

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

posta@muzabreh.cz

DATUM:

27.08.2021

SDĚLENÍ

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MUZB/36195/2021/OD ze dne 14.07.2021

**„Stavební úpravy komunikace v lokalitě "Na Skokance" v Zábřehu,
k.ú. Zábřeh na Moravě“**

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 20.08.2021** a je vykonatelné.


referentka

Pozn. Ověřená PD bude předána osobním převzetím.

Rozdělovník

navrhovatelé (doručenky)

1. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh
