

SMLOUVA O DÍLO

(Dílní smlouva č. 1 uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce,
č. smlouvy objednatele 08PU-004101, ze dne 02. 10. 2025)

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-004166

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: [redacted] ředitelem Správy
Chomutov
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Správy Chomutov,
e-mail: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], technický pracovník,
e-mail: [redacted]
[redacted] technický pracovník
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

název: Silverton s.r.o.
se sídlem: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy,
111 01 Praha 10
IČO, DIČ: 24283410, CZ24283410
bankovní spojení: 107-1853990207/0100
zastoupen: [redacted] jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)



34224

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.
Čj.:
PID: RSDFXFGFKV
Doručeno: 06.11.2025
Listu dokumentu: 5
PŘÍLOHA: 1(12)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **Clony proti oslnění – oprava, servis a údržba**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 141 836,00 bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Clony proti oslnění – oprava, servis a údržba	141 836,00	29 785,56	171 621,56

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací – výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Clony proti oslnění – oprava, servis a údržba**, číslo veřejné zakázky 08PU-004101.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- c) Reporty závad
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (viz. uzavřená Smlouva č. 08PU-004101)
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (viz. uzavřená Smlouva č. 08PU-004101)
- f) Technická specifikace - (viz. uzavřená Smlouva č. 08PU-004101)
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují - (viz. uzavřená Smlouva č. 08PU-004101):
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případně spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží její stejnopis.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

V Chomutově dne 09.10.2025

V Praze dne 09.10.2025

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[Redacted]

Ředitel správy Chomutov
(„Objednatel“)

Silverton s.r.o.

[Redacted]

Jednatel
(„Dodavatel“)

PŘÍLOHA

Název stavby: Clony proti oslušení – oprava, servis a údržba

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Silverton s.r.o.
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	30 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 na základě Výzvy Objednatele
Pověřená osoba	3.1	██████████ Ředitel Správy Chomutov
Zástupce objednatele	3.2	██████████ technický pracovník ██████████ technický pracovník
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) Nepoužije se.
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 2,600,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		520,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000,00 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuté do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list																						
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5																				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplněte]																						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; color: green; font-size: small;">[doplněte dle potřeby]</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplněte dle potřeby]									
Paré č.	Příjemce																					
1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)																					
2	Zhotovitel																					
3	Projektant																					
4	Supervize																					
[doplněte dle potřeby]																						
Iniciátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny:																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; font-size: small;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center; font-size: x-small;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%; text-align: center; font-size: x-small;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 34%; text-align: center; font-size: x-small;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </table>			Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00											
Údaje v Kč bez DPH:																						
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																				
		0,00																				
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center; font-size: x-small;">jméno</td> <td style="width: 20%; text-align: center; font-size: x-small;">datum</td> <td style="width: 20%; text-align: center; font-size: x-small;">podpis</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">jméno</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">datum</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">podpis</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">jméno</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">datum</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">podpis</td> </tr> </table> Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center; font-size: x-small;">jméno</td> <td style="width: 20%; text-align: center; font-size: x-small;">datum</td> <td style="width: 20%; text-align: center; font-size: x-small;">podpis</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">jméno</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">datum</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">podpis</td> </tr> </table>				jméno	datum	podpis		jméno	datum	podpis		jméno	datum	podpis		jméno	datum	podpis		jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis																			
	jméno	datum	podpis																			
	jméno	datum	podpis																			
	jméno	datum	podpis																			
	jméno	datum	podpis																			

Clony proti oslnění – oprava, servis a údržba - soupis prací

Č. pol.	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ	jednotková cena	cena celkem cena
1	demontáž sady clon proti oslnění	<u>položka obsahuje</u> : demontáž kompletního prvku v dl. 4,0 m, jehož součástí je 6 ks plastových clon, přemístění prvku na místo dílenské opravy	ks	■	■	■
2	montáž sady clon proti oslnění	<u>položka obsahuje</u> : zpětnou montáž kompletního prvku v dl. 4,0 m, jehož součástí je 6 ks plastových clon, vč. přemístění prvku z místa dílenské opravy, spojovací materiál	ks	■	■	■
3	demontáž clon proti oslnění	<u>položka obsahuje</u> : demontáž plastové clony (plastového prvku) ze základního nosníku, <u>demontáž ke zpětnému použití</u>	ks	■	■	■
4	demontáž clon proti oslnění	<u>položka obsahuje</u> : demontáž plastové clony (plastového prvku 1200/220 mm) ze základního nosníku, <u>demontáž s likvidací (poškozené clony)</u>	ks	■	■	■
5	montáž clon proti oslnění	<u>položka obsahuje</u> : montáž plastové clony (plastového prvku 1200/220 mm) na základní nosník, spojovací materiál	ks	■	■	■
6	clony proti oslnění	<u>položka obsahuje</u> : dodávku 1 ks plastové clony	ks	■	■	■
7	nosník clony	<u>položka obsahuje</u> : dodávku 1 ks nosného profilu (dl. 4,0 m) a jeho případná úprava pro osazení a následné uchycení 6 ks clon (dodávka montáž plastových clon je v samostatných položkách)	ks	■	■	■
8	DIO	položka obsahuje : veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	den	■	■	■
9	Servis a údržba	<u>položka obsahuje</u> : kontrolu, dotažení spojovacího materiálu, umytí atd...	bm	není předmětem plnění	■	■

Cena celkem bez DPH:

141 836,00 Kč

Detail závady 742617

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

30.05.2025 8:00:00

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

ostatní

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

3 - nízká

Jednotky:

12 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 1

Prov.

staničení:

95 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A078010232A19201

Staničení:

0,654

Poloha začátku:

50°37'3.52"N,13°50'2.61"E



34224

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.

Čj.:

PID: RSDFXFGFKV-01

Doručeno: 06.11.2025

Listu: 12

Druh: PŘÍLOHA

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 3.6.2025

Velikost: 143,2 kB

Název souboru: IMG_20250530_083637.jpg



Vytvořeno: 3.6.2025

Velikost: 132,7 kB

Název souboru: IMG_20250530_083639.jpg



Vytvořeno: 3.6.2025

Velikost: 139,8 kB

Název souboru: IMG_20250530_083640.jpg

Detail závady 742622

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

30.05.2025 9:00:00

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

ostatní

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

3 - nízká

Jednotky:

8 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 1

Prov.

staničení:

95,847 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A192010232A01001

Staničení:

0,473

Poloha začátku:

50°37'28.47"N,13°49'45.27"E

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 3.6.2025

Velikost: 154,6 kB

Název souboru: IMG_20250530_083945.jpg



Vytvořeno: 3.6.2025

Velikost: 195,8 kB

Název souboru: IMG_20250530_083950.jpg

Detail závady 742628

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

30.05.2025 8:29:00

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

ostatní

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

4 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

8 1

Prov. staničení:

22,449 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A010010232A01005

Staničení:

0,099

Poloha začátku:

50°37'45.10"N,13°49'40.08"E

Jízdní pruh

Střední dělicí pás

Směr průběhu staničení

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 3.6.2025

Velikost: 200,5 kB

Název souboru: IMG_20250530_084912.jpg



Vytvořeno: 3.6.2025

Velikost: 85,8 kB

Název souboru: IMG_20250530_084917.jpg




Vytvořeno: 3.6.2025

Velikost: 184,6 kB

Název souboru: IMG_20250530_084920.jpg

Detail závady 761074

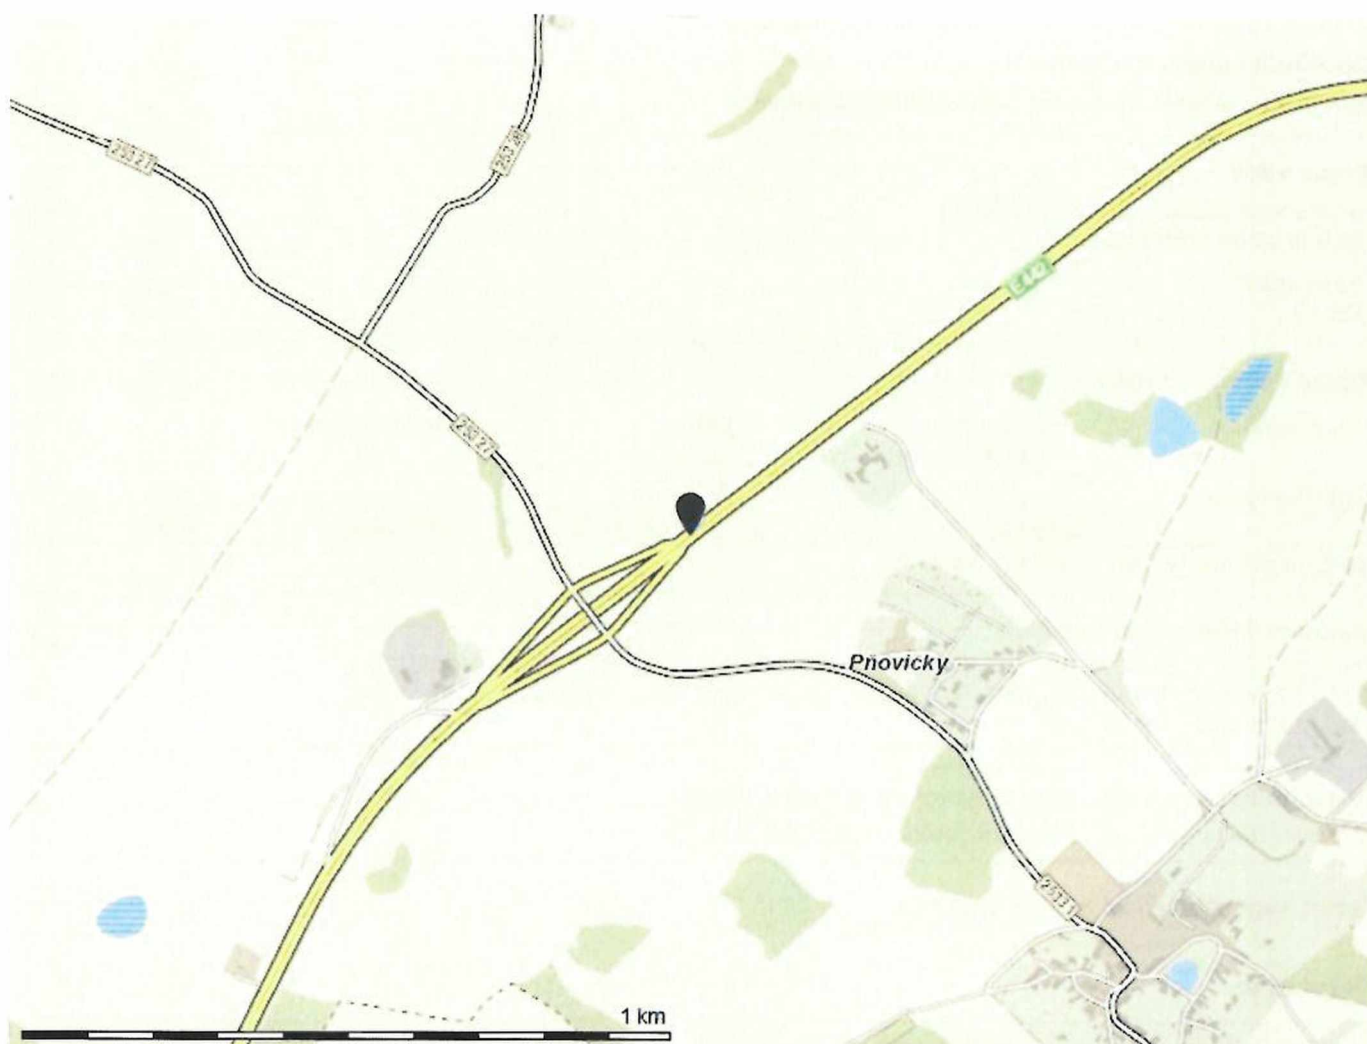**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

01.08.2025 9:00:00

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

12 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 2

Prov.

staničení:

92,43 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A078020232A07901

Staničení:

1,58

Poloha začátku:

50°36'10.04"N, 13°48'36.32"E

Jízdní pruh**Směr průběhu staničení**

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 4.8.2025

Velikost: 126,2 kB

Název souboru: IMG_20250801_084649.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025

Velikost: 139,5 kB

Název souboru: IMG_20250801_084659.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025

Velikost: 162,0 kB

Název souboru: IMG_20250801_084701.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025

Velikost: 65,7 kB

Název souboru: IMG_20250801_084825.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 78,8 kB
Název souboru: IMG_20250801_084829.jpg




Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 92,1 kB
Název souboru: IMG_20250801_084831.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 77,4 kB
Název souboru: IMG_20250801_084835.jpg

Detail záznamu vady

W0001660

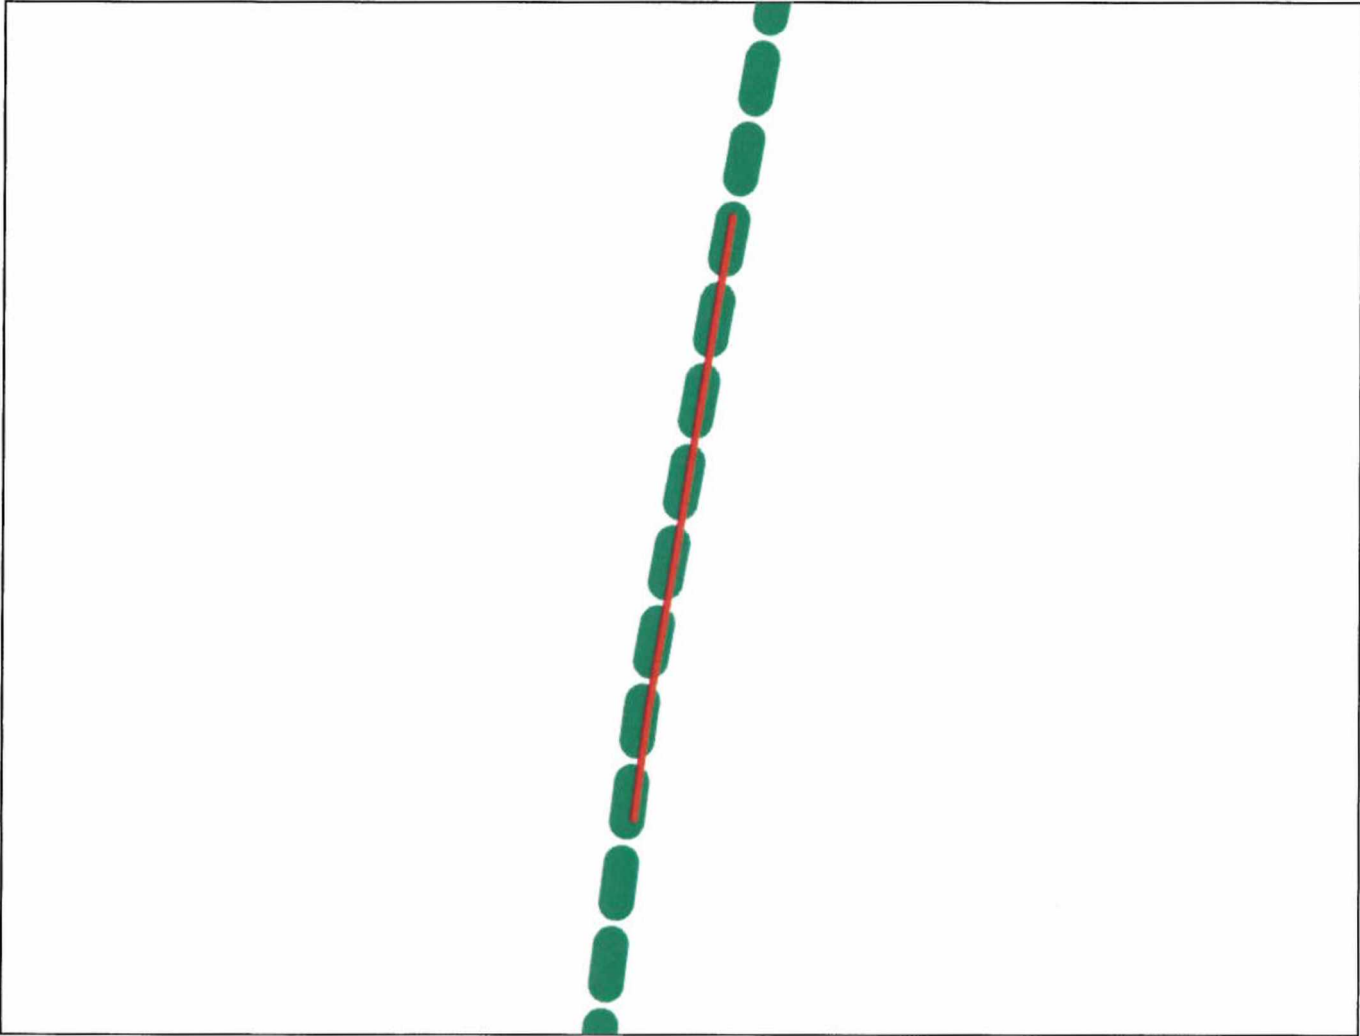

Záznam vytvořil	09.10.2025 09:16
Poslední změna	09.10.2025 09:18
Verze záznamu	2

Základní údaje

Pořadové číslo	W0001660
Stav vady	1 Zadáno inspektorem
Inspektor	
Nalezeno	07.10.2025 00:00 při: Mimo prohlídku
Typ vady	Záchytné systémy, bezp. zařízení (pův. Bezpečnostní zařízení)
Podtyp	ostatní vady
Popis vady	clony proti oslnění na svodidlech poškozených havárií, clony zasahují do jízdního rychlého pruhu
Supervizor	
Dozor	

Údaje pracovních toků

Opakovaná vada	Ne
Duplicitní vada	Ne
Dopravní nehoda	
Číslo jednací	
Přechodné značení	
Typ přechodného značení	
Důvod odmítnutí reklamace	
Důvod odmítnutí opravy interním zhotovitelem	
Důvod vyřazení	
Důvod odmítnutí (zhotovitelem)	
Důvod odmítnutí dozorem	
Důvod vrácení vady k doplnění	
Záruka	
Email pro Řešeno zárukou	

Lokalizace

	Od	Do
Číslo komunikace	13 1	13 1
Provozní staničení	96.133 km	96.170 km
Kilometrovníkové staničení	0.000 km	0.000 km
Úsek ULS	0232A192010232A01001	0232A192010232A01001
Úsekové staničení	759.000 m	796.000 m
Správce	Správa Chomutov	Správa Chomutov
Okruh	CH Teplice	CH Teplice
Úsek	I/13	I/13
Oblast zimní údržby	Oblast 06 Ústecká	
Umístění vůči pozemkům ŘSD	Leží na pozemku ŘSD	
Umístění vůči zárukám	Leží mimo záruky	
Seznam záruk		

Fotografie před opravou



IMG_20251007_122634.jpg

Soubor/Typ IMG_20251007_122634.jpg image/jpeg



IMG_20251007_122743.jpg

Soubor/Typ IMG_20251007_122743.jpg image/jpeg



Soubor/Typ IMG_20251007_122744.jpg image/jpeg



Soubor/Typ IMG_20251007_122746.jpg image/jpeg



Soubor/Typ IMG_20251007_122747.jpg image/jpeg



Soubor/Typ IMG_20251007_122840.jpg image/jpeg



17m756 - vyhledání 1. zář. ul. 5.5 na 41m - 1. zář. ul. 5.5

Soubor/Typ IMG_20251007_122843.jpg image/jpeg



17m756 - vyhledání 1. zář. ul. 5.5 na 41m - 1. zář. ul. 5.5

Soubor/Typ IMG_20251007_122844.jpg image/jpeg



17m756 - vyhledání 1. zář. ul. 5.5 na 41m - 1. zář. ul. 5.5

Soubor/Typ IMG_20251007_122846.jpg image/jpeg



Downloaded from [Google Images](#) - [View source](#) - [Download image](#)

Soubor/Typ IMG_20251007_122850.jpg image/jpeg



Downloaded from [Google Images](#) - [View source](#) - [Download image](#)

Soubor/Typ IMG_20251007_122904.jpg image/jpeg



Downloaded from [Google Images](#) - [View source](#) - [Download image](#)

Soubor/Typ IMG_20251007_122908.jpg image/jpeg



576x768 px (100%) * 64x88 px (11%) na 4Tima * 51 mm, auto.jpg

Soubor/Typ IMG_20251007_122912.jpg image/jpeg
