

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PU-002606/17  
číslo smlouvy dodavatele/zhotovitele: 217065 ŘSD

na realizaci zakázky  
„17098 - I/46 Koberžice - Sudice“

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ostrava

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. název:

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

se sídlem:

Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

IČO, DIČ:

25357352 / CZ25357352

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/46 Kobeřice - Sudice**, ISPROFIN 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **24 320 655,80 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>I/46 Kobeřice - Sudice</b>	24 320 655,80 Kč	5 107 337,72 Kč	29 427 993,52 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 17098 - I/46 Kobeřice - Sudice, číslo veřejné zakázky 16PU-002606.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) <sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu  
Specifikace zakázky

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

<sup>1</sup>Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

<sup>2</sup> Dodavatel/zhotovitel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Dodavatel/zhotovitel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>4</sup> Dodavatel/zhotovitel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>5</sup> Dodavatel/zhotovitel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 54300/419/17

Číslo zakázky: **16PU-002606**

ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

dle Rozdělovníku

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

**„17098 - I/46 Kobeřice - Sudice“**

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0027670 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

**se sídlem: Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov**

**IČO: 25357352**

### O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

**Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek**

V Ostravě dne **31. 08. 2017**

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Rozdělovník**

SILNICE MORAVA s.r.o.

KARETA s.r.o.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

JANKOSTAV s.r.o.

STRABAG a.s.

ALPINE Bau CZ a.s.



## ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### 1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	16PU-002606
Číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	VZ0027670
Název veřejné zakázky	<b>17098- I/46 Kobeřice - Sudice</b>
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
ISPROFIN	500 111 0007

### 2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka
1	SILNICE MORAVA s.r.o.	Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov	25357352
2	KARETA s.r.o.	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál	62360213
3	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	Mlýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno Kontaktní adresa: odštěpný závod Ostrava ul. Palackého 105, 702 00 Ostrava	25317628
4	JANKOSTAV s.r.o.	Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava	25855581
5	STRABAG a.s.	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Korespondenční adresa: odštěpný závod Morava, oblast Sever Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov	60838744
6	ALPINE Bau CZ a.s.	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí	02604795



### 3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

#### 3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	1	SILNICE MORAVA s.r.o.	24 320 655,80
2.	5	STRABAG a.s.	24 904 817,67
3.	6	ALPINE Bau CZ a.s.	26 150 159,10
4.	3	JANKOSTAV s.r.o.	27 073 582,00
5.	3	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby s.r.o.	28 202 607,30
6.	2	KARETA s.r.o.	28 412 817,11

#### 3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

#### 3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1	24 320 655,80	1.
2	28 412 817,11	6.
3	28 202 607,30	5.
4	27 073 582,00	4.
5	24 904 817,67	2.
6	26 150 159,10	3.

### 3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka
1.	SILNICE MORAVA s.r.o.
2.	STRABAG a.s.
3.	ALPINE Bau CZ a.s.
4.	JANKOSTAV s.r.o.
5.	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
6.	KARETA s.r.o.

### 4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
████████████████████	
██████████	
██████████	
████████████████████	
██████████	

V Ostravě dne 08.08.2017



## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **I/46 Kobeřice - Sudice**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
Doba pro dokončení	1.1.9	56 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	56 kalendářních dnů
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 48 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:  (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ (36 měsíců VDZ z plastu)
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);  30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)  75.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		podle Článku 7 (Doba pro dokončení);  15.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  3.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: V Krnově dne ~~31.8.2017~~

SILNICE MORAVA s.r.o.

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlžení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5
---	----------------------------------	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne **doplňte!!!** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: **doplňte**

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>doplňte dle potřeby</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	<b>doplňte dle potřeby</b>	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
<b>doplňte dle potřeby</b>													

Iniciátor změny: **doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel**

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV <b>doplňte dle potřeby</b>	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

### Netištěné přílohy SOD na datovém nosiči CD:

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>1</sup>
- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>2</sup>
- Technická specifikace<sup>3</sup>
- Výkresy




<sup>1</sup> Dodavatel/zhotovitel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>2</sup> Dodavatel/zhotovitel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Dodavatel/zhotovitel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.



Silnice I/46 Koberžice - Sudice v km 129,980 - 133,953

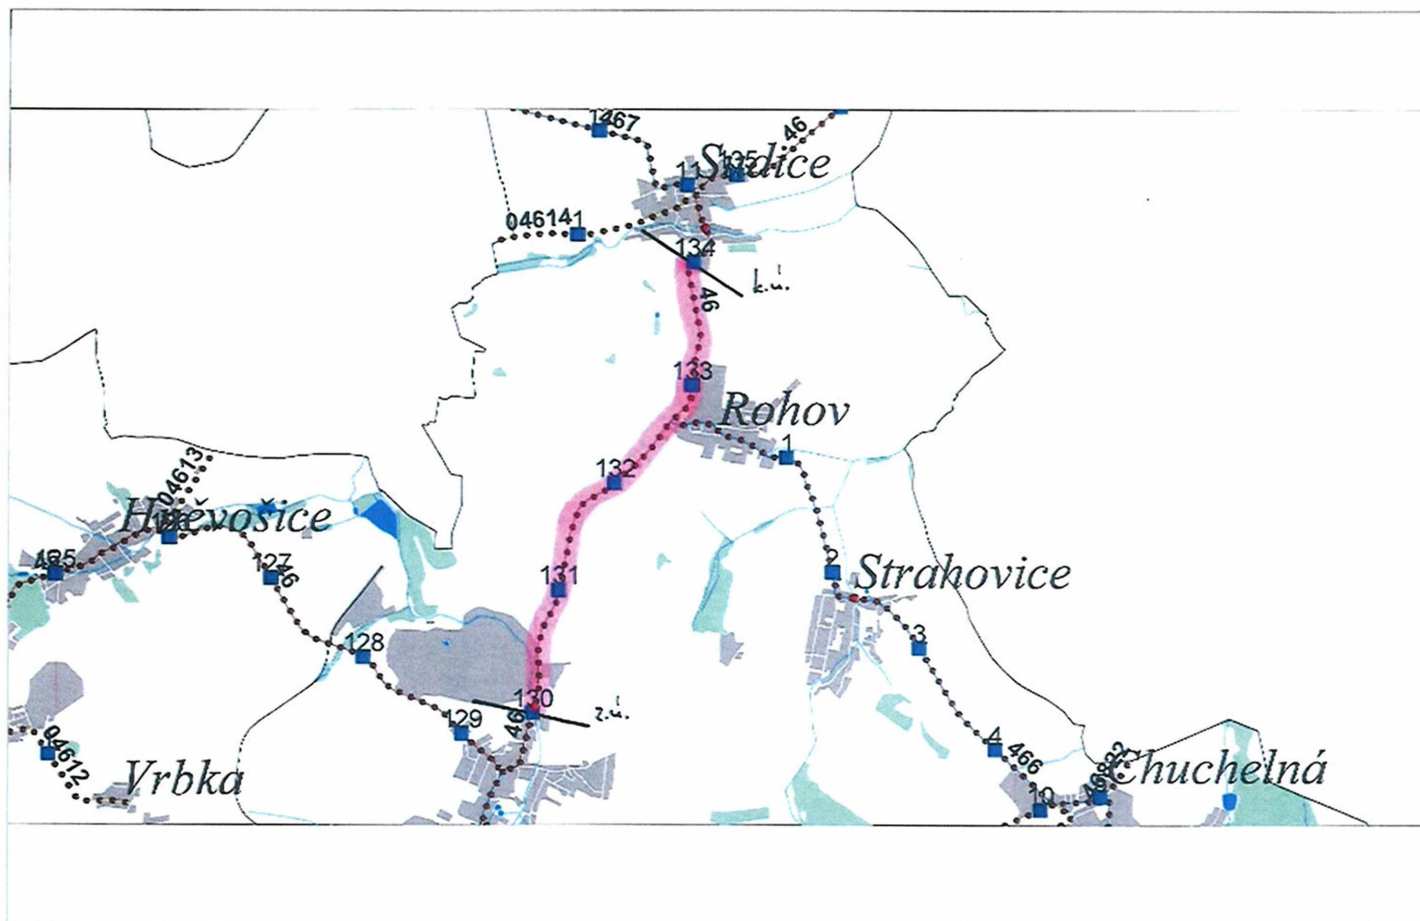

11 060,60 24,69 1:44 792,39

23. 6. 2017 7:31:34

## FORMULÁŘ 2.3.1.

### ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: **SILNICE MORAVA s.r.o.**

se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

IČO: 25357352

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **I/46 Kobeřice - Sudice**, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **VZ0027670** (dále jen „účastník“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

<b>Materiál</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>
<b>Asfaltové směsi frézované a vybourané</b>	4.626,14 t	117,- Kč/t bez DPH
<b>Dlažební kostky</b>	cca 102 t	1 226,- Kč/t bez DPH

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Krnově dne 31.8.2017

SILNICE MORAVA s.r.o.

## SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Jedná se o provozní škody (mozaikové trhliny, síťové trhliny, podélné a příčné trhliny, staré vysprávký, výtluky, ztráta asfaltového tmele) v km 129,980 - 133,953 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu.

Plánovaná oprava na I. úseku (km 129,980 – 130,549) bude provedena odfrézováním v tl. 130 mm, navezením materiálu vhodného k recyklaci v tl. 60 mm, recyklací za studena na místě RS CA tl. 180 mm dle TP 208, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,60 kg/m<sup>2</sup>, pokládkou asf. betonu ACP 16 S mod. v tl. 70 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,40 kg/m<sup>2</sup> a pokládkou asfaltového koberce mastixového SMA 11 S mod tl. 40 mm.

Na II. úseku (km 130,549 – 132,500) bude oprava provedena odfrézováním v tl. 60 mm, provedením lokálních částečných sanací (výměna podkladní recyklované vrstvy za vrstvu SC C<sub>3/4</sub> v tl. 180 mm), na základě provedené prohlídky po odfrézování, provedením lokální kompletní sanace (odstraněním vrstev v tl. 780 mm, zhutněním pláň, pokládkou separační textilie, sanační vrstvou pro podloží z kameniva drceného tl. 400 mm, zřízením vrstvy ŠD tl. 200 mm a stmelené vrstvy SC C<sub>3/4</sub> v tl. 180 mm), opravami trhlín dle TP 115 (prořezání a zalití, pokládka geomříže š. 1,5 m na spoj. postřik z mod. asf emulze 1,50 kg/m<sup>2</sup>), nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,40 kg/m<sup>2</sup>, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 70 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,40 kg/m<sup>2</sup> a pokládkou asfaltového koberce mastixového SMA 11 S mod tl. 40 mm. III. úsek (km 132,500 – 133,100) bude opraven odfrézováním v tl. 100 mm, odstraněním stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm, zhutněním pláň, zřízením podkladní vrstvy ŠD<sub>A</sub> 0/32 v tl. 150 mm, nanesením infiltračního postřiku mod. asf. emulzí 0,80 kg/m<sup>2</sup> s podrcením kamenivem, pokládkou asf. betonu ACP 16 S mod v tl. 50 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,40 kg/m<sup>2</sup>, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,40 kg/m<sup>2</sup> a pokládkou asfaltového koberce mastixového SMA 11 S mod tl. 40 mm.

Na IV. úseku (km 133,100 – 133,953) bude provedeno odfrézování v tl. 50 mm, lokální opravy po odfrézování směsí ACL mod, opravy trhlín dle TP 115 (prořezání a zalití, pokládka geomříže š. 1,5 m na spoj. postřik z mod. asf emulze 1,50 kg/m<sup>2</sup>), nanesení spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,40 kg/m<sup>2</sup>, pokládka asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesení spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,40 kg/m<sup>2</sup> a pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11 S mod. tl. 40 mm.

Celková výměra nepřesáhne 28 467 m<sup>2</sup>.

Součástí opravy bude provedení obnovy VDZ (plast-profil zvučící, resp. plast-nehlučný, plast hladký - symboly), odtěžení tělesa krajnice v š. 0,5 a tl. 0,1 m, dosypání krajnice recyklátem, demontáž a montáž nových dopravních knoflíků, obnova bezpečnostní protismykové úpravy povrchu dle TP 213, výšková úprava poklopů a mříží, výšková úprava betonových obrubníků, předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem (vjezd k nemovitosti), odstranění obrub z velkých dlažebních kostek a výšková úprava stávajících svodidel.

Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.
