

Číslo smlouvy vlastníka CB 2017_0021
Číslo smlouvy stavebníka OST/1/10717/RTA/Hoš

SRM 8020007408
Registr smluv ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ
č. CB 2017_0021**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“), v platném znění mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená na základě pověření [REDAKCE] MBA, Supervizorem, Výstavba

pevné přístupové sítě dle Pověření ze dne 1.8.2016

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „CETIN“)

a

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

právní forma : příspěvková organizace

sídlem : Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10

IČ : 709 71 641

DIČ: CZ 709 71 641

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném KS v Českých Budějovicích, odd. Pr. vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

zastoupená: Ing. Janem Štíchou ředitelem organizace

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 21.2.2014 [] vydané pod čj. 536550/14, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „[VPI Ústrašice most]“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „CTN“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 2 týdny před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 8 této Smlouvy
- iii) zajistit pro společnost CETIN oprávnění k pozemkům, na nichž bude provizorně umístěno komunikační vedení;

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 5 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy 67 062,00 Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do 2měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (bližší specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,

- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.2 Faktura dle odst. 6.1 tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

ve věcech technických:

[REDAKCE]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha
funkce: ředitel organizace
sekretariát@susjk.cz tel.: 387021011

ve věcech technických: [REDAKCE]

funkce: investiční technik

e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zprávy jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;

- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 – „SOUHLAS s vydáním rozhodnutí o povolení stavby“ bez ÚR

Příloha č. 4 - Pověření CETIN

CETIN

Stavebník

V Českých Budějovicích dne 28.8.2017

V Českých Budějovicích dne 1.9.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Supervizor, Výstavba přístupové sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

240

Správa a údržba silnic JČK

Ing. Jan Šticha

ředitel organizace


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (7)


VPI Ústrašice most



mapa Planá nad Lužnicí

ÚSTRAŠICE

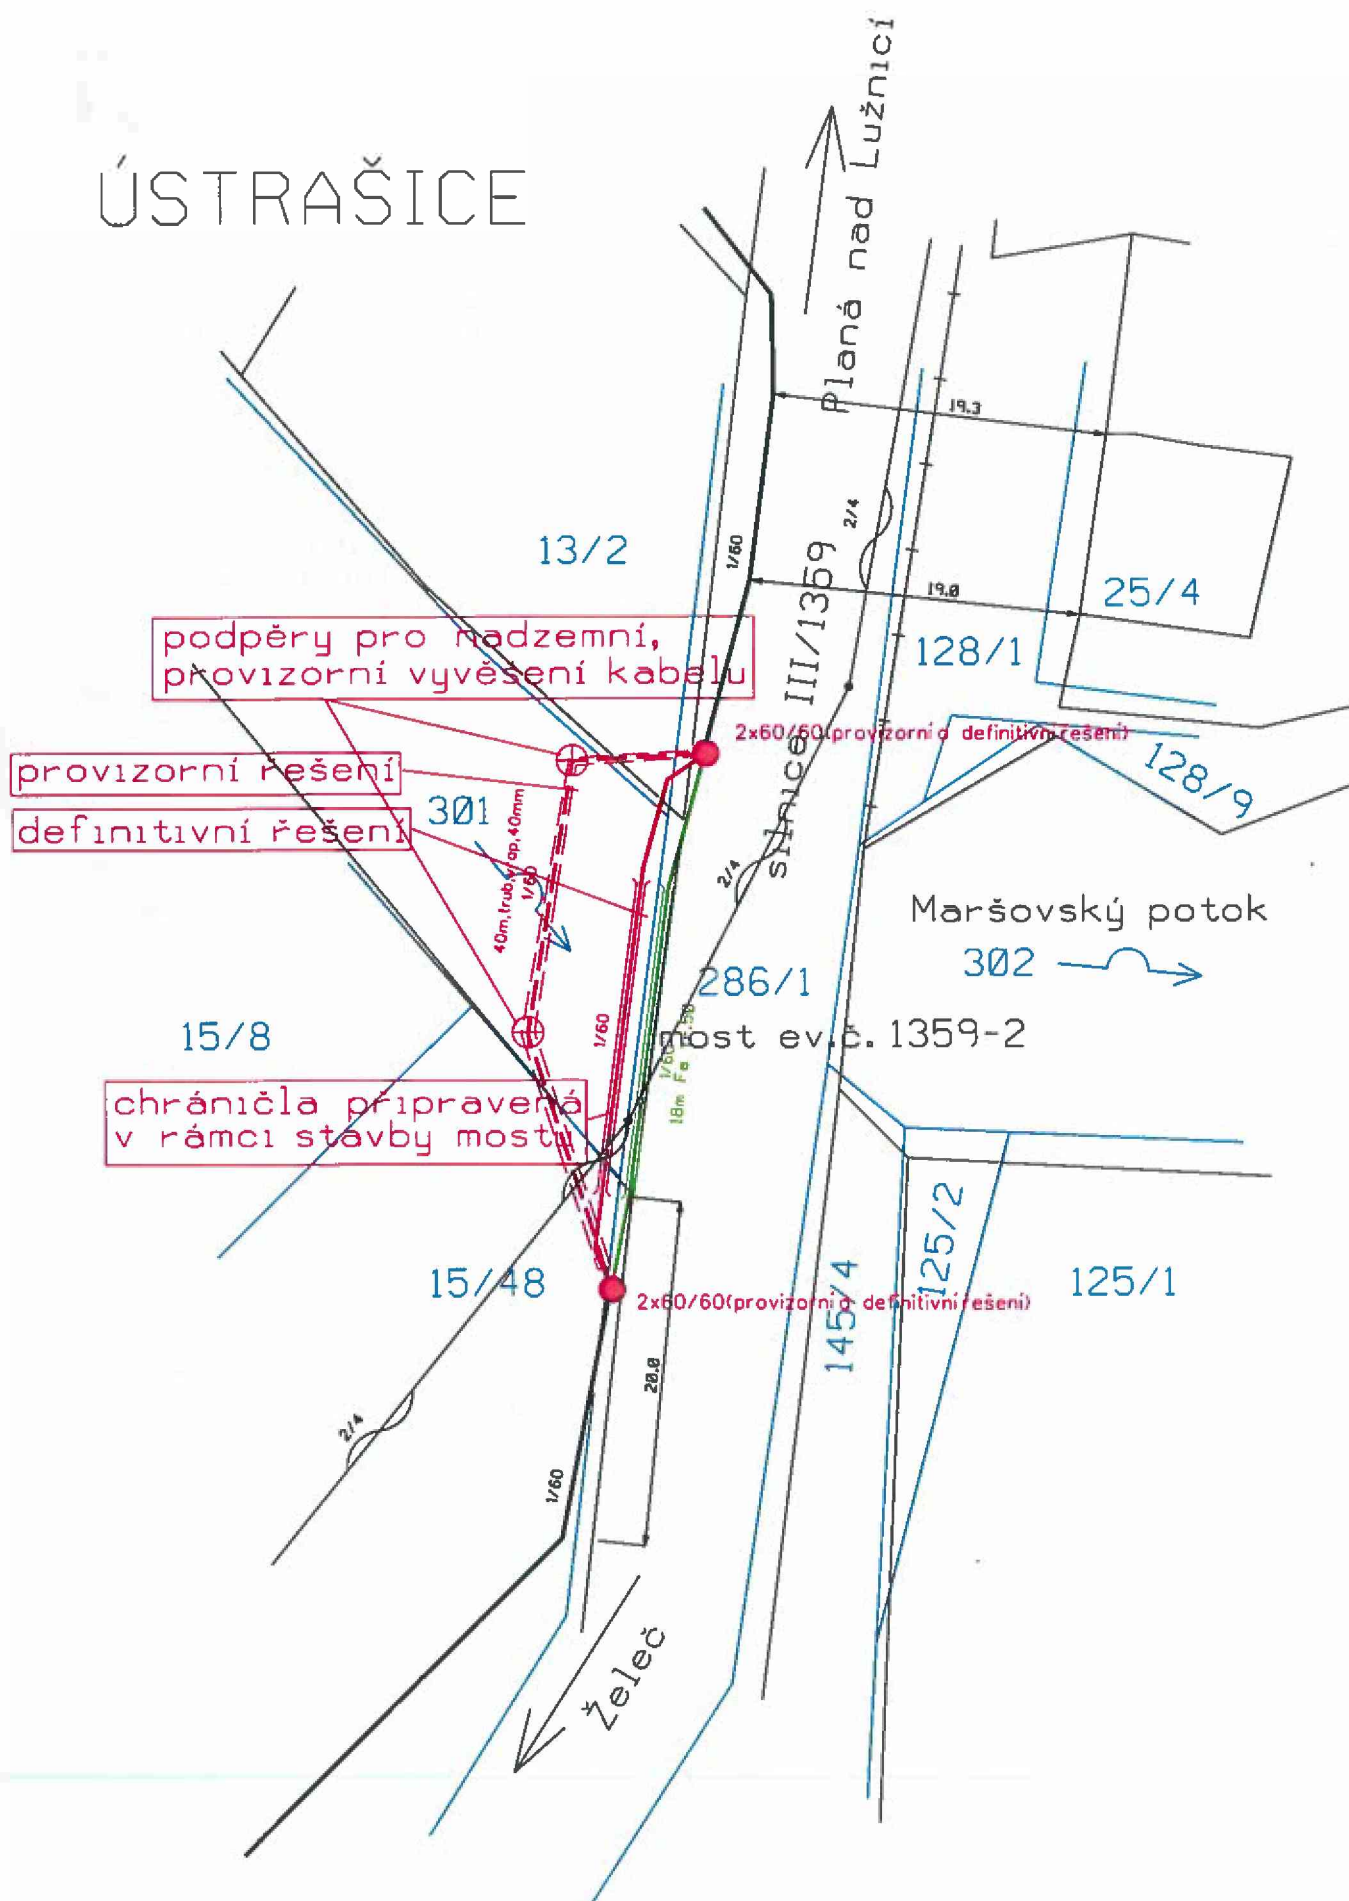

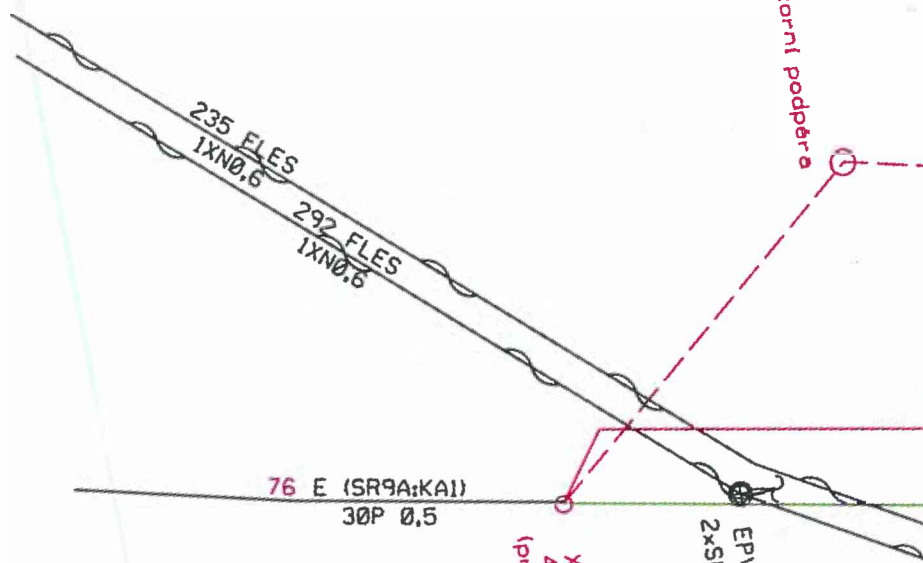

2x
XAGA550
43/8-350
(provizorni a definitivni řešení)

provizorni podpora

EPV9 E.0r
2xSH1 s ob

provizorní podpora
2x
XAGA550
43/8-350
(provizorní a definitivní řešení)

63 E (SR9A:KA1)
30P 0,5

35 E (SR9A:KA1)
30P 0,5

35 PPFL
15XN0,6

50 PPFL
15XN0,6

provizorní řešení
definitivní řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby : VPI C Ústrašice (TA), most
Místo stavby : k.ú. Ústrašice, p.č. 286/1, 15/48, 301 a 13/2
Zákazník : Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Dodavatel : ARANEA NETWORK a.s.
Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

Technické řešení stavby:

V obci Ústrašice se připravuje realizace stavby „Most ev.č. 1359-2, Ústrašice“. Součástí PD této stavby je SO 401 Přeložení komunikačního vedení. Jde o provizorní změnu trasy SEK s navrácením do původní trasy po opravě mostu.

Kabel TCEKE 30P0,5 se v kolizní části trasy zruší, jde o úsek uložení kabelu v chráničce která je součástí mostní konstrukce a navazujících částí úložné trasy. Zbylé části kabelu se prostaví vložkou v dostatečné délce, tvořenou kabelem TCEPKPFLE 15XN0,6 s propojením spojkami XAGA550 43/8-350. Kabel uložený ve vrapované trubce 40mm se volně vyvěsí vedle mostu na provizorní podpěry nad Maršovský potok. Po dokončení opravy mostu se provizorní trasa kabelu zruší, smontuje se nová vložka a kabel se vrátí do původní trasy. Do mostní konstrukce bude nosnou stavbou připravena pro vrácení kabelu chránička.

Výkopové práce budou prováděny v povrchu charakteru bosého chodníku (staveniště). Pro uložení kabelů v kopané trase bude zřízeno kabelové lože z písku nebo prosáté zeminy se zakrytím výstražnou fólií. Spojky budou označeny Ball Markery.

Při pokládce kabelů budou dodrženy ČSN 736005 a 341100.

Závěrečné měření, dodržení BOZP a ochrana životního prostředí bude provedeno a postupováno bude podle předpisu TIMP TD000007.

Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD00004-6.

Polohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.


S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001Sb.

Stavba bude prováděna na územní rozhodnutí nosné stavby, bude zpracován projekt a nebude zřizována služebnost pro VBi.

Kapacity:

KMMK	KMP	KMVKYK	KMNT	KMOK	KMTRU
0,085	2,55	0,02	0	0	0

V Českých Budějovicích
22.5.2017



Název stavby: VPIC Ústrašice (TA), most

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Aranea Network a.s.

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.020	KMP:	2.550	bytových HTS	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.085	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	
ZEMNÍ PRÁCE	
MONTÁŽ	
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	
PROVOZNÍ PRÁCE	
MATERIÁL DOD. CETIN	
MATERIÁL VYŘAZENÝ	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	
POPLATKY	

Celkové náklady:

Seznam položek		Množství	Celková cena
Číslo SAP	Stavební činnost		
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S	Paušál na zemní práce do 50 m		
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		
inženýrská činnost			
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		
MONTÁŽ			
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním		
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové		
provizorní podpěry pro vyvěšení kabelu			
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m		

Název stavby:	VPIC Ústrašice (TA), most		
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.		
955040 S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN		
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		

		Limitka materiálu		
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm		
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová		
300119 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6		
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball		
312425 S		Modul konektor. 9700-10P		
408090 S		Páska speciální 16mmx20m pevnostní		
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350		
302343 S		Trubka vřapovaná 40/32 s lankem		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		



MUSUP000WSYR



Městský úřad Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1

Tel. 381 20 11 11, fax. 381 263 179

Odbor stavebního úřadu,
územního plánování, životního prostředí a dopravy

Č.j.: MESU- 1372/2014/OSÚ/MAR 2 souhl

V Sezimově Ústí : 28.8.2014

Vyřizuje: [redacted] – oprávněná úřední osoba

Tel.: 381 201 142,

e-mail [redacted]

SOUHLAS

Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v úplném znění (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

„Rekonstrukce: Most ev. č. 1359-2 Ústrašice“

odborem dopravy Městského úřadu v Táboře. Stavba je v souladu se záměry se záměry územního plánování, s platnou územně plánovací obce dokumentací obce Ústrašice, s územním plánem, který nabyl účinnosti dne 12.11.2007 (usnesení č.9/2007).

Jelikož projektová dokumentace zpracovaná [redacted] Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 62500 Brno, č. zakázky 13122, řeší rekonstrukci stávajícího mostu, rozhodnutí o umístění stavby se nevydává.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEZIMOVO ÚSTÍ
PSČ 391 01

Otisk úředního razítka

[redacted] á
referent odboru stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy
[redacted] ba

Městský úřad Tábor
Odbor dopravy



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX014WKK5

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 39410/2016/ONov
METAB 56228/2016/OD/ONov

Tábor
9.12.2016

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice I

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů přezkoumal ve stavebním řízení podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 11.8.2016 podal

Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu: **Most ev.č. 1359-2 Ústrašice** (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 13/2, 128/1, 145/4, 286/1, 301, 302 v katastrálním území Ústrašice, obec Ústrašice.

Stavba řeší špatný stav mostu ev.č. 1359-2 v intravilánu obce Ústrašice na silnici III/1359 přes Maršovský potok. Jedná se o stavební úpravy spočívající v kompletním odstranění mostního příslušenství, včetně části poprsních zdí a opěrných zídek v prostoru mostu (za svahovými křídly). Stávající klenba a spodní stavba zůstane zachována. Dojde pouze k otryskání stávajícího torkretu, vyčištění kamenných spár a přespárování. Spodní stavba, a klenba budou navíc staženy helikální výztuží (včetně. křidel).

Nad stávající kamennou klenbou bude zřízena nová mostovková deska navržené jako spojitý nosník o 3 polích na rozpětí 6,3+9,0+6,3 m (celkové délka nosné konstrukce bude 23,4 m). S úložnými prahy (opěrami) výšky 700 mm budou propojeny vrubovými klouby (střední podpěry), resp. uloženy na vrstvu lepenky (krajní opěry). Úložné prahy (nové opěry) budou založeny na mikropilotách. Při jejich provádění dojde rovněž k provedení zainjektování stávajících opěr v patě klenby a prostoru za křídly. Dilatace bude probíhat na obou koncích mostu mezi přechodovou deskou s kotevním prahem a nosnou konstrukcí. Mostní závěr bude podpovrchový. V místě dilatační spáry bude provedeno naříznutí obrusné vrstvy vozovky, která bude vyplněna modifikovanou asfaltovou záhlvkou.

Celková šířka mostu bude 9,20 m. Na levé straně mostu (na straně ocelové lávky) bude provedena římsa š. 0,75 m s odrazným pruhem š. 0,50 m, na pravé straně je navržen chodník šířky 1,50 m. Šířka římsy na mostě vpravo bude 1,75 m. Šířka vozovky navazuje na stávající stav. Je celkové šířky 6,70 m, včetně uvažovaného rozšíření v oblouku 2x0,35 m. Most je tedy navržen na kategorii komunikace MO2k 8,0/7,0/50. Šířka stávající klenby je cca 5,87 m. Nová nosná konstrukce bude vykonzolovaná 1,055 m vlevo a 1,775 m vpravo. Vozovka na mostě bude provedena ve střechovitém příčném sklonu 2,50%. Před a za mostem bude provedeno plynulé napojení na stávající stav. Aby bylo na mostě zajištěno dostatečné odvodnění, bude navržen v minimálním podélném sklonu 0,50%.

Most převádí silnici III/1359 přes Maršovský potok v intravilánu obce Ústrašice.

Příčné uspořádání: Šířka vozovky na mostě navazuje na stávající stav. Je celkové šířky 6,70 m, vč. uvažovaného rozšíření v oblouku 2x0,35 m.

Šířka mezi zvýšenými obrubami na mostě bude 6,70 m. Volná šířka na mostě bude 8,70 m. Na obou stranách mostu je navrženo ocelové trubkové mostní zábradlí se svislou výplní v. 1,10 m.

Silnice je na mostě vedena ve střežovitém sklonu. Výškové napojení na stávající stav je provedeno dvojicí údolnicových zakružovacích oblouků s poloměrem oskulační kružnice $R=700$ m.

Výškové řešení: Začátek mostu ve stávajícím stavu je umístěn v údolnicovém oblouku. Silnice na mostě je v podélném směru prakticky vodorovná. Za mostem komunikace stoupá ve sklonu cca 1,5%. Celková délka úpravy je 40 m.

Stávající mostní otvor se nezmění. Průtokové poměry zůstanou zachovány.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení vyhotovenou Projektovou kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 z 03/2014 – autorizace [REDAKCE] ČKAIT 1003412. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
3. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytyčení stávajících podzemních sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna příslušná opatření zabráňující jejich poškození. O převzetí těchto podzemních sítí bude proveden zápis do stavebního deníku.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců technické infrastruktury pro provádění stavby:
 - Stanovisko ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 14.11.2016, č.j.: O16030004179: Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – [REDAKCE] (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). Při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Funkčnost povrchových prvků vodohospodářských sítí musí být plně zachována. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů na náklady stavby. V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.
 - Stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 21.9.2016, zn: POS 702980/16/CTA/S00/2016: Dle projektové dokumentace vyvolá realizace stavby provádění překládky vedení sítí elektronických komunikací (SEK). Souhlasíme s uložením vedení SEK do chráničky v levé římse mostu. Překládku vedení SEK bude provádět společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., na základě smlouvy uzavřené se stavebníkem. Při respektování výše uvedených podmínek, podmínek obsažených ve vyjádření o existenci SEK: č.j. 702980/16 a „Základních podmínek...“ souhlasíme s vydáním stavebního povolení a realizací stavby.
 - Vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 6.6.2016, zn: M18416-16121257: V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Požadujeme dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení. Ohlášení jakéhokoli poškození zařízení v provozování ECD na tel. [REDAKCE]

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
9. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu.
10. Na stavbě bude k dispozici projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem a bude veden stavební deník v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
11. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
12. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.
13. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby.
15. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Závazné stanovisko Ministerstva obrany č.j.: 34186/2016-8201-OÚZ-ČB ze dne 27.10.2016: V mostě se nachází stálé zařízení k ničení (SZN), které požadujeme v rámci rekonstrukce odstranit. Před zahájením odstranění SZN požaduji kontaktovat KVV České Budějovice ([redacted])

Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 10.10.2016, č.j.: METAB 48456/2016/OŽP/Kr: V průběhu prací nebude docházet k znečišťování vodního toku výkopovou zeminou, ostatními materiály ani jinými látkami závadnými vodám. Žádný z těchto materiálů nebude skladován v blízkosti vodního toku. Koryto vodního toku a pobřežní pozemky dotčené zemními pracemi budou po skončení prací ohumusovány a osety travním semenem. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku. Havarijní plán bude schválen samostatným vodoprávním rozhodnutím. Za škody způsobené průchodem zvýšených průtoků nezodpovídá správce toku ani vodoprávní úřad.

Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 13.3.2014, č.j.: METAB 12386/2014/OŽP/PŠpu: Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození pozemku určeného k plnění funkcí lesa parcela č. 145/1 v k.ú. Ústrašice a lesního porostu na něm rostoucího (např. odření kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypaní kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů). Případná poškození, způsobená na stojících stromech, budou neprodleně řádně ošetřena. Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených kmenů stojících stromů vhodným nátěrem tak, aby nemohlo dojít k následnému infikování patogenními organismy a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene. Na

pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná přebytečná výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad. Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemku určeného k plnění funkcí lesa a lesního porostu na něm rostoucího, únikem nebezpečných látek. Na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť. Stavba bude realizována podle předložené dokumentace a v rozsahu uvedeném v žádosti. Případné změny v projektu, které by se dotkly pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebo pozemků do 50 m od okraje lesa nad rámec uvedený v předložené projektové dokumentaci, budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.

Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 13.3.2014, č.j.: METAB 14260/2014/OŽP/Šo: Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace („Most ev. č. 1359-2 Ústrašice“, DSP+PDPS, zpracovatel dokumentace Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ 46974806, zodpovědný projektant [redacted], číslo zakázky 13122, datum 3/2014). Práce v korytě budou prováděny tak, aby nedocházelo ke splavování materiálu do dolní části toku. Výkopová zemina ani stavební materiál nebude ukládán v blízkosti koryta a v nivě toku. Osazení nových příčných prahů a dorovnání dna lomovým kamenem bude řešeno tak, aby plynule navazovalo na původní přirozené dno v navazujících úsecích a nedošlo ke vzniku příčných překážek. V rámci stavebních prací v korytě bude odstraněno nahromaděné splávi a zbytky nefunkční konstrukce na návodní straně mostu. V případě, že budou v místě stavby nalezeny zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů dle vyhl. č. 395/1992 Sb., budou veškeré práce přerušeny a bezodkladně bude o této skutečnosti informován Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Stavba si nevyžádá kácení, nebude zasahováno do břehových porostů. Během prací nesmí dojít k poškození okolních stromů a je třeba postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Povrch dotčených pozemků bude po ukončení stavebních prací uveden do původního stavu.

16. Stavba bude dokončena do: 31.12.2019.

III. Podmínky pro užívání stavby:

- A. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- B. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
- C. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby
- D. Speciální stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:
 - protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
 - dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (*na správním území obce, která vede technickou mapu obce, doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce*)
 - geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí (*tento plán se nepřipojí, pokud nedochází ke změně půdorysného ohraničení stavby*)
 - stanovení místní úpravy provozu
 - prohlášení zhotovitele
 - doklady k použitým výrobkům
 - certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
 - další potřebné doklady.

Toto stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění:

Navrhovatel dne 11.8.2016 podal žádost o stavební povolení na stavbu: Most ev.č. 1359-2 Ústrašice na pozemcích parc. č. 13/2, 128/1, 145/4, 286/1, 301, 302 v katastrálním území Ústrašice, obec Ústrašice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad výzvou a usnesením přerušil dne 18.8.2016 stavební řízení, protože žádost neobsahovala všechny předepsané náležitosti a podklady. Dne 27.10.2016 byly všechny náležitosti a podklady doplněny do spisu speciálního stavebního úřadu, a proto bylo v řízení pokračováno.

Územní rozhodnutí na stavbu se nevydává. Souhlas dle § 15 stavebního zákona byl vydán obecným stavebním úřadem Městského úřadu Sezimovo Ústí dne 28.8.2014 pod č.j. MESU – 1372/2014/OSÚ/MAR 2 souhl.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Zároveň upozornil, že nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námítky, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.

V řízení speciální stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 109 stavebního zákona a stanovil je tak, jak je uvedeno: vlastník stavby, na níž má být provedena změna; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo bude prováděním stavby přímo dotčeno; vlastníci a správci dotčené infrastruktury (ostatní nemohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech).

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Obec Ústrašice, Ústrašice 55, 390 02 Tábor 2
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých speciální stavební úřad při rozhodování vycházel:

- Souhlas dle § 15 Městského úřadu Sezimovo Ústí ze dne 28.8.2016, č.j.: MESU-1372/2014/OSÚ/MAR 2 souhl
Závazné stanovisko Ministerstva obrany č.j.: 34186/2016-8201-OÚZ-ČB ze dne 27.10.2016
- Stanovisko ČEPRO a.s., Dělnická 213, 170 04 Praha 7, sp.zn.: 4150/14 ze dne 17.1.2014
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ze dne 7.10.2016, č.j.: HSCB-5581-2/2016 UO-TA
- Stanovisko ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 14.11.2016, č.j.: O16030004179
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 10.10.2016, č.j.: METAB 48456/2016/OŽP/Kr

- Vyjádření Městského úřadu Tábor, Odbor rozvoje ze dne 12.10.2016, č.j.: METAB 43607/2016 OR/Bíl 4
- Stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 21.9.2016, zn: POS 702980/16/CTA/S00/2016
- Vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 6.6.2016, zn: M18416-16121257
- Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava ze dne 12.9.2016, zn: 48333/2016-142
- Vyjádření Správy chráněné krajinné oblasti Blanský les, Český Krumlov ze dne 10.3.2014, č.j.: 00315/BL/14
- Krajský úřad - Jihočeský kraj č.j.KUJCK 12351/2014/OZZL ze dne 18.3.2014
- Krajský úřad - Jihočeský kraj č.j.KUJCK 17465/2014/OZZL ze dne 18.3.2014
- Obec Ústředice – smlouva o výpůjčce ze dne 26.4.2016
- Lesy ČR smlouva o nájmu ze dne 16.9.2014
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 18.7.2016, č.j.: METAB 35299/2016/OŽP/SHa
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát ze dne 11.3.2016, č.j.: KRPC-453-124/ČJ-2014-020806
- Vyjádření Comett plus s.r.o. ze dne 7.4.2014
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, České Budějovice ze dne 21.2.2014, č.j.: KHSJC 03779/2014/HOK TA
- Předběžná informace Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 4.3.2014, č.j.: METAB 8739/2014/OŽP/Maš
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 13.3.2014, č.j.: METAB 12386/2014/OŽP/Šo
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 13.3.2014, č.j.: METAB 12386/2014/OŽP/PŠpu
- Stanovisko Obce Želeč ze dne 21.2.2014
- Stanovisko městyse Malšice ze dne 20.2.2014
- Stanovisko Obecního úřadu Lom ze dne 14.3.2014
- Stanovisko Obce Zhoř u Tábora ze dne 10.3.2014

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.

Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.

Speciální stavební úřad došel k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního souhlasu a se stavebním zákonem, zejména s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci rozhodnutí zašle speciální stavební úřad stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

„otisk úředního razítka“


vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000,- Kč byl zaplacen dne 12.8.2016.

Doručí se:

Stavebník: (datovou schránkou)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

zastoupení pro: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Ostatní účastníci: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, datovou schránkou)

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, IDDS: e8jcfns

Obec Ústrašice, IDDS: xeiawnr

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf


ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IDDS: 3ndg7rf

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73


Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury, IDDS: hjyaavk

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

**CETIN**ČESKÁ
TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA

Evidenční číslo: PŘ/701/2016

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

[Redacted Name]

[Redacted Address]

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení:

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

s vystavením souhlasí:

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.7.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 1.8.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Ing. Martin Vlček
předseda představenstva



Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/2107,2115/2016

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

před notářem uznali podpisy na listině se nacházející-----
za vlastní.-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

V Praze dne 13.9.2016-----

[REDACTED]

[REDACTED]
*notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radmou Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6*
