

SMLOUVA O DÍLO

č. S911/2017/345

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitelem
Krajského ředitelství Frýdek Místek

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Lukáš Hanslík

IČO: ...72999560 DIČ: CZ8006015446

místem podnikání: Liliová 28, Opava, 747 07

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Altán Potštát**, evidenční číslo zakázky **S911/2017/345** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném

ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **5. 11. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **4. 9. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **259.474,- Kč** bez DPH, slovy Dvěstěpadesátdevěttisícčtyřístasedmdesátčtyři korun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového

dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení položkového rozpočtu.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před

předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [Hanslík L.], telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímcce těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla;

výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, originál stavebního deníku, protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto

odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

- V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
- V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
- V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
- V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
- V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
- V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové

porušení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským

zákoníkem anebo touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,
že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od
této smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho
prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné
v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby

nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V dne:
dne:



Za zhotovitele

11.9.2017
V Frýdku - Místku,
Lesy České republiky, s.p. ^[09]



Ing. Mgr. Jan Sevcík
ředitel KŘ Frýdek-Místek

Za objednatele

Smlouva o dílo čS911/2017/345
strana č. PAGE 13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	POMP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
I	altán		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
př. 707	Altán Potštát		Náklady na m.j.	0
Projektant	WALDBAU s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	WALDBAU s.r.o.			
Objednatel	Lesy České republiky, s.p. LS Vítkov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	291 303	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	4 197	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
Z RN celkem	295 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
Z RN + HZS	295 500	Ostatní náklady neuvedené	0
Z RN + ost. náklady + HZS	295 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
			Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		295 500 Kč
DPH	21,0 %		62 055 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			357 555 Kč

Poznámka :

Stavba :	pr1707 Altán Potštát	Rozpočet :	
Objekt :	1 altán	POMP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	58 064	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	67 244	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	165 996	0	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 420	0	0	0
783 Nátěry	0	2 777	0	0	0
CELKEM OBJEKT	291 303	4 197	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

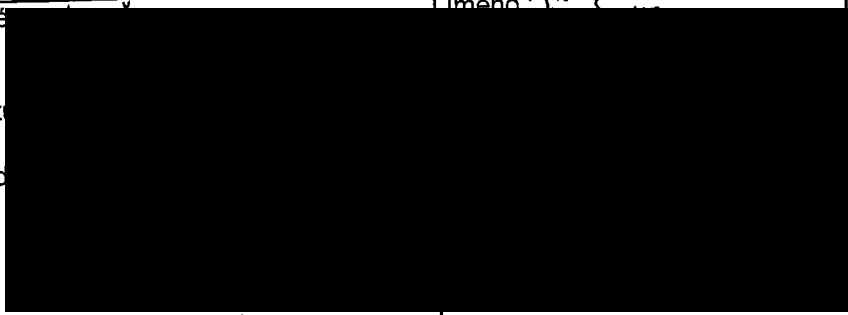
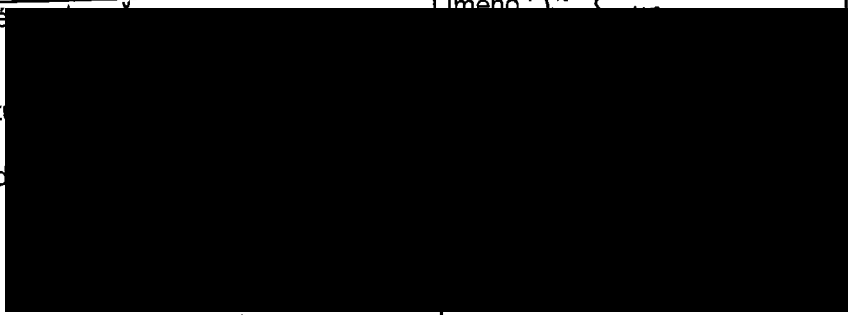
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	295 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	295 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	295 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	295 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	295 500	0
Provoz investora	0	0,0	295 500	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	295 500	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	295 500	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	pr1707 Altán Potštát	Rozpočet:
Objekt :	1 altán	POMP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00	578,00	2 312,00
2	132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,72	217,00	1 024,02
3	182001133R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1	m2	200,00	119,00	23 800,00
4	R17070002	Zhotvení krovu altánu včetně spojovacího materiálu	kpl.	1,00	10 570,00	10 570,00
5	05213020	Výřez pílařský SMJD 20-29 cm, jakost III.A	m3	4,10	2 945,00	12 074,50
6	60512122	Fošna MD neom. II,jak. tl.45 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,32	7 105,00	2 262,94
7	60512522	Prkno SMJDomlt.I-II,jak.tl.2,3 dl.200-390 š.17-24	m3	1,15	5 235,00	6 020,25
	Celkem za	1 Zemní práce				58 063,72
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
8	270210222R00	Zdivo zákl.z lom.kamene, rubové nezatř.spár, MC 15	m3	11,16	4 860,00	54 237,60
9	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. B 20	m3	4,72	2 495,00	11 773,91
10	31171317.A	Kotva pro chem.kotvení CH - M16x250/105GV	kus	22,00	56,00	1 232,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				67 243,51
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
11	434211111R00	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách	m	8,00	1 577,00	12 616,00
12	465511221R00	Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 výpl.drnem,20 cm	m2	75,00	882,00	66 150,00
13	R17070003	Smrkový šindel dvojité pokládka	m2	50,00	1 639,00	81 950,00
14	R17070001	Stojan na kola dle PD	ks	2,00	2 640,00	5 280,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				165 996,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
15	775591411U00	Podlahy dřevo nátěr olej + vosk včetně nákupu nátěrových hmot	m2	4,55	312,00	1 419,60
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				1 419,60
Díl:	783	Nátěry				
16	R783783312	Nátěr tesář kol dřevokaz prev ext včetně nákupu nátěrové hmoty	m3	5,25	529,00	2 777,25
	Celkem za	783 Nátěry				2 777,25

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	LANDBAU	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	altán		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
pr1707	Altán Potštát		Náklady na m.j. 0
Projektant	WALDBAU.s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	WALDBAU.s.r.o.		
Objednatel	Lesy České republiky,s.p. LS Vítkov		Zakázkové číslo
Dodavatel			Počet listů
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 276 096	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 3 903	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	279 998	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	279 998	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	279 998	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
			279 998 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		58 800 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			338 798 Kč

Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	LANDBAU	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	altán		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
pr1707	Altán Potštát		Náklady na m.j. 0
Projektant	WALDBAU.s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	WALDBAU.s.r.o.		
Objednatel	Lesy České republiky,s.p.-LS Vítkov		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	276 096	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 903	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	279 998	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	279 998	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	279 998	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jm		Jméno :
Da		Datum :
Po		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	279 998 Kč
DPH	21,0 %	58 800 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		338 798 Kč

Poznámka :

Stavba :	pr1707 Altán Potštát	Rozpočet :	
Objekt :	1 altán	LANDBAU	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54 046	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	62 583	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	159 467	0	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 320	0	0	0
783 Nátěry	0	2 583	0	0	0
CELKEM OBJEKT	276 096	3 903	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	279 998	0
Oborová přírážka	0	0,0	279 998	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	279 998	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	279 998	0
Zařízení staveniště	0	0,0	279 998	0
Provoz investora	0	0,0	279 998	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	279 998	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	279 998	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	pr1707 Altán Potštát	Rozpočet:
Objekt :	1 altán	LANDBAU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00	531,00	2 124,00
2	132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,72	202,00	953,24
3	182001133R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1	m2	200,00	111,00	22 200,00
4	R17070002	Zhotvení krovu altánu včetně spojovacího materiálu	kpl.	1,00	9 831,00	9 831,00
5	05213020	Výřez pilařský SM/JD 20-29 cm, jakost III.A	m3	4,10	2 739,00	11 229,90
6	60512122	Fošna MD neom. II.jak. tl.45 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,32	6 612,00	2 105,92
7	60512522	Prkno SM/JDomít.I-II.jak.tl.2,3 dl.200-390 š.17-24	m3	1,15	4 871,00	5 601,65
Celkem za 1 Zemní práce						54 045,71
Díl: 2						
		Základy a zvláštní zakládání				
8	270210222R00	Zdivo zákl.z lom.kamene, rubové nezatř.spár, MC 15	m3	11,16	4 523,00	50 476,68
9	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. B 20	m3	4,72	2 323,00	10 962,24
10	31171317.A	Kotva pro chem.kotvení CH - M16x250/105GV	kus	22,00	52,00	1 144,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						62 582,92
Díl: 4						
		Vodorovné konstrukce				
11	434211111R00	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách	m	8,00	1 469,00	11 752,00
12	465511221R00	Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 výpl.drnem,20 cm	m2	75,00	821,00	61 575,00
13	R17070003	Smrkový šindel dvojitá pokládká	m2	50,00	1 526,00	76 300,00
14	R17070001	Stojan na kola dle PD	ks	2,00	4 920,00	9 840,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						159 467,00
Díl: 775						
		Podlahy vlysové a parketové				
15	775591411U00	Podlahy dřevo nátěr olej+vosk včetně nákupu nátěrových hmot	m2	4,55	290,00	1 319,50
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové						1 319,50
Díl: 783						
		Nátěry				
16	R783783312	Nátěr tesař kčí dřevokaz prev ext včetně nákupu nátěrové hmoty	m3	5,25	492,00	2 583,00
Celkem za 783 Nátěry						2 583,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: Lukáš Hanslík		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: altán	JKSO:
Stavba: pr1707	Název stavby: Altán Potštát	SKP:
Projektant: WALDBAU s.r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. LS Vítkov	Náklady na MJ:	259 474,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	255 507,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	3 967,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	259 474,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady	259 474,00	Ostatní náklady celkem:		0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Lukáš Hanslík	Jméno:	Jméno:
		Datum:
		Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí:	259 474,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	54 490,00 Kč
Cena za objekt celkem:		313 964,00 Kč

Stavba: pr1707	Altán Potštát	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	altán	Datum tisku:	
Rozpočet:	Lukáš Hanslík		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	48 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5
2 Základy a zvláštní zakládání	59 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7
4 Vodorovné konstrukce	147 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9
775 Podlahy výsové a parketové	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	255 507,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	81,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	259 474,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	259 474,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	259 474,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	259 474,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	259 474,00	0,00
Provoz investora	0,00	259 474,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	259 474,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	259 474,00	0,00

0,00

Stavba: pr1707	Altán Potštát	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	altán	Datum tisku:	
Rozpočet:	Lukáš Hanslík		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

1 Zemní práce

1	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,0000	543,00	2 172,00	0,00005	0,00020
		<i>odstranění pařezů a uložení v rámci staveniště: 4</i>				<i>4,0000</i>		
2	132 10-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,7190	205,00	967,40	0,00000	0,00000
		<i>rýha pro základy zdíva obvodu altánu: 0,6*0,5*13,45</i>				<i>4,0350</i>		
		<i>základ pod středový stůl: 0,6*0,6*1,9</i>				<i>0,6840</i>		
3	182 00-1133.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1	m2	200,0000	95,00	19 000,00	0,00000	0,00000
		<i>20*10</i>				<i>200,0000</i>		
4	R17070002	Zhotvení krovu altánu včetně spojovacího materiálu	kpl.	1,0000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
5	052-13020	Výřez pilařský SM/JD 20-29 cm, jakost III.A	m3	4,1000	2 050,00	8 405,00	0,65000	2,66500
		<i>kulařina na stojky prům. mín. 0,35 m: 10*0,16</i>				<i>1,6000</i>		
		<i>řezivo na krov dle výkresu PD: 2,5</i>				<i>2,5000</i>		
6	605-12122	Fošna MD neom. II.jak. tl.45 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,3185	6 723,00	2 141,28	0,55000	0,17518
		<i>sedáky: 0,35*0,07*1*9</i>				<i>0,2210</i>		
		<i>stůl: 0,7*2*0,07</i>				<i>0,0980</i>		
7	605-12522	Prkno SM/JDomít.I-II.jak.tl.2,3 dl.200-390 š.17-24	m3	1,1500	4 950,00	5 692,50	0,55000	0,63250
		<i>prkna na zabezení krovu: 10*5*0,023</i>				<i>1,1500</i>		
1	Zemní práce					48 378,18		3,47288

2 Základy a zvláštní zakládání

8	270 21-0222.R00	Zdívka zákl.z lom.kamene, rubové nezatř.spár, MC 15	m3	11,1600	4 200,00	46 872,00	2,77536	30,97302
		<i>6*0,6*2,0+3*0,6*2,2</i>				<i>11,1600</i>		
9	274 31-1116.R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. B 20	m3	4,7190	2 360,00	11 136,84	2,47494	11,67924
		<i>základy zdíva obvodu altánu: 0,6*0,5*13,45</i>				<i>4,0350</i>		
		<i>základ pod středový stůl: 0,6*0,6*1,9</i>				<i>0,6840</i>		
10	311-71317.A	Kotva pro chem.kotvení CH - M16x250/105GV	kus	22,0000	53,17	1 169,74	0,00000	0,00000
		<i>sedáky: 2*9</i>				<i>18,0000</i>		
		<i>stůl: 4</i>				<i>4,0000</i>		
2	Základy a zvláštní zakládání					59 178,58		42,65226

4 Vodorovné konstrukce

Stavba: pr1707	Altán Potštát	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1	altán	Datum tisku:	
Rozpočet:	Lukáš Hanslík		

Prof. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
			11	434 21-1111.R00	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách	m	8,0000	1 150,00
12	465 51-1221.R00	Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 výpl.dmem,20 cm	m2	75,0000	750,00	56 250,00	0,40000	30,00000
	75					75,0000		
13	R17 07-0003.	Smrkový šindel dvojité pokládka	m2	50,0000	1 550,00	77 500,00	0,00000	0,00000
14	R17070001	Stojan na kola dle PD	ks	2,0000	2 500,00	5 000,00	0,00000	0,00000
	4	Vodorovné konstrukce				147 950,00		34,88864

775 Podlahy vlysové a parketové

15	775 59-1411.U00	Podlahy dřevo nátěr olej+vosk včetně nákupu nátěrových hmot	m2	4,5500	295,00	1 342,25	0,00048	0,00218
		<i>prvky na sezení - fošna tl. 70 mm: 0,35*1*9</i>				3,1500		
		<i>fošna stolu: 0,7*2</i>				1,4000		
	775	Podlahy vlysové a parketové				1 342,25		0,00218

783 Nátěry

16	R783783312	Nátěr tesař kci dřevokaz prev ext včetně nákupu nátěrové hmoty	m3	5,2500	500,00	2 625,00	0,00016	0,00084
	783	Nátěry				2 625,00		0,00084
