
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/VY/2025/058/ha**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Ing. Dagmar Krupičkovou, Team Leader, Překládka, smlouvy VFS dle pověření
(„CETIN“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem

Ing. Vladimírem Novotným, 2. náměstkem hejtmána

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

ID DS: ksab3eu

(„Stavebník“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích tuto

**Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(„Smlouva“)**

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN znamená cenový a technický návrh provedení Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Faktura znamená daňový doklad nebo zálohový daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Lukov u Moravských Budějovic; Lažínky; Moravské Budějovice spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „II/152 Moravské Budějovice - obchvat“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelety;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne **31. 1. 2024** vydané pod č.j. **4039/24**, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích.

- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II152 M.Budějovice - obchvat**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v CTN.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
- a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích, vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a Zákona o elektronických komunikacích nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno;
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5. Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
- a) před realizací Překládky:
 - (i) zajistit zpracování Projektu,
 - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;

- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:

- a) zajistit rozhodnutí o povolení záměru o umístění stavby Překládky, přičemž stavba Překládky bude v žádosti o vydání povolení označena jako stavební objekt „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- b) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
- c) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však sedm (7) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru předat společnosti CETIN toto rozhodnutí včetně grafické a dokladové části, a to zasláním na email kontaktní osobě ve věcech smluvních dle odst. 8.1. Smlouvy.

4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

- a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1. písm. a) Smlouvy;
- c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.

4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka. Společnost CETIN je oprávněna přerušit a/nebo vůbec nezačít realizaci Překládky v případě, kdy jí nebude uhrazena zálohová platba dle odst. 6.1. písm. b) Smlouvy, a to až do plného uhrazení této platby.

4.7. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **1.662.953,- Kč** (slovy: jeden milion šest set šedesát dva tisíc devět set padesát tři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (**„Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“**). Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
 - b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - f) náklady na identifikaci parcel,
 - g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, a které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,
 - i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5. Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu,

se změni písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3. a/nebo odst. 5.5. Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **167.985,- Kč** (slovy: jedno sto šedesát sedm tisíc devět set osmdesát pět korun českých) bude společností CETIN vystavena po předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
 - b) zálohovou platbou ve výši **800.000,- Kč** (slovy: osm set tisíc korun českých) („**Záloha**“); výzva k úhradě Zálohy bude společností CETIN vystavena poté, kdy bude společností CETIN doručena Kvalifikovaná výzva;
 - c) úhradou doplatku na základě Faktury na celkovou výši nákladů Překládky; Fakturu vystaví společnost CETIN po dokončení Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. Faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy; v případě, že výsledkem vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30) kalendářních dní od vystavení vyúčtování dle tohoto odstavce.
- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. Kromě povinných náležitostí bude na jednotlivých fakturách uveden přesný název akce kraje „II/152 Moravské Budějovice – obchvat“.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: faktury@kr-vysocina.cz. Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečně vzniklé škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Eva Hájková
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail: e.hajkova@cetin.cz, tel.: 723 974 149

ve věcech technických: Jiří Macek
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: j.macek@cetin.cz, tel.: 774 626 370

- 8.2. Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Novotný
funkce: 2. náměstek hejtmána
e-mail: posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111

ve věcech technických: Ing. Jiří Lojda
funkce: referent odd. investičního a správy komunikací, odboru dopravy a silničního hospodářství (ODSH)
e-mail: lojda.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 217, 724 650 197;
Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
funkce: vedoucí odd. investičního a správy komunikací, odboru dopravy a silničního hospodářství (ODSH)
e-mail: hartmanova.p@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 216, 724 650 221

- 8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Smlouvu lze zrušit:

- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
- (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:

- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
- b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

- 9.4. Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 20 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5. Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6. Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1. Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva.
- 10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.
- 10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona o registru smluv. Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonom o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonom o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.
- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonom o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního

systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
 - b) § 1767 odst. 2;
 - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
 - d) § 1743;
 - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převládá text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv a základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník

prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

- 12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.13. Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.
- 12.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

V Brně dne _____

Za CETIN:

V _____ dne _____

Za Stavebníka:

Ing. Dagmar Krupičková
Team Leader, Překládky, smlouvy VFS
CETIN a.s.

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmana
Kraj Vysočina

TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN

VPIC II152 M.Budějovice - obchvat

CTN řeší situaci vyvolanou stavbou **II/152 Moravské Budějovice - obchvat**.

Plánovaný obchvat kříží podzemní vedení SEK CETIN v km 0,74778 a km 0,75458 (SO 461), v km 1,00250 (SO 463), v km 2,46573 (SO 465).

SO 461

1. V km 0,75458 se nachází metalické kabely E35XN0,8 a DCKOY1RP1,3+26DM0,9.

Tyto kabely nebudou překládány, budou prohlášeny za neprovozované.

2. V km 0,74778 se nachází metalický kabel PPFLEZE 100XN0,8 a 4 HDPE40 trubky, z nichž 2 jsou obsazeny optickými kabely. Stavba podchodu pod silnici vyžaduje výškové přeložení těchto vedení, aby výsledné krytí bylo 1 m. Proti původní poloze se jedná o zahloubení až o 3,5 m. Odebrání terénu na pláň provede stavba silnice, v rámci překládky bude odkrytí stávajícího vedení a nový výkop hloubky 1 m.

Výkop bude proveden vedle odkryté stávající trasy, původní délka překládaného vedení je 48 m, nová 48,5 m.

Metalický kabel bude odkryt, na začátku překládky přerušen a přeložen do prohloubeného výkopu. V místě přerušení bude nastaven kabelovou vložkou.

HDPE trubky budou přeloženy společně s metalickým kabelem. Černá a bílá trubka jsou prázdné, na začátku překládky budou nastaveny HDPE trubkami a spojkami Plasson. Oranžová a oranžová s bílým pruhem jsou obsazeny optickými kabely, budou nastaveny půlenými opravnými trubkami.

Oranžová trubka je obsazena kabelem 650 042 05. Bude odkryta spojka OS06 u které je rezerva 16 m, z ní bude potřebná délka pofouknuta do místa nastavení trubky.

Oranžová s bílým pruhem je obsazena kabelem 650 011 002. Bude odkryta spojka OS13 u které je rezerva 23 m, z ní bude potřebná délka pofouknuta do místa nastavení trubky.

V překládaném úseku budou metalický kabel a HDPE trubky uloženy do půlených plastových chrániček. Bude k nim přiložena rezervní vrapovaná trubka 110.

Dále v místě křížení nadsvahového příkopu bude vedení odkryto a uloženo do požadované hloubky, v místě křížení územní rezervy (SO 106) bude vedení odkryto a uloženo do chrániček.

SO 463

V km 1,00250 kříží plánovanou silnici trubka HDPE40 obsazená optickým kabelem 48 vl. (dříve ITSELF)

Trubka bude odkryta a vedle ní bude proveden výkop pro uložení trubky do požadované hloubky. Proti původní poloze se jedná o zahloubení až o 5,8 m. Odebrání terénu na pláň provede stavba silnice, v rámci překládky bude odkrytí stávající trubky a nový výkop hloubky 1 m.

Původní délka překládaného vedení je 29,7 m, nová 32 m. HDPE trubka bude nastaveno půlenou opravnou trubkou, kabel bude pofouknut z rezervy u optické spojky.

Do výkopu bude přiložena nová HDPE40 trubka v délce 32 m jako rezerva a vytyčovací vodič.

SO 465


V místě napojení plánované silnice na stávající směrem na Jaroměřice je v kolizi s plánovanou stavbou trubka HDPE40 obsazená optickým kabelem 48 vl. (dříve ITSELF).


V trase podél nové silnice budou položeny dvě HDPE40 trubky a vytyčovací vodič v délce 635 m. Do jedné trubky bude zafouknut nový optický kabel 48 vl., druhá zůstane rezervní. Stávající optický kabel bude přerušen, sfouknut a na koncích překládaného úseku navařen na nový.

Úpravu terénu na pláň provede stavba silnice, v rámci překládky bude odkrytí stávající trubky a nový výkop hloubky do 1,5 m.

Na akci bude zpracován realizační stupeň PD.

VBř bude pouze SO 465. Počet smluv bude znám až po zákresu do aktuální katastrální mapy. V dodaných podkladech není katastrální mapa aktuální. V rozpočtu je použit odhad 5 smluv.

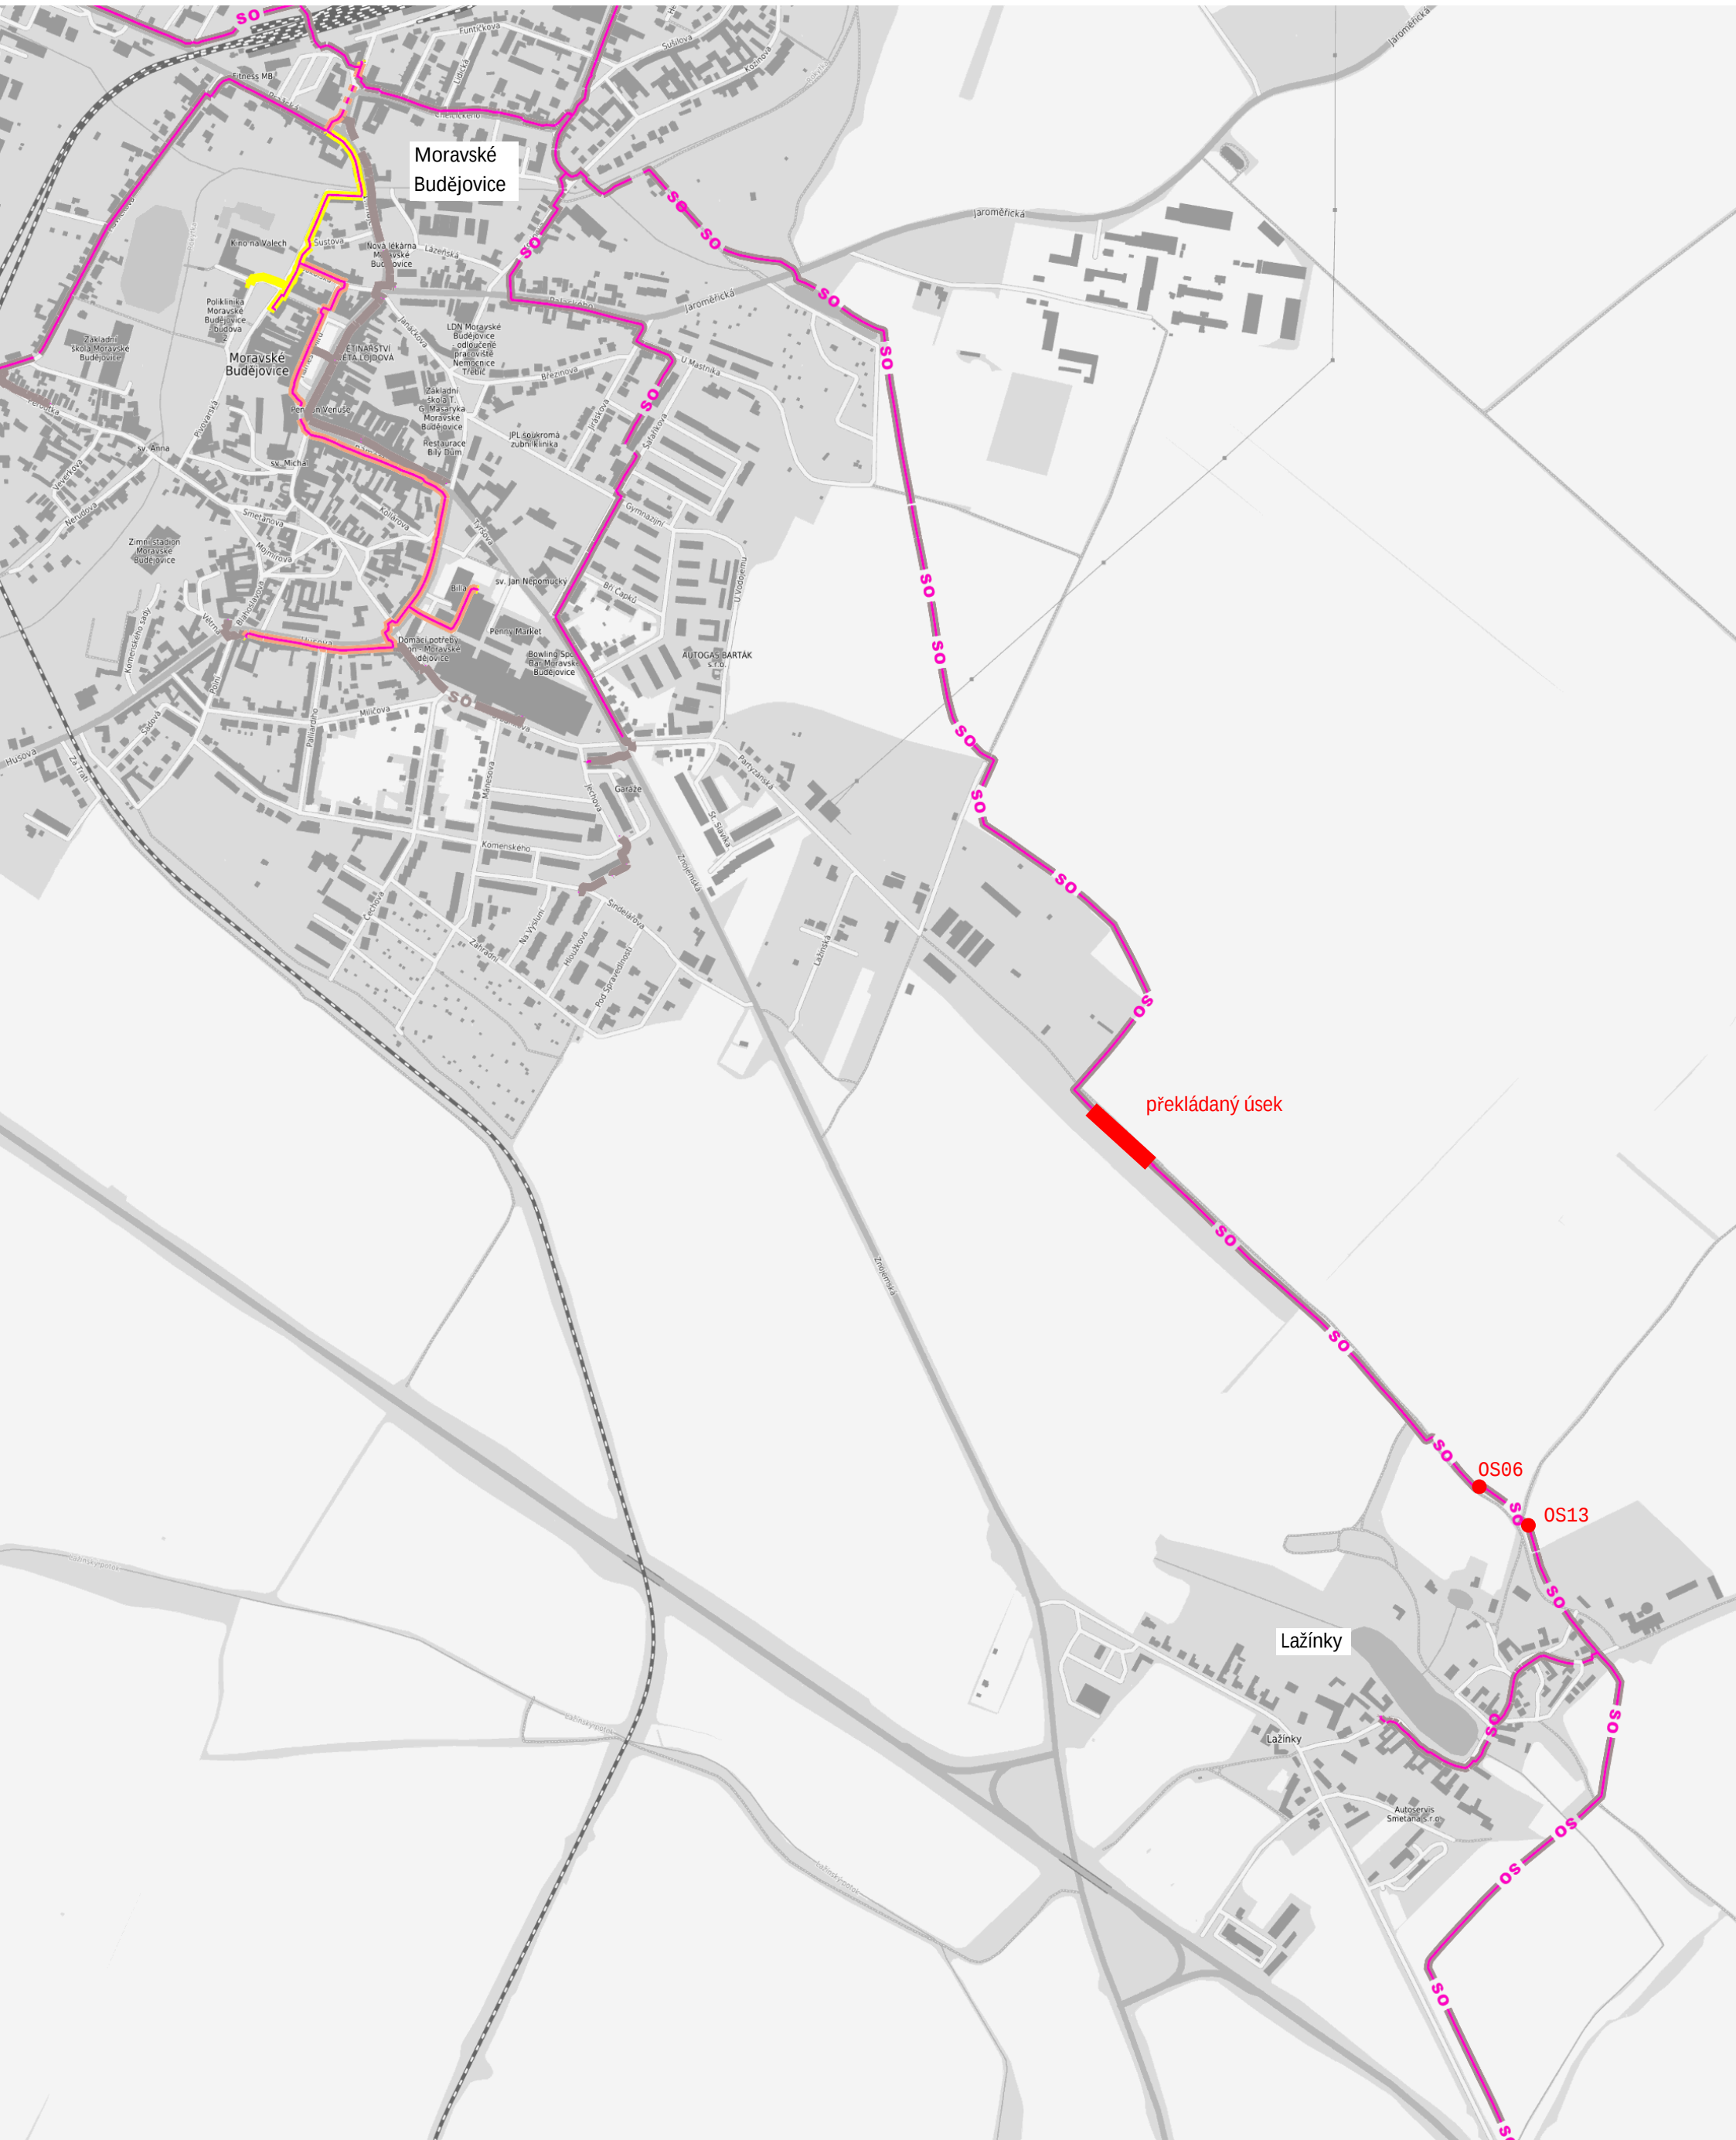

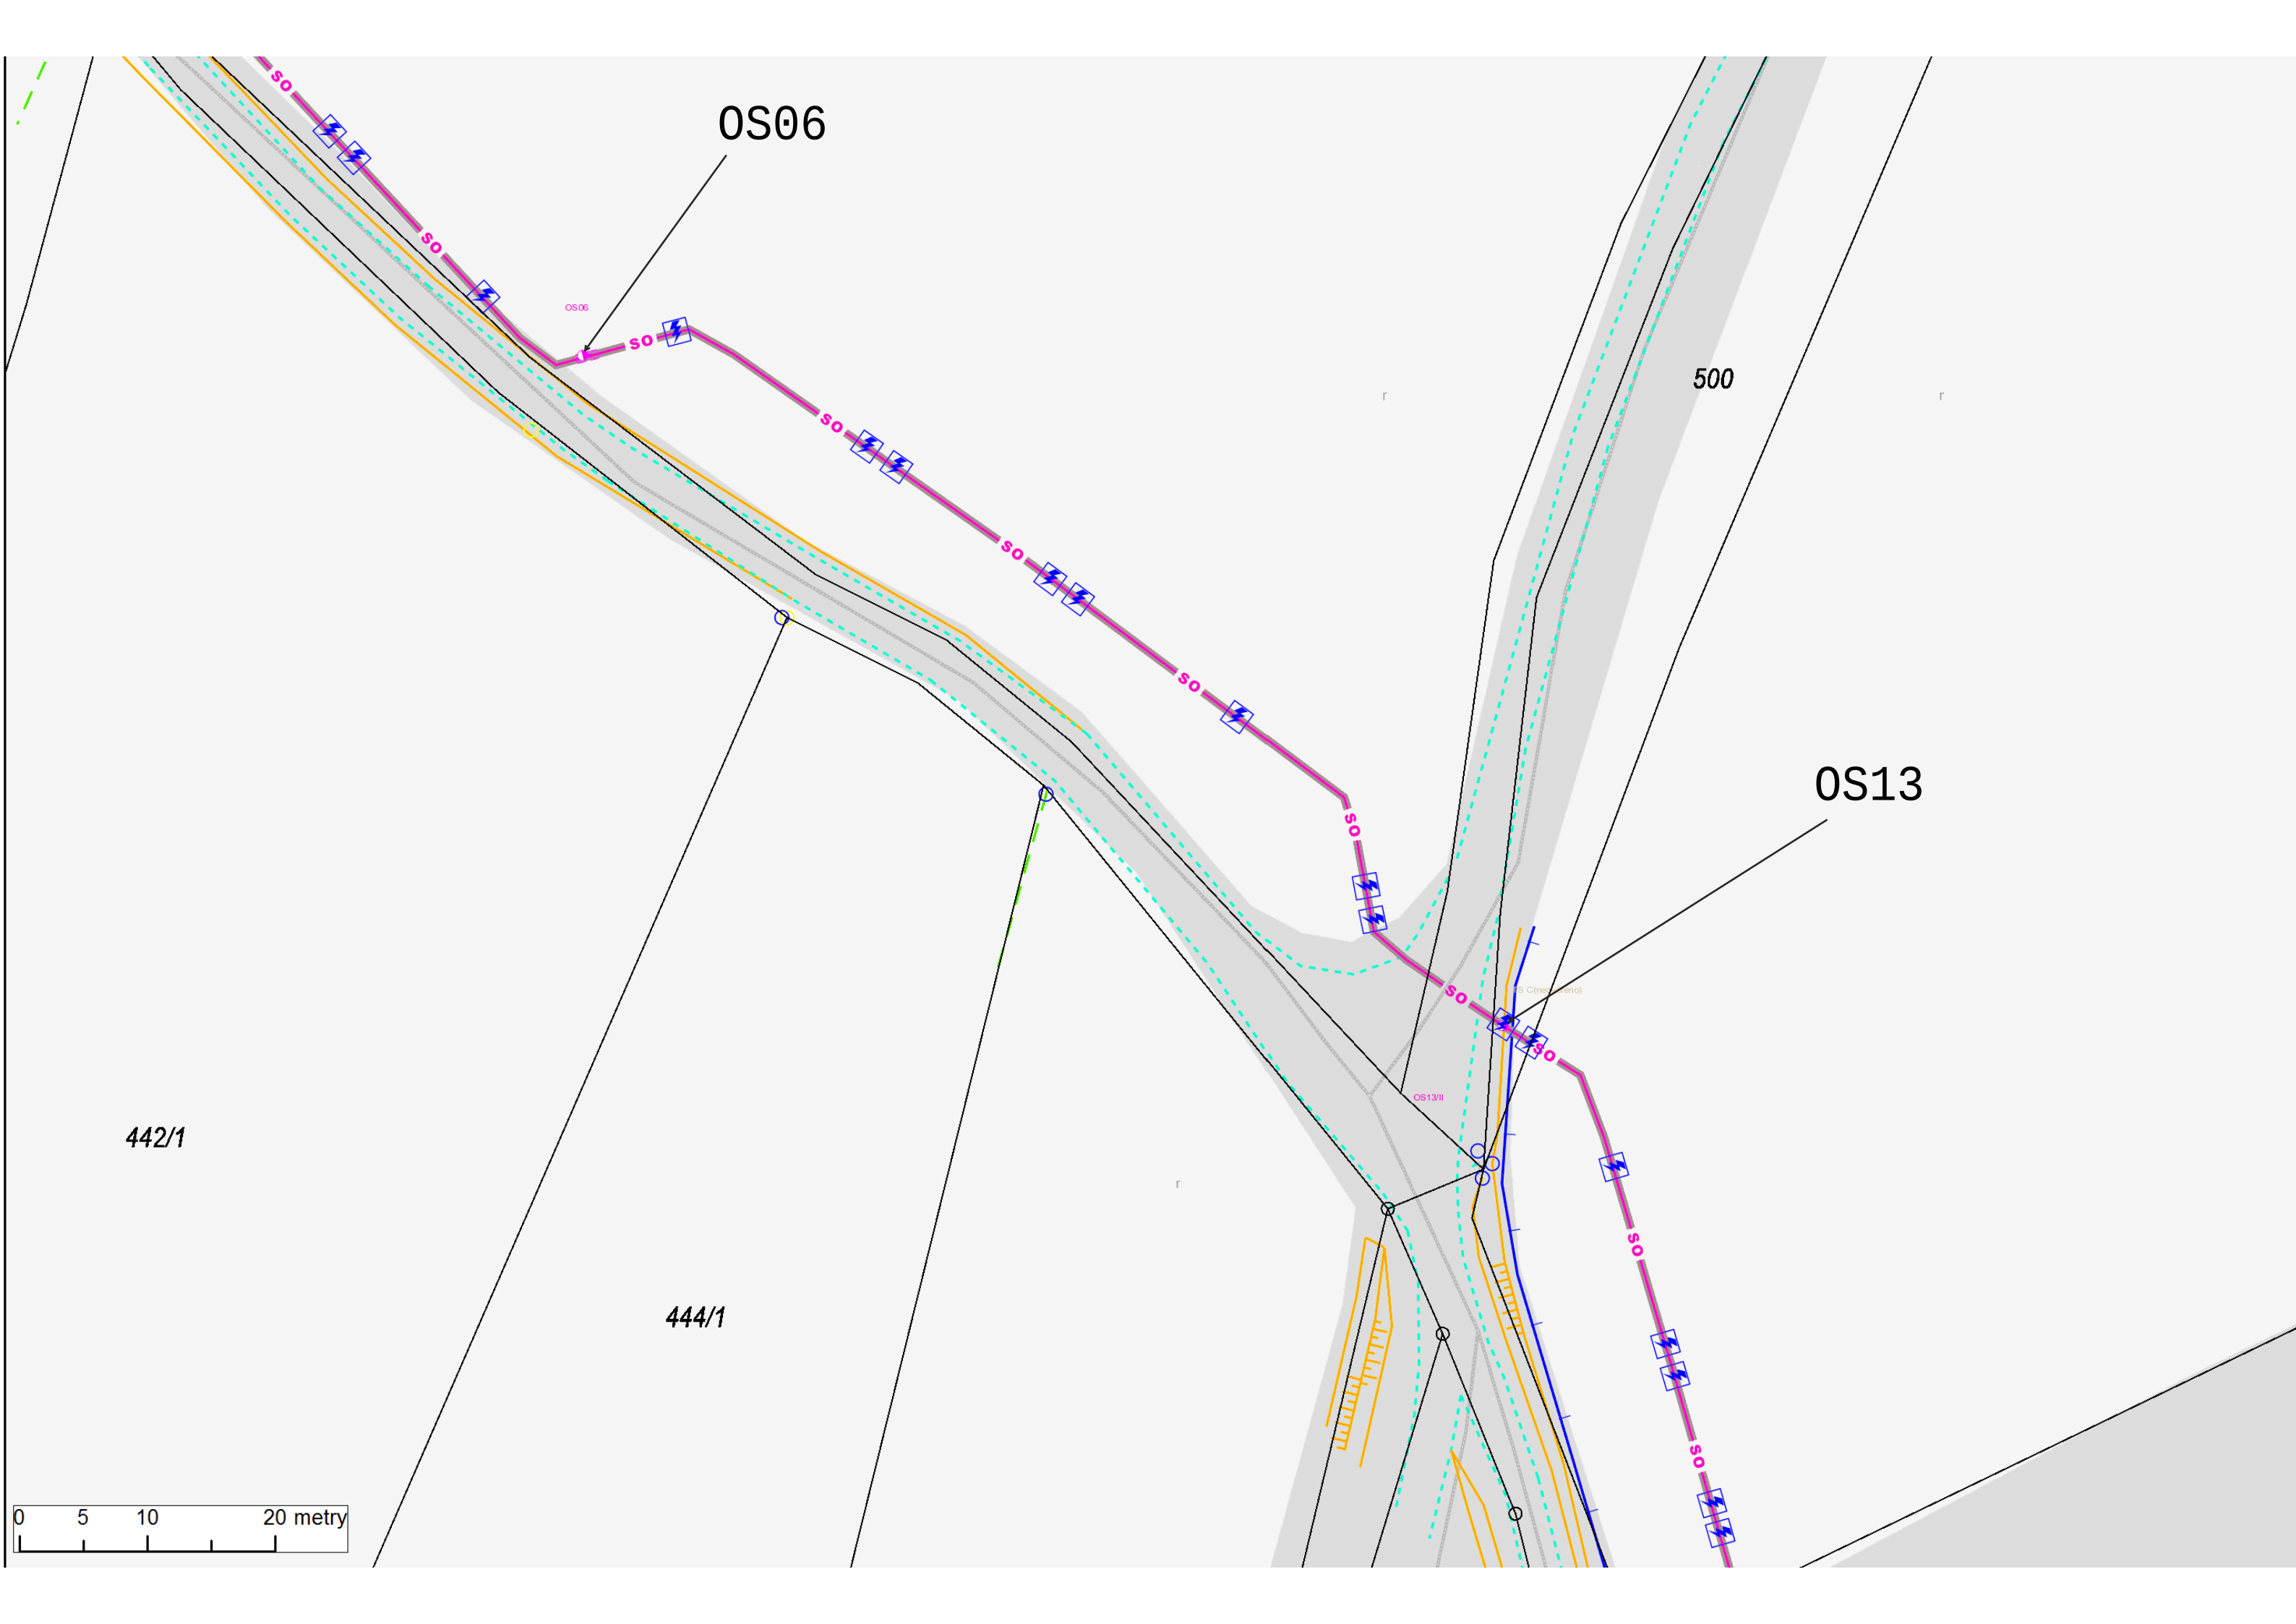

OS06


500

OS13

442/1

444/1



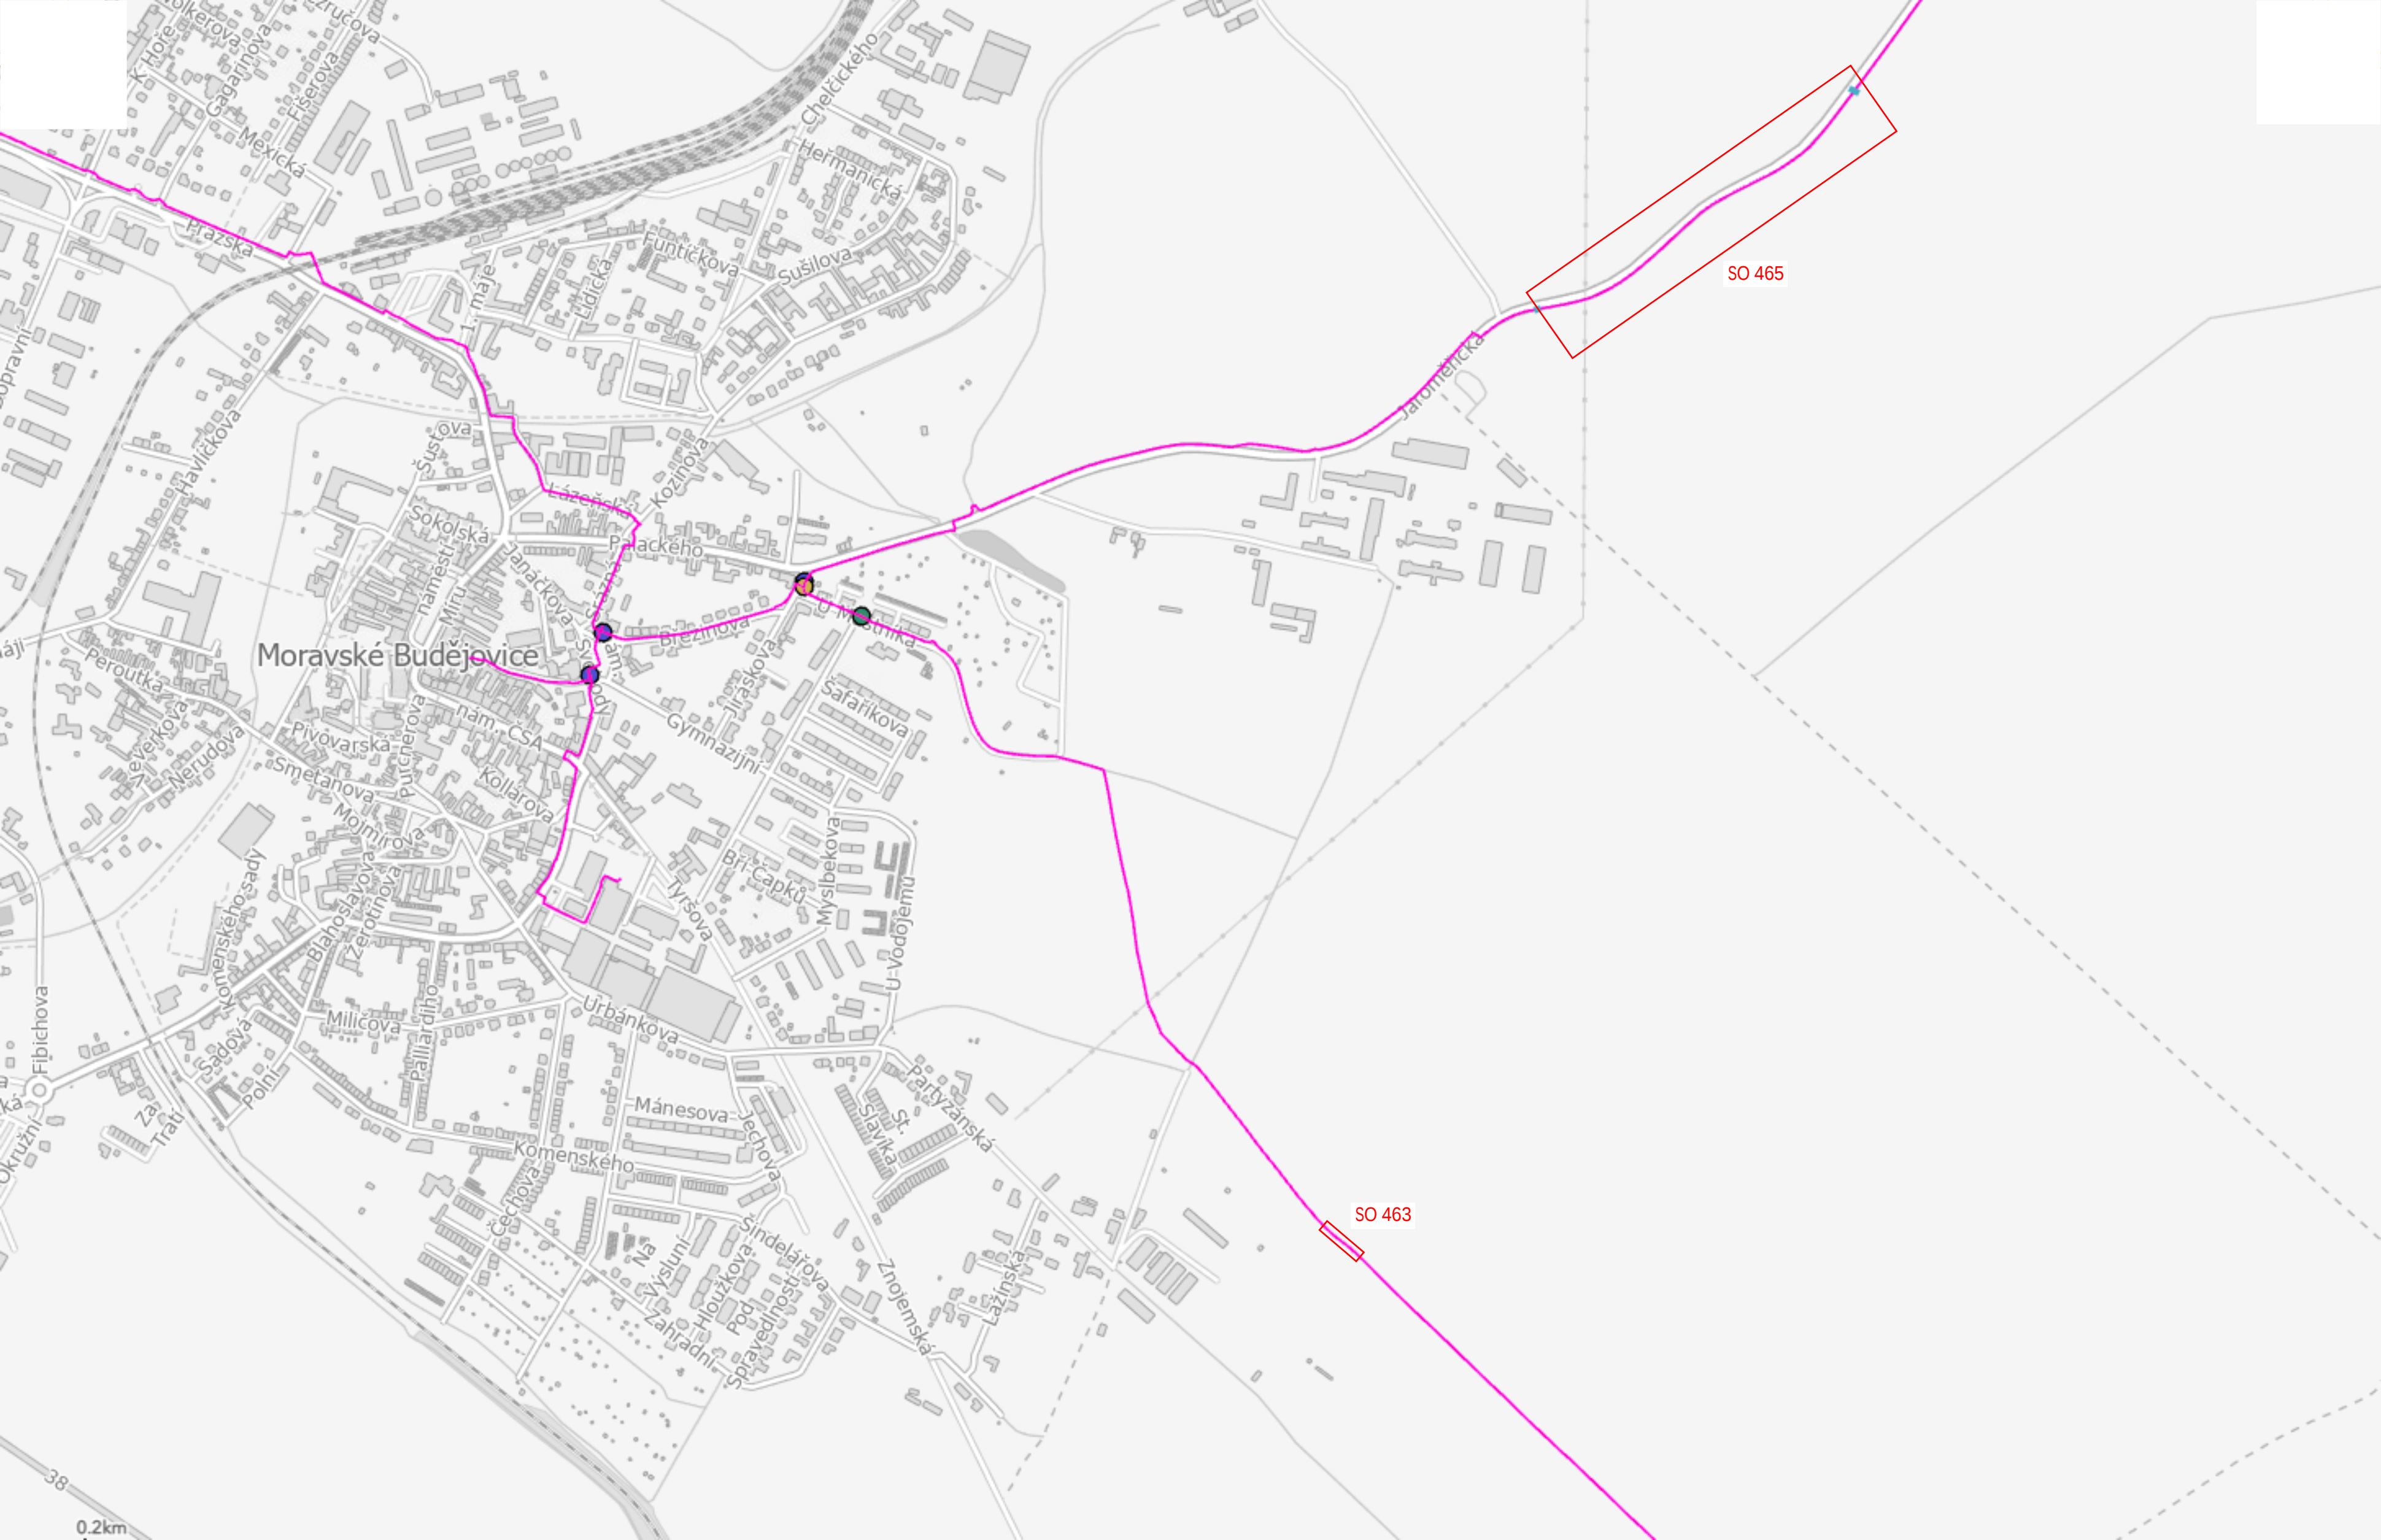

Moravské Budějovice

SO 465

SO 463

0.2km

Příčný řez: M 1:100

původní poloha (výška dle ČSN)

výškové přeložení kabelu

ULOŽENÍ DO CHRÁNIČKY PVC

29.71

29.68

14.42

4.37

1:2.50

1:1.75

150°

8.90

6.58

7.58

12.00

2.50%

8.0%

7.46

7.52

0.75

3.25

3.25

0.75

5.28

1.50

1.0

457.60

451.00

Situace: M 1:500

NAVRŽENÉ:

- | | |
|---|---------------------------|
|  | navržená komunikace |
|  | nezpevněná krajnice |
|  | Kamenná dlažba |
|  | Odláždění lomovým kamenem |
|  | Sadová výsadba |
|  | Svahy náspů a zářezů |
|  | Objekty ke zrušení |
|  | Kácené dřeviny |
|  | Příčný sklon |
|  | SO 301 - Úprava meliorací |
|  | Hranice trvalého záboru |
|  | Hranice dočasného záboru |

SO 464 - Přeložka sdělovacích kabelů T-mobile v km 1,002 50

PŮVODNÍ POLOHA KABELU --- ~ --- ~ ---
 NAVRHOVANÁ TRASA KABELU --- ~ --- ~ ---

AUTORDSPACE		ČÍSLO PARE	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS


název akce
462; 463; 464 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ
stavební objekt

Kraj Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČO: 708 90 749	• • •	
objednatel	spolupráce	DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik-hk.cz, http : www.dik-hk.cz
k.ú. Moravské Budějovice, Lažánky, Lukov u M. B. místo stavby	Vysočina kraj	

SITUACE: Přeložka sdělovacích kabelů Optocon, Itself, T-mobile- km 1,002 50 výkres	1:1000 měřítko	DUR stupeň
--	-------------------	---------------

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. R. FIŠER hlavní inženýr projektu		A003/18 číslo zakázky	D.4.3.
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant		vedoucí projektant		06/2018 datum	

Situace: M 1:1000

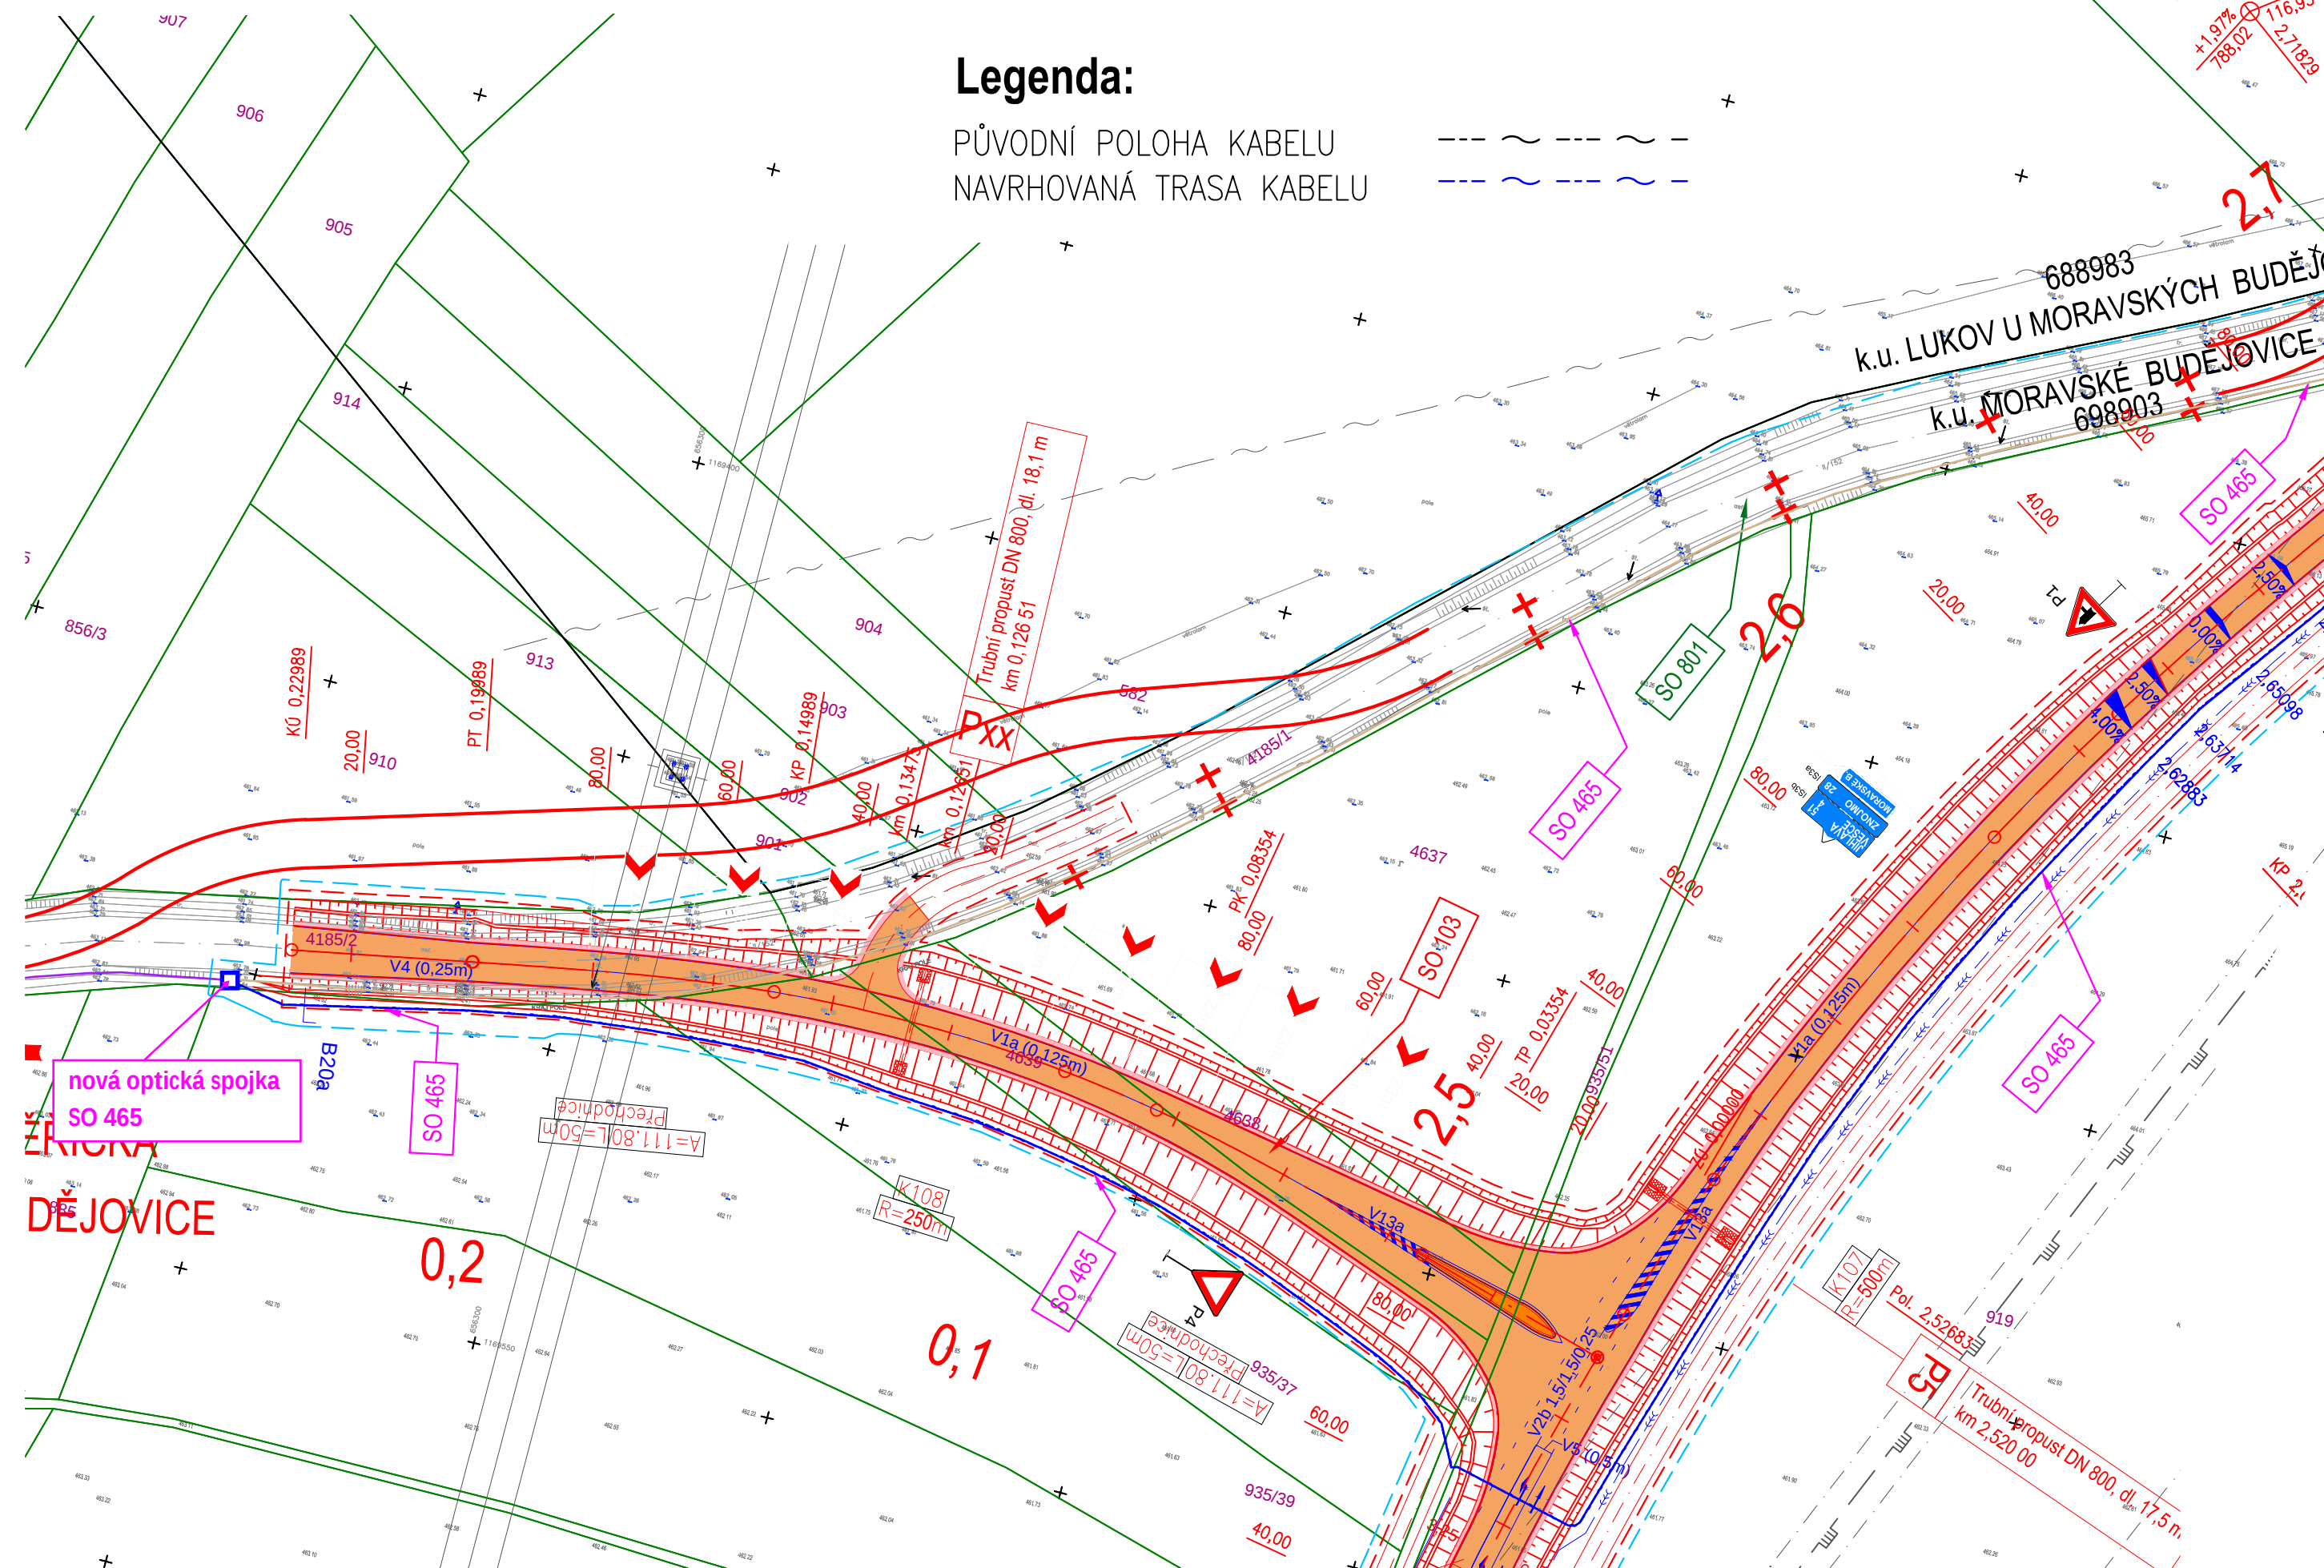

PR: 123
km 2,440 00

0,75 4,29 4,75 0,75

2,35 2,37 4,00% 4,00% 2,06 1,99 8,0% 8,0%

1:2,50 -1:2,50 -1:2,50 1:2,50 1:77

2,53 1,00 2,13 m 1,00

výškové přeložení kabelu
výškové uložení kabelu

ULOŽENÍ DO CHRÁNIČKY PVC


19,46

Legenda:

PŮVODNÍ POLOHA KABELU
NAVRHOVANÁ TRASA KABELU

LEGENDA

NAVRŽENÉ:

- | | |
|---|---------------------------|
|  | navržená komunikace |
|  | nezpevněná krajnice |
|  | Kamenná dlažba |
|  | Odláždění lomovým kamenem |
|  | Sadová výsadba |
|  | Svahy náspů a zářezů |
|  | Objekty ke zrušení |
|  | Kácené dřeviny |
|  | Příčný sklon |
|  | SO 301 - Úprava meliorací |
|  | Hranice trvalého záboru |
|  | Hranice dočasného záboru |

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/152 Moravské Budějovice - obchvat

název akce

465 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ

stavební objekt

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 708 90 749



objednatel


k.ú. Moravské Budějovice, Lažínky, Lukov u M. B.
místo stavby

spolupráce

Vysočina
kraj

DIK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
 Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
 tel: 495 219 036, 495 212 647, fax: 495 221 677
 e-mail: dik@dik-hk.cz, <http://www.dik-hk.cz>

SITUACE: Přeložka sdělovacích kabelů Itself v km 2,465 73			DUR stupeň
výkres		měřítka	
ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. R. FIŠER hlavní inženýr projektu	
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant		vedoucí projektant	
		A003/18 číslo zakázky	
		06/2018 datum	
			D.4.4. číslo přílohy

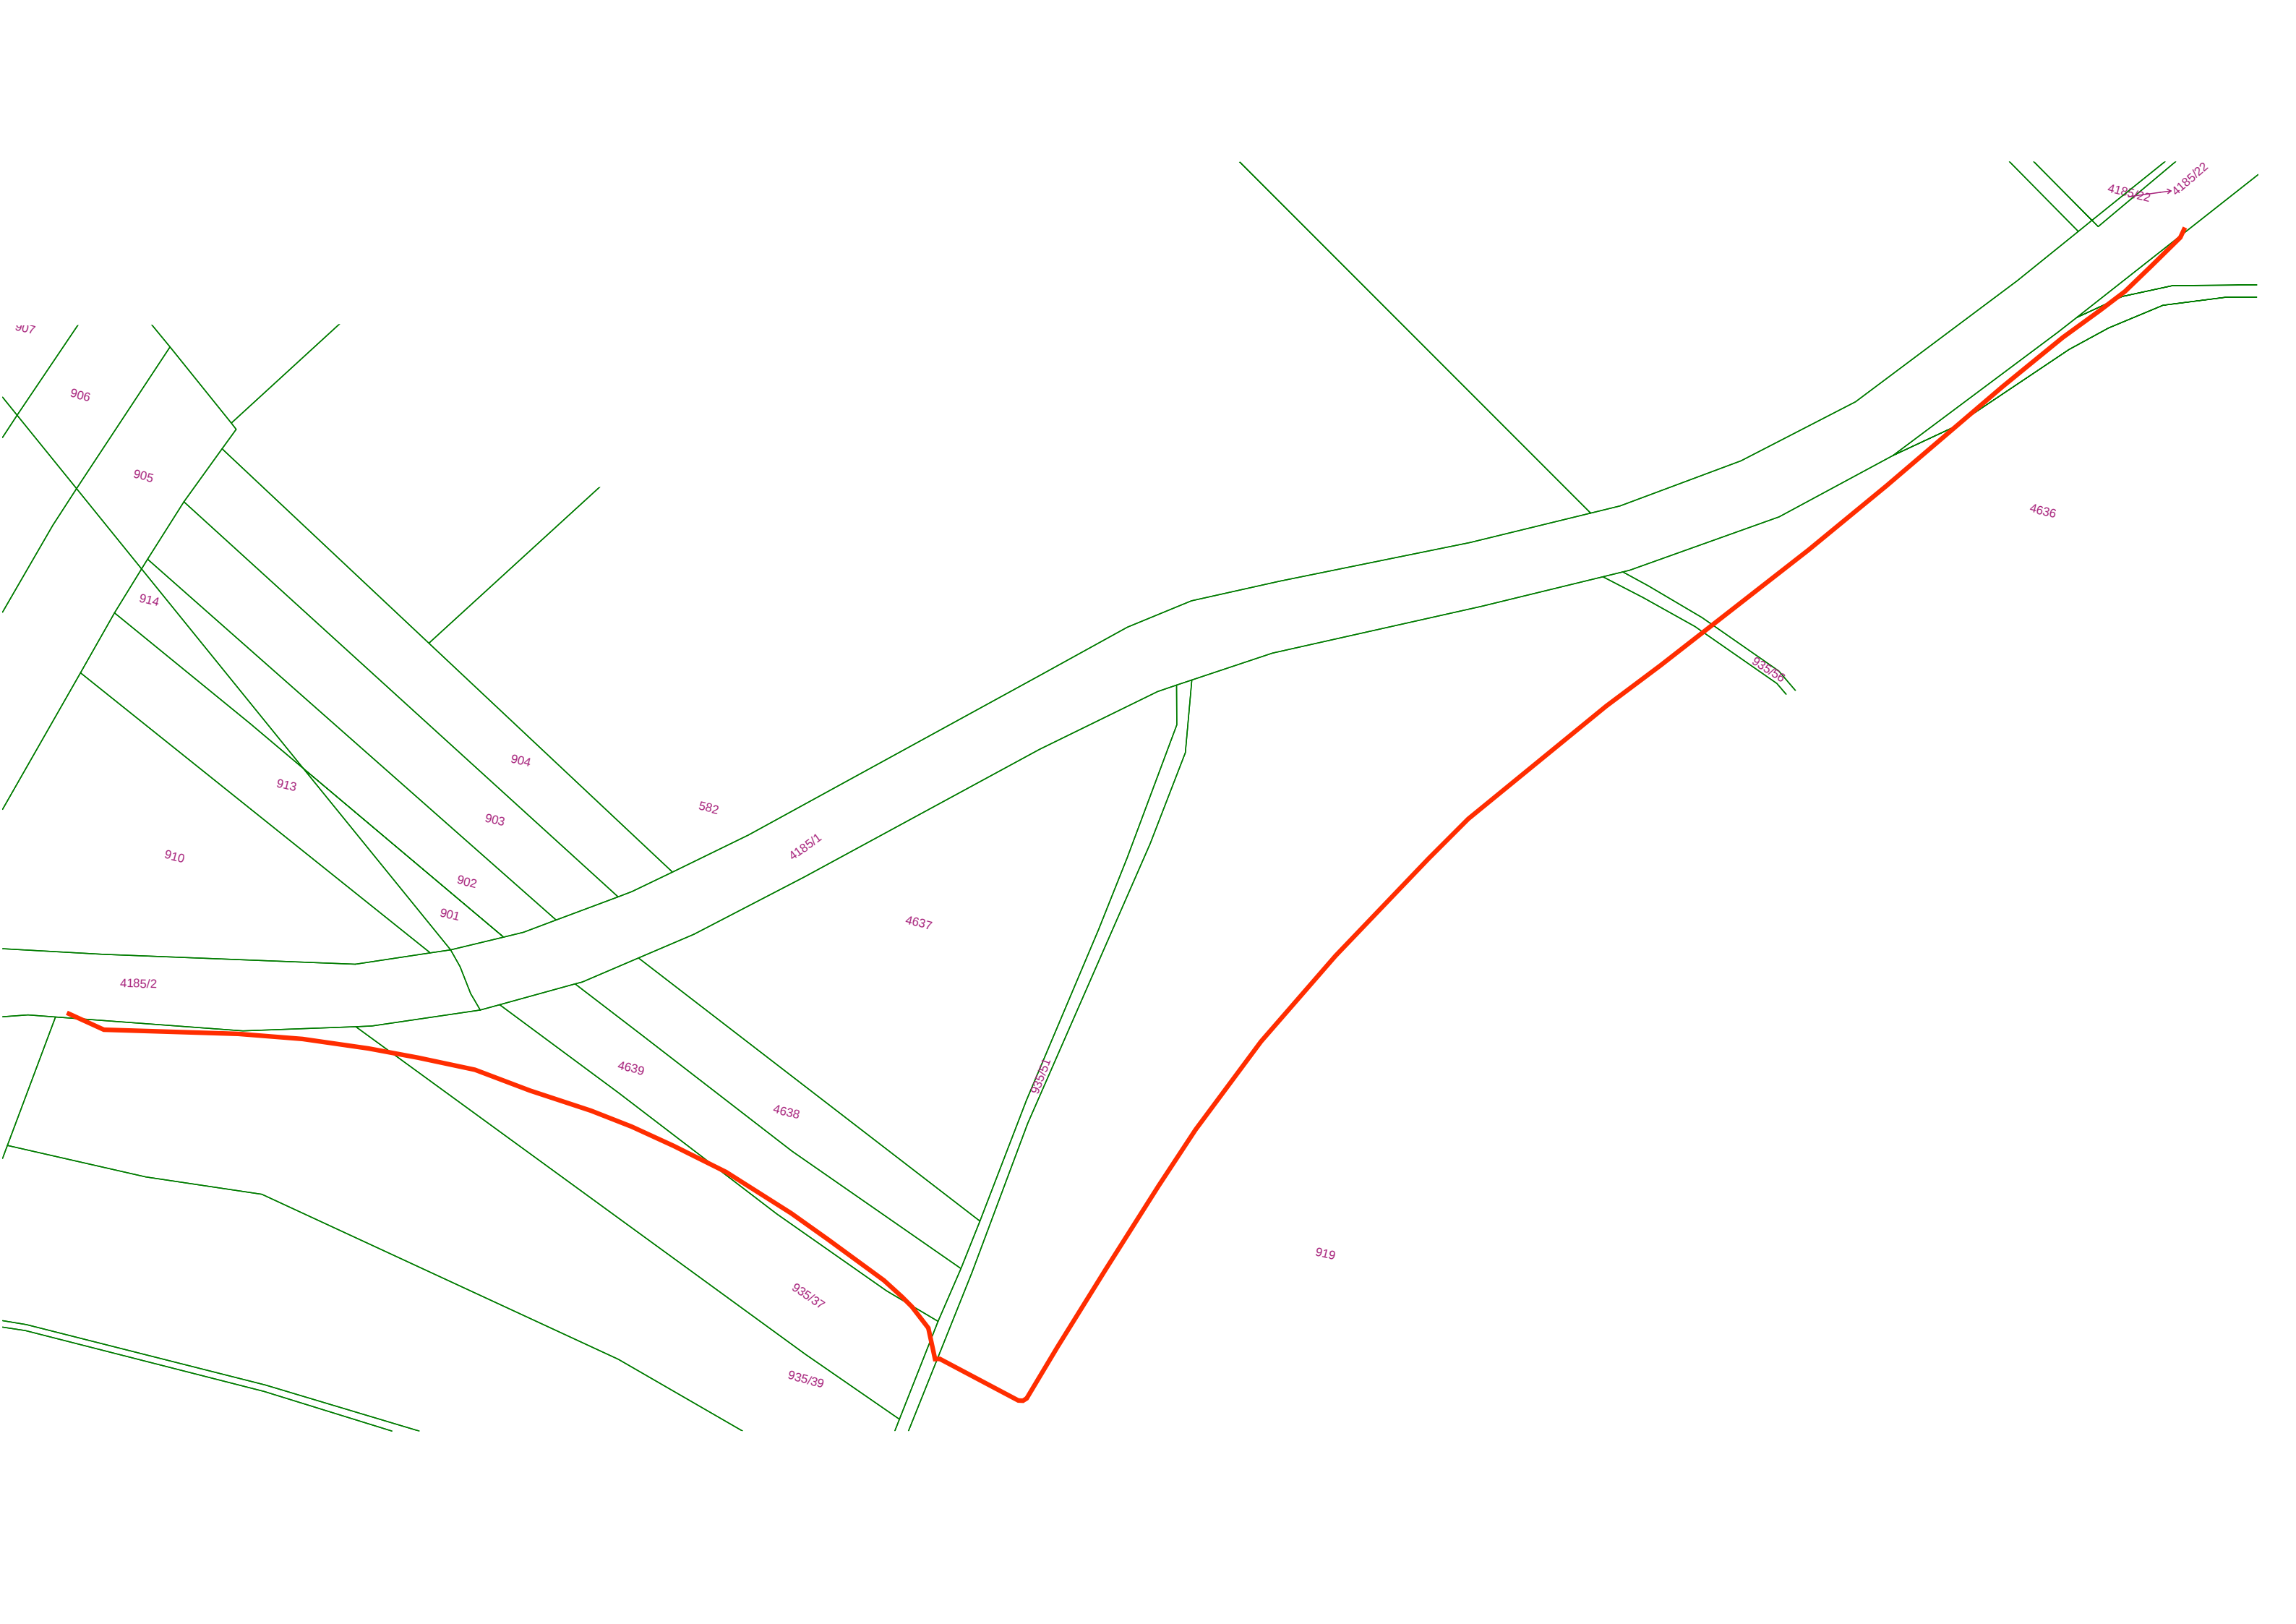

PPD - Propočet projektové dokumentace
▣ VP TEMO 2021 - STAND. ▣ 2025.10

Název stavby: VPIC II152 M.Budějovice - obchvat	
Rekapitulace nákladů:	
PŘÍPRAVA	147 798,82 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	614 952,37 Kč
MONTÁŽ	502 698,02 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	22 273,06 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	22 273,06 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	20 186,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	83 693,21 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	1 233,52 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	39 956,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	207 888,95 Kč
Celkové náklady:	
1 662 953,36 Kč	

Seznam položek		Název položky	Množství	Celková cena
Číslo SAP	Stavební činnost			
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	12 637,81 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		40232.07 JV	40 232,07 Kč
	Zóna 1, 750 m			
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě		94928.94 JV	94 928,94 Kč
	3950 m			
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		75.00 m	1 843,50 Kč
952368	Pokládka žlabů TK2,T2N		75.00 m	9 374,25 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm		105.00 m	7 575,75 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70		41.00 m	29 326,48 Kč
958755	Rýha v chodníku 50/130		81.00 m	143 301,15 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		39.00 m	7 980,57 Kč
952353	Rýha v poli 50/110		675.00 m	375 549,75 Kč
958751	Rýha v poli 50/130		50.00 m	39 408,00 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		36.00 m	592,92 Kč
MONTÁŽ				
955038	Demontáž ochranného boxu pro spojku		4.00 ks	3 200,84 Kč
955010	Demontáž úložné trubky		630.00 m	8 750,70 Kč
955032	Demontáž úložných kabelů nad 300 XN		75.00 m	4 443,00 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)		48.00 ks	23 007,36 Kč
	stavba			
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)		48.00 ks	5 315,52 Kč
	stavba			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		1.00 ks	208,32 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		99.00 ks	4 757,94 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním		200.00 ks	8 014,00 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent		4.00 ks	188,80 Kč
955002	Montáž nadložního lana ve výkopu		640.00 m	10 227,20 Kč
955003	Montáž ochranného boxu pro spojku		6.00 ks	5 453,10 Kč
955269	Montáž podzemní tratě síťové optické		98400.00 JV	98 400,00 Kč
955286	Montáž spojky bez montáže vláken		2.00 ks	2 942,48 Kč
955280	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.		2.00 ks	6 077,66 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb		8.00 ks	503,44 Kč
952602	Montáž trubky úložné		1940.00 m	46 734,60 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN		79.00 m	3 864,68 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window		1.00 ks	32 209,64 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti		1.00 ks	18 037,42 Kč
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transportní		96.00 ks	47 618,88 Kč
	a metropolitní síti			
958469	Uvedení stavby do provozu		4814.22 JV	4 814,22 Kč
958336	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky		4700.00 m	155 993,00 Kč
958558	Zkouška trhací		1.00 ks	2 213,80 Kč
958555	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m		2.00 ks	2 863,58 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km		2.00 ks	6 857,84 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km		650.00 m	15 099,50 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka		1.00 ks	7 173,56 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956283	Doměření trasy nad 100 m do 1km		650.00 m	15 099,50 Kč
956282	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka		1.00 ks	7 173,56 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ		5.00 ks	20 186,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958749	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)		7.00 ks	21 425,81 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene		30000.00 JV	30 000,00 Kč
	náhrady odhad			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ		5.00 ks	13 340,80 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN		5.00 ks	18 926,60 Kč
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob			
	jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení			
	služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
PROVOZNÍ PRÁCE				
958465	Montáž děleného zámku		8.00 ks	651,92 Kč
958464	Montáž trubky opravné		4.00 ks	581,60 Kč

Limitka materiálu		Název položky	Množství	Celková cena
Číslo SAP	Stavební činnost			
MATERIÁL DOD. CETIN				
323705	KABEL OPT MIDIA SAFE,48VL.AWF,LS0H,10MM		700.00 m	39 956,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE				
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm		41.00 ks	1 796,21 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		725.00 m	2 987,00 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		766.00 m	3 607,86 Kč
300157	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 100x4x0,8		4.00 m	4 671,08 Kč
318863	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		4.00 ks	2 051,48 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson		4.00 ks	451,28 Kč
321714	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450		2.00 ks	23 825,38 Kč
302532	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		2.00 ks	584,04 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball		2.00 ks	522,98 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P		40.00 ks	1 059,60 Kč
323050	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm		96.00 ks	509,76 Kč
303251	Průchodka těsnicí D 40mm Jackmoon		4.00 ks	421,40 Kč
306732	Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line		2.00 ks	10 076,20 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		8.00 ks	1 040,56 Kč
322267	Spojka XAGA 500-125/30-460/EZE		2.00 ks	17 855,12 Kč
319184	Spona trubkySYSPRO		450.00 ks	16 128,00 Kč
319210	Trubka dělená SYSPRO 200/160		75.00 m	63 312,75 Kč
302557	Trubka HDPE 40/2000mm opravná		4.00 ks	3 265,20 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy		670.00 m	19 657,80 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		640.00 m	18 777,60 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		75.00 m	4 071,75 Kč
303643	Zámek trubky HDPE D 40mm		10.00 ks	11 215,90 Kč
