

Číslo smlouvy CETIN: VPI/VY/2025/062/ha
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP: 8030006386
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/VY/2025/062/ha**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy CETIN: VPI/VY/2025/062/ha
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP: 8030006386
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená [REDACTED] Team Leader, Překládky, smlouvy VFS dle pověření
(„CETIN“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ 70890749

ID DS: ksab3eu

zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem

zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána

(„Stavebník“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích tuto

**Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(„Smlouva“)**

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN znamená cenový a technický návrh provedení Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Nová Cerekev spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „Transformace domova Černovice Lidmaň XIV. Nová Cerekev“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelety;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne **9. 10. 2025** vydané pod č.j. **280616/25**, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích.

- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC N.Cerekev PE - Transfor. Domova**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v CTN.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
- a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích, vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a Zákona o elektronických komunikacích nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5. Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
- a) před realizací Překládky:
 - (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;

- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:

- a) zajistit rozhodnutí o povolení záměru o umístění stavby Překládky, přičemž stavba Překládky bude v žádosti o vydání povolení označena jako stavební objekt „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- b) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
- c) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru předat společnosti CETIN toto rozhodnutí včetně grafické a dokladové části, a to zasláním na email kontaktní osobě ve věcech smluvních dle odst. 8.1. Smlouvy.

4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

- a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1. písm. a) Smlouvy;
- c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.

4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

4.7. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **168.478,- Kč** (slovy: jedno sto šedesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech vyčíslených v odst. 5.2. Smlouvy.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
 - b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - e) náklady na koordináční výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - f) náklady na identifikaci parcel,
 - g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, a které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,
 - i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.4. Výše nákladů na Překládku stanovených na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2. a/nebo odst. 5.5. Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **14.106,- Kč** (slovy: čtrnáct tisíc jedno sto šest korun českých) bude společností CETIN vystavena po uzavření této Smlouvy;
 - b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.3. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány elektronicky na adresu: faktury@kr-vysocina.cz. Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečně vzniklé škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
[REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
[REDAKCE]
- 8.2. Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Otto Vopěnka
funkce: 1. náměstek hejtmána
e-mail: vopenka.o@kr-vysocina.cz, tel.: +420 564 602 126

ve věcech technických: Martin Kocmánek
funkce: úředník na úseku investic a správy realit
e-mail: Kocmanek.M@kr-vysocina.cz, tel.: +420 564 602 214

- 8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Smlouvu lze zrušit:
- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
 - (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:
- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
 - b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4. Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1. Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva.
- 10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.

- 10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona o registru smluv. Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.

- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
- Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu contract_termination@cetin.cz.
- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na též dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
 - b) § 1767 odst. 2;
 - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
 - d) § 1743;
 - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv a základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

- 12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.13. Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.
- 12.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Číslo smlouvy CETIN: VPI/VY/2025/062/ha
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP: 8030006386
Registr smluv: ANO

V Brně dne _____

V _____ dne _____

Za CETIN:

Za Stavebníka:

[Redacted signature]

Ing. Otto
Vopěnka

Digitálně podepsal
Ing. Otto Vopěnka
Datum: 2026.01.21
15:56:36 +01'00'

[Redacted signature]

Team Leader, Překládky, smlouvy VFS dle
pověření
CETIN a.s.

Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána
Kraj Vysočina

Technická zpráva

Název: VPIC N.Cerekev PE - Transfor. Domova

Popis zadání:

Akce řeší stranové přeložení metalických kabelů a rozvaděče z důvodu přestavby stávajících obytných budov čp.16 a čp.17 v Nové Cerekvi na Pelhřimovsku.

Navrhované řešení:

Při stavebních úpravách stávajících budov dojde k dočasnému zrušení KR NOCE303 a NOCE288. Stávající koncové rozvaděče RSKP budou zrušeny stavbou a přívodní kabely budou před jednotlivými budovami odkopány, přerušeny a opatřeny koncovkou. Dle vyjádření od projektanta nosné stavby p. Davida není třeba provizorní přeložení stávajícího rozvaděče NOCE33 při demoličních a stavebních úpravách obou objektů. Po dokončení stavebních úprav vznikne ulička mezi čp.71 a čp.17. Na severní roh budovy čp.17 v nové uličce bude do obvodové zdi umístěn nový rozvaděč MIS -1b NOCE33, do kterého budou přepojeny kabely ze stávajícího rozvaděče NOCE33. Mezi KR NOCE288 a UR NOCE33 dojde k odkopání stávající trasy SEK CETIN. Mezi stávající dělicí spojkou a novým rozvaděčem NOCE33 bude položen nový přívodní kabel TCEPKPFLE 5x0,4. Dojde k demontáži a opětovné montáži dělicí spojky a ukončení kabelu v novém rozvaděči na stávající pozici. Stávající rozvaděč NOCE33 SIS – 1k bude zrušen. Tři stávající kabely TCEPKPFLE 3x0,4 do KR NOCE276, NOCE261 a NOCE245 budou prodlouženy novými kabely stejného typu a ukončí se v novém rozvaděči NOCE33 na stávajících pozicích. Z nového rozvaděče NOCE33 budou položeny dva nové kabely TCEPKPFLE 3x0,4 do nových budov čp.16 a čp.17 a budou ukončeny v technických místnostech, ve kterých se provede montáž nových koncových rozvaděčů MRK 20-QT. Z každé technické místnosti bude vyvedena do trasy SEK CETIN jedna rezervní mikro trubička. Pod novými vjezdy do budov bude stávající trasa SEK CETIN prohloubena a stávající kabely budou uloženy do dělené chráničky SYSPRO 160/110 mm.

Na akci je nutná PEW.

ÚR - Ne (zajistí investor)

PD - Ne

GEO - Ano

GP - Ano

VBŘ - Ano

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601

Martin Kocmánek

mob: +420 724 650 153

email: Kocmanek.M@kr-vysocina.cz

Projektant: Petr David


mob: +420 720 964 417


email: david@projektcentrum.cz

k.ú. Nová Cerekev

23/1

80

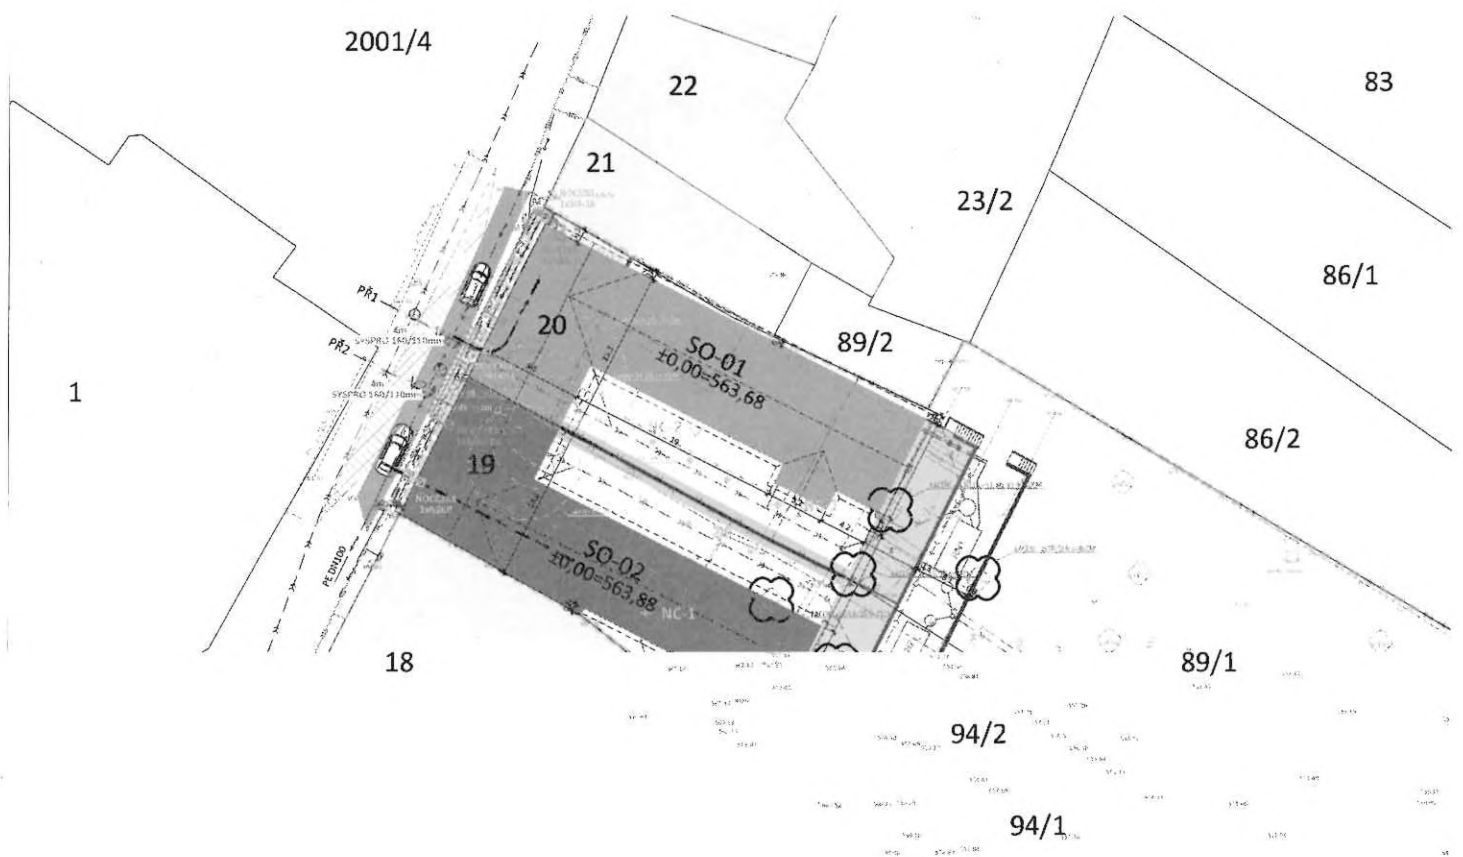

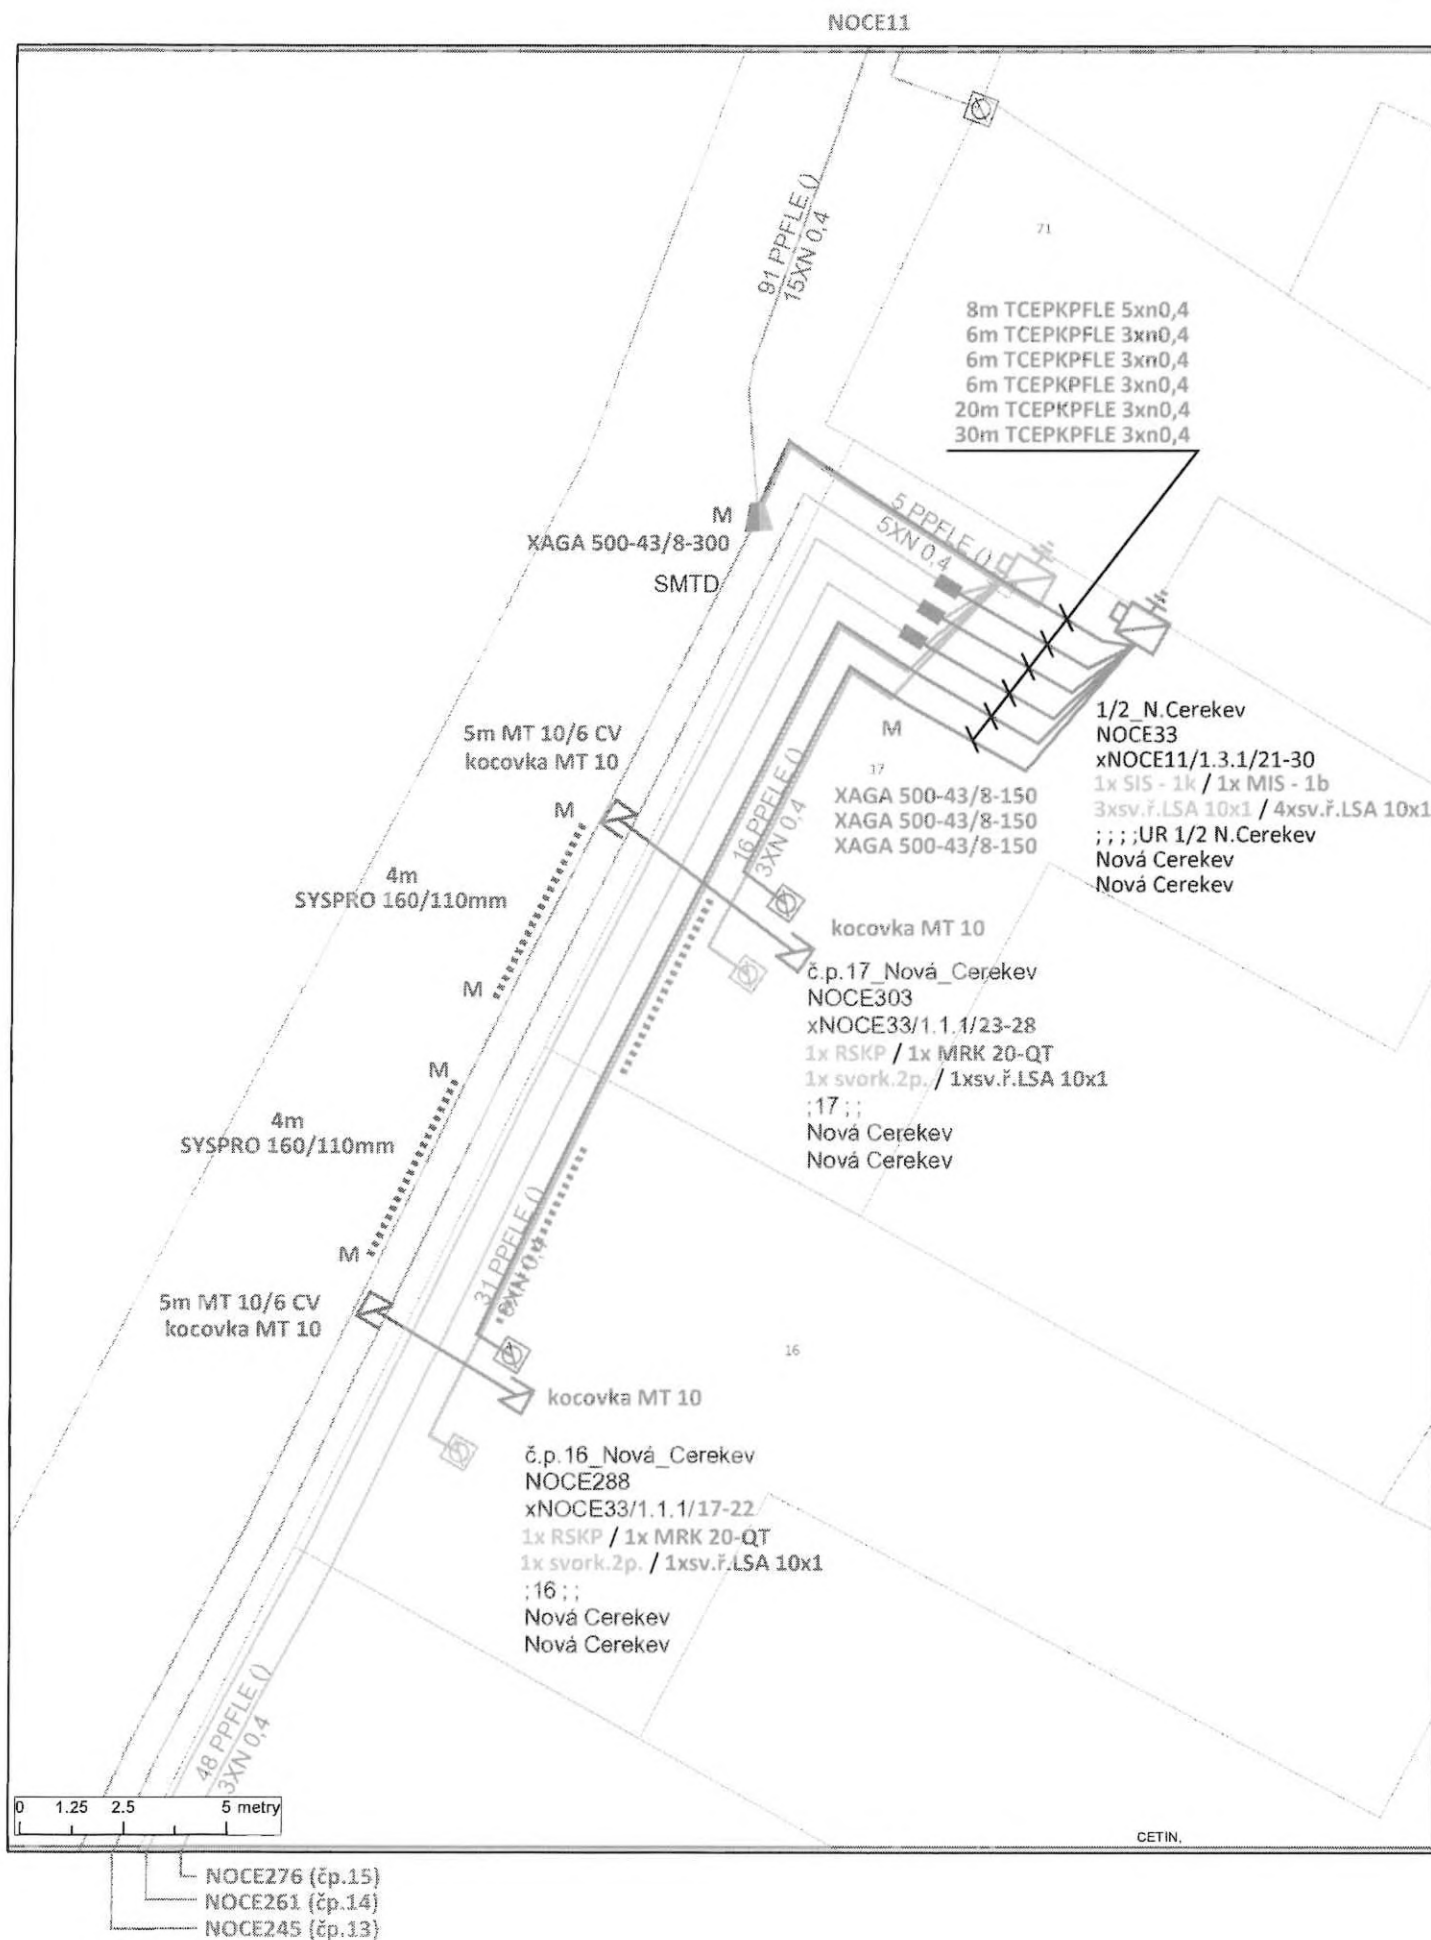

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [2001/4](#) 
Obec: [Nová Cerekev \[548456\]](#) 
Katastrální území: [Nová Cerekev \[705012\]](#)
Číslo LV: [10001](#)
Výměra [m²]: 8761
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Nová Cerekev, č. p. 276, 39415 Nová Cerekev

Způsob ochrany nemovitosti

Název

nemovitá kulturní památka

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#),
[Katastrální pracoviště Pelhřimov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 04.11.2025 12:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [st. 20](#) ↗
Obec: [Nová Cerekev \[548456\]](#) ↗
Katastrální území: [Nová Cerekev \[705012\]](#)
Číslo LV: [101](#)
Výměra [m²]: 634
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova s číslem popisným: [Nová Cerekev \[105015\]](#) ↗; č. p. 17; rodinný dům
Stavba stojí na pozemku: p. č. [st. 20](#)
Stavební objekt: [č. p. 17](#) ↗
Adresní místa: [č. p. 17](#) ↗

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěceným majetkem kraje	Podíl
Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace, Dobešovská 1, 39494 Černovice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 04.11.2025 12:00.

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle CTN

Ceník: ▣ VP TEMO 2021 - STAND. ▣ 2025.11
Položková databáze: 2025.11

Název stavby:

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

VPIC N.Cerekev PE - Transfor. Domova

SP

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 031,94 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	33 214,55 Kč
MONTÁŽ	66 635,94 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 173,56 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 173,56 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	8 074,54 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	20 452,26 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	924,66 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	18 796,71 Kč

Celkové náklady:

168 477,72 Kč

	Seznam položek		
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 031,94 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	4.00 m	98,32 Kč
952368	Pokládka žlabů TK2,T2N	8.00 m	999,92 Kč
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	6 191,95 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	24.00 m	1 731,60 Kč
951566	Průraz zdívkou cihlovým tl. nad 600 mm včetně	1.00 ks	676,20 Kč
954949	Průvrt zdívkou betonovým tl. nad 600 mm včetně	2.00 ks	1 706,60 Kč
951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	2.00 ks	98,32 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	4.00 m	2 861,12 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	23.00 m	10 549,41 Kč
954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	24.00 m	3 159,12 Kč
954956	Rýha vjezd kostky 35/70-90	3.00 m	3 748,23 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	30.00 m	442,50 Kč
954972	Znovuosazení obrubníků chodníkových	2.00 m	622,86 Kč
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	328,40 Kč
MONTÁŽ			
955076	Demontáž spojky mechanické	1.00 ks	2 271,81 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	108.00 m	2 588,76 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	833,28 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	17.00 ks	817,02 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	17.00 ks	545,36 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	448,84 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	24.00 ks	961,68 Kč
955288	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	128,08 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	7 380,00 Kč
	montáž vnitřních tras v technologických místnostech		
955292	Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	1.00 ks	2 114,99 Kč
955310	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	2.00 ks	527,00 Kč
955281	Montáž spojky smřštitelné do 50 čtyřek	4.00 ks	6 080,12 Kč
955946	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	4.00 ks	155,84 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	184.00 m	5 043,44 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 458,46 Kč
956049	Pokládka tlustostěnné trubičky	10.00 m	147,50 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	15 375,00 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	26.00 ks	824,46 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	3 711,60 Kč
957739	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	2.00 ks	1 844,98 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	4 814,22 Kč
958555	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 431,79 Kč

955109	Zrušení objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	977,92 Kč
955103	Zrušení rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř	2.00 ks	2 089,32 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	26.00 ks	543,40 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	1 532,88 Kč
955040	Zrušení úložných kabelů do15 XN	55.00 m	980,65 Kč
955097	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 007,54 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	7 173,56 Kč
--------	---------------------------	---------	-------------

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956281	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	7 173,56 Kč
--------	-------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	8 074,54 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 545,30 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	2.00 ks	4 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 336,32 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	7 570,64 Kč
	Přesná výše náhrad za zřízení služebností (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		

PROVOZNÍ PRÁCE

955204	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	251,83 Kč
955205	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	6.00 ks	272,16 Kč
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	273,83 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	2.00 ks	126,84 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	Název položky		
303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm	22.00 ks	768,02 Kč
305833	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	5.00 kg	464,55 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	30.00 m	123,60 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	50.00 m	111,50 Kč
300000	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	68.00 m	1 345,04 Kč
300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	8.00 m	198,16 Kč
316527	Koncovka smršť. SKH 1 4/10 mm	2.00 ks	107,04 Kč
301765	Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	4.00 ks	78,56 Kč
312240	Konektor UY2 přímý - plněný	56.00 ks	101,36 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 568,94 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	3.00 ks	79,47 Kč
325649	Skříň rozváděče MIS 1b-QT 50p-pod o.LSA	1.00 ks	1 387,05 Kč
325644	Skříň rozváděče MRK20-QT10-20p-na o. LSA	2.00 ks	1 576,84 Kč
320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	161,31 Kč
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	3.00 ks	1 369,08 Kč
312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	571,46 Kč
319184	Spona trubkySYSPRO	48.00 ks	1 720,32 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks	87,62 Kč
309290	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02	6.00 ks	858,48 Kč
323235	Trubička HDPE 10/6mm č.1 červená polopr	10.00 m	57,30 Kč
319209	Trubka dělená SYSPRO 160/110	8.00 m	4 544,80 Kč
302343	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	4.00 m	72,20 Kč
303222	Vodič prop. SMclíp-autok. C1 10114-C1L35	8.00 ks	738,80 Kč
315508	Vodič sděl. nf U 2x0,5 rudozelený	5.00 m	16,35 Kč
316266	Zámek skříňně 1370 L2 Jih-24313	3.00 ks	688,86 Kč
