

Číslo smlouvy vlastníka CB 2017\_0023  
Číslo smlouvy stavebníka 010/17/147/03/00  
SON/ODSH/169/2017

SRM 8020007452\_  
Registr smluv ANO



KUJCP01GBCPT

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH  
KOMUNIKACÍ  
č. CB 2017\_0023**

---

mezi

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

a

**Jihočeský kraj**



Číslo smlouvy vlastníka      CB 2017\_0023  
Číslo smlouvy stavebníka    010/17/147/03/00

SRM 8020007452\_  
Registr smluv ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“), v platném znění mezi:

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená na základě pověření Ing. Václavem Rozhoněm MBA, Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě dle Pověření ze dne 1.8.2016

bankovní spojení: PPF banka, Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

**Jihočeský kraj**

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

70890650

CZ70890650

ČSOB, a.s., Č. Budějovice

199783072/0300

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“.

**DEFINICE**

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

**Překládka** je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém

jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

**Vyjádření o existenci SEK** je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 22. 7. 2016 vydané pod čj. 664420/16, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Čížkrajice (CB),komunikace,přel.SEK“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebně technickém) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „CTN“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
  - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

## 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Číslo smlouvy vlastníka CB 2017\_0023  
Číslo smlouvy stavebníka 010/17/147/03/00

SRM 8020007452\_  
Registr smluv ANO

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 8.1 ve věcech technických této Smlouvy

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „ Přeložka silnice III/1545 Čížkrajice“, č.j. MUTS/6756/17/Pe. ze dne 20.3.2017, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 4 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „První etapa Překládky“) a je považována za ukončenou dnem ukončení První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8.2 této Smlouvy oznámení o ukončení První etapy Překládky. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa Překládky“) a je považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8.2 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy 190 370,00 Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do 2. měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Přebádkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, přebádanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Přebádky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Přebádky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Přebádky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Přebádky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Přebádku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
- a) Fakturu č. 1 ve výši 27 834,00. Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
  - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Přebádku do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Přebádky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

## 7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN  
ve věcech smluvních: Valenta Theodor  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: [theodor.valenta@cetin.cz](mailto:theodor.valenta@cetin.cz), tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Josef Filípek  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: [josef.filipek@cetin.cz](mailto:josef.filipek@cetin.cz) tel. [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:  
ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Tetourová  
funkce: vedoucí oddělení ODSH  
e-mail: [tetourova@kraj-jihocesky.cz](mailto:tetourova@kraj-jihocesky.cz) tel.: 386720132

ve věcech technických: Mgr. Andrea Tetourová [ ]  
funkce: viz. výše [ ]  
e-mail: , tel.: viz. výše

## 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.

9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA



- 10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

## 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
  - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
  - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.



Číslo smlouvy vlastníka CB 2017\_0023  
Číslo smlouvy stavebníka 010/17/147/03/00

SRM 8020007452\_  
Registr smluv ANO

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky

Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: MUTS/6756/17/Pe. ze dne 20. 3. 2017

Příloha č. 5 – Pověření CETIN

CETIN

V Českých Budějovicích dne .... 28. 9. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Jméno :...ing. Václav Rozhoň MBA

Funkce : Supervizor výstavby přístupové sítě

Olšanská 2681/6

130 00 Praha 3

DIČ: CZ04084063

240

VPIC Čížkrajice (CB), komunikace, přel. SEK

Stavebník

- 9. 09. 2017

V Českých Budějovicích dne ....


Stavebník Jihočeský kraj

Mgr. Ivana Stráská

hejtmanka



KRAJ

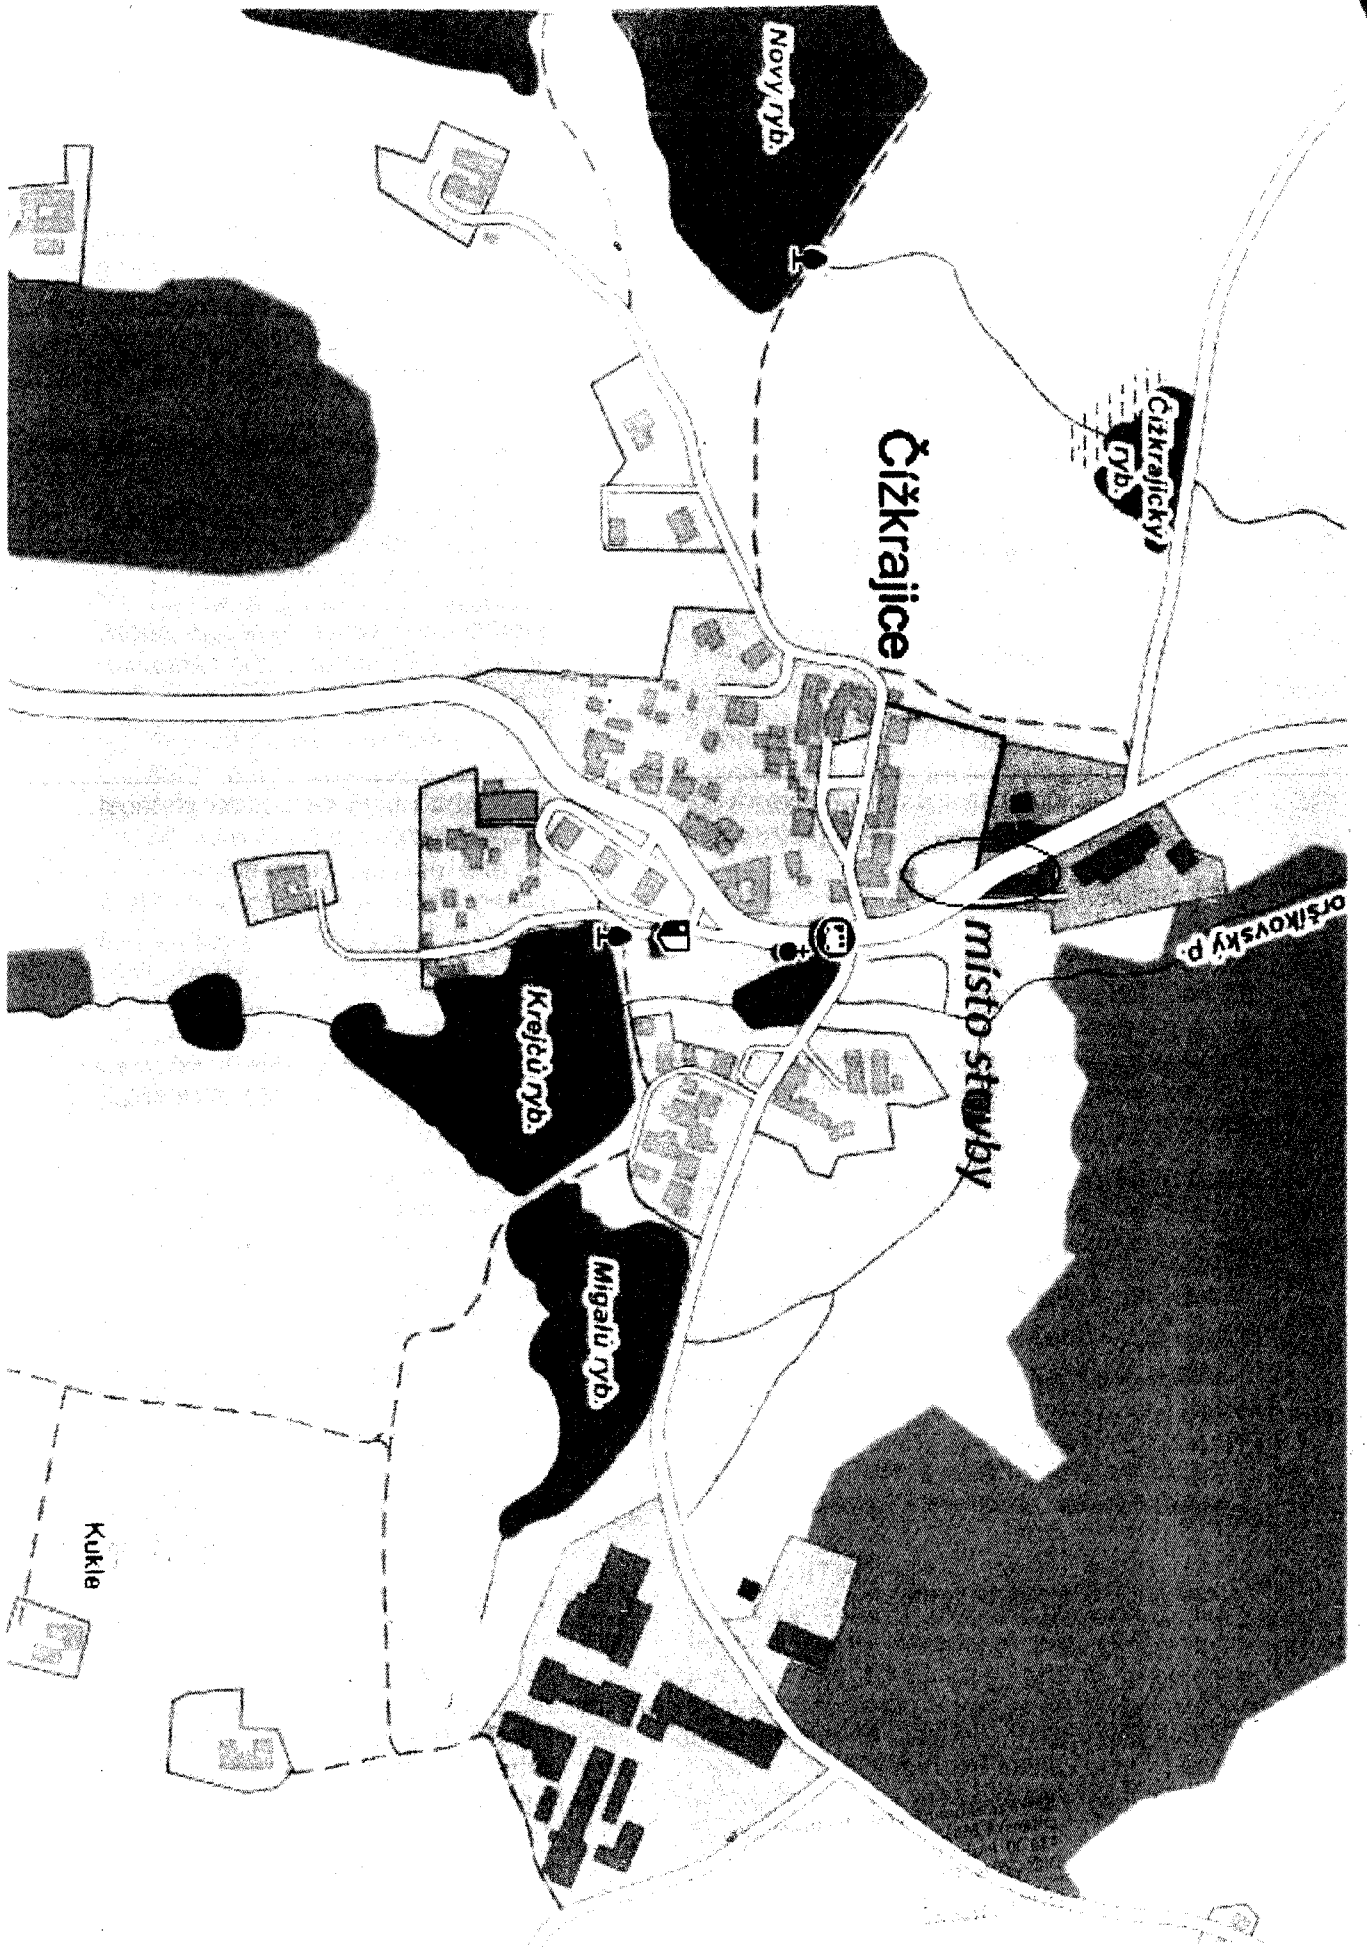





Název stavby: VPIC Čížkrajice (CB), komunikace, přel. SEK

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.100	KMP:	7.964	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.168	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.148	PP HR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	18 083 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	36 283 Kč
MONTÁŽ	33 718 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 197 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 505 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	9 850 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	66 180 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	10 000 Kč
<b>Celkové náklady:</b>	<b>190 370 Kč</b>
<b>STAVEBNÍ ČINNOST</b>	<b>142 686 Kč</b>
<b>NESTAVEBNÍ ČINNOST</b>	<b>47 684 Kč</b>

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	13640.00 JV	13 640 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	44.00 m	663 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové inženýrská činnost	2799.42 JV	2 799 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	25.00 m	10 924 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	75.00 m	20 996 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	100.00 m	902 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	148.00 m	494 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	380 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	38.00 ks	1 112 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	34.00 ks	663 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	68 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	155.00 ks	3 788 Kč
955292 S		Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	1.00 ks	1 043 Kč
955280 S		Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	4.00 ks	7 411 Kč

Název stavby:	VPIC Čížkrajice (CB), komunikace, přel. SEK		
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	5.00 ks	4 632 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks	345 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	148.00 m	1 590 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	94.00 m	1 555 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	74.00 m	1 516 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	3.00 ks	59 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	283 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222 Kč
955103 S	Zrušení rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř	1.00 ks	614 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	3.00 ks	41 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	117 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	102.00 m	744 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	51.00 m	699 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	58.00 m	623 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 197 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 197 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 554 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	5 332 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	4 518 Kč
<b>POPLATKY</b>			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým náhrada za VBř	10000.00 JV	10 000 Kč

## Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	60.00 ks	2 198 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	100.00 m	426 Kč
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	94.00 m	1 904 Kč
300148 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,6	74.00 m	19 898 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	7.00 ks	1 658 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	33.00 ks	733 Kč
408090 S		Páska speciální 16mmx20m pevnostní	2.00 ks	704 Kč
306320 S		Skříň rozvaděče MRK 20-QT 10-20p-pod omítku	1.00 ks	729 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	5.00 ks	2 093 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	6.00 ks	201 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	8.00 ks	1 664 Kč
322270 S		Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE	4.00 ks	25 043 Kč
309380 S		Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	1.00 ks	122 Kč
300028 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x červené pr.	74.00 m	1 956 Kč
300035 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy	74.00 m	1 956 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	6.00 ks	4 522 Kč
302343 S		Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	12.00 m	177 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	1.00 ks	90 Kč
316266 S		Zámek skříňe 1370 L2 Jih-24313	1.00 ks	107 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	3.00 ks	0 Kč

Název stavby: VPIC Čížkrajice (CB), komunikace, přel. SEK\_ et.1  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.100	KMP:	7.964	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.168	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.148	PP HR:	0

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	18 083 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 197 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč
	0 Kč
<b>Celkové náklady:</b>	<b>27 834 Kč</b>

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	13640.00 JV	13 640 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>				
956278		Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 197 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 554 Kč



## TECHNICKÁ ZPRÁVA

**Název stavby** : VPIC Čížkrajice (CB), komunikace, přel. SEK  
**Místo stavby** : k.ú. Čížkrajice, p.č. 215/2, 2353/13 a 2353/12  
**Zákazník** : Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
**Dodavatel** : ARANEA NETWORK a.s.  
Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

### Technické řešení stavby:

V obci Čížkrajice se připravuje realizace stavby „Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice“. Součástí PD této stavby je přeložení komunikačního vedení. Jde o změnu trasy SEK tvořené metalickými kabely a HDPE trubkami.

Kabel PPFLE 3XN do TRSV1480 se ve svém koncovém úseku zruší, včetně rozvaděče tvořeného skříní MRK10. Zbývá část kabelu se nastaví, použije se kabel PPFLE 3XN0,6 a spojka XAGA 500 43/8-150, kabel se položí do nového místa a ukončí se rozvaděčem MRK20. Kabel PPFLEZE 35XN0,6 a PPFLE 3XN0,6, trubky HDPE40 O/CC a C/OO se ve dvou částech trasy, jedna na p.p.č. 215/2 a 2353/3 a druhá na p.p.č. 2353/33 a 2353/12 zruší. Zbylé části kabelů a trubek budou prostaveny vložkami na potřebnou délku. Použijí se kabely PPFLEZE 50XN0,6, PPFLE 3XN0,6, trubky HDPE40 O/CC a C/OO, spojky XAGA 500 75/15-400/EZE, XAGA500 43/8-150 a Plasson 40. Kabely a trubky se položí v nových trasách.

Výkopové práce budou prováděny v povrchu charakteru bosého chodníku (dvůr zemědělského objektu) a travnatém povrchu. Pro uložení kabelů v kopané trase bude zřízeno kabelové lože z písku nebo prosáté zeminy se zakrytím plastovými deskami a výstražnou fólií. V místě křížení komunikace budou prvky SEK uloženy do chráničky z trubky PE Ø110mm, včetně založení rezervních chrániček. U TRSV1480 bude kabel uložen do chráničky z vrapované trubky Ø 40mm. Krytí v úsecích s chráničkami bude pouze výstražnou fólií. Spojky a konce chrániček budou označeny Ball Markery.

Při pokládce kabelů a trubek budou dodrženy ČSN 736005 a 341100.

Závěrečné měření, kalibrace a tlaková zkouška, dodržení BOZP a ochrana životního prostředí budou provedeny a postupováno bude podle předpisu TIM P TD000007.

Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD00004-6.

Polohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.

S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001Sb.

Stavba bude prováděna na územní rozhodnutí nosné stavby, bude zpracován projekt a vyřízeno zřízení služebnosti pro VBř.

### Kapacity:

KMMK	KMP	KMVYK	KMNT	KMOK	KMTRU
0,168	7,964	0,1	0	0	0,148

V Českých Budějovicích  
15.6.2017



Franti  
ARANEA N  
Mocifanská 30  
147 00 Praha  
IČ: 24126039  
DIČ: CZ24126039  
www.araneanetwork.cz



## Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad

Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

Spis. zn. : Výst. 1106/3-ÚR/2017/P  
Vyřizuje : Ing. Kateřina Petrášková  
Telefon : 386 301 426

Trhové Sviny, dne 20.3.2017  
Č. j.: MUTS/6756/17/Pe



Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

**Zastoupen:**  
Akiprojekt, s.r.o.  
Boženy Němcové 12/2  
370 01 České Budějovice

### ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Trhové Sviny - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.1.2017 podal

**Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650,  
zastoupen: Akiprojekt, s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 02773961**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

#### **Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 215/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 215/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2353/9 (trvalý travní porost), parc. č. 2353/12 (trvalý travní porost), parc. č. 2353/13 (trvalý travní porost), parc. č. 2484/4 (ostatní plocha), parc. č. 2489/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3183/1 (ostatní plocha), parc. č. 3183/32 (ostatní plocha), parc. č. 3183/33 (ostatní plocha), parc. č. 3205/1 (ostatní plocha), parc. č. 3205/14 (ostatní plocha), parc. č. 3206/1 (ostatní plocha), parc. č. 3206/13 (ostatní plocha), parc. č. 3206/14 (ostatní plocha), parc. č. 3206/30 (ostatní plocha), parc. č. 3232 (ostatní plocha) v katastrálním území Čížkrajice.

#### Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o přeložku krátkého úseku silnice III/1545 v obci Čížkrajice tak, aby neprocházela stávajícím dvorem a zděnou bránou u objektu č.p. 7, která je bodovou závadou.

#### Umístění stavby na pozemku:

- Nová trasa je vedena ve směru od severu k jihu (od Trhových Svinů k Benešovu nad Černou) po východním okraji zástavby obce Čížkrajice. Nová komunikace se odpojuje od stávající trasy silnice III/1545 cca v místě značky IZ4a začátek obce, kde trasa směřuje lehce na východ. Komunikace dál vede přes plochy využívané především pro parkování vozidel. Následně trasa kříží část budovy na pozemku st. p. 215/2, tato část budovy bude zdemolována. Dále trasa vede přes louky kolem budovy na pozemku st. p. 110/1 až před stávající autobusovou zastávku, kde se napojuje na stávající trasu silnice III/1545.

**Určení prostorového řešení stavby:**

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

**SO 011 Demolice stávající budovy**

- Bude demolována a rozebrána jižní část haly v celé šíři a délce přibližně 12,7 m. Jedná se o samostatně provozovanou část (místnost) haly, která je konstrukčně oddělena od zbylé části (která zůstane bez úprav). Oddělení je provedeno příčnou zděnou stěnou, která v současném stavu neplní nosnou funkci, její konstrukce však odpovídá nosné stěně. Po tuto část bude demontována střešní krytina a 3 příhradové ocelové nosníky. Bude odstraněn podhled. Obvodové zdivo demolované části objektu bude odstraněno postupným rozebíráním konstrukcí až po základovou desku.

**SO 101 Přeložka silnice III/1545**

- Délka navržené trasy silnice III/1545 je 214 m (staničení osy km 0,020 00 – km 0,234 12). Komunikace je navržena v kategorii MO6,5/6,5/30, ve směrových obloucích je komunikace rozšířena dle ČSN 736110. Jízdní pruhy jsou tak široké 3,10 až 3,55 m. Trasa je navržena s kružnicovými oblouky o poloměrech R1=75m, R2=50m a R3=150m.

**SO 103 Místní komunikace**

- Jedná se o úpravu stávající místní komunikace spojující Čížkrajice a místní část Na Stráni. Stávající silnice svírá se silnicí III/1545 nevhodný úhel, komunikace bude nově nakolmena k silnici III/1545.
- Délka upravovaného úseku je 17 m.

**SO 104 Sjezdy**

- Jsou navrženy nové sjezdy šířky 4 m na okolní pozemky. Sjezd bude vypsádován směrem na přilehlý pozemek. Výška obrubníku v místě sjezdu bude snížena na 4 cm.

**SO 301 Odvodnění komunikace**

- V rámci odvodnění komunikace bude realizována dešťová stoka z potrubí DN250 délky 100,0 m. Na stoce bude osazeno 5 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet Ø1,0 m. Trasa kanalizace je navržena tak, aby poklapy kanalizačních šachet byly umístěny v ose komunikace nebo ose jízdního pruhu a nebyly tak pojížděny. Poklapy šachet umístěných v komunikaci budou samonivelační litinové Ø0,6 m s nosností D400.
- Samotné odvodnění komunikace bude řešeno 5 ks prefabrikovaných uličních vpustí Ø0,5 m s kalovou prohlubní a kalovým košem pro zachycení hrubších nečistot. Napojení uličních vpustí bude řešeno navrtávkami se sedlovými odbočkami UR2/KG DN250/150. Přípojky uličních vpustí budou z potrubí PVC-U KG DN150.
- Dešťová kanalizace bude zaústěna do stávající kanalizace DN600 v nově osazené šachtě Š.1. Tato stávající kanalizace ústí po cca 40 m do zatrubněného vodního toku DN1000 IDVT 10245873.

**SO 302 Úprava stávající kanalizace**

- Stávající kanalizace je v místě křížení s novou komunikací uložena s krytím cca 1,5 m pod stávajícím terénem. Niveleta nové komunikace bude o cca 1,0 m nad stávajícím terénem, čímž bude krytí stávající kanalizace navýšeno na cca 2,5 m.
- Stávající šachta v místě přeložky komunikace bude výškově upravena pomocí prefabrikovaných skruží na úroveň nové komunikace. Poklop šachty bude samonivelační litinový Ø0,6 m s nosností D400.

**SO 401 Přeložka kabelů CETIN**

- V místech křížení stavby přeložky se stávajícími kabely ve správě firmy CETIN je navrženo přeložení kabelů do nové trasy. V místě přechodu pod navrhovanou přeložkou jsou navrženy chráničky.

**SO 402 Přeložka kabelu NN a SO 403 Elektrická rozvodna**

- Z důvodu demolice části stávající budovy, kde se nachází elektrická rozvodna pro celou budovu, je navržena přeložka kabelu NN a rozvodny. Poloha nových kabelů NN a nové elektrické rozvodny byla konzultována s majitelem dotčeného pozemku.

**SO 801 Sadové úpravy**

- V rámci sadových úprav bude provedeno vykácení všech dřevin v místě přeložky, stavební objekt obsahuje i odstranění pařezů a náhradní výsadbu.

**Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

- Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno určením okruhu účastníků územního řízení, neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
- Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být umístěním stavby dotčeny, následovně: st. p. 110/1, st. p. 110/3, st. p. 109/5, parc. č. 2485/3, parc. č. 3183/3, parc. č. 2368/2, parc. č. 3183/31, parc. č. 2353/4, parc. č. 2352, parc. č. 2484/1 v katastrálním území Čížkrajice.

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna podle dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Jáchym – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 0102152. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 215/1, 215/2, parc. č. 2353/9, 2353/12, 2353/13, 2484/4, 2489/1, 3183/1, 3183/32, 3183/33, 3205/1, 3205/14, 3206/1, 3206/13, 3206/14, 3206/30, 3232 v katastrálním území Čížkrajice.
4. Žadatel v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá o stavební povolení u příslušného silničního správního úřadu, kterým je Městský úřad Trhové Sviny, odbor dopravy a silničního hospodářství.
5. Žadatel dodrží podmínky a požadavky těchto stanovisek a vyjádření:
  - a) *Závazné stanovisko - souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které vydal Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a rybářství – spis. zn. OŽP/3369/16/Zo, č.j. MUTS/29748/16/Zo/OŽP/ZS-sou:*
    - *Při návrhu a provedení likvidace srážkových vod z komunikace postupovat podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.*
  - b) *Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 22.7.2016 pod č.j. 664420/16.*
  - c) *Závazné stanovisko – udělení souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF, které vydal Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ZPF dne 8.2.2017 spis. zn. OŽP/146/17/Hor, č.j. ZPF/8/MUTS/1128/17/Hor:*
    - *Před započatím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby se bude řídit zásadami ochrany ZPF.*
    - *Dle předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy bude skrývka zeminy z plochy trvale odňaté ze ZPF provedena podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, na vlastní náklady. Objem orníční vrstvy půdy (hl. cca 0,20 m) činí cca 305 m<sup>3</sup> a bude využit ke zúrodnění dotčených pozemků v k.ú. Čížkrajice na částech nevyjmutých ze ZPF.*
    - *Rozproštění ornice bude dokončeno nejpozději do termínu kolaudace stavby.*
    - *Investor učiní po dobu výstavby opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její vegetační kryt.*
    - *Přílehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny.*

- d) *Rozhodnutí o povolení k pokácení dřevin č.j. 6/2017 ze dne 1.2.2017 vydané Obecním úřadem Čížkrajice:*
- *Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3.*
  - *Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.*
  - *Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.*
  - *Platnost tohoto rozhodnutí končí 31.3.2020.*
  - *Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.*
  - *Pokácení lze provést až po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice“.*
- e) *Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 15.7.2016 pod zn. M18416-16127608.*
- f) *Vyjádření Radouňské vodohospodářské společnosti, a.s. ze dne 28.11.2016 zn. VVK/1014/88/16/MB.*
- g) *Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 16.11.2016 spis. zn. S-KHSJC 30812/2016, č.j. KHSJC 30812/2016/HOK CB-CK:*
- *KHS Jč. kraje požaduje respektovat závěr a doporučení Akustické studie (Ing. Petr Mynář, INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, Brno, zak. č.: 0545-16/D01) a do dalšího stupně projektové dokumentace zpracovat protihluková opatření k zajištění splnění hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro období provádění stavebních prací.*
- h) *Odborné vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 4.11.2016 č.j. NPÚ-331/85125/2016:*
- *Stavba proběhne na území s archeologickými nálezy a její realizace je z hlediska památkové péče možná za podmínky, že stavebník podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.*
- i) *Vyjádření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 7.11.2016 pod zn. SÚS JcK/18416/2016/1545:*
- *přeložená část silnice bude vyřazena ze silniční sítě a bude provedeno příslušné majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi.*
6. Před zahájením výkopových prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabráňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650

zastoupen: Akiprojekt, s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 02773961

#### **Odůvodnění:**

Dne 12.1.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 2.2.2017 č.j. MUTS/2960/17/Pe zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem Čížkrajice, který nabyl účinnosti dne 10.9.2013 a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavba „Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice“ je součástí zastavitelné plochy označené „DS1“ s funkčním využitím plocha dopravní infrastruktury (silniční doprava - silnice III. třídy, místní a účelové komunikace). Plocha „DS1“ je Územním plánem Čížkrajice vymezena jako koridor pro přeložku silnice III/1545.

Územní plán Čížkrajice stanovuje pro plochy dopravní infrastruktury následující podmínky využití:

#### **Hlavní využití**

Plochy dopravní infrastruktury jsou samostatně vymezeny v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití a dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, např. ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej.

#### **Přípustné využití**

- výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb dopravních
- liniové stavby technické infrastruktury

#### **Podmíněně přípustné využití**

- do doby realizace navržených záměrů lze navrženou plochu využívat pro zařízení uvedená v dalších stupních projektové dokumentace jako zařízení dočasná

#### **Nepřípustné využití**

- veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí – předběžná informace č.j. OŽP/PI 280/27189/3046/16/Rou ze dne 13.11.2016
- Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a rybářství – závazné stanovisko - souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spis. zn. OŽP/3369/16/Zo, č.j. MUTS/29748/16/Zo/OŽP/ZS-sou
- Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ZPF – závazné stanovisko (souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF) sp. zn. OŽP/146/17/Hor, č.j. ZPF/8/MUTS/1128/17/Hor ze dne 8.2.2017.
- Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování, oddělení kulturních památek – vyjádření spis. zn. KP/2988/5/2017/Ko, č.j. MUTS/4935/17/Ko ze dne 22.2.2017.
- Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování – vyjádření č.j. MUTS/28494/16/Roj ze dne 14.11.2016.
- Městský úřad Trhové Sviny, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření č.j. MUTS/29642/16/Kas ze dne 28.11.2016.
- Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – rozhodnutí spis. zn. OZZL 64033/2015/jakubec, č.j. KUJCK 73909/2015/OZZL ze dne 7.10.2015.
- Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – stanovisko spis. zn. OZZL 141912/2016/pedo, č.j. KUJCK 148308/2016/OZZL ze dne 14.11.2016.
- Krajský úřad Jihočeský kraj, oddělení územního plánování – vyjádření spis. zn. OREG 113529/2016/stlu SO/4, č.j. KUJCK 147907/2016 ze dne 18.11.2016.
- Krajský úřad Jihočeský kraj, oddělení památkové péče – vyjádření spis. zn. OKPP 141760/2016/misi/2, č.j. KUJCK 152481/2016 OKPP ze dne 25.11.2016.
- Národní památkový ústav – vyjádření č.j. NPÚ-331/85125/2016 ze dne 4.11.2016.
- Policie České republiky, dopravní inspektorát ČB – stanovisko č.j. KRPC-171304-2/Čj-2016-020106 ze dne 15.11.2016.
- Krajská hygienická stanice Jč kraje – závazné stanovisko č.j. KHSJC 30812/2016/HOK CB-CK ze dne 16.11.2016.
- Správa a údržba silnic Jč kraje – vyjádření zn. SÚS JcK/18416/2016/1545 ze dne 7.11.2016

- Hasičský záchranný sbor Jč kraje – závazné stanovisko č.j. HSCB-6021-2/2016 KŘ ze dne 31.10.2016
- ČEVAK, a.s – vyjádření č.j. O16010024560 ze dne 18.7.2016.
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – vyjádření č.j. 12198/2016-SŽDC-OŘ-PLZ-OPS-341-M ze dne 7.7.2016.
- Povodí Vltavy, s.p. – vyjádření zn. 35644/2016-PVL ze dne 29.7.2016, stanovisko zn. 61948/2016-142 ze dne 24.11.2016.
- Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková – vyjádření spis. zn. 33784/2016-8201-OÚZ-ČB ze dne 29.7.2016
- E.ON Servisní, s.r.o. – vyjádření (plyn) zn. H18585-16127608 ze dne 29.6.2016 a vyjádření (elektrická síť) zn. M18416-16127608 ze dne 15.7.2016.
- E.ON Česká republika, s.r.o. – stanovisko ze dne 12.10.2016.
- CETIN a.s. – vyjádření č.j. 664420/16 ze dne 22.7.2016, vyjádření zn. ZD-590/16 ze dne 3.10.2016.
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn. E18289/16 ze dne 29.6.2016.
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn. MW000004614310639 ze dne 29.6.2016.
- Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. – vyjádření zn. V/VK/1014/88/16/MB ze dne 28.11.2016.
- Lesy České republiky, s.p.
- Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl – vyjádření zn. SPU 339174/2016 ze dne 21.7.2016.
- Jihočeský vodárenský svaz – vyjádření zn. 2016/1545 ze dne 26.7.2016.
- ČEPS, a.s. – vyjádření zn. 810/16/KOC/Ro/3 ze dne 14.7.2016.
- Obecní úřad Čížkrajice – rozhodnutí o povolení k pokácení dřevin č.j. 6/2017 ze dne 1.2.2017.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení jsou účastníky územního řízení žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci, jak je výše uvedeno.

Stavební úřad vymezil okruh sousedních pozemků a staveb na nich, které by mohly být umístěním stavby dotčeny, následovně: st. p. 110/1, st. p. 110/3, st. p. 109/5, parc. č. 2485/3, parc. č. 3183/3, parc. č. 2368/2, parc. č. 3183/31, parc. č. 2353/4, parc. č. 2352, parc. č. 2484/1 v katastrálním území Čížkrajice.

#### **Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:**

Akiprojekt, s.r.o., zastupující na základě plné moci Jihočeský kraj  
Obec Čížkrajice

#### **Účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:**

Zemědělské družstvo Čížkrajice - dotčené pozemky: parc. č. 2353/9, st. p. 215/1  
Obec Čížkrajice - dotčené pozemky: parc. č. 3206/1, parc. č. 3206/30, parc. č. 3232, st. p. 215/2, parc. č. 3183/1, parc. č. 3205/1, sousední pozemky: st. p. 110/3, parc. č. 3183/3  
Ing. Pavel Tláskal - dotčené pozemky: parc. č. 3183/32, parc. č. 2353/12, parc. č. 3205/14  
Stanislav Skamene - dotčené pozemky: parc. č. 2353/13, parc. č. 3183/33  
Ing. Petr Skamene - dotčené pozemky: parc. č. 2353/13, parc. č. 3183/33  
Jana Kamenová - dotčené pozemky: parc. č. 2353/13, parc. č. 3183/33  
Pavel Skamene - dotčené pozemky: parc. č. 2353/13, parc. č. 3183/33



Mgr. Jana Dvořáková - dotčené pozemky: parc. č. 2353/13, parc. č. 3183/33  
František Kubík - dotčený pozemek: parc. č. 2484/4, sousední pozemky: st. p. 110/1, parc. č. 2485/3  
Miroslav Dill - dotčený pozemek: parc. č. 2489/1, sousední pozemek: parc. č. 2352  
Jiřina Kortanová - dotčený pozemek: parc. č. 3206/13  
Miroslav Tesař - dotčený pozemek: parc. č. 3206/14  
RNDr. Martin Hais, PhD. - sousední pozemky: st. p. 109/5, parc. č. 2368/2, parc. č. 3183/31  
Ladislav Vávra - sousední pozemek: parc. č. 2353/4  
Marcela Vanišová - sousední pozemek: parc. č. 2484/1

Všechny uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Čížkrajice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Bez návrhů a námitek.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Luděk Klein  
vedoucí stavebního úřadu  
Mě Ú Trhové Sviny

Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Petrášková – referent stavebního úřadu

#### **Příloha:**

- ověřený situační výkres

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 7.2.2017.

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky) podle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
Akiprojekt, s.r.o., zastupující na základě plné moci Jihočeský kraj  
Obec Čížkrajice

**účastníci (dodejky) podle § 85 odst. 2 stavebního zákona**

Zemědělské družstvo Čížkrajice

Obec Čížkrajice

Ing. Pavel Tláskal

Stanislav Skamene

Ing. Petr Skamene

Jana Skamenová

Pavel Skamene

Mgr. Jana Dvořáková

František Kubík

Miroslav Dill

Jiřina Kortanová

Miroslav Tesař

RNDr. Martin Hais, PhD.

Ladislav Vávra

Marcela Vanišová

**dále obdrží**

CETIN a.s.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Městský úřad Trhové Sviny, odbor dopravy

Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí

Policie České republiky, Dopravní inspektorát České Budějovice

vlastní

## POVĚŘENÍ

Obchodní korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto potvrzuje, že její zaměstnanec pan

**Ing. Václav Rozhoň, MBA**  
Supervizor, Výstavba PPS Čechy

os. č. 3241, nar. dne 18.5.1964, bytem Lipenská 37, České Budějovice, PSČ 370 01 („Zaměstnanec“)

**Je v rámci své zaměstnanecké pozice pověřen k tomu aby:**

za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případné majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

[www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. Pro účely změn uvedených právních vztahů se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku přijatému či novým způsobem upravenému v dodatku ke smlouvě za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely ukončení smluv se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku, z něhož v důsledku ukončení smlouvy sešlo.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.


Toto pověření je platné do 31. 7. 2018. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 31. 7. 2017

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

.....  


Ing. Martin Vlček  
 předseda představenstva

.....  


mistopredseda predstavenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 01/1062/2008/1007

Ověřuji, že:

Ing. Martin Vlček, nar. [redacted] -----

bydlištěm [redacted] -----

Ing. Petr Slovacek, nar. [redacted] -----

bydlištěm [redacted] -----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne 31.7.2017-----



Marcela Šramková  
notářská tajemnice  
pověřená Mgr. Radimem Neudvázarem  
notářem v Praze, se sídlem  
Praha 1, Křižovatka 6

