

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. UL 2026\_0001**

---

**mezi**

**CETIN a.s.**

**a**

**Statutární město Liberec**

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření Ing. Hanou Holušovou, Specialistou výstavby sítě – smlouvy,  
Výstavba liniových sítí ČV

(„**CETIN**“)

a

**Statutární město Liberec**

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

ID DS: 7c6by6u

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem

(„**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích tuto

**Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(„**Smlouva**“)**

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** znamená cenový a technický návrh provedení Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Faktura** znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

**GDPR** znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

**Občanský zákoník** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

**Překládka** znamená stavbu v k.ú. Dolní Hanychov spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Příprava Překládky** znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další nutné činnosti;

**SEK** znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Stavba** znamená stavbu pod označením „**Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Strakonická – Bajkalská**“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

**Stavební připravenost** znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelety;

**Stavební zákon** znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

**Vedení a zařízení společnosti CETIN** znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

**Vyjádření o poloze sítě** znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne 11. 12. 2024 vydané pod č.j. 351125/24, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

**Zákon o elektronických komunikacích** znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;

**Zákon o registru smluv** znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

**Zákon o vyvlastnění** znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

**ZDPH** znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI Liberec, Strakonická - Bajkalská**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v CTN.  
3.2. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.  
3.3. Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

## 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje po realizaci Překládky zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.  
4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:  
a) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;  
b) vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“), a to nejdříve dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy.  
4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:  
a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.  
4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů, nejsou-li tyto vztahy smluvně upraveny již před uzavřením této Smlouvy.  
4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při realizaci Překládky potřebnou součinnost.  
4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.  
4.7. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny



nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **104 631,- Kč** (slovy: jedno sto čtyři tisíc šest set třicet jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3. [ZÁMĚRNĚ NEVYUŽITO]

- 5.4. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech vyčíslených v odst. 5.2 Smlouvy.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
  - b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
  - c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
  - d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
  - e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
  - f) náklady na identifikaci parcel,
  - g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, a které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
  - h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,
  - i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
  - j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
  - k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
  - l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
  - m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5. Výše nákladů na Překládku uvedených v odst. 5.2 Smlouvy se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2. a/nebo odst. 5.5. Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktura k úhradě nákladů souvisejících s Překládkou bude vystavena po ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: [posta@nagostrat.liberec.cz](mailto:posta@nagostrat.liberec.cz). Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečně vzniklé škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:  
ve věcech smluvních: Hana Holušová  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel.: 720 752 377, e-mail: [hana.holusova@cetin.cz](mailto:hana.holusova@cetin.cz)  
ve věcech technických: Petr Tauchman  
funkce: Projektový koordinátor  
tel.: 721 836 328, e-mail: [petr.tauchman@novaoptika.cz](mailto:petr.tauchman@novaoptika.cz)
- 8.2. Za Stavebníka:  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
funkce: primátor statutárního města Liberec  
tel.: 485 243 122, e-mail: [trminkova.dana@magistrat.liberec.cz](mailto:trminkova.dana@magistrat.liberec.cz)  
ve věcech technických: Kristýna Růžicková  
funkce: pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení investic  
e-mail: [ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz](mailto:ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz), tel.: 485 243 460

- 8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

## **9. Odstoupení od Smlouvy**

- 9.1. Smlouvu lze zrušit:
- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
  - (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:
- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
  - b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.
- Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4. Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

## **10. Rozvazovací podmínka**

- 10.1. Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva.
- 10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.



- 10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona o registru smluv. Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.

- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
  - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
  - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
  - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
- Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu [contract\\_termination@cetin.cz](mailto:contract_termination@cetin.cz).
- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5. Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
  - b) § 1767 odst. 2;
  - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
  - d) § 1743;
  - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.



- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převládá text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv a základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
- Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.13. Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.
- 12.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

**Příloha č. 1 - CTN**

**Doložka**


Smlouva byla schválena Radou města Liberec usnesením č. 374/2026 ze dne 17. 3. 2026.

V Praze dne

V Liberci dne

Za CETIN:

Za Stavebníka:





---

Ing. Hana Holušová  
specialista výstavby sítě – smlouvy  
na základě pověření  
CETIN a.s.  
(*podepsáno elektronicky*)

---

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc  
primátor

Statutární město Liberec  
(*podepsáno elektronicky*)

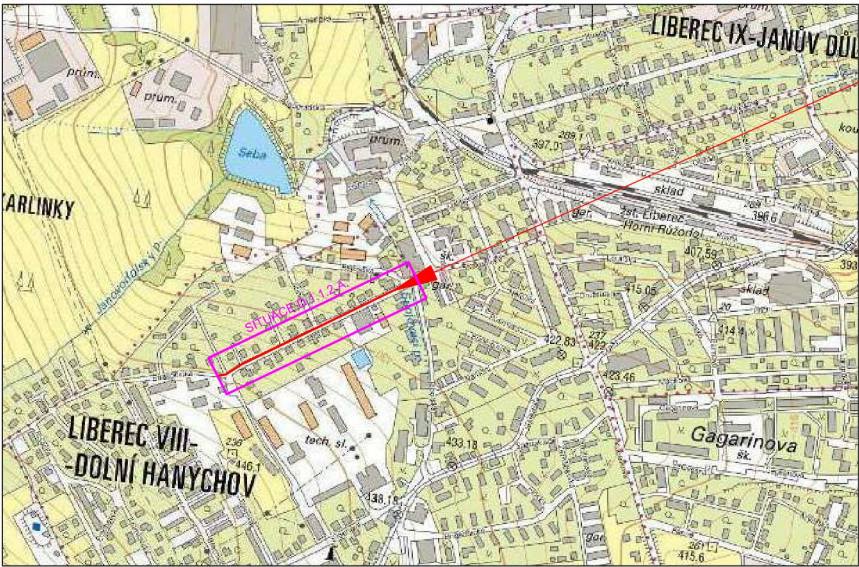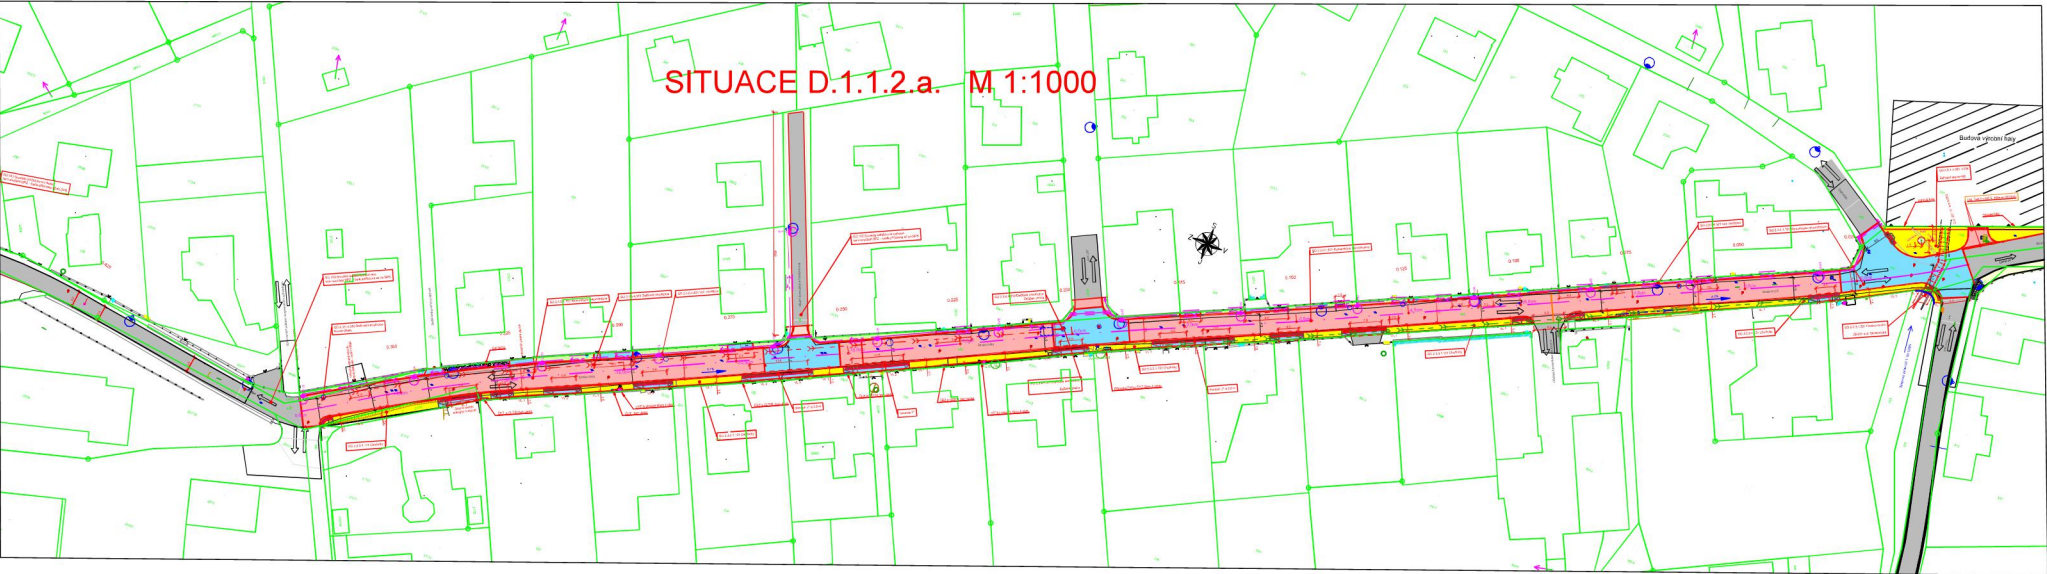


**ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ**




|                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investor :                         | Statutární město Liberec<br>Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec                                                |
| Zpracovatel projektu :             | Jan Maděra<br>Oblačná 266, 460 01 Liberec , IČO : 460 340 13,IDS : z3j48q8                                      |
| Zpracovatel vodohosp. části:       | SNOWPLAN s r.o.<br>Ing. Petr Kořínek<br>Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III, IČO : 274 97 763, IDDCS : ure273h |
| Zpracovatel projektu mostní části: | RAL spol. s r.o.<br>Ing. Radka Louthanová<br>Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou IČO: 018 79 570    |

|                                                                                               |                                        |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zodp. projektant komunikace a HIP :                                                           | Jan Maděra                             | kancelář: Kateřinská 118<br>463 03 Stráž nad Nisou<br>tel. +420 608 000 649<br>jan.madera@email.cz |
| zodp. projektant osvětlení:                                                                   | Ing. Jan Kadlec                        |                                                                                                    |
| zodp. projektant kanalizace :                                                                 | Ing. Petr Kořínek                      |                                                                                                    |
| zodpovědný projektant mostu :                                                                 | Ing. Radka Louthanová                  |                                                                                                    |
| vypracoval :                                                                                  | Jan Maděra                             |                                                                                                    |
| kreslil:                                                                                      | Ing. Petr Dostál                       |                                                                                                    |
| Název akce:<br><b>Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Strakonická-Bajkalská</b><br>Revize 09/2025 |                                        | Čísł zak.: 01012025                                                                                |
| Lokalita:                                                                                     | K.Ú. Dolní Hanychov (682268) - Liberec | Datum: 09/2025                                                                                     |
| Obsah:                                                                                        | Situační výkres širších vztahů         | Měřtko: 1:8000/1000                                                                                |
|                                                                                               |                                        | Stupeň: DPZ                                                                                        |
|                                                                                               |                                        | Příloha: C.1.                                                                                      |
|                                                                                               |                                        | Paré č.:                                                                                           |









|                                                              |                      |                       |                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Investor:<br><b>CETIN</b>                                    |                      |                       |                              |
| Vypracoval:<br><b>Jiří Kapras</b>                            | Formát:<br><b>A4</b> | Stupeň:<br><b>CTN</b> |                              |
| Měřítko:<br>bez                                              |                      |                       |                              |
| Název stavby:<br><b>VPI Liberec, Strakonická - Bajkalská</b> |                      |                       |                              |
| Název přílohy:<br><b>POLOHOPIS</b>                           |                      |                       | Číslo přílohy:<br><b>P 1</b> |

**Název stavby: VPI Liberec, Strakonická - Bajkalská**

## Rekapitulace nákladů:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| PŘÍPRAVA                            | 17 946,93 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE                         | 27 205,50 Kč |
| MONTÁŽ                              | 32 874,31 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA           | 0,00 Kč      |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE          | 7 713,33 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA              | 0,00 Kč      |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE             | 0,00 Kč      |
| PROVOZNÍ PRÁCE                      | 0,00 Kč      |
| MATERIÁL DOD. CETIN                 | 0,00 Kč      |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ                   | 0,00 Kč      |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný   | 18 890,55 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč      |
| POPLATKY                            | 0,00 Kč      |

Celkové náklady: 104 630,62 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 86 683,69 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 17 946,93 Kč

## Seznam položek

| Číslo SAP          | Stavební činnost                                       | Název položky | Množství   | Celková cena |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| <b>PŘÍPRAVA</b>    |                                                        |               |            |              |
| 958084             | Návrh cenový a technický                               |               | 1.00 ks    | 16 359,00 Kč |
| 957746             | Šetření technické rozšířené                            |               | 1.00 ks    | 1 587,93 Kč  |
| <b>ZEMNÍ PRÁCE</b> |                                                        |               |            |              |
| 954970 S           | Pokládka PE nebo vrapované chráničky                   |               | 9.00 m     | 273,42 Kč    |
| 958554 S           | Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti                   |               | 1.00 ks    | 7 451,34 Kč  |
| 955265 S           | Práce zemní pro podzemní tratě síťové - kvalifikovaná  |               | 4.00 hod.  | 3 134,04 Kč  |
| 952345 S           | Rýha v trávě 35/70-100                                 |               | 30.00 m    | 16 346,70 Kč |
| <b>MONTÁŽ</b>      |                                                        |               |            |              |
| 952649 S           | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka         |               | 10.00 ks   | 2 300,10 Kč  |
| 952643 S           | Měření střídavé během stavby - první čtyřka            |               | 10.00 ks   | 1 233,70 Kč  |
| 954999 S           | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování               |               | 30.00 ks   | 1 059,00 Kč  |
| 955268 S           | Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná |               | 5.00 hod.  | 3 917,55 Kč  |
|                    | Koordinace se stavbou                                  |               |            |              |
| 955282 S           | Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek                |               | 2.00 ks    | 4 929,84 Kč  |
| 958469 S           | Uvedení stavby do provozu                              |               | 5416.92 JV | 5 416,92 Kč  |
| 955630 S           | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě             |               | 3.00 ks    | 4 715,82 Kč  |

|                            |                                         |          |             |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------|
| 958555 S                   | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m | 1.00 ks  | 3 921,24 Kč |
| 955109 S                   | Zrušení objektu samost. SIS do 50 čtyř. | 2.00 ks  | 2 081,16 Kč |
| 955081 S                   | Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. | 30.00 ks | 745,50 Kč   |
| 955083 S                   | Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči     | 12.00 ks | 2 553,48 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE |                                         |          |             |
| 956284 S                   | Zaměření trasy pro stavbu do 100m       | 1.00 ks  | 7 713,33 Kč |

#### Limitka materiálu

| Číslo SAP                          | Stavební činnost                          | Název položky | Množství   | Celková cena |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný  |                                           |               |            |              |
| 303918 S                           | Deska krycí plast. 300x1000 mm            |               | 30.00 ks   | 1 338,60 Kč  |
| 303813 S                           | Fólie výstražná 330mm PE oranžová         |               | 30.00 m    | 143,70 Kč    |
| 320879 S                           | Materiál pro tratě síťové                 |               | 3690.00 ks | 3 690,00 Kč  |
| 302550 S                           | Mini Marker 1401 3M Ball                  |               | 2.00 ks    | 532,66 Kč    |
| 312425 S                           | Modul konektor. 9700-10P                  |               | 6.00 ks    | 161,88 Kč    |
| 410636 S                           | Souprava čistící metallic. kabelů - velká |               | 1.00 ks    | 500,21 Kč    |
| 320312 S                           | Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15    |               | 10.00 ks   | 1 643,00 Kč  |
| 312889 S                           | Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE   |               | 2.00 ks    | 1 622,74 Kč  |
| 319209 S                           | Trubka dělená SYSPRO 160/110              |               | 16.00 m    | 9 257,76 Kč  |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkázovaný |                                           |               |            |              |
| 304267 S                           | Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá    |               | 2.00 ks    | 0,00 Kč      |
| 301685 S                           | Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda     |               | 2.00 ks    | 0,00 Kč      |
