

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. VPI/VY/2026/015/ha**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Kraj Vysočina**

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Evou Hájkovou, specialistou pro výstavbu sítě – překládky SEK

(„**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

ID DS: ksab3eu

zastoupená Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem; k podpisu smlouvy pověřen Ing. Vladimír  
Novotný, náměstek hejtmána

(„**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích tuto

**Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(„Smlouva“)**

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** znamená cenový a technický návrh provedení Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Faktura** znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

**GDPR** znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

**Občanský zákoník** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

**Projekt** znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

**Překládka** znamená stavbu v k.ú. Dolní Cerekev spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Příprava Překládky** znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**SEK** znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Stavba** znamená stavbu pod označením „II/639 úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

**Stavební připravenost** znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelety;

**Stavební zákon** znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

**Vedení a zařízení společnosti CETIN** znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

**Vyjádření o poloze sítě** znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne **5. 1. 2026** vydané pod č.j. **339628/25**, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

**Zákon o elektronických komunikacích** znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;

**Zákon o registru smluv** znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

**Zákon o vyvlastnění** znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

**ZDPH** znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Rohozná JI II\_639 úpr.křižovatky**“.

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## **3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY**

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v CTN.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
  - a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
  - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společností CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích, vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a Zákona o elektronických komunikacích nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno;
  - c) jsou zajištěny zemní práce související s Překládkou včetně zřízení kabelového lože;
  - d) společnosti CETIN byla doručena písemná výzva k převzetí výkopu a předání staveniště, včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, a to minimálně s 7 denním předstihem před počátkem realizace Překládky.
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5. Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

## **4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN**

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
  - a) před realizací Překládky:
    - (i) zajistit zpracování Projektu,
    - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

- b) po realizaci Překládky:
- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
  - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
  - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

#### 4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:

- a) zajistit rozhodnutí o povolení záměru o umístění stavby Překládky, přičemž stavba Překládky bude v žádosti o vydání povolení označena jako stavební objekt „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- b) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
- c) zajistit zemní práce související s Překládkou včetně zřízení kabelového lože;
- d) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však sedm (7) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“);
- e) písemně vyzvat společnost CETIN k převzetí výkopu a předání staveniště, včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, a to minimálně s sedmi (7) denním předstihem před počátkem realizace Překládky.

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru předat společnosti CETIN toto rozhodnutí včetně grafické a dokladové části, a to zasláním na email kontaktní osobě ve věcech smluvních dle odst. 8.1. Smlouvy.

#### 4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

- a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1. písm. a) Smlouvy;
- c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.

#### 4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

#### 4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

#### 4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena

z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodloužení Stavebníka.

- 4.7. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **440.395,- Kč** (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc tři sta devadesát pět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě („**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- f) náklady na identifikaci parcel,
- g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, a které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,
- i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,

- k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
  - l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
  - m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5. Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu, se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3. a/nebo odst. 5.5. Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **40.265,- Kč** (slovy: čtyřicet tisíc dvě stě šedesát pět korun českých) bude společností CETIN vystavena po předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
  - b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou po ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: faktury@kr-vysocina.cz. Daňový doklad zasláný na adresu elektronické pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečně vzniklé škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Eva Hájková  
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK  
e-mail: e.hajkova@cetin.cz, tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Macho  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: petr.macho@novaoptika.cz, tel.: 720 758 105

- 8.2. Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Novotný  
funkce: náměstek hejtmana  
e-mail: novotny.v@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 144

ve věcech technických: Tomáš Pípal  
funkce: úředník ODSH  
e-mail: pipal.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 386

- 8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

## 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Smlouvu lze zrušit:

- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
- (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:

- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
- b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

- 9.4. Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 20 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.

- 9.5. Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6. Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1. Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva.
- 10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.
- 10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností

ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona o registru smluv. Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.
- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
  - datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
  - e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
  - e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu [contract\\_termination@cetin.cz](mailto:contract_termination@cetin.cz).

- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
  - b) § 1767 odst. 2;
  - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
  - d) § 1743;
  - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv a základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

- 12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.13. Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.
- 12.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

**Příloha č. 1 - CTN**

V Brně dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za CETIN:

Za Stavebníka:

\_\_\_\_\_  
Eva Hájková  
specialista pro výstavbu sítě – překládky  
SEK  
CETIN a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Novotný  
2. náměstek hejtmana  
Kraj Vysočina

## **Technická zpráva**

**Název:** VPIC Rohozná JI II\_639 úpr.křižovatky

### **Popis zadání:**

Akce řeší stranové přeložení metalického kabelu a síťového rozvaděče z úpravy stávající křižovatky nedaleko obce Rohozná u Dolní Cerekve.

### **Navrhované řešení:**


Dojde ke stranovému posunu stávajícího rozvaděče BATE14 mimo nově budovaný propustek. Nový rozvaděč bude posunut k budoucímu vjezdu na pole a bude umístěn na stávající trasu SEK CETIN. Stávající kabel a HDPE trubky budou odkopány a zkráceny. Na rezervním kabelu TCEPKPFLEZE 100xn0,8 a trubkách HDPE40 B a Z bude provedena montáž nových koncovek u nově postaveného rozvaděče. Do nového výkopu bude položen nový kabel TCEPKPFLE 25xn0,8 z BATE14 do místa přepojení za stávající komunikací, kde se provede montáž nové spojky. Pod stávající komunikací bude proveden nový řízený podvrst, do kterého bude zatažena PE chránička o pr.125mm. V druhé části překládky bude podél budoucí komunikace položen do nového výkopu nový kabel TCEPKPFLE 25xn0,8. Pod budoucí komunikací a budoucím vjezdem na pole budou položeny dvě PE chráničky o pr.110mm. Do jedné chráničky bude zatažen nový kabel, druhá chránička bude sloužit jako rezervní. Na obou koncích přeložky bude provedena montáž nových spojek a nový kabel bude napojen na stávající trasu SEK. Zemní práce je nutné koordinovat s hlavním zhotovitelem stavby. Je třeba určit budoucí niveletu vozovky a přilehlých příkopů. Po dokončení přeložky, bude odpojený kabel zrušen stavbou.

### **Na akci není nutná PEW.**

ÚR - Ne (zajistí investor)  
PD - Ano  
GEO - Ano  
GP - Ano  
VBŘ - Ano

**Investor:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, 58601

**Projektant:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
Ing. Roman Fišer  
mob: +420 730 896 239

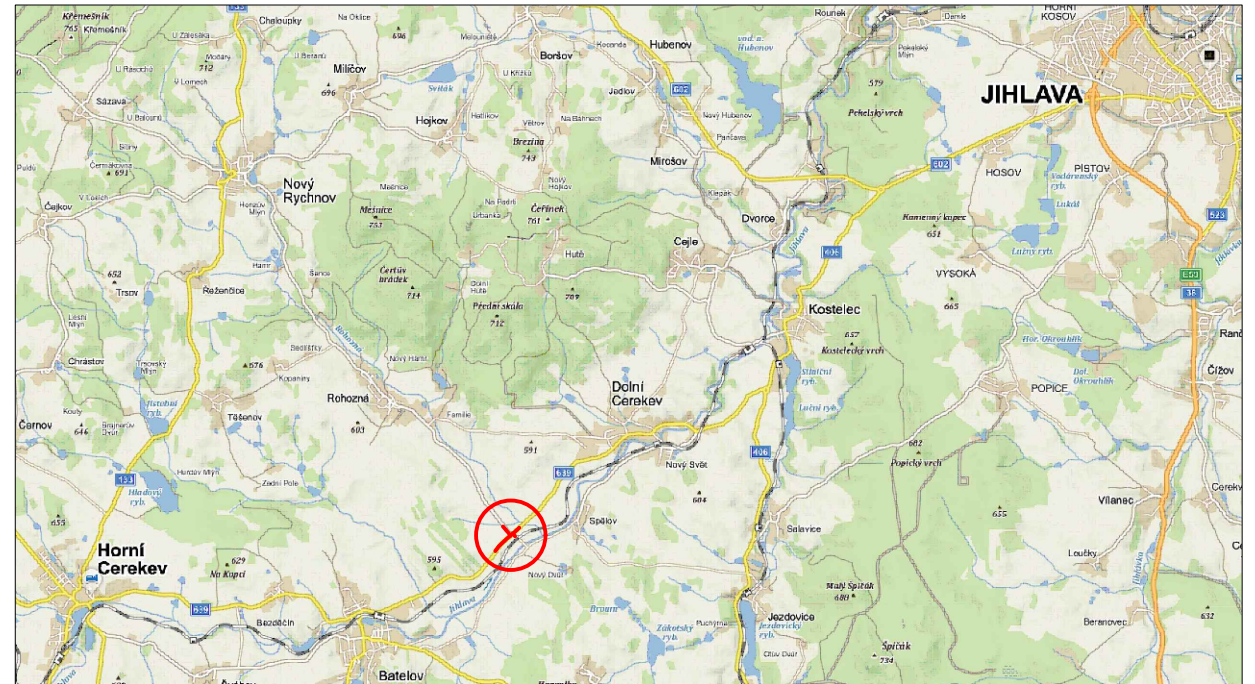

AUTORDSPACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

### II/639 úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná

název akce

stavební objekt

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 000 90 450  
objednatel

.  
. .  
. .  
spolupráce

k.ú. Dolní Cerekev  
místo stavby

Kraj Vysočina  
kraj

**DTIK**  
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677  
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

### SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

výkres

1:10 000  
měřítko

DPS+PDPS  
stupeň


ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>Burianec</i>	ING. R. FIŠER hlavní inženýr projektu	<i>Fišer</i>	A034/25 číslo zakázky	<b>C.1.</b> číslo přílohy
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant	<i>Burianec</i>	ING. R. FIŠER vypracoval	<i>Fišer</i>	12/2025 datum	

Souřadnicový systém JTSK	Výškový systém BPV	RSGeo-pro s.r.o. Geodetické a kartografické práce Vošvinská 16, Praha 2, 120 00 tel: 775 603 456 www.rsgo.cz
Zaměřil Ing. Lukáš Vais Ing. Roman Šulc	Vyhotovil Ing. Lukáš Vais Ing. Roman Šulc	
Zadavatel: DIK – Dopravní inženýrská kancelář Bozděchova 1668, Hradec Králové, 500 02		
Akce: Palohopisné a výškopisné zaměření lokality křižovatek silnic II/639, III/1333 a II/639, III/0339, k.ú. Horní Cerekev		
Výkres: Výkres situace	Č. výkresu: 01	
Datum zaměření: 6.10.2018		Měřítko 1:500/1000

### LEGENDA SÍTÍ

	NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU (Cetín) – (ochranné pásmo 1,0m od osy)
	ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH OPT. A METAL. KABELU (Cetín) – (ochranné pásmo 1,0m od osy)
	Plynovod VII (ocel 150) – GasNet, s.r.o. (ochranné pásmo 4,0m od osy)
	Vn – Nadzemní (EON) – (ochranné pásmo 7,0m od osy)
	Neprovozovaná síť (Cetín)

Průběh podzemních inženýrských sítí je zakreslen pouze informativně, podle vyjádření jejich správců. Před zahájením stavebních prací je nutné požádat správce o jejich přesné výtčeni. V místech předpokládané kolize stavby s podzemními sítěmi, bude jejich hloubka uložení ověřena ručně kopanými sondami. O výše uvedeném bude proveden zápis do stavebního deníku.

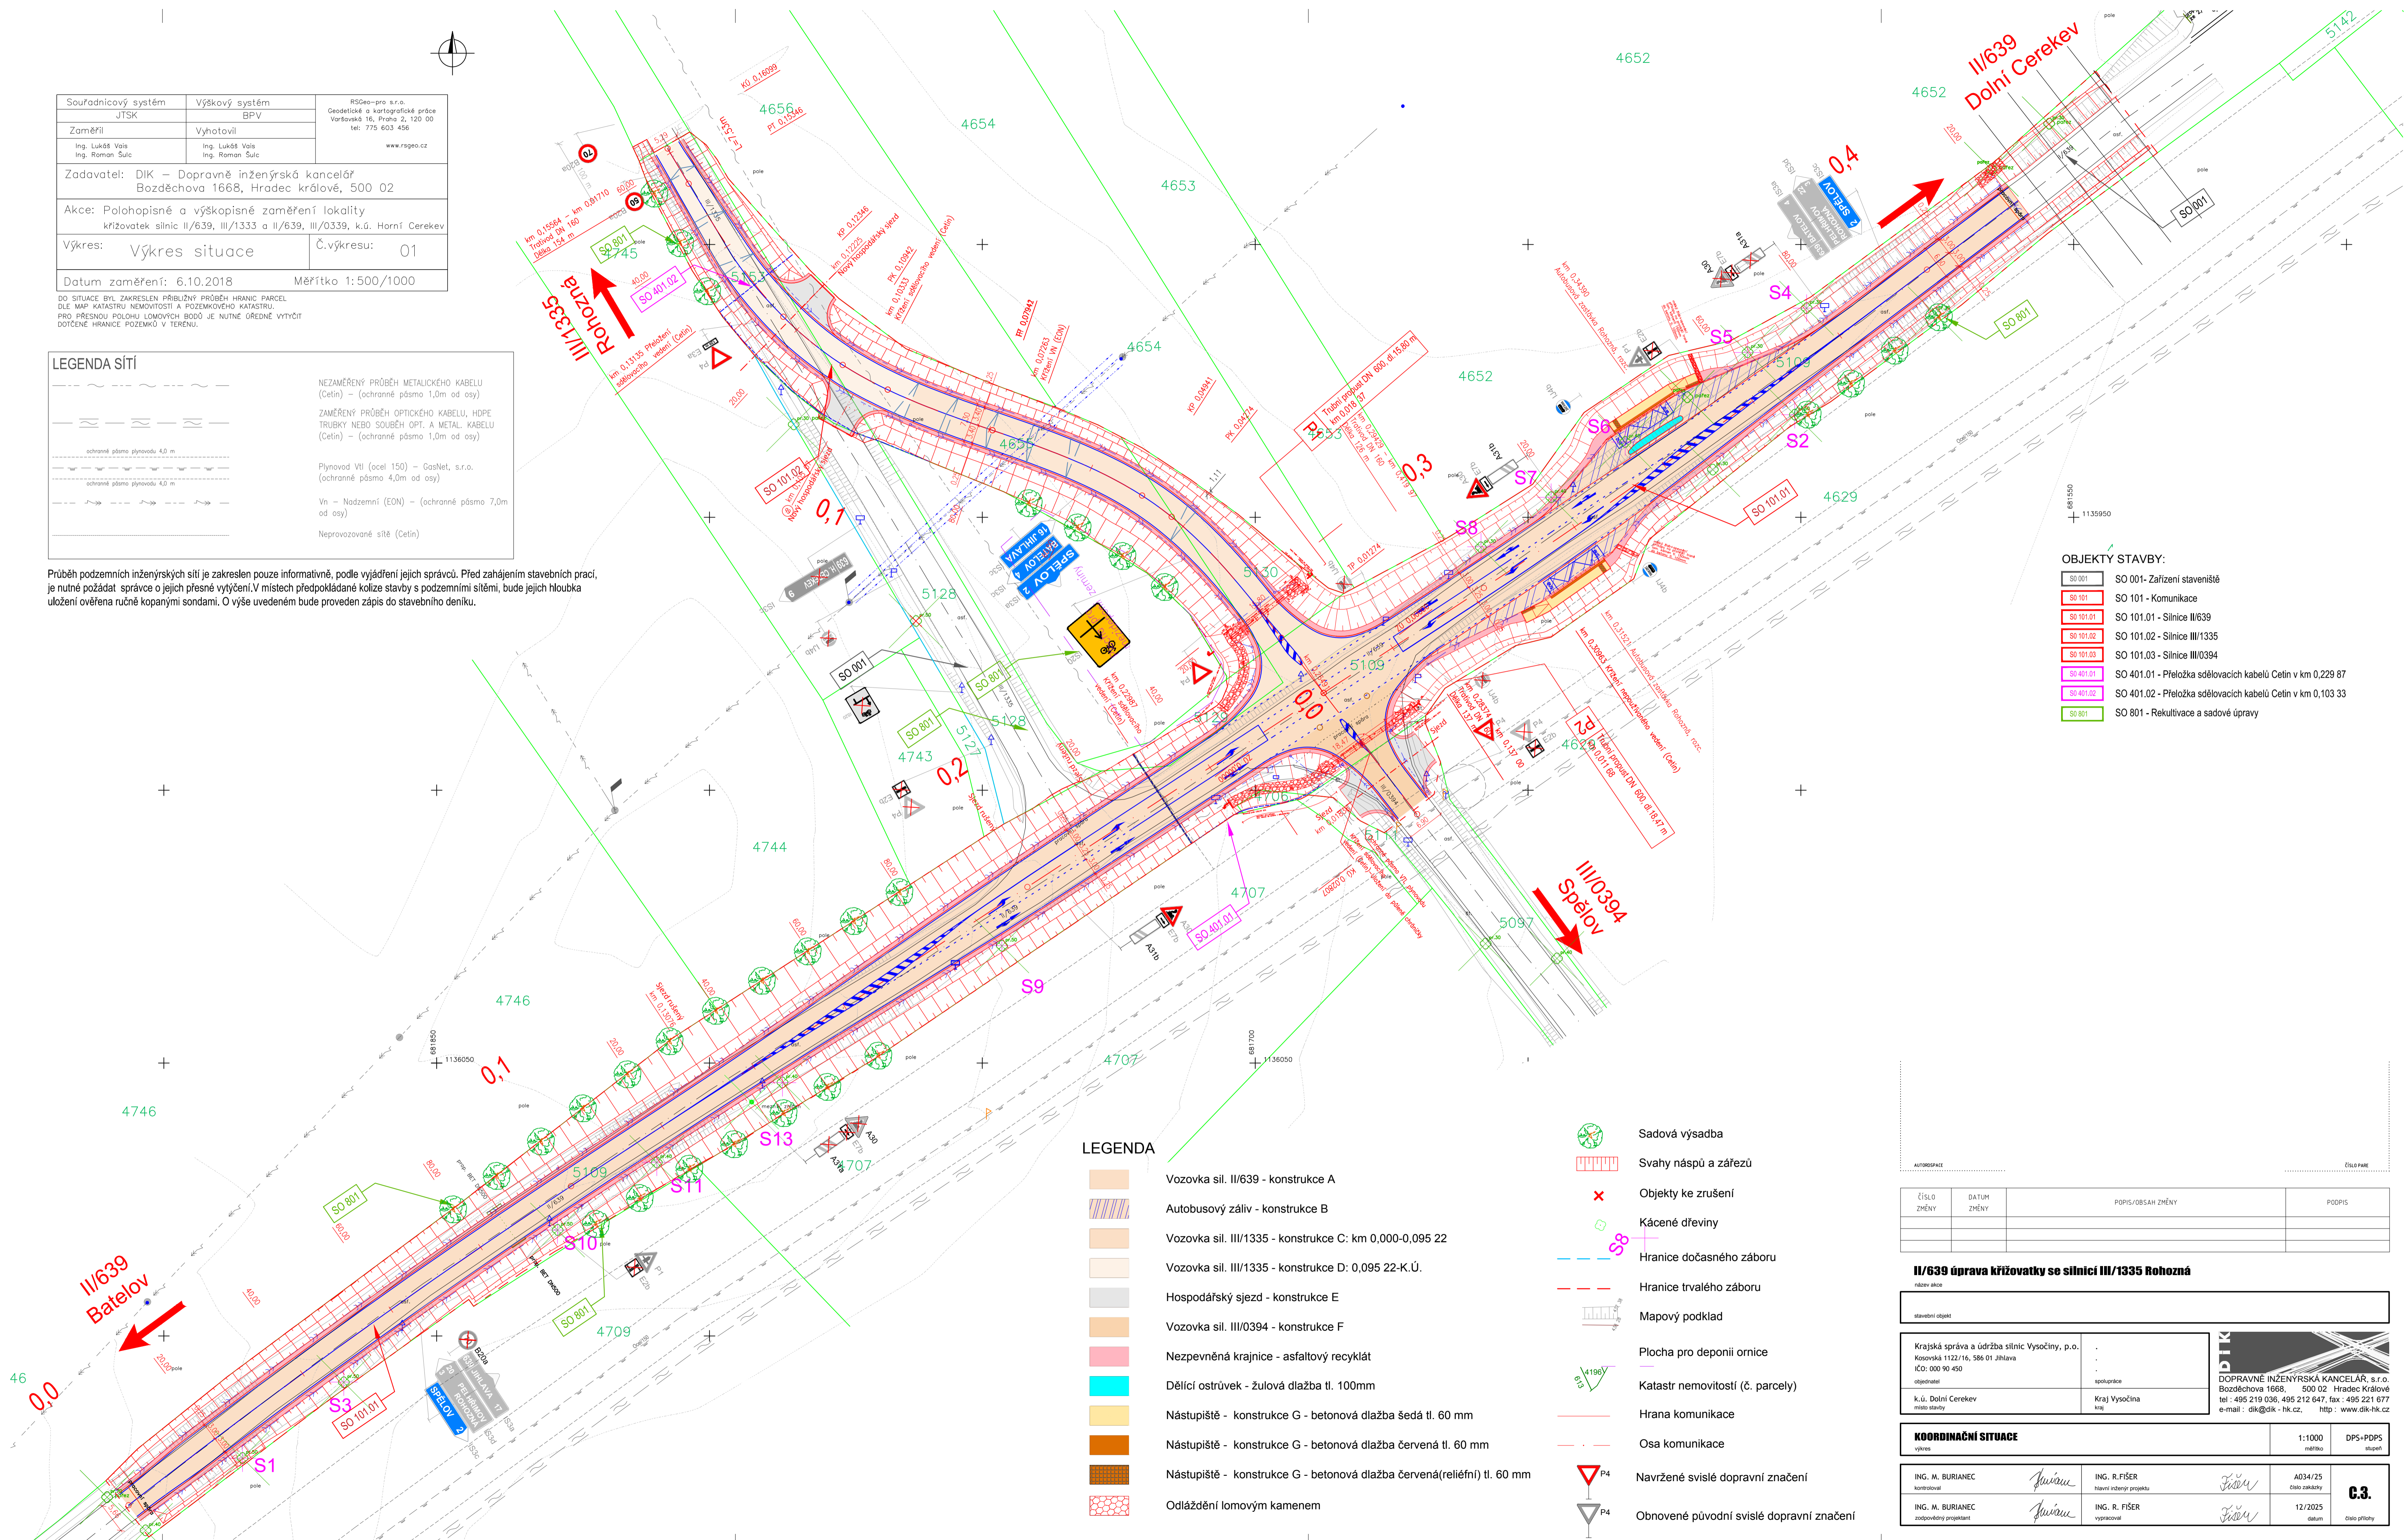

### OBJEKTY STAVBY:

	SO 001 - Zařízení staveniště
	SO 101 - Komunikace
	SO 101.01 - Silnice II/639
	SO 101.02 - Silnice III/1335
	SO 101.03 - Silnice III/0394
	SO 401.01 - Přeložka sdělovacích kabelů Cetín v km 0,229 87
	SO 401.02 - Přeložka sdělovacích kabelů Cetín v km 0,103 33
	SO 801 - Rekulтивace a sadové úpravy

### LEGENDA

	Vozovka sil. II/639 - konstrukce A
	Autobusový záliv - konstrukce B
	Vozovka sil. III/1335 - konstrukce C: km 0,000-0,095 22
	Vozovka sil. III/1335 - konstrukce D: 0,095 22-K.Ú.
	Hospodářský sjezd - konstrukce E
	Vozovka sil. III/0394 - konstrukce F
	Nezpevněná krajnice - asfaltový recyklát
	Dělicí ostrůvek - žulová dlažba tl. 100mm
	Nástupiště - konstrukce G - betonová dlažba šedá tl. 60 mm
	Nástupiště - konstrukce G - betonová dlažba červená tl. 60 mm
	Nástupiště - konstrukce G - betonová dlažba červená (reliefní) tl. 60 mm
	Odláždění lomovým kamenem

	Sadová výsadba
	Svahy náspů a zářezů
	Objekty ke zrušení
	Kácené dřeviny
	Hranice dočasného záboru
	Hranice trvalého záboru
	Mapový podklad
	Plocha pro deponii ornice
	Katastr nemovitostí (č. parcely)
	Hrana komunikace
	Osa komunikace
	Navržené svislé dopravní značení
	Obnovené původní svislé dopravní značení

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

### II/639 úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná

název akce	
stavební objekt	

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 000 90 450	
objednatel k.ú. Dolní Cerekev místní stavby	spolupřítel Kraj Vysočina Hrg

<b>KOORDINAČNÍ SITUACE</b>		1:1000	DPS+PDPS
výkres		měřítko	stupně
ING. M. BURIANEK kontroloval	ING. R. FIŠER hlavní inženýr projektu	A034/25 číslo zakázky	<b>C.3.</b>
ING. M. BURIANEK zodpovědný projektant	ING. R. FIŠER vypracoval	12/2025 datum	


SITUACE PŘELOŽENÍ DATOVÝCH KABELŮ  
MĚŘÍTKON 1:250

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ POLOHA KABELU
	NAVRHOVANÁ POLOHA KABELU

OBJEKTY STAVBY:

- SO 401.01 - Přeložka sdělovacích kabelů Cetin v km 0,229 87
- SO 401.02 - Přeložka sdělovacích kabelů Cetin v km 0,088 24

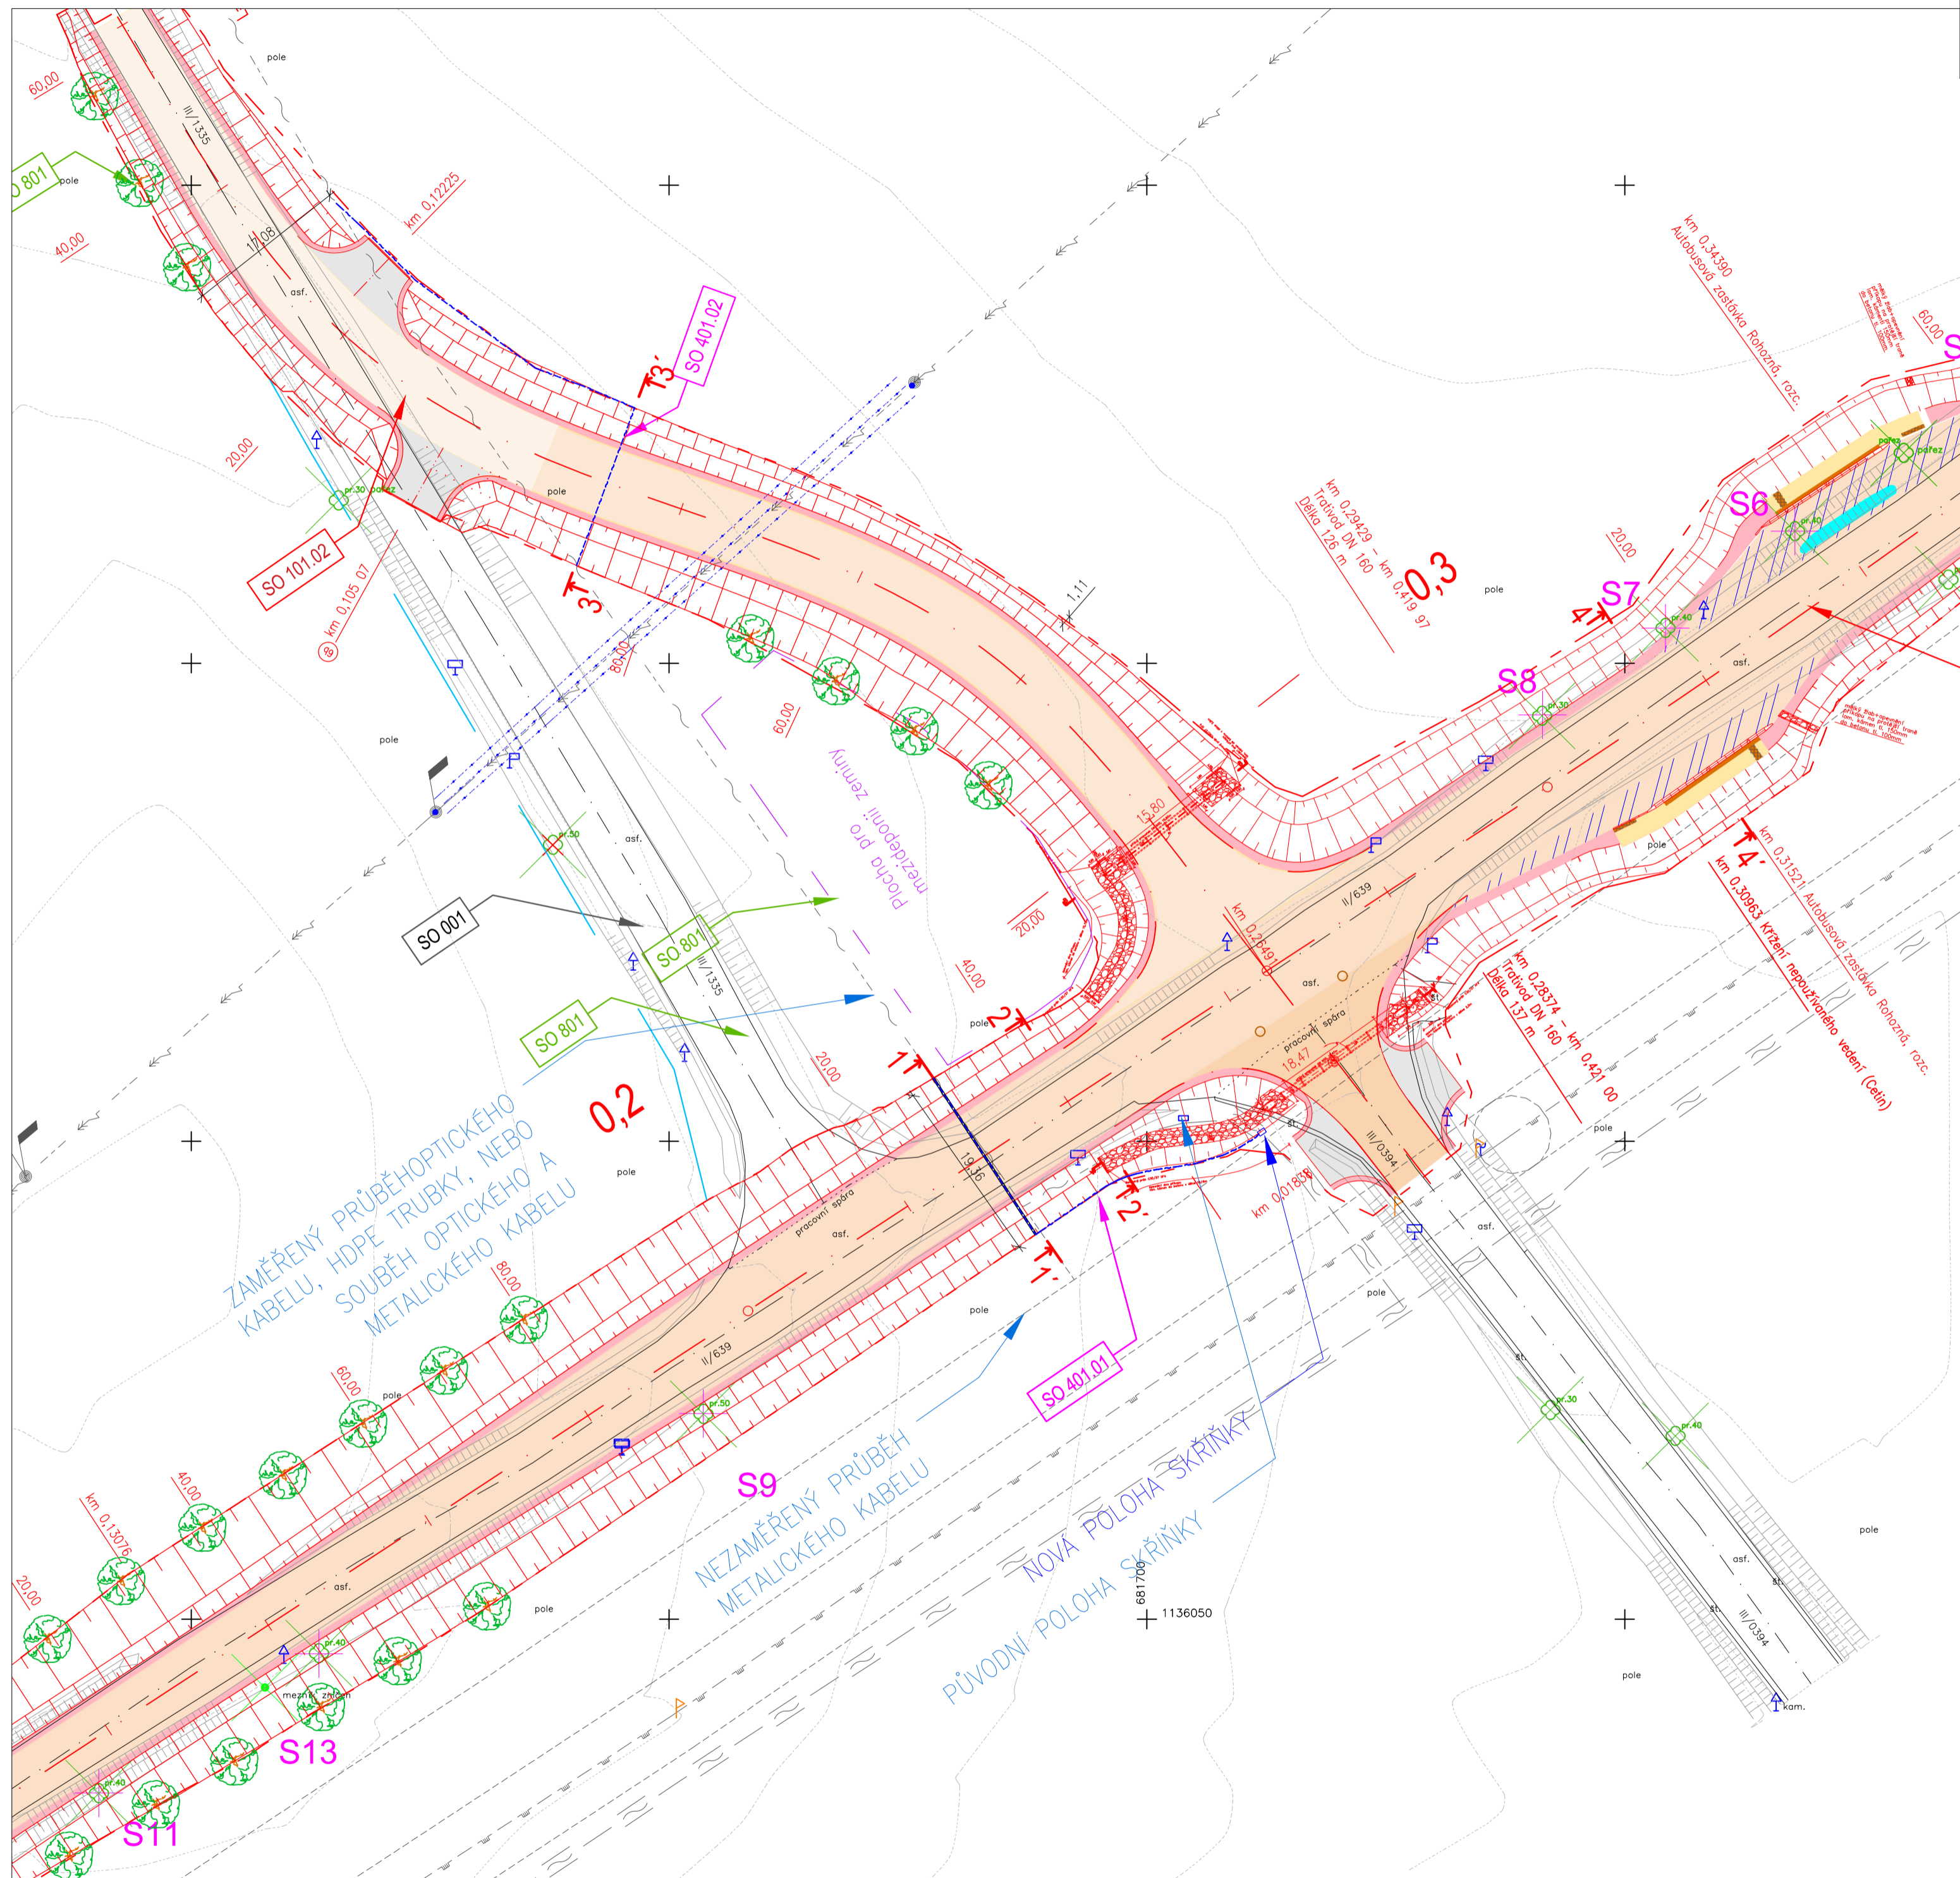

- Odláždění lomovým kamenem
- Hrana komunikace
- Osa komunikace
- Podélný trativod
- Sklonové poměry
- Sadová výsadba
- Svahy náspů a zářezů
- Příčný sklon
- Hranice stavby
- Mapový podklad
- Katastr nemovitostí (č. parcely)

LEGENDA SÍTĚ





	NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU (Cetin) - (ochranné pásmo 1,0m od osy)
	ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH OPT. A METAL. KABELU (Cetin) - (ochranné pásmo 1,0m od osy)
	Ochranné pásmo plynovodu 4,0 m
	Ochranné pásmo plynovodu 4,0 m
	Vn - Nadzemní (EON) - (ochranné pásmo 7,0m od osy)
	Neprazdované sítě (Cetin)

PRO ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU JE NAVRŽENA ÚPRAVA NIVELETY SILNICE II/639 A PŘELOŽENÍ SILNICE III/1335, TAK, ABY VZNIKLA PRŮSEČNÁ KŘÍŽOVATKA. TATO ÚPRAVA VVOLÁ NUTNOST VÝŠKOVÉHO A SMĚROVÉHO PŘELOŽENÍ DATOVÝCH KABELŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI CETIN. Navržené úpravy vyvolá:

- SO 401.01 - Přeložka sdělovacích kabelů Cetin v km 0,229 87**
  - a) Nezaměřený průběh metalického kabelu: Výškové a směrové přeložení pod silnicí II/639 - Původní délka ( 35,43m) - Nová délka (46,21 m)
  - b) Nezaměřený průběh opt. kabelu, HDPE trubky, nebo souběh opt. a metal kabelu: Posunem skříňe datových kabelů bude zkrácen o 8,6m
  - c) Přeložení skříňe datových kabelů o 8,0m do nové polohy.
- SO 401.02 - Přeložka sdělovacích kabelů Cetin v km 0,088 24**
  - d) Nezaměřený průběh metalického kabelu: Směrové a výškové přeložení datového kabelu pod silnicí III/1335 - Původní délka ( 45,50 m) - Nová délka (55,50 m)

LEGENDA

- Vozovka sil. II/639 - konstrukce A
- Autobusový záliv - konstrukce B
- Vozovka sil. III/1335 - konstrukce C: km 0,000-0,095 22
- Vozovka sil. III/1335 - konstrukce D: 0,095 22-K.Ú.
- Hospodářský sjezd - konstrukce E
- Vozovka sil. III/0394 - konstrukce F
- Nezpevněná krajnice - asfaltový recyklát
- Dělicí ostrůvek - žulová dlažba tl. 100mm
- Nástupiště - konstrukce G - betonová dlažba šedá tl. 60 mm
- Nástupiště - konstrukce G - betonová dlažba červená tl. 60 mm
- Nástupiště - konstrukce G - betonová dlažba červená (reliéfní) tl. 60 mm

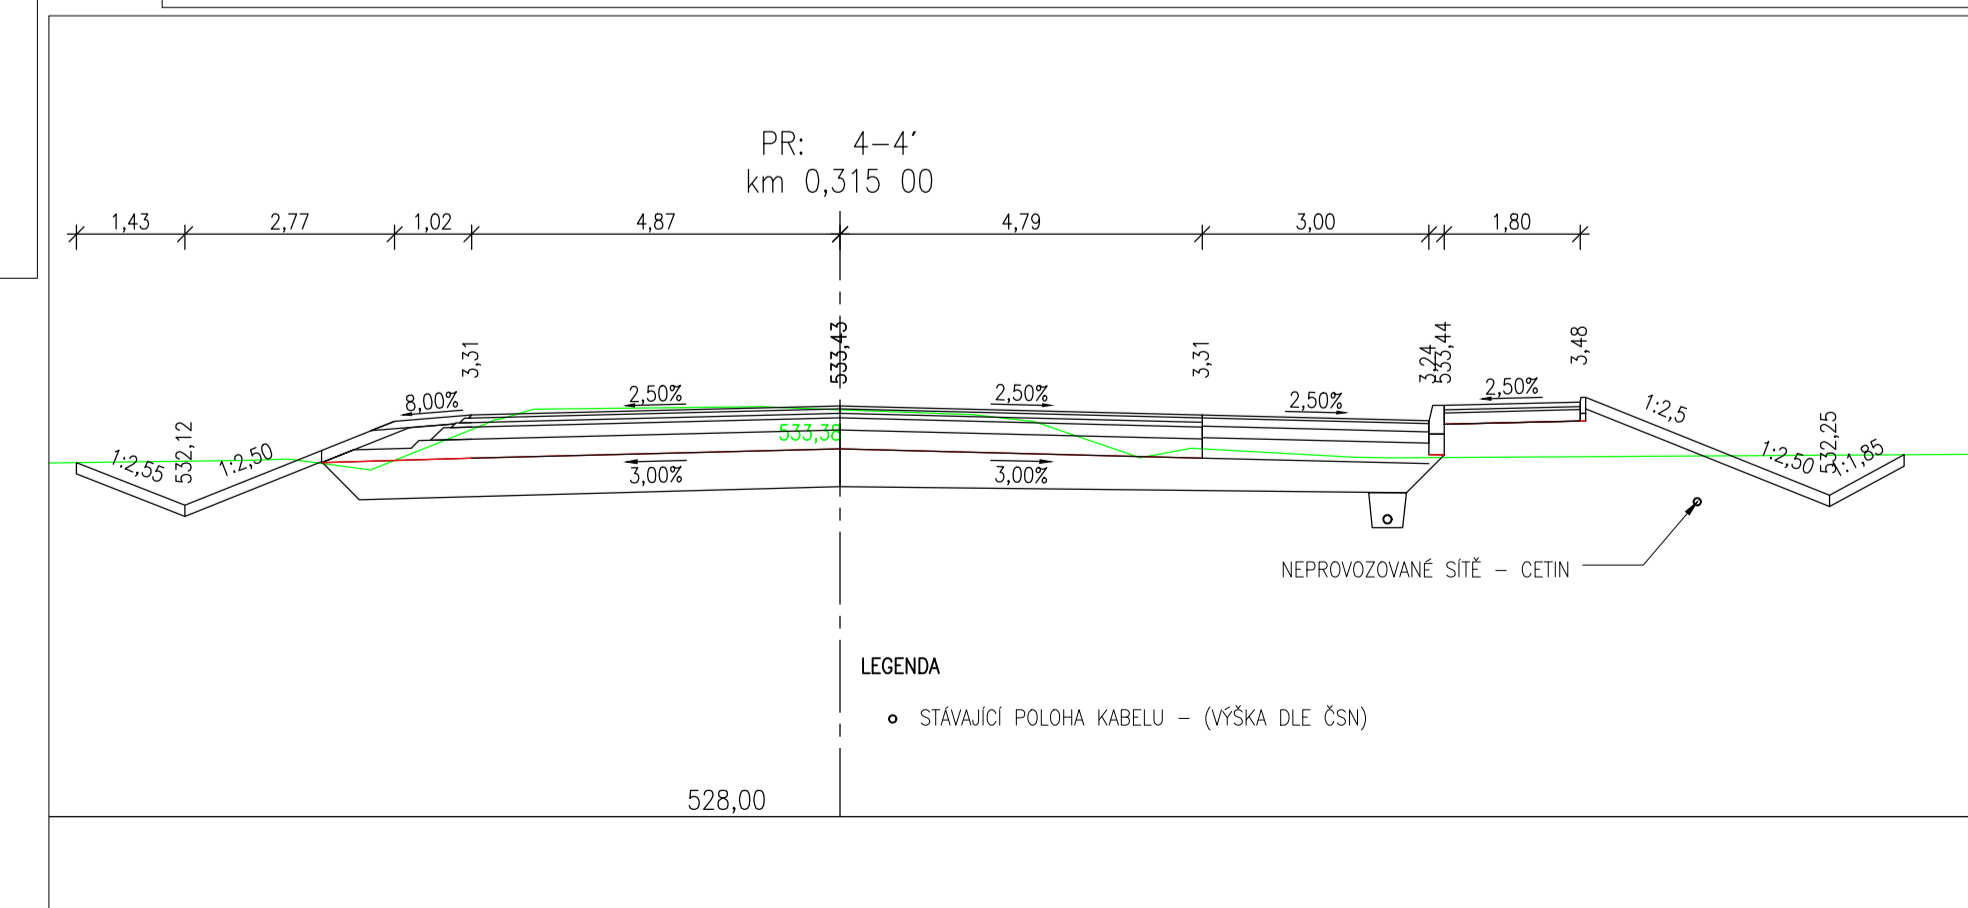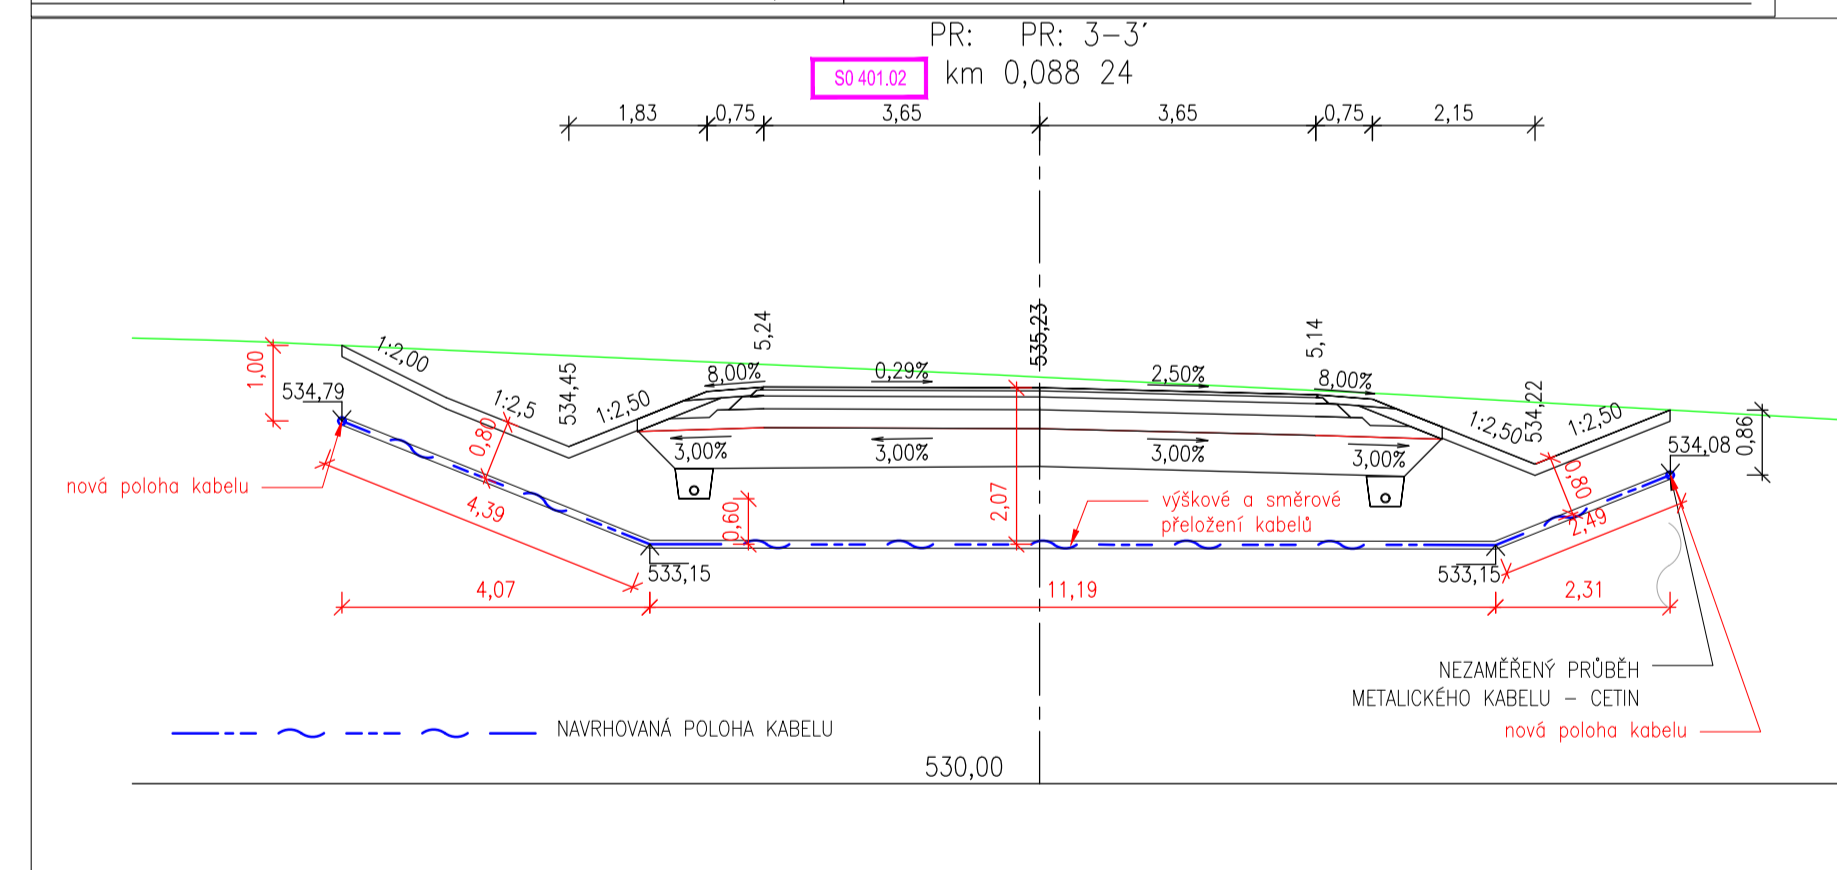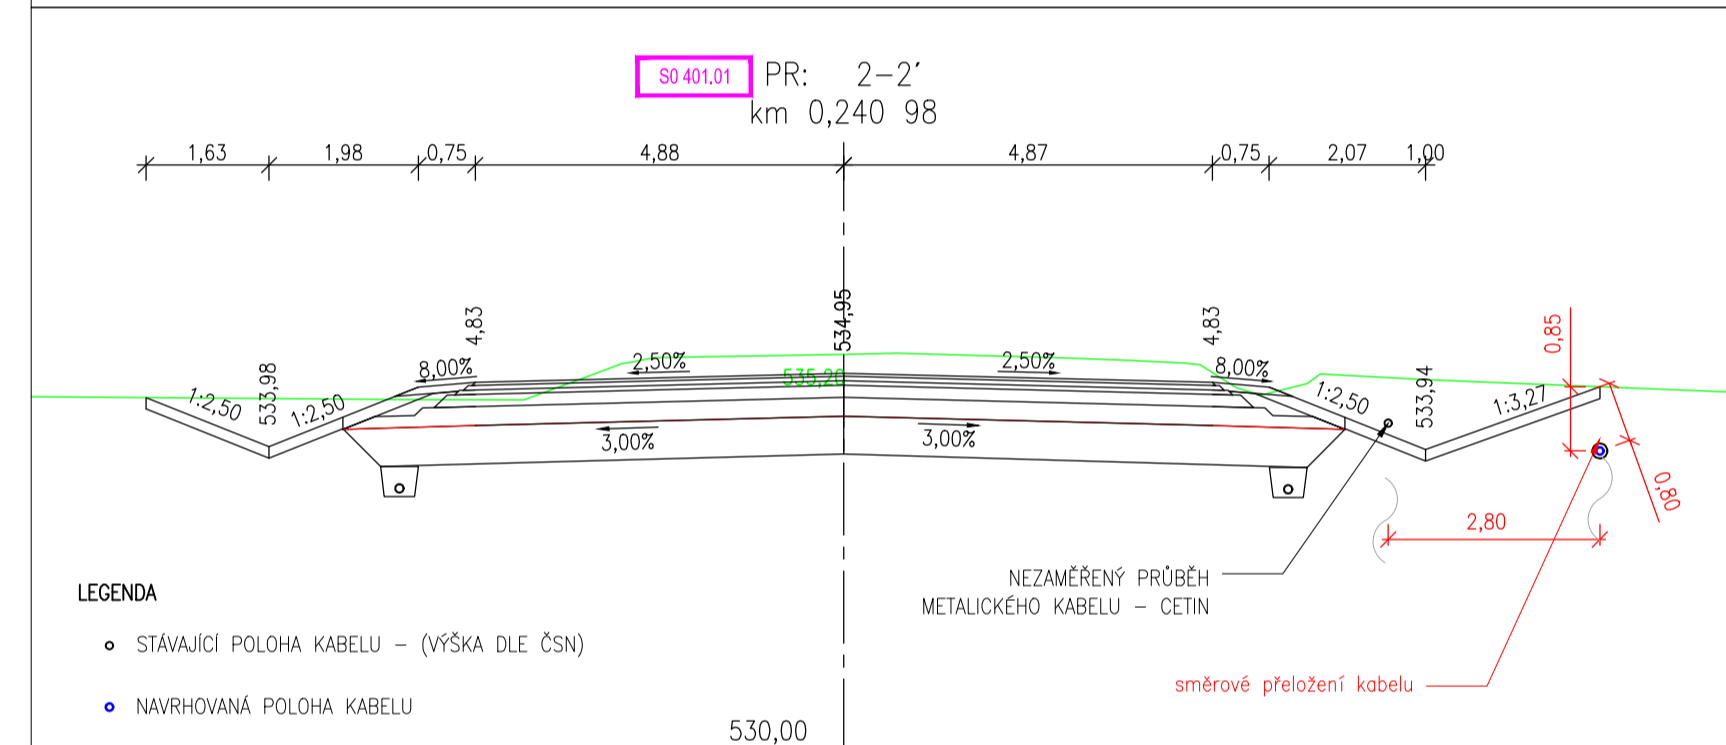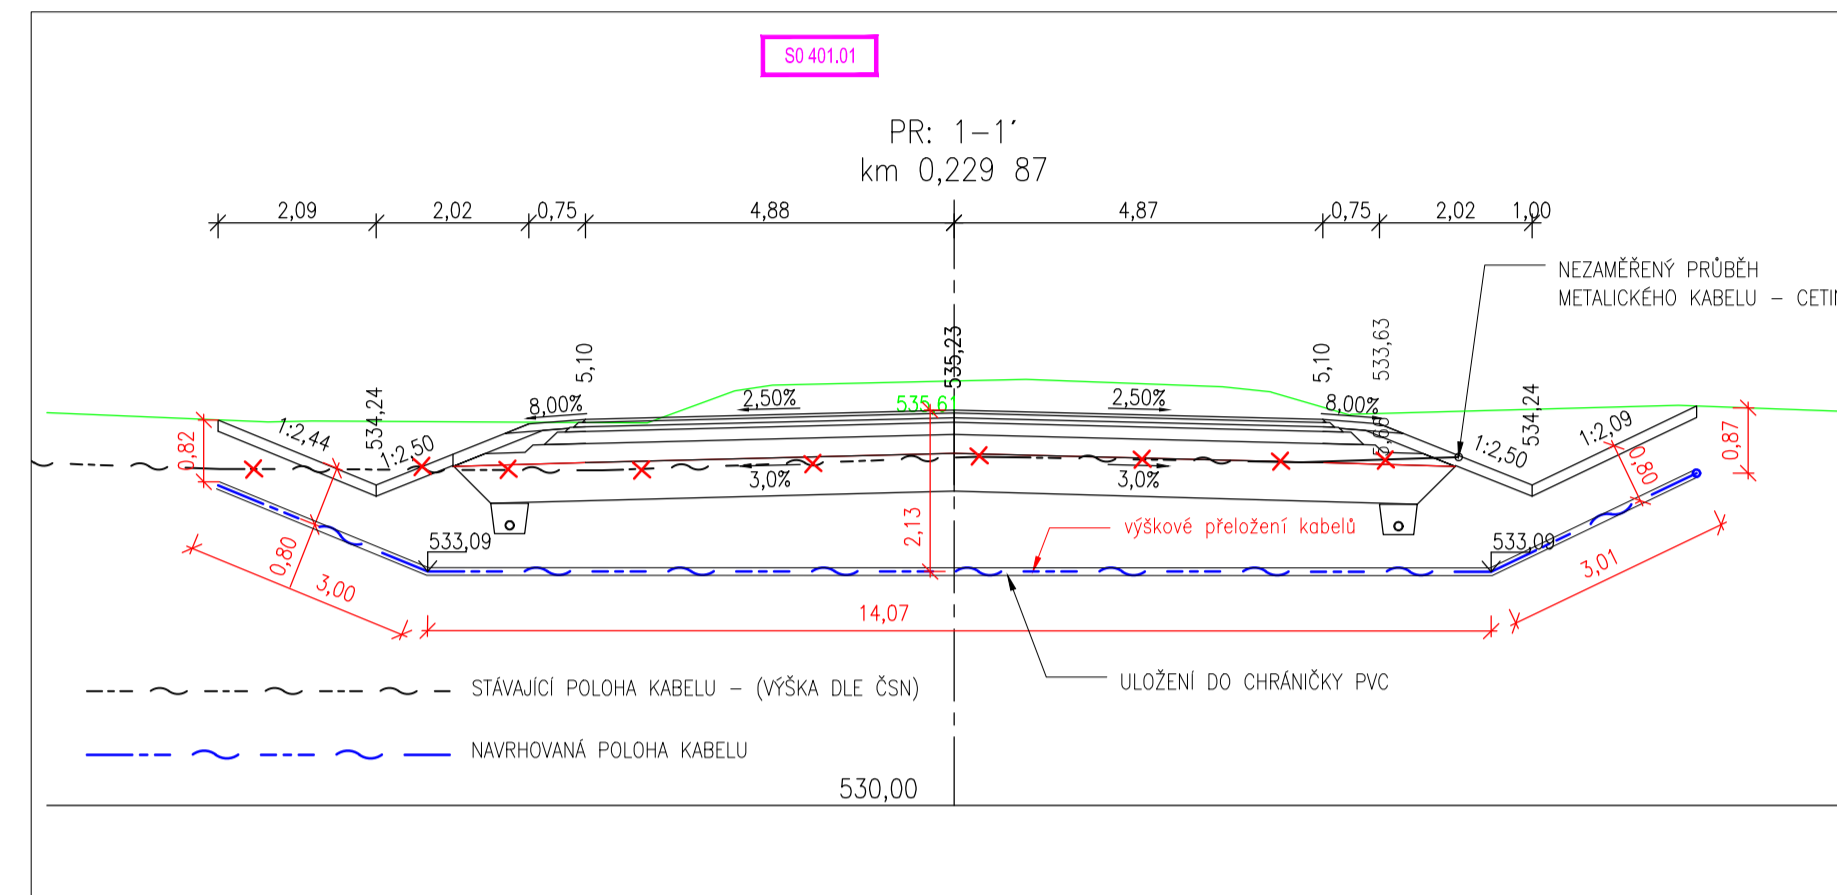

Přeložky datových kabelů budou provedeny jejich správcem.


ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/639 úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná

<b>SO 400 - PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ</b>	
stavěbní objekt	
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 000 90 450	
objednatel	spolupráce
k.ú. Dolní Cerekev místo stavby	Kraj Vysočina střez

<b>SITUACE PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ</b>		1:250	DPS+PDPS
výřez		mřítko	skupině
ING. M. BURIANEČ kontroloval	ING. R. FÍŠER hlavní inženýr projektu	A034/Z5 číslo zakázky	<b>D.16.12.</b>
ING. M. BURIANEČ zodpovědný projektant	ING. R. FÍŠER výpracoval	12/2025 datum	





Průběh podzemních inženýrských sítí je zakreslen pouze informativně, podle vyjádření jejich správců. Před zahájením stavebních prací je nutné požádat správce o jejich přesné výtčění. V místech předpokládané kolize stávajících a podzemních sítí, bude jejich hloubka ukázaná ověřena ručně konjurní sondami. O výše uvedeném bude proveden zápis do stavebního deníku.

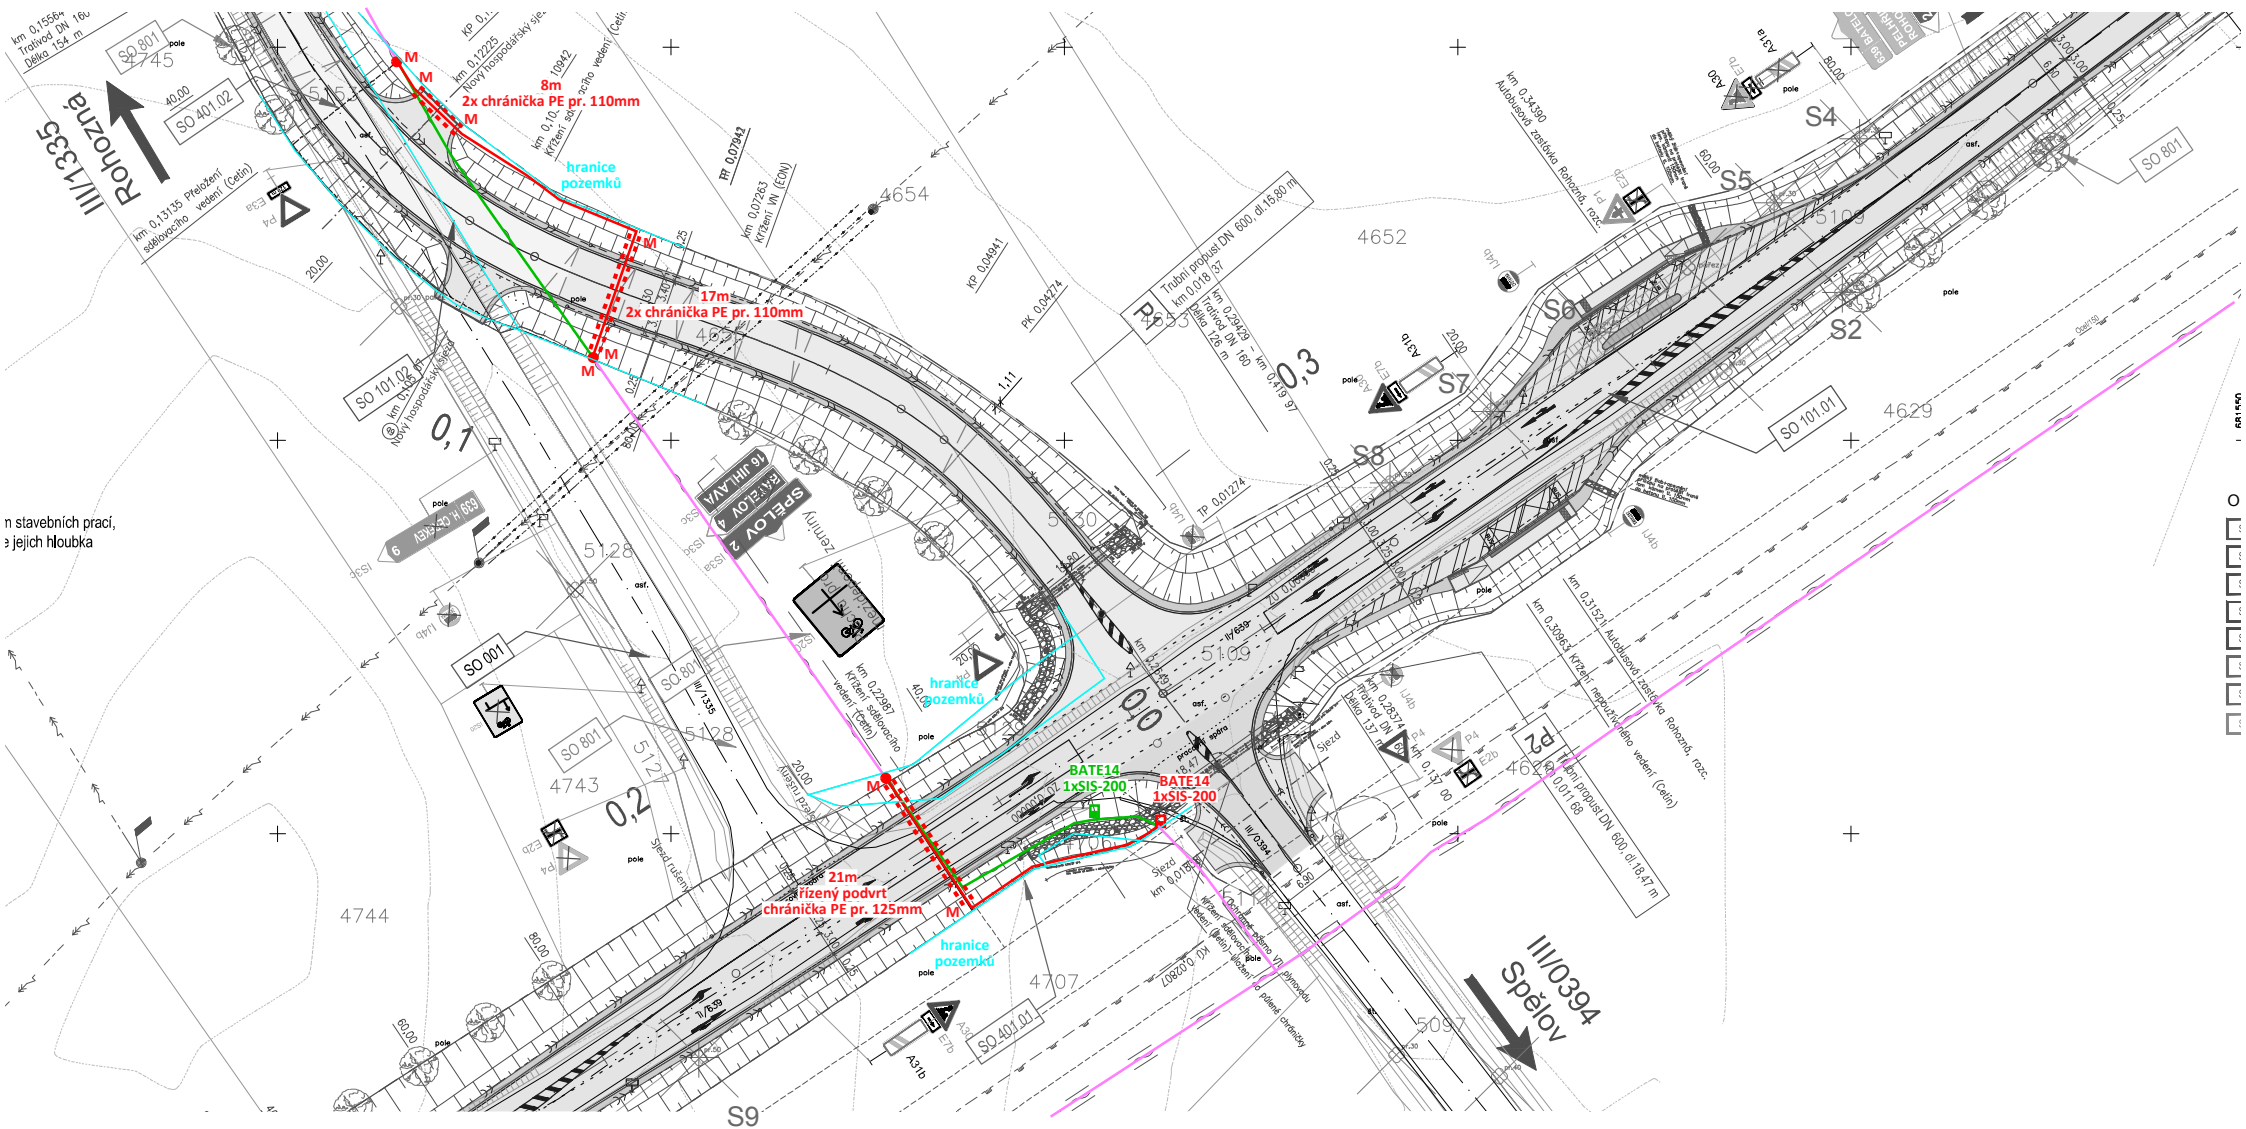

n stavebních prací,  
a jejich hloubka





BATE13

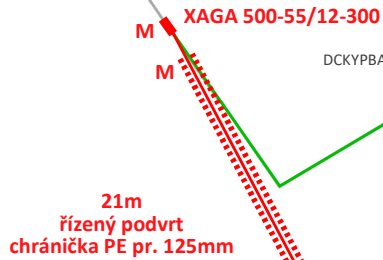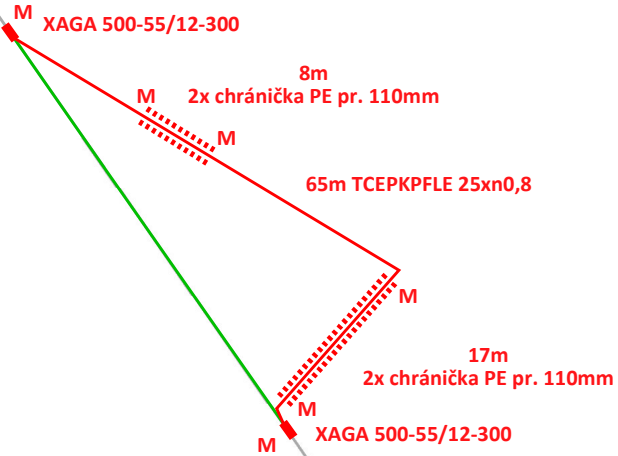

2\_Batelov-Rohozná-D.Cerekev  
BATE14  
xBATE1HR(Batelov)/1.3.1/1-100  
1xSIS - 200 - QT  
15xsv.ř. I.SA 10x1  
;;;SR 2 Bat.-Roh.-D.Ce  
Batelov  
Batelov  
DCER427  
xBATE1HR(Batelov)/1.3.1/1-100;1.3.2/1-100  
1xSKH 9/20 mm  
200xREZ 1p.  
;;;SR 2 Bat.-Roh.-D.Ce  
Batelov  
Batelov

DCKYPBAU 27DM 0,9

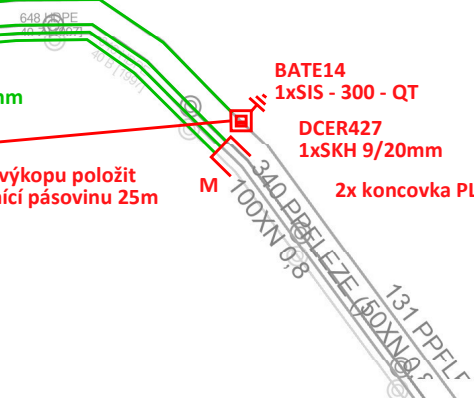

BATE1HR


Souřadnicový systém JTSK	Výškový systém BPV	RSGeo-pro s.r.o. Geodetické a kartografické práce Varděbáská 16, Praha 2, 120 00 tel: 775 603 456 www.rsgeo.cz
Zaměřil Ing. Lukáš Vais Ing. Roman Sulc	Vyhotovil Ing. Lukáš Vais Ing. Roman Sulc	
Zadavatel: DIK – Dopravně inženýrská kancelář Bozděchova 1668, Hradec králové, 500 02		
Akce: Polohopisné a výškopisné zaměření lokality křižovatek silnic II/639, III/1333 a II/639, III/0339, k.ú. Horní Cerekev		
Výkres: Výkres situace	Č. výkresu: 01	
Datum zaměření: 6.10.2018		Měřítko 1:500/1000

DO SITUACE BYL ZAKRESLEN PŘIBLIŽNÝ PRŮBĚH HRANIC PARCEL  
DLE MAP KATASTRU NEMOVITOSTÍ A POZEMKOVÉHO KATASTRU.  
PRO PŘESNOU POLOHU LOMOVÝCH BODŮ JE NUTNÉ OŘEDNĚ VYTÝČIT  
DOTČENÉ HRANICE POZEMKŮ V TERÉNU.

#### LEGENDA SÍTÍ

	NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU (Cetín) – (ochranné pásmo 1,0m od osy)
	ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH OPT. A METAL. KABELU (Cetín) – (ochranné pásmo 1,0m od osy)
	Plynovod Vtl (ocel 150) – GasNet, s.r.o. (ochranné pásmo 4,0m od osy)
	Vn – Nadzemní (EON) – (ochranné pásmo 7,0m od osy)
	Neprůvodované sítě (Cetín)

Průběh podzemních inženýrských sítí je zakreslen pouze informativně, podle vyjádření jejich správců. Před zahájením stavebních prací, je nutné požádat správce o jejich přesné vytyčení. V místech předpokládané kolize stavby s podzemními sítěmi, bude jejich hloubka uložení ověřena ručně kopanými sondami. O výše uvedeném bude proveden zápis do stavebního deníku.

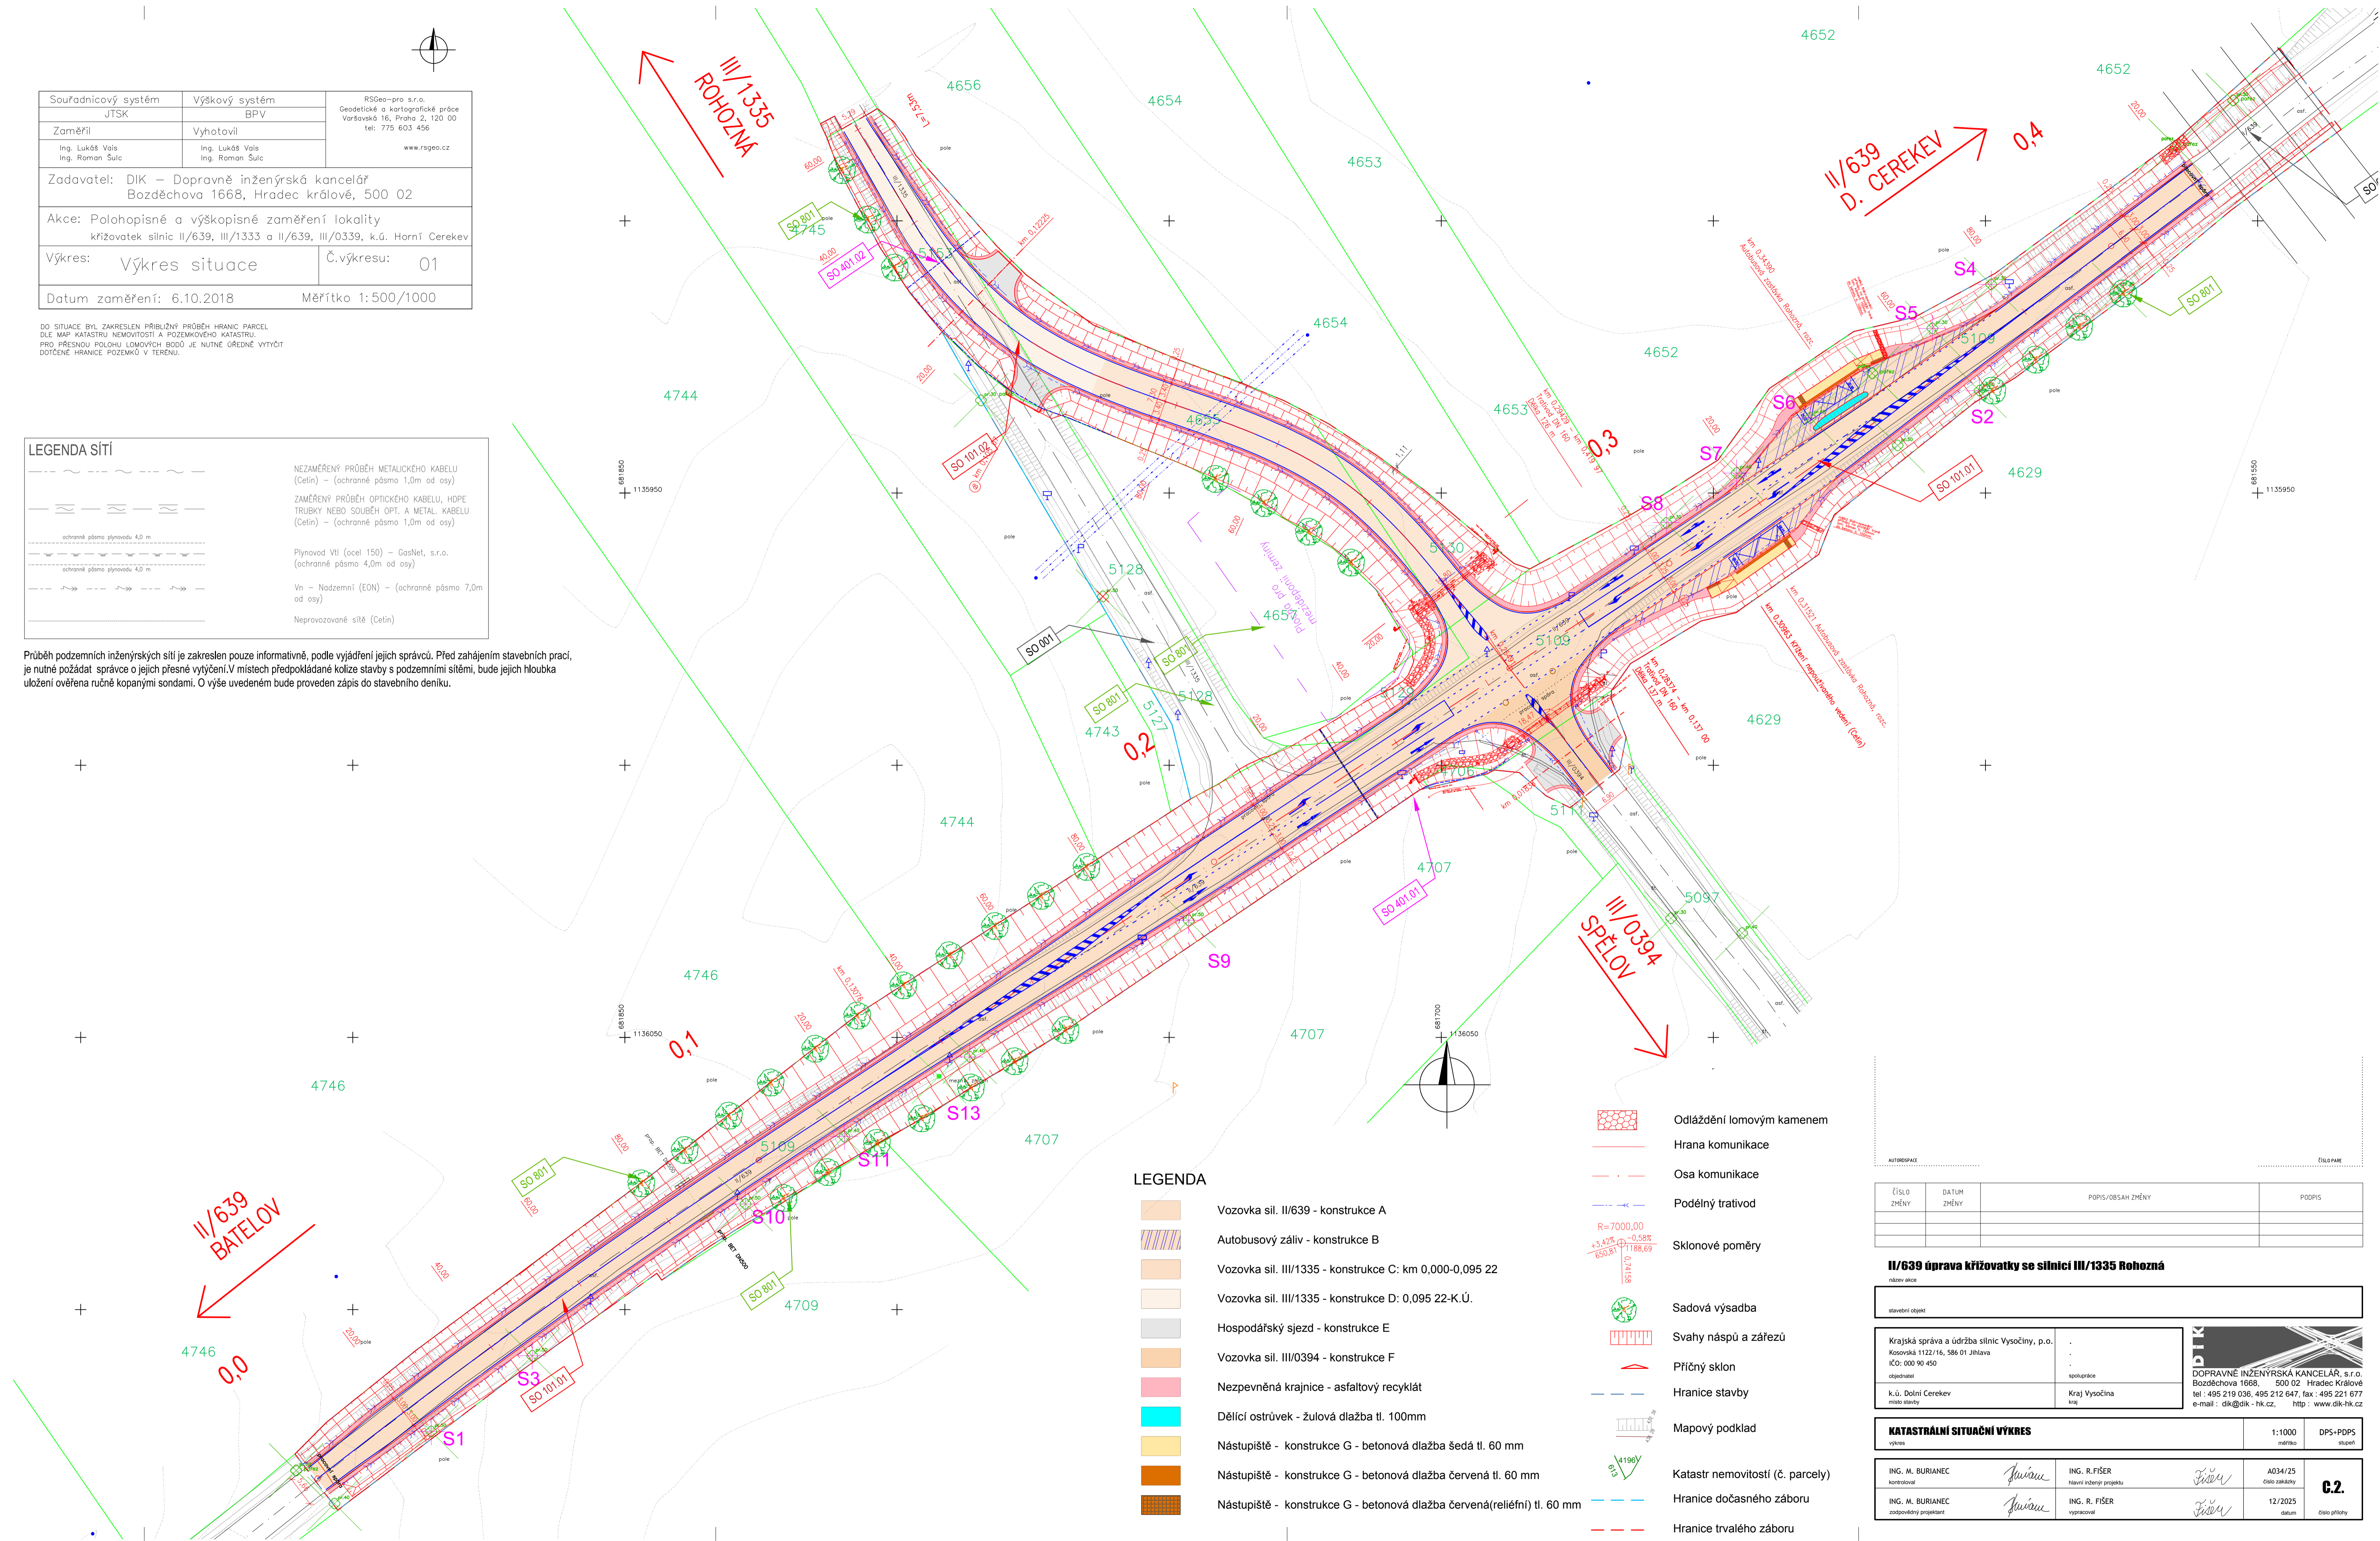

#### LEGENDA

	Vozovka sil. II/639 - konstrukce A		Hrana komunikace
	Autobusový závil - konstrukce B		Osa komunikace
	Vozovka sil. III/1335 - konstrukce C: km 0,000-0,095 22		Podélný trativod
	Vozovka sil. III/1335 - konstrukce D: 0,095 22-K.Ú.		Sklonové poměry
	Hospodářský sjezd - konstrukce E		Sadová výsadba
	Vozovka sil. III/0394 - konstrukce F		Svahy naspů a zářezů
	Nezpevněná krajnice - asfaltový recyklát		Příčný sklon
	Dělicí ostrůvek - žulová dlažba tl. 100mm		Hranice stavby
	Nástupiště - konstrukce G - betonová dlažba šedá tl. 60 mm		Mapový podklad
	Nástupiště - konstrukce G - betonová dlažba červená tl. 60 mm		Katastr nemovitostí (č. parcely)
	Nástupiště - konstrukce G - betonová dlažba červená (reliefní) tl. 60 mm		Hranice dočasného záboru
			Hranice trvalého záboru

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

#### II/639 úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná

název akce	
stavební objekt	
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Kozovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 000 90 450	
objednatel	
K.ú. Dolní Cerekev místní stavby	Kraj Vysočina Kraj

#### KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES

ING. M. BURIANEK kontrola	ING. R. FIŠER hlavní inženýr projektu	A034/25 číslo zakázky	<b>C.2.</b>
ING. M. BURIANEK zodpovědný projektant	ING. R. FIŠER vypracoval	12/2025 datum	

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">4655</a>
Obec:	<a href="#">Dolní Cerekev [587044]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Dolní Cerekev [628875]</a>
Číslo LV:	<a href="#">120</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	1565
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	<a href="#">DKM</a>
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	orná půda



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

## Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

## Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<a href="#">73214</a>	1565

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 27.01.2026 09:40.

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">4706</a>
Obec:	<a href="#">Dolní Cerekev [587044]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Dolní Cerekev [628875]</a>
Číslo LV:	<a href="#">882</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	26
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	<a href="#">DKM</a>
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	orná půda



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Hájek Jiří, Nádražní 256, 37381 Kamenný Újezd	1/4
Vrtalová Petra, č. p. 164, 58844 Rohozná	1/4
Zahradníková Hana, U Hřbitova 1121, 58813 Polná	1/2

## Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

## Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<a href="#">73214</a>	26

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 27.01.2026 09:40.

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">5109</a>
Obec:	<a href="#">Dolní Cerekev [587044]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Dolní Cerekev [628875]</a>
Číslo LV:	<a href="#">120</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	60505
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	<a href="#">DKM</a>
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 27.01.2026 09:40.

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">5129</a>
Obec:	<a href="#">Dolní Cerekev [587044]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Dolní Cerekev [628875]</a>
Číslo LV:	<a href="#">120</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	212
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	<a href="#">DKM</a>
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

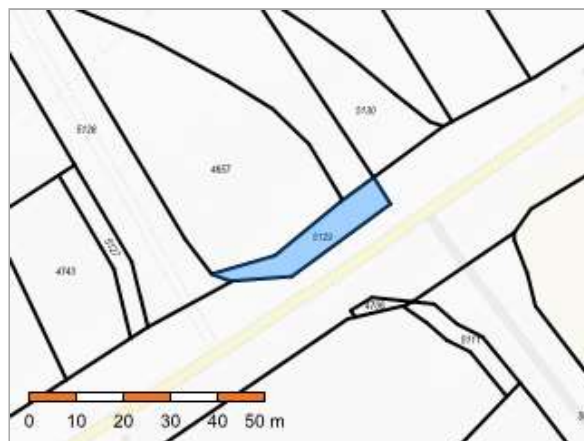

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


[↗](#) Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 27.01.2026 09:40.

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">5153</a>
Obec:	<a href="#">Dolní Cerekev [587044]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Dolní Cerekev [628875]</a>
Číslo LV:	<a href="#">120</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	672
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	<a href="#">DKM</a>
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

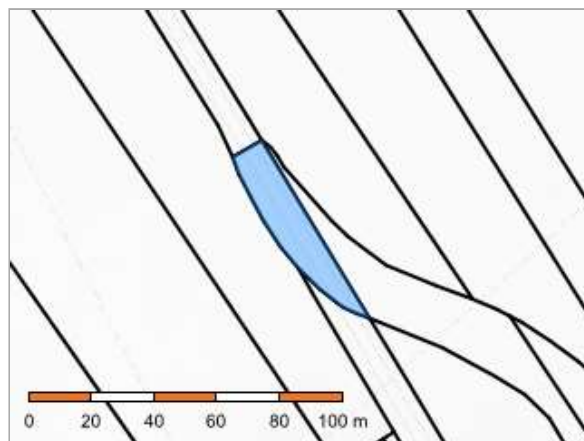

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 27.01.2026 09:40.

PPD - Propočet projektové dokumentace  
Specifikace nákladů dle CTN

Ceník: ▫ VP TEMO 2021 - STAND. ▫ 2026.02  
Položková databáze: 2026.02

**Název stavby: VPIC Rohozná II II\_639 úpr.křižovatky**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

SP

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	32 190,35 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	163 057,31 Kč
MONTÁŽ	108 376,94 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 289,71 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	7 289,71 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	8 074,54 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	44 597,56 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	752,46 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	68 766,82 Kč

**Celkové náklady: 440 395,40 Kč**

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 031,94 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	26 158,41 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>			
954969	Podvrt řízený do 150 mm	21.00 m	85 931,16 Kč
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	50.00 m	1 229,00 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	9.00 m	4 128,03 Kč
954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	27.00 m	3 554,01 Kč
952355	Rýha v trávě 50/110	67.00 m	40 587,26 Kč
958753	Rýha v trávě 50/130	25.00 m	21 332,50 Kč
958754	Rýha v trávě 50/130 rozšíření o 10 cm	24.00 m	4 566,00 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	105.00 m	1 729,35 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	416,64 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	73.00 ks	3 508,38 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	73.00 ks	2 341,84 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	224,42 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	75.00 ks	3 005,25 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	94,40 Kč
955288	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	64,04 Kč
955300	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	2 693,11 Kč
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	3.00 ks	4 560,09 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	120.00 m	4 041,60 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 458,46 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	32 209,64 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	36 900,00 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	75.00 ks	2 378,25 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	927,90 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	4 814,22 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks	3 428,92 Kč
955110	Zrušení objektu samost.SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 558,62 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	75.00 ks	1 567,50 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	383,22 Kč
955012	Zrušení úložné trubky	20.00 m	211,40 Kč
955042	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	10.00 m	356,50 Kč
955041	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	10.00 m	225,00 Kč
955097	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 007,54 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	5.00 m	116,15 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	7 173,56 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			

956283	Doměření trasy nad 100 m do 1km	5.00 m	116,15 Kč
956282	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	7 173,56 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	8 074,54 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	7 090,60 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBř - protlak pod vozovkou 12m x 500kč + ostatní Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí. pozemky 93m x 200Kč	105.00 ks	24 600,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 336,32 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	7 570,64 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	251,83 Kč
955205	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	5.00 ks	226,80 Kč
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	273,83 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
305833	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	5.00 kg	464,55 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	92.00 m	433,32 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	250.00 m	557,50 Kč
300129	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	120.00 m	35 020,80 Kč
316534	Koncovka smršř. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	69,33 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	223,54 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	2 614,90 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	15.00 ks	397,35 Kč
309931	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 294,25 Kč
325656	Skříň rozv.SIS300-QT200-300p-sloupek LSA	1.00 ks	13 399,29 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	3.00 ks	2 376,72 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	43,81 Kč
309992	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	45,13 Kč
309290	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02	15.00 ks	2 146,20 Kč
302655	Trubka PE 110/3,5/6000mm	9.00 ks	4 897,89 Kč
302752	Trubka PE 125/7,1/6000mm	4.00 ks	4 353,60 Kč
303240	Vodič prop. SMclip-autok. C2 10114-C2L50	2.00 ks	199,02 Kč
316266	Zámek skříně 1370 L2 Jih-24313	1.00 ks	229,62 Kč
