



Smlouva o dílo na zhotovení projektu a stavby (P+R)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5047/2017/PH

číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/VIT/1106

ISPROFOND: 500 372 0025

Název zakázky: „GSM-R Plzeň - České Budějovice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

Kapsch CarrierCom s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8707

bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx/xxxx

zastoupena: **Ing. Karlem Feixem**, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01.01.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.6 V době uzavírání této smlouvy probíhá u Objednatele vývoj informačního systému na řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení uvedeného informačního systému bude objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu (XML, příp. XLS):
 - daňový doklad,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek dne **03.07.2017** pod evidenčním číslem **Z2017-017541** svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**GSM-R Plzeň – České Budějovice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka (dále jen Nabídka) Zhotovitele
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Projekt stavby, zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a ve smyslu § 14, odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností. Projektem se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí projektová dokumentace, která pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci Objednatele. Součástí povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je i výkon autorského dozoru projektanta, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Projekt bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro schválení Projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze č. 2 d) této Smlouvy.

Zhotovitel v rámci zpracování Projektu zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě (projekt stavby ve schválené podobě, soupisy prací).

Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení. Poplatek za vydání stavebního povolení uhradí Objednatel.

Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě notifikovanou osobou.

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **293 804 084,- Kč**

slovy: **dvě stě devadesát tři milionů osm set čtyři tisíc osmdesát čtyři korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, na vlastní nebezpečí a s výjimkami plynoucími z této Smlouvy na svůj náklad a samostatně. Tato povinnost se vztahuje k Dílu jako k celku. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv změny Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Díla či jeho Ceně pokud by plynuly z porušení jeho povinností při provádění dříve realizovaných částí Díla. Zhotovitel zejména není oprávněn žádat změny Díla v podobě víceprací, jejichž potřeba vyvstane v důsledku vad, chyb nepřesností či jiných nedostatků Projektu. Veškeré překážky a obtíže vzniklé z důvodů popsaných v tomto odstavci je Zhotovitel povinen překonat samostatně, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad a bez nároku na přiměřené zvýšení Ceny Díla, přerušení prací na Díle či úpravu Harmonogramu postupu prací. Ust. § 2594 a § 2627 občanského zákoníku se pro tyto případy nepoužijí.
- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **20 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **17 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst.2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.9 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.10 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.11 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **29 380 408 Kč**.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o vyluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o vyluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.18 Obchodních podmínek, nebo o vyluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.17 a v odst. 3.18 Obchodních podmínek

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti, nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v **devíti (9)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
- 5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/16/17
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby

VTP/P-P+R/04/17

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby

VTP/R-P+R/08/17

d) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne 2. 10. 2017

Za Zhotovitele:

V Praze dne 19. 9. 2017

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Karel Feix
jednatel společnosti
Kapsch CarrierCom s.r.o.

Příloha č. 1
Obchodní podmínky
OP/P+R/16/17

Příloha č. 2
Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Přílohy v elektronické formě na CD. Současně jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>.

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VTP/P-P+R/04/17

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/R-P+R/08/17

d) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3
Související dokumenty

- posuzovací protokol přípravné dokumentace,
- přípravná dokumentace stavby vč. vydaných rozhodnutí o umístění stavby

***Výše uvedené Související dokumenty obdržel Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace
a k této smlouvě o dílo se tak v listinné formě již nepřipojují.***

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 13 měsíců) v celkovém počtu x hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 293 804 084 Kč

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“):

Smluvní cena za P bez DPH 10 500 808 Kč

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“):

Smluvní cena za AD bez DPH 673 200 Kč, tj. 1 450 Kč/hod

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“):

Smluvní cena za RS bez DPH 282 630 076 Kč

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
GSM-R Plzeň - České Budějovice			293 804 084	293 804 084
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Technologická část, úsek Plzeň - Strakonice				82 025 509
PS 101	BTS 601 žst. Plzeň-Kotěrov	SŽDC	████████	
PS 102	BTS 602 žst. Starý Plzeňec	SŽDC	████████	
PS 103	BTS 604 žst. Nezvěstice	SŽDC	████████	
PS 104	BTS 607 žst. Blovice	SŽDC	████████	
PS 105	BTS 609 žst. Ždírec u Plzně	SŽDC	████████	
PS 106	BTS 611 zast. Srby	SŽDC	████████	
PS 107	BTS 612 žst. Nepomuk	SŽDC	████████	
PS 108	BTS 613 zast. Mléč	SŽDC	████████	
PS 109	BTS 616 zast. Kovčín	SŽDC	████████	
PS 110	BTS 618 žst. Pačejov	SŽDC	████████	
PS 111	BTS 620 zast. Velký Bor	SŽDC	████████	
PS 112	BTS 621 žst. Horažďovice předměstí	SŽDC	████████	
PS 113	BTS 622 žst. Střelské Hoštice	SŽDC	████████	
PS 114	BTS 624 žst. Katovice	SŽDC	████████	
PS 115	BTS 625 zast. Pracejovice	SŽDC	████████	
PS 116	BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění	SŽDC	████████	
PS 121	Uvedení do provozu, úsek Plzeň - Strakonice	SŽDC	████████	
PS 131	Přenosové zařízení, úsek Plzeň - Strakonice	SŽDC	████████	
D.2 Technologická část, úsek Strakonice - České Budějovice				60 618 172
PS 201	BTS 627 žst. Strakonice	SŽDC	████████	
PS 202	BTS 629 žst. Čejetice	SŽDC	████████	
PS 203	BTS 631 žst. Ražice	SŽDC	████████	
PS 204	BTS 633 zast. Skály	SŽDC	████████	
PS 205	BTS 636 zast. Protivín	SŽDC	████████	
PS 206	BTS 639 žst. Čtenice	SŽDC	████████	
PS 207	BTS 640 zast. Záblatičko	SŽDC	████████	
PS 208	BTS 641 žst. Divčice	SŽDC	████████	
PS 209	BTS 643 žst. Zliv	SŽDC	████████	
PS 210	BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou	SŽDC	████████	
PS 221	Uvedení do provozu, úsek Strakonice - České Budějovice	SŽDC	████████	
PS 231	Přenosové zařízení, úsek Strakonice - České Budějovice	SŽDC	████████	
D.3 Technologická část, centrální a uživatelské části sítě, zapojovače				106 350 328
PS 601.1	Doplnění centrálních částí sítě GSM-R	SŽDC	████████	
PS 601.2	Doplnění ústřednové části	SŽDC	████████	
PS 602	Vybavení uživatelů terminály GSM-R	SŽDC	████████	
PS 603	Radiovníky	SŽDC	████████	
PS 611	Zapojovače v úseku Plzeň - Horažďovice	SŽDC	████████	
PS 612	Zapojovače v úseku Střelské Hoštice - České Budějovice	SŽDC	████████	
D.5 Technologická část, kabelizace				28 409 163
PS 703	DOK Ražice - Písek	SŽDC	████████	
PS 704	Úpravy DOK SŽDC, úsek Plzeň - Strakonice	SŽDC	████████	
PS 705	Úpravy DOK SŽDC, úsek Strakonice - České Budějovice	SŽDC	████████	
PS 706	POK Plzeň-Kotěrov	SŽDC	████████	
E.1 Stavební část, stavební úpravy				2 116 236
SO 801	žst. Starý Plzeňec, stavební úpravy	SŽDC	████████	
SO 802	zast. Mléč, demolice objektu zastávky	SŽDC	████████	
SO 803	žst. Pačejov, stavební úpravy	SŽDC	████████	
SO 804	zast. Protivín, stavební úpravy	SŽDC	████████	
SO 805	zast. Záblatičko, stavební úpravy	SŽDC	████████	
SO 806	Doplnění klimatizace	SŽDC	████████	
SO 807	žst. Plzeň-Kotěrov, demolice přístřešku	SŽDC	████████	
E.2 Stavební část, přípojky a úpravy rozvodů NN				2 468 268
SO 811	zast. Kovčín, rekonstrukce přípojky NN	SŽDC	████████	
SO 821	žst. Starý Plzeňec, úprava rozvodů NN	SŽDC	████████	
SO 823	žst. Ždírec u Plzně, úprava rozvodů NN	SŽDC	████████	
Projekt stavby				10 500 808
Projekt stavby		SŽDC	████████	
Dokumentace skutečného provedení stavby				457 600
Dokumentace skutečného provedení stavby		SŽDC	████████	
Autorský dozor projektanta				673 200
Autorský dozor projektanta		SŽDC	████████	
Posouzení interoperability				184 800
Posouzení interoperability		SŽDC	████████	
Autorský dozor projektanta				
hodinová sazba			████████	


Příloha č. 5

Harmonogram prací

Název stavby: GSM-R Plzeň - České Budějovice


Název práce / činnosti	Doba trvání (ve dnech)	Předpokládaný začátek	Předpokládaný konec
		(ve dnech)	(ve dnech)
Podpis smlouvy / zahájení stavby k 11/17	1	1	1
Přípravné práce	29	1	30
Úvodní porada	1	7	7
Zpracování rádiového plánování	60	14	74
Zpracování projektu stavby, odsouhlasení, projednání	61	14	75
Vydání stavebního povolení v právní moci	30	60	90
PS 101-116	310	90	400
PS 121 - Uvedení do provozu, úsek Plzeň - Strakonice	40	370	410
PS 131- PS 131 Přenosové zařízení, úsek Plzeň - Strakonice	96	304	400
PS 201 - 210	350	130	480
PS 221 - Uvedení do provozu, úsek Strakonice - České Budějovice	30	475	505
PS 231 - Přenosové zařízení, úsek Strakonice - České Budějovice	70	430	500
PS 601.1 - Doplnění centrálních částí sítě GSM-R	130	304	434
PS 601.2 - Doplnění ústřednové části	80	356	436
PS 602 - Vybavení uživatelů terminály GSM-R	50	440	490
PS 603 - Radiovníky	130	300	430
PS 611 - Zapojovače v úseku Plzeň - Horažďovice	140	280	420
PS 612 - Zapojovače v úseku Střelské Hoštice - České Budějovice	160	290	450
PS 703 - DOK Ražice - Písek	90	243	333
PS 704 - Úpravy DOK SŽDC, úsek Plzeň - Strakonice	380	121	501
PS 705 - Úpravy DOK SŽDC, úsek Strakonice - České Budějovice	40	151	191
PS 706 - POK Plzeň-Koterov	260	140	400
SO 801 - žst. Starý Plzenec, stavební úpravy	180	121	301
SO 802 - zast. Míleč, demolice objektu zastávky	61	196	257
SO 803 - žst. Pačejov, stavební úpravy	140	150	290
SO 804 - zast. Protivín, stavební úpravy	140	120	260
SO 805 - zast. Záblatičko, stavební úpravy	140	60	200
SO 806 - Doplnění klimatizace	110	320	430
SO 807 - žst. Plzeň-Koterov, demolice přístřešku	90	295	390
SO 811 - zast. Kovčín, rekonstrukce přípojky NN	140	150	290
SO 821 - žst. Starý Plzene, úprava rozvodů NN	140	120	260
SO 823 - žst. Ždírec u Plzně, úprava rozvodů NN	110	90	200
Provedení akceptačního měření	10	500	510
Autorský dozor + rezerva	455	55	510
Dokončení projekční a stavební části	509	1	510
Vyhotovení a předání dokumentace projektu	90	510	600
Lhůta pro dokončení projektu	600	1	600

Harmonogram GSM-R Plzeň - České Budějovice

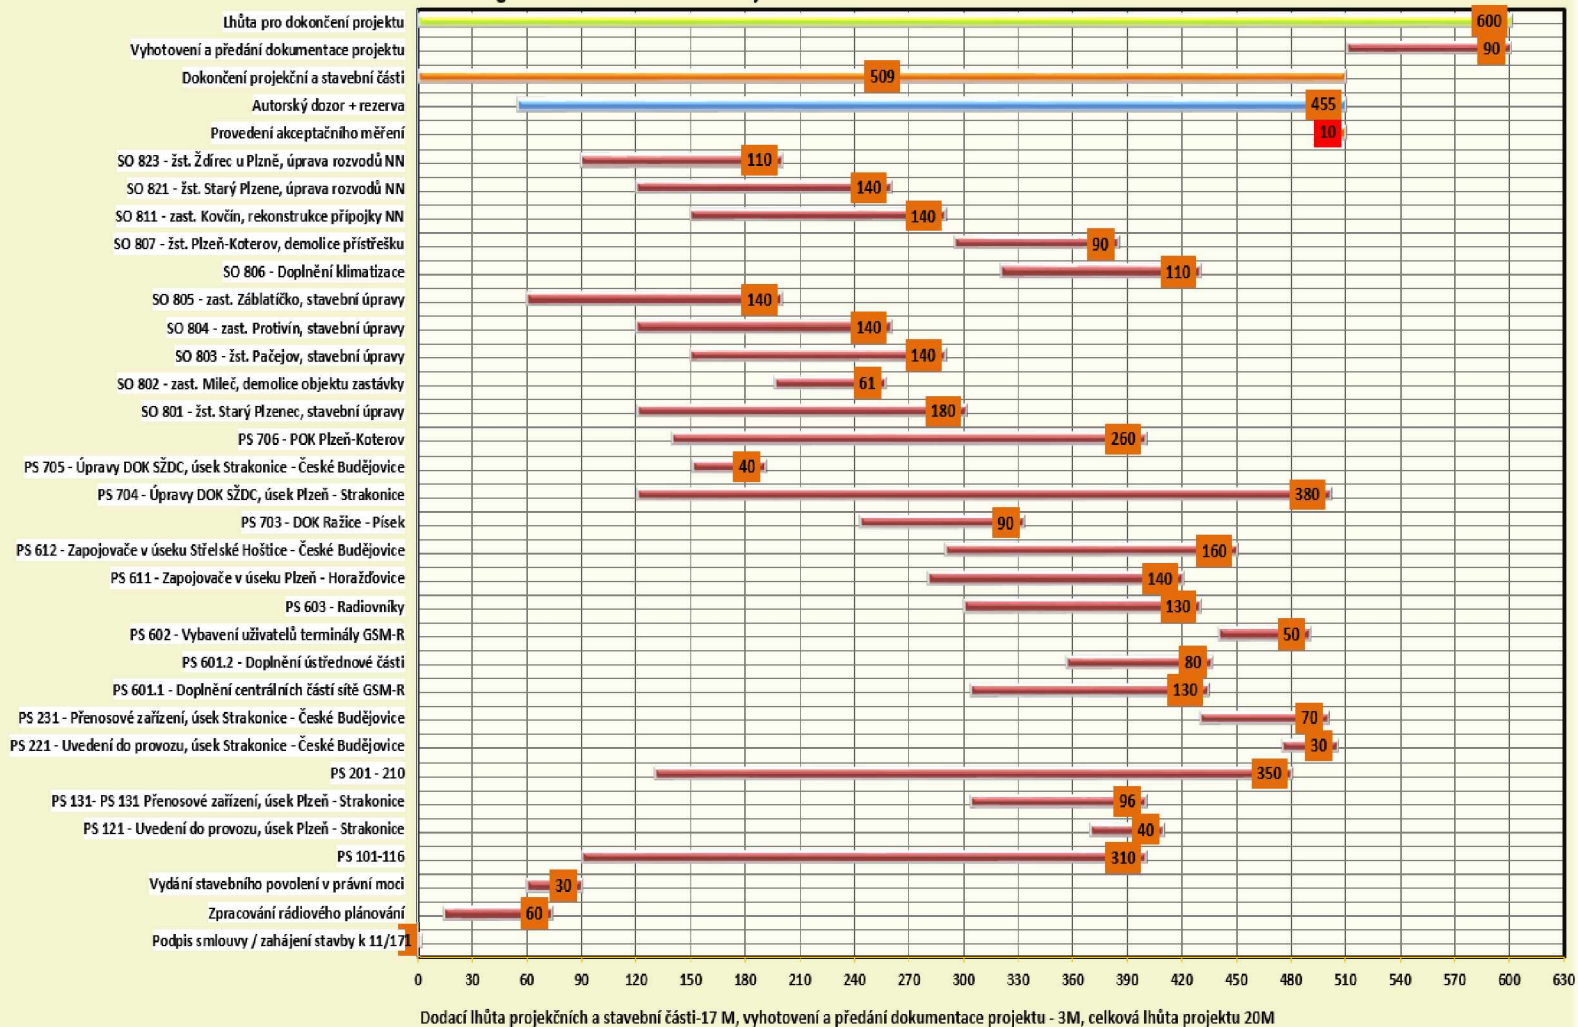

Harmonogram - finanční objemy po měsících

Měsíce	Procenta
1	0,50%
2	0,70%
3	1,00%
4	1,50%
5	2,20%
6	2,60%
7	2,70%
8	4,00%
9	4,50%
10	5,50%
11	5,60%
12	6,80%
13	7,00%
14	7,20%
15	7,40%
16	7,50%
17	8,10%
18	8,40%
19	8,70%
20	8,10%

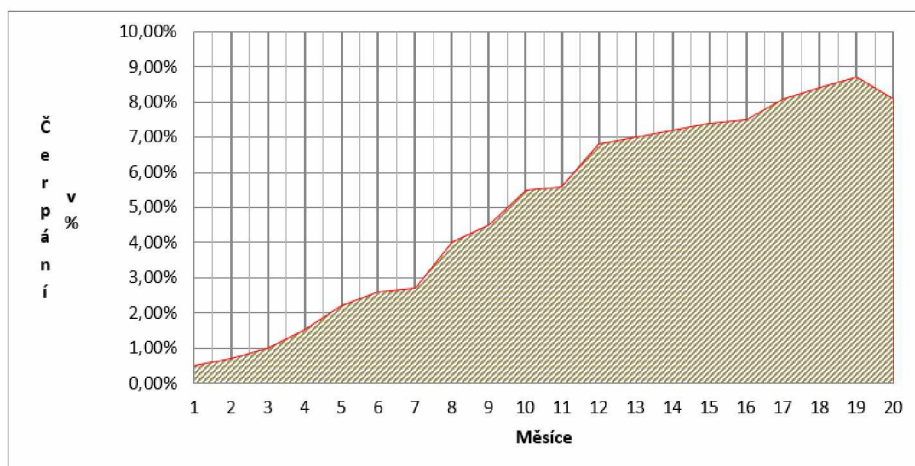

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- technický dozor stavebníka (TDS) - hlavní inženýr stavby:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech obchodních a realizace stavby:
 - náměstek ředitele stavební správy pro investice a jím pověřený zástupce

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění orientační kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Poddodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- Koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění orientační kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Poddodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Číslo osvědčení	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 Česká republika
E-mail	
Telefon	
Fax	

- projekt manager:

Jméno a příjmení	
Adresa	Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 Česká republika
E-mail	
Telefon	
Fax	

- odpovědný projektant:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 Česká republika
E-mail	
Telefon	
Fax	

- rádiový plánovač GSM-R:

Jméno a příjmení	
Adresa	Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 Česká republika
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) pro systémové části GSM-R (NSS a BSS specialisté):

Jméno a příjmení	
Adresa	Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 Česká republika
E-mail	
Telefon	
Fax	
Jméno a příjmení	
Adresa	Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 Česká republika
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) pro pokládku a montáž metalických a optických kabelů:

Jméno a příjmení	
Adresa	Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 Česká republika
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na zakládání staveb a výstavbu anténních stožárů technologických objektů:

Jméno a příjmení	
Adresa	Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 Česká republika
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 Česká republika
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	
Adresa	Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 Česká republika
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7
Seznam požadovaných pojištění

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	282 630 076 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	minimálně 30 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 50 mil. Kč v úhrnu za rok

Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavatelů (označené dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	% hodnoty poddodávky z nabídkové ceny
<p>AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, Praha 10, IČ 480 29 483</p>	<p>montážní práce a zajištění strojů a zařízeních vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla</p> <p>PS 101 BTS 601 žst. Plzeň-Koterov, PS 102 BTS 602 žst. Starý Plzenec, PS 103 BTS 604 žst. Nezvěstice, PS 104 BTS 607 žst. Blovice, PS 105 BTS 609 žst. Ždírec u Plzně, PS 106 BTS 611 zast. Srby, PS 107 BTS 612 žst. Nepomuk, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 109 BTS 616 zast. Kovčín, PS 110 BTS 618 žst. Pačejov, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 112 BTS 621 žst. Horažďovice předměstí, PS 113 BTS 622 žst. Střelské Hoštice, PS 114 BTS 624 žst. Katovice, PS 115 BTS 625 zast. Pracejovice, PS 116 BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 202 BTS 629 žst. Čejetice, PS 203 BTS 631 žst. Ražice, PS 204 BTS 633 zast. Skály, PS 205 BTS 636 zast. Protivín, PS 206 BTS 639 žst. Čičenice, PS 207 BTS 640 zast. Záblatičko, PS 209 BTS 643 žst. Zliv, PS 210 BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou, úsek Strakonice - České Budějovice, PS 603 Radiovníky, PS 703 DOK Ražice - Písek, PS 704 Úpravy DOK SŽDC, úsek Plzeň - Strakonice, PS 705 Úpravy DOK SŽDC, úsek Strakonice - České Budějovice, PS 706 POK Plzeň-Koterov, SO 801 žst. Starý Plzenec, stavební úpravy, SO 802 zast. Mileč, demolice objektu zastávky, SO 803 žst. Pačejov, stavební úpravy, SO 804 zast. Protivín, stavební úpravy, SO 805 zast. Záblatičko, stavební úpravy, SO 806 Doplnění klimatizace, SO 807 žst. Plzeň-Koterov, demolice přístřešku, SO 811 zast. Kovčín, rekonstrukce přípojky NN, SO 821 žst. Starý Plzeň, úprava rozvodů NN, SO 823 žst. Ždírec u Plzně, úprava rozvodů NN</p>	<p>16%</p>
<p>ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, Praha 3, IČ 614 59 445</p>	<p>dodávka a montáž přenosové techniky, zajištění vstupů do drážních objektů</p> <p>PS 131 Přenosové zařízení, úsek Plzeň – Strakonice</p> <p>PS 231 Přenosové zařízení, úsek Strakonice - České Budějovice</p>	<p>24%</p>

<p>BETONBAU, s.r.o, Průmyslová 566/5, PSČ 108 50, Praha 10, IČ 496 14 819</p>	<p>výroba a montáž technologických objektů (domků)</p> <p>PS 101 BTS 601 žst. Plzeň-Koterov, PS 102 BTS 602 žst. Starý Plzenec, PS 103 BTS 604 žst. Nezvěstice, PS 104 BTS 607 žst. Blovice, PS 105 BTS 609 žst. Ždírec u Plzně, PS 106 BTS 611 zast. Srby, PS 107 BTS 612 žst. Nepomuk, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 110 BTS 618 žst. Pačejov, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 112 BTS 621 žst. Horažďovice předměstí, PS 113 BTS 622 žst. Střelské Hoštice, PS 114 BTS 624 žst. Katovice, PS 116 BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 202 BTS 629 žst. Čejetice, PS 203 BTS 631 žst. Ražice, PS 204 BTS 633 zast. Skály, PS 205 BTS 636 zast. Protivín, PS 206 BTS 639 žst. Čičenice, PS 209 BTS 643 žst. Zliv, PS 210 BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou, úsek Strakonice - České Budějovice</p>	<p>3%</p>
<p>SUDOP PRAHA a.s, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČ 257 93 349</p> <p>IXPROJEKTA s.r.o. Bidláky 837/20, Štýřice, PSČ 639 00 Brno, IČ 03977471</p> <p>pod názvem „SP + IXPROJ_GSM-R_Plzeň - ČB“</p>	<p>PS 101 BTS 601 žst. Plzeň-Koterov, PS 102 BTS 602 žst. Starý Plzenec, PS 103 BTS 604 žst. Nezvěstice, PS 104 BTS 607 žst. Blovice, PS 105 BTS 609 žst. Ždírec u Plzně, PS 106 BTS 611 zast. Srby, PS 107 BTS 612 žst. Nepomuk, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 109 BTS 616 zast. Kovčín, PS 110 BTS 618 žst. Pačejov, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 112 BTS 621 žst. Horažďovice předměstí, PS 113 BTS 622 žst. Střelské Hoštice, PS 114 BTS 624 žst. Katovice, PS 115 BTS 625 zast. Pracejovice, PS 116 BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 202 BTS 629 žst. Čejetice, PS 203 BTS 631 žst. Ražice, PS 204 BTS 633 zast. Skály, PS 205 BTS 636 zast. Protivín, PS 206 BTS 639 žst. Čičenice, PS 207 BTS 640 zast. Záblatičko, PS 209 BTS 643 žst. Zliv, PS 210 BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou, úsek Strakonice - České Budějovice, PS 603 Radiovníky, PS 703 DOK Ražice - Písek, PS 704 Úpravy DOK SŽDC, úsek Plzeň - Strakonice, PS 705 Úpravy DOK SŽDC, úsek Strakonice - České Budějovice, PS 706 POK Plzeň-Koterov, SO 801 žst. Starý Plzenec, stavební úpravy, SO 802 zast. Mileč, demolice objektu zastávky, SO 803 žst. Pačejov, stavební úpravy, SO 804 zast. Protivín, stavební úpravy, SO 805 zast. Záblatičko, stavební úpravy, SO 806 Doplnění klimatizace, SO 807 žst. Plzeň-Koterov, demolice přístřešku, SO 811 zast. Kovčín, rekonstrukce přípojky NN, SO 821 žst. Starý Plzeň, úprava rozvodů NN, SO 823 žst. Ždírec u Plzně, úprava rozvodů NN</p>	<p>7%</p>

<p>TEPLOTECHNA Ostrava a.s., Šenovská 101/543, PSČ 716 12, Ostrava, IČ 451 93 771</p>	<p>dodávka a montáž stožárů, anténních konstrukcí a kabelových lávek a zajištění strojů a zařízeních vyžadovaných při plnění veřejné zakázky</p> <p>PS 101 BTS 601 žst. Plzeň-Koterov, PS 102 BTS 602 žst. Starý Plzenec, PS 103 BTS 604 žst. Nezvěstice, PS 104 BTS 607 žst. Blovice, PS 105 BTS 609 žst. Ždírec u Plzně, PS 106 BTS 611 zast. Srby, PS 107 BTS 612 žst. Nepomuk, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 109 BTS 616 zast. Kovčín, PS 110 BTS 618 žst. Pačejov, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 112 BTS 621 žst. Horažďovice předměstí, PS 113 BTS 622 žst. Střelské Hoštice, PS 114 BTS 624 žst. Katovice, PS 115 BTS 625 zast. Pracejovice, PS 116 BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 202 BTS 629 žst. Čejetice, PS 203 BTS 631 žst. Ražice, PS 204 BTS 633 zast. Skály, PS 205 BTS 636 zast. Protivín, PS 206 BTS 639 žst. Čičenice, PS 207 BTS 640 zast. Záblatičko, PS 209 BTS 643 žst. Zliv, PS 210 BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou, úsek Strakonice - České Budějovice</p>	<p>15%</p>
<p>EnerSys, s.r.o., Roztylské náměstí 649/19, PSČ 141 00, Praha 4, IČ 452 41 759</p>	<p>dodávka a montáž baterií a dalších napájecích komponent</p> <p>PS 101 BTS 601 žst. Plzeň-Koterov, PS 102 BTS 602 žst. Starý Plzenec, PS 103 BTS 604 žst. Nezvěstice, PS 104 BTS 607 žst. Blovice, PS 105 BTS 609 žst. Ždírec u Plzně, PS 106 BTS 611 zast. Srby, PS 107 BTS 612 žst. Nepomuk, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 109 BTS 616 zast. Kovčín, PS 110 BTS 618 žst. Pačejov, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 112 BTS 621 žst. Horažďovice předměstí, PS 113 BTS 622 žst. Střelské Hoštice, PS 114 BTS 624 žst. Katovice, PS 115 BTS 625 zast. Pracejovice, PS 116 BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 202 BTS 629 žst. Čejetice, PS 203 BTS 631 žst. Ražice, PS 204 BTS 633 zast. Skály, PS 205 BTS 636 zast. Protivín, PS 206 BTS 639 žst. Čičenice, PS 207 BTS 640 zast. Záblatičko, PS 209 BTS 643 žst. Zliv, PS 210 BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou, úsek Strakonice - České Budějovice</p>	<p>4%</p>

<p>KABEL TRADE PRAHA s.r.o., Praha 4 - Kunratice, Dobronická 1257, PSČ 148 00, IČ 25613383</p>	<p>Dodávka anténních systémů a komponent</p> <p>PS 101 BTS 601 žst. Plzeň-Koterov, PS 102 BTS 602 žst. Starý Plzenec, PS 103 BTS 604 žst. Nezvěstice, PS 104 BTS 607 žst. Blovice, PS 105 BTS 609 žst. Ždírec u Plzně, PS 106 BTS 611 zast. Srby, PS 107 BTS 612 žst. Nepomuk, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 109 BTS 616 zast. Kovčín, PS 110 BTS 618 žst. Pačejov, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 112 BTS 621 žst. Horažďovice předměstí, PS 113 BTS 622 žst. Střelské Hoštice, PS 114 BTS 624 žst. Katovice, PS 115 BTS 625 zast. Pracejovice, PS 116 BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 202 BTS 629 žst. Čejetice, PS 203 BTS 631 žst. Ražice, PS 204 BTS 633 zast. Skály, PS 205 BTS 636 zast. Protivín, PS 206 BTS 639 žst. Čičenice, PS 207 BTS 640 zast. Záblatičko, PS 209 BTS 643 žst. Zliv, PS 210 BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou, úsek Strakonice - České Budějovice</p>	<p><1%</p>
<p>ELPRAMO s.r.o., Praha 9 - Hloubětín, Nademelejská 600/1, PSČ 198 00, IČ 28187903</p>	<p>PS 101 BTS 601 žst. Plzeň-Koterov, PS 102 BTS 602 žst. Starý Plzenec, PS 103 BTS 604 žst. Nezvěstice, PS 104 BTS 607 žst. Blovice, PS 105 BTS 609 žst. Ždírec u Plzně, PS 106 BTS 611 zast. Srby, PS 107 BTS 612 žst. Nepomuk, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 109 BTS 616 zast. Kovčín, PS 110 BTS 618 žst. Pačejov, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 112 BTS 621 žst. Horažďovice předměstí, PS 113 BTS 622 žst. Střelské Hoštice, PS 114 BTS 624 žst. Katovice, PS 115 BTS 625 zast. Pracejovice, PS 116 BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 202 BTS 629 žst. Čejetice, PS 203 BTS 631 žst. Ražice, PS 204 BTS 633 zast. Skály, PS 205 BTS 636 zast. Protivín, PS 206 BTS 639 žst. Čičenice, PS 207 BTS 640 zast. Záblatičko, PS 209 BTS 643 žst. Zliv, PS 210 BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou, úsek Strakonice - České Budějovice</p>	<p>4%</p>
<p>Delta G s. r. o., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ 02362538</p>	<p>Geodetické práce</p> <p>PS 101 BTS 601 žst. Plzeň-Koterov, PS 102 BTS 602 žst. Starý Plzenec, PS 103 BTS 604 žst. Nezvěstice, PS 104 BTS 607 žst. Blovice, PS 105 BTS 609 žst. Ždírec u Plzně, PS 106 BTS 611 zast. Srby, PS 107 BTS 612 žst. Nepomuk, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 109 BTS 616 zast. Kovčín, PS 110 BTS 618 žst. Pačejov, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 112 BTS 621 žst. Horažďovice předměstí, PS 113 BTS 622 žst. Střelské Hoštice, PS 114 BTS 624 žst. Katovice, PS 115 BTS 625 zast. Pracejovice, PS 116 BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 202 BTS 629 žst. Čejetice, PS 203 BTS 631 žst. Ražice, PS 204 BTS 633 zast. Skály, PS 205 BTS 636 zast. Protivín, PS 206 BTS 639 žst. Čičenice, PS 207 BTS 640 zast. Záblatičko, PS 209 BTS 643 žst. Zliv, PS 210 BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou, úsek Strakonice - České Budějovice</p>	<p><1%</p>

<p>Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Novodvorská 1698, Praha 4 - Braník, PSČ 14201 IČO: 27257258</p>	<p>Autorizovaná / Notifikovaná osoba, certifikace</p> <p>PS 101 BTS 601 žst. Plzeň-Koterov, PS 102 BTS 602 žst. Starý Plzenec, PS 103 BTS 604 žst. Nezvěstice, PS 104 BTS 607 žst. Blovice, PS 105 BTS 609 žst. Ždírec u Plzně, PS 106 BTS 611 zast. Srby, PS 107 BTS 612 žst. Nepomuk, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 109 BTS 616 zast. Kovčín, PS 110 BTS 618 žst. Pačejov, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 112 BTS 621 žst. Horažďovice předměstí, PS 113 BTS 622 žst. Střelské Hoštice, PS 114 BTS 624 žst. Katovice, PS 115 BTS 625 zast. Pracejovice, PS 116 BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 202 BTS 629 žst. Čejetice, PS 203 BTS 631 žst. Ražice, PS 204 BTS 633 zast. Skály, PS 205 BTS 636 zast. Protivín, PS 206 BTS 639 žst. Čičenice, PS 207 BTS 640 zast. Záblatičko, PS 209 BTS 643 žst. Zliv, PS 210 BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou, úsek Strakonice - České Budějovice</p>	<p><1%</p>
<p>KATHREIN CS s.r.o. (původní název AEC ELEKTROTECHNIKA, spol. s r.o.), Praha 4, Na rovinách 6/390, PSČ 140 00, IČ 61774812</p>	<p>Anténní systémy</p> <p>PS 101 BTS 601 žst. Plzeň-Koterov, PS 102 BTS 602 žst. Starý Plzenec, PS 103 BTS 604 žst. Nezvěstice, PS 104 BTS 607 žst. Blovice, PS 105 BTS 609 žst. Ždírec u Plzně, PS 106 BTS 611 zast. Srby, PS 107 BTS 612 žst. Nepomuk, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 108 BTS 613 zast. Mileč, PS 109 BTS 616 zast. Kovčín, PS 110 BTS 618 žst. Pačejov, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 111 BTS 620 zast. Velký Bor, PS 112 BTS 621 žst. Horažďovice předměstí, PS 113 BTS 622 žst. Střelské Hoštice, PS 114 BTS 624 žst. Katovice, PS 115 BTS 625 zast. Pracejovice, PS 116 BTS 151 žst. Plzeň, hl.n., doplnění, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 201 BTS 627 žst. Strakonice, PS 202 BTS 629 žst. Čejetice, PS 203 BTS 631 žst. Ražice, PS 204 BTS 633 zast. Skály, PS 205 BTS 636 zast. Protivín, PS 206 BTS 639 žst. Čičenice, PS 207 BTS 640 zast. Záblatičko, PS 209 BTS 643 žst. Zliv, PS 210 BTS 645 žst. Hluboká nad Vltavou, úsek Strakonice - České Budějovice</p>	<p><1%</p>
<p>CELKEM %</p>	<p>76%</p>	
