

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 01PU-003360

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

ELTODO, a.s.

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO, DIČ:

45274517, CZ45274517

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Úpravy dopravního značení MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice na D1 – zamezení průjezdu nákladních vozidel obcí Klimkovice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši sedm milionů osm set osmdesát čtyři tisíc pět set čtyřicet dva korun českých devadesát osm haléřů bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Úpravy dopravního značení MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice na D1 – zamezení průjezdu nákladních vozidel obcí Klimkovice	7 884 542,98	1 665 754,03	9 540 297,01

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Úpravy dopravního značení MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice na D1 – zamezení průjezdu nákladních vozidel obcí Klimkovice, číslo veřejné zakázky 01PU-003360.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

FORMULÁŘ 2.3.2.SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 29-09-2017

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

za dodavatele/zhotovitele

ELTODO, a.s.

Datum: _____

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

PŘÍLOHA SMLOUVY

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha

Naše zn.: 12400-6-7-6/2017

Číslo zakázky: **01PU-003360**

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 156 0002

Vyřizuje: Jeřábek, Pavel Ing.

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Úpravy dopravního značení MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice na D1 – zamezení průjezdu nákladních vozidel obcí Klimkovice“

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0027239 (dále jen „**Zakázka**“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

ELTODO, a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

IČO: 45274517


7.

Odůvodnění:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

V Praze dne



PŘÍLOHA SMLOUVY

c) Příloha a Oceněný soupis prací

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	<p>Věcný milník:</p> <p>DÚR - koncept</p> <p>Doba pro dokončení: 3 měsíce po podpisu smlouvy</p> <p>DSP – koncept</p> <p>Doba pro dokončení: 1 měsíc po schválení čistopisu DÚR</p> <p>Podání žádosti o SP</p> <p>Doba pro dokončení: 1 týden po schválení čistopisu DSP</p> <p>Zpracování RDS</p> <p>Doba pro dokončení: 1 měsíc po schválení čistopisu DSP</p> <p>Doba pro uvedení stavby do provozu: 11 měsíců od podpisu smlouvy</p>
Odstranění vad	9.1	<p>Záruční doba činí 84 měsíců, pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:</p> <p>(i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,</p> <p>(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže],</p> <p>(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ</p>

1.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>(b)</p> <p>Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p> <p>c)</p> <p>84 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.</p>
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		povinnosti); do 0,01 % předpokládané hodnoty zakázky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) do 0,25 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); do 0,05 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; do 0,05 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); do 0,1 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. do 0,01 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
smluvních pokut		
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?0, 2, 3, 4 a 5											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]													
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; color: cyan;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>													
Údaje v Kč bez DPH:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00							
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
		0,00											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum	podpis										
			Číslo paré:										

A

Poř. č.pol.	Rozpis ceny služeb Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
Všeobecné konstrukce a práce					
1	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytýčení objektů a sítí v JTSK, podklady pro zpracování knihy plánů týkající se předmětného SO	SOUBOR			
Dokumentace					
VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE					
2	Dokumentace k územnímu rozhodnutí	SOUBOR			
3	Dokumentace pro stavební povolení Inženýrská činnost související s vypracováním PD a získáním právoplatného SP	SOUBOR			
4	Realizační dokumentace stavby	SOUBOR			
5	Zpracování kapitoly provozního a havarijního řádu týkající se předmětného SO, zaškolení uživatele	SOUBOR			
6	Revize vč. revizní zprávy	KUS			
INTEGRACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ					
7	Integrace do ŘSDT Klimkovice	SOUBOR			
8	Úpravy/doplnění vizualizace tunelu Klimkovice	SOUBOR			
9	Integrace PDZ do PLC DIS	SOUBOR			
10	Úpravy/doplnění vizualizace DIS	SOUBOR			
11	Vytvoření SW pro nové SX včetně řízení pro PDZ	SOUBOR			
12	SW úpravy stávajících MX	SOUBOR			
13	Zkoušky řídicích systémů Komplexní oživení, nastavení a vyzkoušení v koordinaci s návaznými systémy s vazbou na centrální dispečinky, zkušební provoz	KUS			
14	Práce systémového integrátora Systémová integrace předmětného objektu zajišťovaná supervizorem pro technologické vybavení DIS-SOS	SOUBOR			
15	pomocné práce zajišť. nebo zřiz. regulaci a ochranu dopravy Inženýrsko bezpečnostní opatření při dodávce a montáži za částečného provozu	SOUBOR			
Všeobecné konstrukce a práce					
Zemní práce					
16	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I Výkop šachty 5x(0,5x0,5x0,3m)	M3			
17	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení rýh pro chráničky (0,35x0,80x540m), vč. přesunů	M3			
18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST. HMOT DN DO 200MM Včetně realizace startovací a cílové jámy a zakrytí (4x)	M			
19	KONSTRUKCE ZE ZEMIN - ZÁSYPY SE ZHUTNĚNÍM	M3			
20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN - ZÁSYPY Z NAKUP. MATERIÁLŮ Pískové lože (0,15x0,35x540 m)	M3			
21	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2			
Zemní práce					
Přidružená stavební výroba					
22	MĚŘENÍ KABELŮ Měření uzemňovací soustavy	KUS			
23	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Napájecí kabel CYKY-O 2x4, vč. ukončení	M			
24	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Napájecí kabel CYKY-J 3x4, vč. ukončení	M			
25	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5, vč. ukončení	M			
26	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Napájecí kabel CYKY-J 4x10, vč. ukončení	M			
27	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 Spojka na kabelu CYKY-J 4x10, vč. spojování	KUS			
28	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn 30x4mm, včetně připojení (9ks)	M			
29	KABELY MÍSTNÍ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNIČKY TCEKFY 12P1,0, vč. ukončení	M			
30	KABELY MÍSTNÍ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNIČKY TCEPKPFL 3XN0,8, vč. ukončení	M			
31	SKŘÍNĚ KABELOVÉ Silový odbočný rozvaděč (RO) ve SDP - skříň - odnímatelné víko - vývodky (2 ks) - modulový páčkový spínač - řadová svorkovnice - rám pro skříň do bet. základu + 3x ocelová trubka	KUS			
32	SKŘÍNĚ KABELOVÉ Demontáž stávajících skříní RO	KUS			
33	SKŘÍNĚ KABELOVÉ Demontáž stávající skříně mX	KUS			
34	SKŘÍNĚ KABELOVÉ Skříňka jednotky SX vč. uchycení na sloupek PDZ a elektrovýbavy (jistice, přepětové ochr. atd.)	KUS			
35	SKŘÍNĚ KABELOVÉ El. vyhodnocovací jednotka SX	KUS			
36	SKŘÍNĚ KABELOVÉ SD a NN svorkovnice do SX	KUS			

A.

37	SKŘÍNĚ KABELOVÉ Dovybavení stávající MX pro řízení SX	KUS			
38	POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - ETHERNET MM O/M switch pro napojení technologie, dodávka, montáž, nastavení	KUS			
39	POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - ETHERNET Sada optických patchcordů vč. konektorů pro napojení technologie	KUS			
40	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN OK MM 8x50/125 vč. zafouknutí	M			
41	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN Optický rozvaděč ODF 8vl. (MM) vč. patchcordů s konektory	KUS			
42	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL Spojka na kabelu TCEKFY 12P1,0, vč. spojování	KUS			
43	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS			
44	MĚŘENÍ NA TŘECH VLNŮVÝCH DÉLKÁCH PO MONTÁŽI DO 12 VLÁKEN	KUS			
Přidružená stavební výroba					
Potrubí					
45	CHRÁNIČKY Z TRUB DN DO 100MM Chráníčka HDPE40 Modrá Ø40 mm	M			
46	CHRÁNIČKY Z TRUB DN DO 100MM Chráníčka plastová vrapovaná 63/52	M			
47	CHRÁNIČKY Z TRUB DN DO 100MM Chráníčka Ø40 mm, pancéřová, UV odolná	M			
48	CHRÁNIČKY Z TRUB DN DO 100MM Chráníčka Ø32 mm, plastová, UV odolná	M			
49	CHRÁNIČKY Z TRUB DN DO 150MM PVC silnostěnná chráníčka Ø 110 mm (kab. protlak)	M			
50	KABELOVÁ KOMORA Z PLAST HMOT UŽ. PL. DO 1,5M2 Kabelová šachta 45/20	KUS			
51	KABELOVÁ KOMORA Z PLAST HMOT UŽ. PL. DO 1,5M2 Markery do kab. šachet	KUS			
52	KABELOVÁ KOMORA Z PLAST HMOT UŽ. PL. DO 1,5M2 Odkrytí stávající kab. šachty, uvedení do původního stavu	KUS			
53	ZKOUŠKY CHRÁNIČEK DN DO 100 KALIBRACE HDPE 40	M			
54	DOPLŇKY NA TRUB. VEDENÍ OSTATNÍ Varovná fólie oranžová + červená	M			
55	DOPLŇKY NA TRUB. VEDENÍ DN DO 100MM Spojka HDPE 40/40, vč. spojování	KUS			
56	DOPLŇKY NA TRUB. VEDENÍ DN DO 100MM Spojka HDPE 40/40/40, vč. spojování	KUS			
57	DOPLŇKY NA TRUB. VEDENÍ DN DO 100MM Koncovka na HDPE 40	KUS			
58	DOPLŇKY NA TRUB. VEDENÍ DN DO 100MM Průchodka na HDPE 40 vč. utěsnění konce	KUS			
59	DOPLŇKY NA TRUB. VEDENÍ DN DO 150MM Průchodka na PE 110 vč. utěsnění konce	KUS			
Potrubí					
Ostatní konstrukce a práce					
60	BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÁ ZAŘÍZENÍ - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
61	BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÁ ZAŘÍZENÍ - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Náběh svodidla	M			
62	BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÁ ZAŘÍZENÍ - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N1, N2 - DEMONTÁŽ A ODVOZ	M			
63	BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÁ ZAŘÍZENÍ - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ VYŠŠÍ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
64	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
65	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
66	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
67	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
68	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
69	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
70	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
71	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
72	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
73	UTĚSNĚNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ A CHRÁNIČEK Ochrana proti vnikání vlhkosti a hlodavců	SOUBOR			
74	PDZ A ZPI HRANOL S RETRORREFLEX FÓLII TR 2 HLINÍK DOD A MONT Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
75	PDZ A ZPI HRANOL S RETRORREFLEX FÓLII TR 2 HLINÍK DOD A MONT Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
76	PDZ A ZPI HRANOL S RETRORREFLEX FÓLII TR 2 HLINÍK DOD A MONT Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			


77	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
78	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD A MONT Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
79	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD A MONT Rozsah a specifikace dle projektu	KUS			
80	Krajnice rozšířena z původní šířky 0.75m na celkovou šířku 0.90mdle (PPK-SVO ŘSD ČR)	M			
Ostatní konstrukce a práce					2 311 930,48 Kč
C e l k e m					7 884 542,98 Kč

7.

PŘÍLOHA SMLOUVY

- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace³
- g) Výkresy⁴

NA PŘILOŽENÉM ELEKTRONICKÉM DATOVÉM NOSIČI

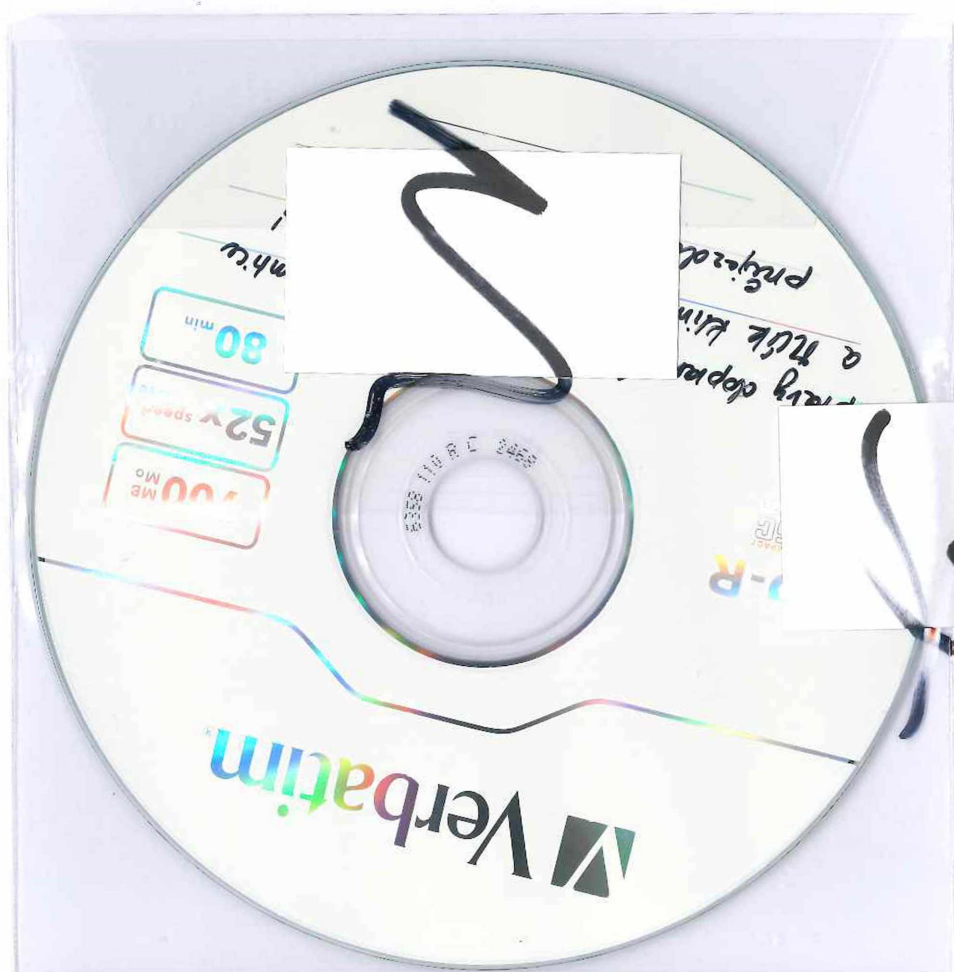

¹ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

✓

PŘÍLOHA SMLOUVY

- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:**
FORMULÁŘ 2.3.2.SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

2.

FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Úpravy dopravního značení MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice na D1 – zamezení průjezdu nákladních vozidel obcí Klimkovice“, číslo veřejné zakázky 01PU-003360 na profilu zadavatele (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
SPEL, a.s.	004 73 057	Optické sítě a část integrace
ESMOFLEX s.r.o.	286 02 218	Zemní práce

V Praze dne 5.9.2017

