

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PMJ/2017/504
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020007652
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2017/504**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Město Havlíčkův Brod



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PMJ/2017/504
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020007652
Registr smluv: ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“), v platném znění mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená: Miroslav Kot, Supervizor, Supervizor Výstavba PPS Čechy/Morava jih

bankovní spojení: PPF banka, Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Město Havlíčkův Brod

se sídlem Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

IČO :00267449

DIČ : CZ00267449

zastoupená: starostou města Mgr. Janem Teclem MBA

bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, číslo účtu: 327521/0100

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Cenový a technický návrh je realizační dokumentace a specifikace nákladů Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19. 7. 2017 vydané pod čj. 669316/17, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve dle ustanovení § 104 odst. Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC H.Brod Sportovní areál Na Losích“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Cenovém a technickém návrhu Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „CTN“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.
- (vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení CTN
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebností do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),

- ii) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Sportovní areál Na Losích stavební úpravy atletické dráhy a fotbalového hřiště Havlíčkův Brod Na Losích, č.j. ST/864/2010/Ve ze dne 7.9.2010, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 2 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 a 6.1 a) této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **97.559,- Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,

- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
 - a) Fakturu č. 1 za CTN ve výši 4.443,- Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: : Miroslav Kot
funkce: Supervizor Výstavba PPS Čechy/Morava jih
e-mail: miroslav.kot@cetin.cz. tel.: 238465200

věcech technických Ing. Milan Baránek
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Mgr. Jan Tecl MBA
funkce: starosta města
e-mail: posta@muhb.cz. tel.: 569 497 111

ve věcech technických: Beránek Tomáš
funkce: stavební dozor stavebníka
e-mail: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. V případě, že dojde k zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména

prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

10.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

10.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

10.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

10.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PMJ/2017/504
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020007652
Registr smluv: ANO

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 – Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j ST/864/2010/Ve

Doložka


Tato Smlouva byla schválena Radou města usnesením č. R 768/17 na schůzi dne 18.09.2017.

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne 10-10-2017


V Havl. Brodě dne 13.10.2017



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Miroslav Kot
Supervizor Výstavba PPS Čechy/Morava jih

Ušatná 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

219



Město Havlíčkův Brod
Mgr. Jan Tecl MBA
Starosta města



Číslo stránky: 1

xHAVB110/1 3 1/41-60
KR2712

KR2711


xHAVB110/1 2 1/11-20

254

H
xHAY

29:2
HAVB729
xHAVB110/1 3 1/21-40

3028Havličkův_Brod
HAVB3222
xHAVB729/2 3/1-5

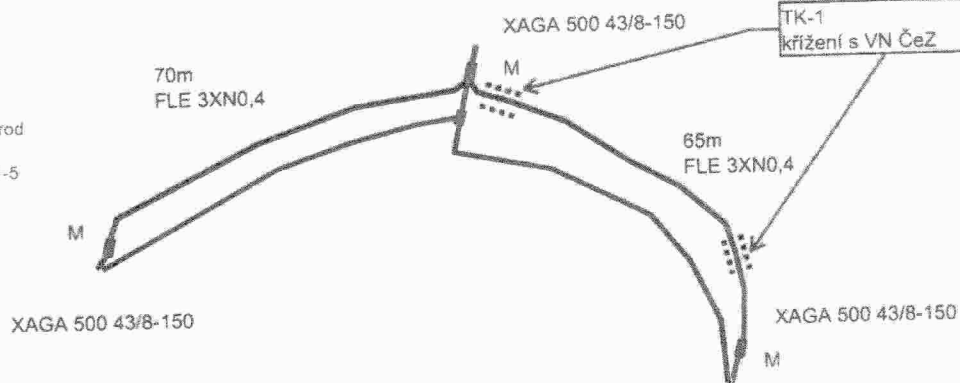

2848Havličkův_Brod
HAVB3082
xHAVB729/1 2 2/1-5

KR 3880
HAVB5086
xHAVB3082/1 2/1-5

21.08.2017 07:13

Pa

Technická zpráva

Název: VPIC H.Brod Sportovní areál Na Losích

Stručný popis:

Překládka SEK z důvodu stavby Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod

Výkop nové trasy , pokládka kabelu FLE 3XN0,4 a naspojování dle schema, označení spojek Markery, v místě křížení v NN a VN pokládka do TK-1

PD –Ne

Geo –Ano

SoU –Ano

GP-Ano

Stavebník: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

Kontakt: Renáta Pajerová, referent odboru rozvoje města, Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, tel. 569 497 134,

e-mail: rpajerova@muhb.cz

ÚR – Ne zajistí investor



v zeleném, krytí 0,6m
min. 0,3m od energ. ved. nn,
min. 0,4m od stl plynovodu,
min. 2m od vtl plynovodu
min. 0,5m od lampy
veřejného osvětlení

místo napojení
a stávající VKS

LEGENDA (stáv.inž.sítě):

TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ - TELEFONČKA OZ. ÚSTŘ. REPUBLIC, A.S.
ČEZ - KABELOVÁ VEŘENÍ HN
ČEZ - KABELOVÁ VEŘENÍ VN
VYSOKOTLAČNÝ PLYNOVOD (RWE)
STŘEDOTLAČNÝ PLYNOVOD (RWE)
STŘEDOTLAČNÝ PLYNOVOD (RWE)
STOŽAR V0 - STAVNICE
KABELNÍ TRASY VĚROSTAVENÍ (TECH.SLUŽBY MĚSTA H.BROD)
VĚŘEJNÝ KABELNÍ TELEVIZE (HSTV HAVL.BROD)
VĚŘEJNÝ VODOVOD (VAK HAVL.BROD)
VĚŘEJNÁ KANALIZACE (VAK HAVL.BROD)

POZORNOST : ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAKLÁDÁNÍM
TECHNICKÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT TYTO SÍTÍ VYČISTĚNY, PŘI SAMOTNÉ REALIZACI MUSÍ BÝT
DOROVNĚNÝ POŽADAVKY STÁNOVÝCH JEDNOTLIVÝCH SPRÁVČÍ TECHTO SÍTÍ.

LEGENDA (navržené inž.sítě):

S0 04 SKLAD – ZPRŮMĚNÁ PLOCHA – ZAKRYTÝ OBLASTÍ

TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.

Havlíčkův Brod

Zákres inženýrských sítí (IS) je pouze orientační! Před zahájením prací je nutné upřesnit IS vytkáním a sondami (vč. přípojek IS v majetku jednotlivých občanů) !!

Koncovky, spojky a oba konce chráničky dlouhě
6 m a více a chráničky v komunikačních označit
elní markery.

Stavbu koordinovat se stavbou "Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod". Koordinaci domluvit se zástupcem MěO Havlíčkův Brod (Ing. Pačerová, tel. 569497134, e-mail: ppacerova@muhb.b.z).

B-projekt

Ing. Lenka Bláhová
inženýrka pro technologiemi různě
autorizovaná
č. p. 80 582 32 LIPNICE NAD SÁZAVOU

Číslo vzkazu:

Q

Archivautor: Hauschild-Nietzsch / 2010

PPD - Propočet projektové dokume
Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2017.08
Položková databáze: 2017.08

Název stavby: **VPIC H.Brod Sportovní areál Na Losích**
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: FM
KPO: Pardubicko
HOST: Havlíčkův Brod
VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 443,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	36 451,64 Kč
MONTÁŽ	15 364,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 190,72 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	18 616,51 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov.	8 492,70 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykaz	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: **97 559,14 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 69 499,15 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 28 059,99 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA		
958210	Návrh cenový a technický bez proj	1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE		
952367	Pokládka žlabů TK1	4.00 m
951549	Přesun lávky přechodové z ocelov	2.00 ks
952345	Rýha v trávě 35/70-100	126.00 m
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terén	126.00 m
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.d	2.00 ks
MONTÁŽ		
955029	Demontáž úložných kabelů do15 >	6.00 m
952649	Měření stejnosměrné během stav	2.00 ks
952650	Měření stejnosměrné během stav	4.00 ks
952644	Měření střídavé během stavby - d:	4.00 ks
952643	Měření střídavé během stavby - p:	2.00 ks
952647	Měření útlumu během stavby- prv	2.00 ks
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.čís	11.00 ks

Handwritten signature

955268	Montáž podzemní tratě síťové me 6200.00 JV
	Projektová rezerva a technický dozor
955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 č 3.00 ks
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN 135.00 m
958556	Zpracování dok. skut. provedení n 1.00 ks
955066	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 č 1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(k 2.00 ks
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 10 20.00 m
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 10 1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcn 15000.00 JV
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vl 1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného 1.00 ks
POPLATKY	
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.r 5000.00 JV
	archeologický dozor

Limitka materiálu		
Číslo SAP	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný		
303838	Deska krycí plast. 150x1000 mm	126.00 ks
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžov	126.00 m
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenol	250.00 m
300000	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	135.00 m
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks
312425	Modul konektor. 9700-10P	3.00 ks
305338	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k	8.00 ks
407582	Souprava čistící 44135	1.00 ks
320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43,	1.00 ks
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8-	3.00 ks
305195	Žlab kabelový beton 100x17x14 cr	4.00 ks

PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2017.08
Položková databáze: 2017.08

Název stavby: **VPIC H.Brod Sportovní areál Na Losích** 1. etapa
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: FM
KPO: Pardubicko
HOST: Havlíčkův Brod
VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 4 443,48 Kč

16.

124

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 12.10.2010
Rozhodnutí je vykonatelné dnem 12.10.2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

stavební úřad

Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Městský úřad

stavební úřad

HAVLÍČKŮV BROD

Č.j.: ST/864/2010/Ve
JID: 62550/2010/muhb

Havlíčkův Brod, dne 7.9.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.7.2010 podalo

Město Havlíčkův Brod, IČ 00267449, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

SPORTOVNÍ AREÁL NA LOSÍCH

stavební úpravy atletické dráhy a fotbalového hřiště
Havlíčkův Brod, Na Losích

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3231, 3232, 5199, parc. č. 546/2, 546/10, 546/11, 546/12, 546/13, 546/14 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Druh a účel umísťované stavby:

- Současná plocha atletického oválu s okolními sportovišti je zastaralá a pro moderní sportování nevhodná až nebezpečná. Projektované řešení také rozšíří použití areálu i pro mimoškolní aktivity žáků i ostatní obyvatelé města. Dopravní napojení areálu zůstává zachováno stávající tj. od ul. Masarykova a od ul. Ledečská. Napojení el. energie bude ze stávajících el. rozvodů. Drenážní systém bude zaústěn do stávajícího drenážního vedení (do šachty v JV rohu areálu). V rámci stavby budou provedeny přeložky STL plynovodu, komunikačního vedení a kabelových vedení (bude samostatně řešeno přímo ČEZ Distribuce, a.s.).
- V rámci řešeného atletického oválu a sportoviště je zde navrženo umístění základních atletických disciplín mimo kladiva, disku a oštěpu. Sportovní aktivity budou probíhat na moderních sportovních površích, které umožňují bezpečnější a pohodlnější sportování i při zhoršených klimatických podmínkách.

Určení prostorového řešení stavby:

- SO 01 Atletický ovál a sektory: rekonstrukce běžeckého oválu délky 400 m a atletických sektorů - skoku do dálky a trojskoku, skoku do výšky, skoku o tyči, vrhu koulí a hodu oštěpem. Použity umělé sportovní povrchy - propustný tartan pro běžecký ovál, nepropustný tartan pro atletické sektory. Hrací plochy odvodněny, provedeno záchytné oplocení u fotbalové plochy, provedeny související terénní úpravy nejbližšího okolí.
- SO 02 Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště: v lajnách rozměrů 100 x 65 m, opět použit travnatý povrch, odvodněný. Nejbližší okolí terénně upraveno.
- SO 03 Automatický závlahový systém: napojený přes akumulační nádrž a čerpací stanici vody z řeky.

- SO 04 Sklad - zpevněná plocha: 2 kontejnery (6 x 3 m, výšky cca 2,7 m) pro skladování výbavy na atletiku se zpevněnou komunikační plochou.
- SO 05 Elektroinstalace: podzemní rozvod kabelového vedení v prostoru sportoviště, napojený z rozvaděče umístěného v průchodu v hlavní tribuně.
- SO 06 Přeložka plynu: trasa STL přípojky PE 63 délky cca 75 m navržena mimo ovál (směrem k oplocení).
- SO 07 Přeložka komunikačního vedení společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.: trasa komunikačního vedení délky cca 125 m navržena mimo ovál (směrem k oplocení, v souběhu s přeložkou plynovodní přípojky).

Stavba komunikačního vedení nevyžaduje podle § 103 odst.1 písm.b) bodu 1. stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavba musí být prováděna v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací stavby Koordinační situace (M 1:500), která obsahuje výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb na okolí.
2. Při zpracování projektové dokumentace a při provedení stavby budou dodrženy požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
3. Při zpracování projektové dokumentace a při provedení stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních:
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., pracoviště Pardubice – zn. 1323/10/134 ze 2.4.2010 – stanovisko k projektu přeložky plyn.zářzení – STL přípojky ocel DN 50, v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s STL plynovodem ocel DN 150 a STL plynovodní přípojkou, VTL plynovodem DN 100 PN 25
 - Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pracoviště Jihlava – č.j. 148292/09/MJL/M00 z 5.1.2010 – v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
 - ČEZ Distribuce, a.s., odd. Dokumentace sítí Benešov, pracoviště Havlíčkův Brod – zn. 1025139327 ze 23.12.2009 – v zájmovém prostoru se nachází podzemní energetické zařízení ČEZ + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení
4. V zájmovém území stavby se nachází vodovod a kanalizace ve správě Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.. Během stavby bude zachována přístupnost především revizních šachet kanalizace pro příjezd tlakového vozu, u vodovodu přístupnost po celé trase. Projektová dokumentace stavby bude předložena správci k vyjádření.
5. V zájmovém území stavby se nachází kabely veřejného osvětlení ve správě Technických služeb Havlíčkův Brod. Před započítím zemních prací bude správce požádán o přesné vytýčení kabelů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod I

Odůvodnění:

Dne 9.7.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona: Město Havlíčkův Brod

účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona: Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, Povodí Vltavy, s.p., ČEZ Distribuce, a.s., Technické služby Havlíčkův Brod, Telefonica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Stavební úřad oznámil dle § 87 odst.1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou ze 4.8.2010 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 7.9.2010, o jehož výsledku byl sepsán stručný protokol.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost nepodala žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – ÚZEMNÍM PLÁNEM SÍDELNÍHO ÚTVARU HAVLÍČKŮV BROD, který byl schválen dne 26.6.1995 usnesením č.196 Městského zastupitelstva v Havlíčkově Brodě. Záměr stavby je navržen ve funkční ploše územního plánu „sportovní plochy“.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Jelikož je v zájmovém území stavby schválen územní plán obce, doručuje se v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Těmito účastníky jsou vlastníci pozemku a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemku, na kterém má být stavba umístěna, osoby jejichž vlastnické nebo jiné práva k sousedním pozemkům a stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. v případě projednávání umístění stavby veřejnou vyhláškou bude podáno odvolání ve 3 stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



otisk úředního razítka

Bohumil Veselý
referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha:

- ověřená dokumentace (podle § 92 odst.4 stavebního zákona) – bude zaslána žadateli po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

navrhovatel - žadatel

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod I

dalším účastníkům se podle § 92, odst. 3 stavebního zákona rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou

dále obdrží

Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna – vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů, včetně způsobu umožňujícímu dálkový přístup



CETIN

Evidenční číslo: PŘ/966/2017

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Ing. Miroslava Kota

os. č. 3672, bytem Starý Pelhřimov 89, Pelhřimov, PSČ 393 01, r.č. 600222/2072,

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutí ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.


V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. Pro účely změn uvedených právních vztahů se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku přijatému či novým způsobem upravenému v dodatku ke smlouvě za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely ukončení smluv se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku, z něhož v důsledku ukončení smlouvy sešlo.


Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10. 6. 2018. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 8. 6. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo


Ing. Martin Vlček
předseda představenstva


Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/946/1036 /2017

Ověřuji, že:

Martin Vlček, nar. 2.10.1977-----

bydlištěm, Korunní 962/85, Praha 3-----

Ing. Petr Slovák, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm, K Potokům 205, Řitka-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

V Praze dne 8.6. 2017-----

Veronica repens

15-
