



SMLOUVA O DÍLO

evid. č. objednatele: 39474

evid. č. zhotovitele: HS2916-AG01-R01

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** ČEPRO, a.s.
sídlo: Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
č. účtu: Komerční banka, a.s. č. ú.11902931/0100
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy bez oprávnění k jejím změnám či zrušení (každá samostatně, není-li výslovně uvedeno jinak):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních, smluvní dokumentace technických a realizace díla, převzetí díla, zápis do pracovního deníku (ke všem částem díla)			
Smluvních a smluvní dokumentace			
Realizace a převzetí díla, zápis do pracovního deníku část A- produktovodní dispečink Hněvice, a část F			
Realizace a převzetí díla, zápis do pracovního deníku část B- sklad Klobouky			
Realizace a převzetí díla, zápis do pracovního deníku část C- sklad Nové Město			
Realizace a převzetí díla, zápis do pracovního deníku část D- sklad Potěhy			
Realizace a převzetí díla, zápis do pracovního deníku část E- sklad Litvinov			

Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) část A produktovodní dispečink Hněvice, a část F	
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) část B - sklad Klobouky	
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) část C - sklad Nové Město	
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) část D - sklad Potěhy	
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) část E - sklad Litvínov	

(dále též jen „**Objednatel**“)

Objednatel pověřuje k jednání za Objednatele výše uvedené osoby, přičemž vyjma otázky převzetí díla (každé části) je každá osoba oprávněna jednat samostatně (tj. zápisy do pracovního deníku může dělat každý z výše jmenovaných pracovníků samostatně). Převzetí díla, resp. dotčené části musí být stvrzeno písemně – podpisem Protokolu o předání a převzetí, přičemž Protokol o předání a převzetí bude výše uvedenými oprávněnými pracovníky Objednatele podepsáno společně, jinak je neplatné a pro účely této smlouvy o dílo bez právních účinků.

a

1.2. Zhotovitel: HIMA Slovakia, s.r.o.

sídlo: Vodná 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČ: 36 753 769

DIČ: SK2022350209

č. účtu: 2928750377/1100

zapsána: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č. 20995/N

zastoupena: Ing. Robert Hulák, MBA, jednatel

Osoby oprávněné jednat každý samostatně za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy bez oprávnění k jejím změnám:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace			
technických			
zápisů do stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále též jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jen „**Smluvní strany**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

ČI. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v této Smlouvě.

2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „Upgrade ŘS - Produktovody“ rozdělené na sedm částí:

Část A - Upgrade části řídicího systému SCADA z aktuální verze CITECT 7.10 na novou platformu CITECT na produktovodním dispečinku 01 Hněvice

Část B - Upgrade části řídicího systému SCADA z aktuální verze CITECT 7.10 na novou platformu CITECT sklad Klobouky včetně vizualizace na produktovodním dispečinku Hněvice

Část C - Upgrade části řídicího systému SCADA z aktuální verze CITECT 7.10 na novou platformu CITECT sklad Nové Město u Kolína včetně vizualizace na produktovodním dispečinku Hněvice

Část D - Upgrade části řídicího systému SCADA z aktuální verze CITECT 7.10 na novou platformu CITECT sklad Potěhy včetně vizualizace na produktovodním dispečinku Hněvice

Část E - Upgrade části řídicího systému SCADA z aktuální verze CITECT 7.10 na novou platformu CITECT sklad Litvínov včetně vizualizace na produktovodním dispečinku Hněvice

Část F - Záložní server s doplněním na remote desktop server pro vizualizaci CitectSCADA klientů (1ks view only client a 1ks control client) v podnikové síti (opcia 1 a 2 z nabídky Zhotovitele).

(dále též souhrnně jen „dílo“ - a pro účely Všeobecných obchodních podmínek také jen „Dílo“)

Realizace díla zahrnuje dle požadavků zadavatele zejména níže uvedené dodávky, služby a práce dodavatele:

-Vypracování realizační dokumentace

-Dodávku nových serverů, inženýrské stanice a pracovních stanic,

-Aktualizaci Citect SCADA licencí na poslední stabilní verzi, licencí OPC a ostatního souvisejícího SW

-aktualizace software pro aplikaci zálohování dat MicroMotion pro embeddedPC na lokalitách Hněvice a Litvínov

-úprava a sjednocení názvů signálů, zejména šachet (Objednatel nepředpokládá úpravu a sjednocení názvů signálů na úrovni lokálních HMI, lokálního značení přístrojů a na úrovni projektové dokumentace PLC, vznikne-li však potřeba provedení takových činností v průběhu provádění díla, pak jsou tyto činnosti, resp. náklady Zhotovitele na jejich provedení již obsaženy v Ceně díla).

-úprava grafických objektů/template, úprava databáze a vizualizace SCADA do souladu s novou verzí CITECT SCADA, drobné úpravy ve vizualizaci SCADA, sjednocení jednotek analogů, sjednocení reportů, diagnostické stavy PLC, doplnění signálů šachet na straně SCADA

-úprava výpočtu kompenzace objemu v nádržích a doplnění diagnostiky stavu radarů (nádrže)

-Aktualizaci verze Únikového systému FLOWorX včetně systému postupu dávek a jeho přesun na nový hardware

-Přesun aplikace Zálohování dat z MicroMotion na nový hardware

-uvažuje se s pevnými adresami IP pro O2 komunikace (bude potvrzeno v projektové fázi)

-Demontáž starého hardware a montáž nového hardware

-Provedení továrních akceptačních testů (FAT) za přítomnosti objednatel

-Provedení polních testů (SAT)

-Vypracování a dodávka dokumentace skutečného provedení, včetně návodů na obsluhu, údržbu, instalaci a konfiguraci

2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále a výše jen „Závazné podklady“):

- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 26. 10. 2015 k zakázce č. 229/15/OCN nazvané „Upgrade ŘS - Produktovody“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“),
- b) nabídky Zhotovitele č. HS2916-OF01-R05 ze dne 28. 10. 2015 ve znění nabídky č. HS2916-OF01-R06 včetně příloh pod č. HS2916-OF01-R06-A01, HS2916-OF01-R06-A02 a HS2916-OF01-R06-A03 ze dne 10. 12. 2015 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka“),

2.3.1. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace specifikovaná v čl. 2 odst. 2.3. písm. a) Smlouvy.

2.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

2.5. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas

2.5.1. provést dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených:

- touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
- platnými právními a technickými předpisy a technickými normami,
- Závaznými podklady,
- pokyny Objednatele,

2.5.2. a předat řádně provedené dílo a jeho jednotlivé části Objednateli.

2.5.3. V případě rozporu mezi podmínkami, podklady či pokyny uvedenými pod ust. 2.5.1 tohoto odstavce, požádá Zhotovitel písemně Objednatele o určení dalšího postupu, pokud tak Zhotovitel neučiní, považuje se za závazný podklad, podmínka nebo pokyn, který je pro Objednatele výhodnější. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za řádné provedení díla z odborného hlediska.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy prostudoval veškeré podmínky, podklady a pokyny Objednatele s vynaložením veškeré odborné a náležité péče a prohlašuje, že je podle nich možné řádně provést dílo v celém rozsahu. Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady nebo pokyny k provádění díla až v průběhu realizace díla po podpisu Smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady a pokyny neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné vady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži Zhotovitele.

2.7. Dílo bude prováděno v souladu s Harmonogramem plnění.

2.7.1. V případě potřeby dalšího upřesnění v rámci Harmonogramu plnění, jež tvoří závaznou přílohu č. 2 této Smlouvy, bude Harmonogram plnění dále upřesněn v rámci zpracování Realizačního projektu Zhotovitelem formou vyhotovení podrobného harmonogramu plnění, bude ze strany Objednatele schválen a bude oboustranně potvrzen podpisy oprávněných osob. Změny v rámci Harmonogramu plnění mohou být prováděny způsobem dle předchozí věty tohoto bodu bez uzavření dodatku k této smlouvě pouze pro dílčí postupové termíny a nesmí mít vliv na lhůtu plnění Zhotovitelem stanovenou v této smlouvě. V opačném případě, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy, musí být mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě způsobem specifikovaným v této Smlouvě.

- 2.8. Součástí díla, a rovněž součástí Ceny díla, jsou veškeré práce, výkony či dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno ve smluvních dokumentech a v Závazných podkladech, je neoddelitelnou součástí řádného provedení díla (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení díla a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, výkony či jiná plnění Zhotovitele, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání díla a k jeho úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením).
- 2.9. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutými v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, zvyklosti, jakož i technické a technologické postupy závazné na základě obecně závazných právních předpisů, včetně doporučujících ustanovení, ujednání této Smlouvy a jejich příloh a dokumentů, na které odkazuje, a vycházet ze Závazných podkladů a pokynů předaných mu Objednatелеm.
- 2.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných k řádnému provedení díla.
- 2.11. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět díla považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
- 2.12. Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že osoby provádějící dílo mají veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění a odbornou způsobilost pro provádění díla.
- 2.13. Práce na díle mohou částečně probíhat též v zónách s nebezpečím výbuchu (Zóna 1) a Zhotovitel je povinen přizpůsobit této skutečnosti veškeré strojní zařízení a strojní vybavení používané k provedení činností na díle a též je povinen přizpůsobit této skutečnosti vybavení osob podléhajících se na provádění prací z hlediska bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen na pracovišti dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a vnitřní předpisy Objednatele platné v areálu místa provedení díla (místa plnění), se kterými byl Zhotovitel předem seznámen. Veškeré náklady Zhotovitele spojené s výše uvedenými povinnostmi jsou zahrnuty ve smluvní Ceně díla.
- 2.14. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy a v souvislosti s ní (při realizaci díla, jakož i při nakládání, odvozu, likvidaci odpadu vzniklého v průběhu provádění díla Zhotovitelem) dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy v oblasti nakládání s odpady.
- 2.15. Zhotovitel je na základě a v souladu s touto Smlouvou zahájit neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy realizaci díla. V souladu se specifikací předmětu díla dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen nejprve zpracovat a vyhotovit ke každé části díla realizační projekt díla (dále a výše jen „Realizační projekt“). Realizační projekt bude Zhotovitelem vypracován v souladu se Závaznými podklady Objednatele.
- 2.15.1. Realizačním projektem dle této Smlouvy se rozumí příslušná realizační projektová dokumentace vypracovaná Zhotovitelem a další dokumenty specifikované v této Smlouvě. Veškerá dokumentace, pokud není pro jednotlivé dokumenty stanoveno dále výslovně jinak, bude Zhotovitelem zpracována v 3 (slovy: třech) vyhotovení/ch v tištěné podobě a v 3 (slovy: třech) vyhotoveních na CD v digitální podobě ve formátu PDF a ve zdrojových souborech formátů DWG, DOCX, XLSX, podle povahy zdrojových dat.
- 2.15.2. Součástí Realizačního projektu jsou dokumenty vypracované Zhotovitelem dle této Smlouvy dohodnuté mezi Smluvními stranami a zejména uvedené níže:
- a) technické zprávy obsahující popis technického řešení včetně popisu funkcionality instalovaného software,
 - b) seznam instalovaného software (dále také jen „SW“),
 - c) dokumentace hardware (dále také jen „HW“) včetně výkresu architektury řídícího systému,

- d) technické schéma umístění komponent v dotčených datových rozvaděčích,
- e) zapojovací schémata doplnění grafického manuálu Objednatele,
- f) popis reportů,
- g) popis řešení výpočtu dat a zápisu stavu nádrží zapisovaných do centrální databáze Objednatele
- h) popis všech možných rizik, například BOZP, prevence závažných havárií, atp. a postupy řešení rizik - krizové plány.

2.15.3. Součástí dokumentace k Realizačnímu projektu bude též podrobný harmonogram plnění, jež bude obsahovat:

- a) harmonogram dodávek a prací,
- b) popis činností (jako výměna, implementace, upgrade, migrace SW atd.),
- c) postupy a dílčí termíny laboratorních zkoušek,
- d) termíny reportu stavu rozpracovanosti díla Objednateli,
- e) termíny laboratorních funkčních zkoušek za účasti Objednatele,
- f) návrh předpokládaných odstávek ASŘ v místě plnění, bude-li k řádné realizaci díla potřeba
- g) termíny a postupy zkoušek pro uvedení do provozu, doba provádění testování, tzv. zkušebního provozu.

2.15.4. Podrobný harmonogram plnění v členění dle ustanovení výše musí odpovídat Harmonogramu plnění, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 2.

2.15.5. Realizační projekt musí být předán Zhotovitelem Objednateli v termínu stanoveném v Harmonogramu plnění a musí být ze strany Objednatele písemně schválen. Po schválení Realizačního projektu Objednatel se tento stává součástí Závazných podkladů a Zhotovitel je oprávněn a povinen započít s pracemi na díle postupem sjednaným v Realizačním projektu. Práce na díle budou Zhotovitelem prováděny podle Realizačního projektu.

2.15.6. Změnu Realizačního projektu smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatel písemně odsouhlaseny změny HW a SW komponent, které ovlivňují životnost, jakost a provozování díla.

2.16. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění této Smlouvy, zejména dodržování podrobného harmonogramu plnění, technologických postupů a bezpečnosti práce kdykoli v průběhu provádění díla a Zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v průběhu provádění díla poskytnout Objednateli nebo jeho zástupci veškeré požadované informace o provádění díla a umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace k dílu se vztahující a požívat si z ní výpisy a opisy.

2.17. Zhotovitel je povinen vést pracovní deník, v němž budou zapisovány veškeré skutečnosti mající vliv na způsob provádění díla a jeho kvalitu.

2.18. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností vyplývajících z této Smlouvy a jejích nedílných součástí. Veškeré důsledky vzniklé porušením povinností Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele.

2.19. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

2.20. Smluvní strany si rovněž ujednaly, že před předáním díla, resp. každé části díla bude dílo, resp. dotčená část díla vyzkoušena. Vyzkoušením díla, resp. dotčené části díla se rozumí provedení následujících zkoušek: funkční zkoušky Smluvní strany se též dohodly na tzv. zkušebním provozu díla spočívajícím v testování funkčnosti díla před jeho uvedením do provozu. Testování - dále též tzv. akceptační testy budou probíhat v délce 5 po sobě následujících dnů a za podmínek a způsobem sjednaným mezi Smluvními stranami a uvedeném v podrobném harmonogramu plnění.

- 2.21. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli prosté práv třetích osob, tj. zejména, pokud je součástí plnění Zhotovitele též projekt či jiné autorské dílo, předá jej Zhotovitel Objednateli s prohlášením Zhotovitele opravňujícím Objednatele za odměnu již obsaženou v rámci Ceny díla na dobu trvání k využití - ke všem způsobům užití dané části plnění chráněné předpisy na ochranu autorských práv, a to s právem následné úpravy takového autorského díla, jeho kopírování a včetně práva předání k úpravě třetím osobám.
- 2.22. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k udělení licence k dodávaným SW. Zhotovitel touto smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k užití SW dodaných Zhotovitelem v rámci plnění díla. Pro konfigurační část SW bude též předáno právo následné úpravy díla, jeho kopírování, odstranění a včetně práva předání k úpravě třetím osobám. Licenční ujednání je Zhotovitel povinen objednateli předat nejpozději v den převzetí díla. Licence k užití dotčených SW je udělena na dobu neurčitou jako výhradní s územním rozsahem Česká republika.
- Licence budou uděleny jako výhradní, územně a časově neomezené.
- 2.23. V případě, že v průběhu provádění díla vyjde najevo nezbytnost provedení dodatečných prací či výkonů, které nebyly obsaženy v původním vymezení díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce či výkony jsou nezbytné pro řádné provedení díla (dále jen „Vícepráce“), je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele tyto Vícepráce provést za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 2.23.1. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli Vícepráce bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uvedeného v dodatku k této Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli Vícepráce provedené bez předchozího písemného souhlasu Objednatele stvrzené dodatkem k této Smlouvě.
- 2.24. Není-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn navrhnout změnu rozsahu díla kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. Veškeré změny díla budou vždy doloženy změnovým listem, zapsány v pracovním deníku a bude sepsán a Smluvními stranami podepsán dodatek k této Smlouvě.
- 2.25. Zhotovitel je oprávněn začít provádět změny teprve po písemné dohodě s Objednatelem formou dodatku ke Smlouvě, jinak není Objednatel povinen uhradit cenu takovýchto prací a výkonů, ledaže se jedná pouze o omezení/zúžení rozsahu díla, které je pro Zhotovitele závazné ke dni písemně určenému Objednatelem.
- 2.26. Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít přednost vždy verze v českém jazyce. Komunikačním jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem je stanoven jazyk český a slovenský.
- 2.27. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č. 229/15/OCN s názvem „**Upgrade ŘS - Produktovody**“ včetně výsledku daného řízení, jímž je tato mezi Smluvními stranami uzavřená Smlouva.
- 2.28. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení veškerých informací získaných v souvislosti s plněním této Smlouvy (dále jen „informace“) způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost trvá po dobu platnosti této Smlouvy a 2 (slovy: dva) roky po ukončení účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných osob na straně Zhotovitele a rovněž u jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí Smluvní straně ukládá zákon či soudní rozhodnutí.
- 2.29. Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí se zpřístupněním a zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, výši skutečné uhrazené ceny za plnění Zhotovitele a příp. seznam subdodavatelů Zhotovitele na internetových stránkách na profilu Objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 2.30. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006, insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění této Smlouvy do likvidace.

- 2.31. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/eticky_kodex-final.pdf nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 2.32. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a.s.

ČI. 3. CENA A PĚTEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Celková cena za provedení díla Zhotovitelem v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:
12 100 029,- Kč (slovy: dvanáctmilionůstotiscidvacetdevět korun českých)
(dále a výše též jen „Cena díla“),
- 3.2. Podkladem pro Cenu díla je Cenová nabídka Zhotovitele Položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Položkový rozpočet, na jehož základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úpíného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2821 zák. č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.4. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
Cena díla je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací díla Zhotovitelem a s předáním díla Objednateli včetně dokladů, předepsaných v platných právních a technických předpisech nebo sjednaných v této Smlouvě.
- 3.5. Objednatel bude hradit platby dle této smlouvy bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v úvodní části této smlouvy. Dodavatel určí pro úhradu plateb účet u peněžního ústavu v České republice. V případě že zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této Smlouvě v souladu s ustanovením článkem 12 odst. 12.3 této Smlouvy, a to za podmínky uvedené v předchozí větě.
- 3.6. Cena díla bude Zhotovitelem vyúčtována Objednateli dílčími fakturami – daňovými doklady s DPH dle podmínek v této Smlouvě dále uvedených.
- 3.7. Provedené práce a dodávky budou hrazeny dílčími fakturami - daňovými doklady (dále také jen „díličí faktury“ a samostatně též „díličí faktura“) s DPH, které je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě prací a dodávek a předání veškeré dokumentace potvrzeného zástupcem Objednatele a potvrzeného zjišťovacího protokolu (rekapitulace). Zjišťovací protokol bude vyhotoven Zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc provádění Díla a bude obsahovat:
- a) práce a dodávky Zhotovitelem provedené při provádění díla za příslušný kalendářní měsíc, ke kterému se vztahuje
 - b) provedené práce a dodávky načítané celkem za celé dílo
- 3.8. Objednatelem potvrzený soupis a zjišťovací protokol budou nedílnou součástí Zhotovitelem vystavené díličí faktury. V díličí faktuře uvede Zhotovitel celý objem odsouhlasených prací a

dodávek a sám provede odpočet 10% z ceny fakturovaných prací a dodávek bez DPH jako pozastávku (zádržné) tak, že k úhradě bude vždy 90% z ceny prací a dodávek bez DPH a příslušné DPH dle platných předpisů. Celková fakturace všemi dílčími fakturami a konečnou fakturou nepřesáhne 90% smluvní Ceny díla podle této Smlouvy bez DPH. Zádržné ve výši 10 % ze smluvní Ceny díla bude použito k případné úhradě nákladů a újm, které Objednateli vzniknou porušením povinnosti Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů

- 3.9. Součástí každé dílčí faktury vystavené Zhotovitelem musí být vedle zjišťovacího protokolu také oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto dílčí fakturou účtovány písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem Objednatele vykonávajícím technický dozor, přičemž je Zhotovitel povinen vystavit vždy zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH Zhotovitel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká Zhotoviteli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH objednatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká Objednateli). Objednatel potvrdí zjišťovací protokol a soupis provedených dodávek, jsou-li vyhotoveny v souladu s touto Smlouvou a ze strany Objednatele bez výhrad.
- 3.10. Smluvní strany se zároveň dohodly, že pro zádržné se neuplatní ustanovení čl. 6.7.2.2 VOP s tím, že celá částka zádržného ve výši 10% Ceny díla bude uhrazena dle postupu uvedeným v čl. 6.7.2.1, tj. po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, tj. všech částí díla nebo v případě vad a nedodělků až po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků (u všech částí díla).
- 3.11. Adresy pro doručení faktur/ů:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Mstětice 62, 411 08 Štětí;
- 3.12. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 3.13. Objednatel bude hradit platby dle této Smlouvy bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v čl. 1 této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této Smlouvě. Objednatel nebude povinen platit na účet, který nebude splňovat podmínky, které stanoví obecně závazné právní předpisy.

ČI. 4. ZAPOČETÍ PRACÍ A PRACOVISTĚ

- 4.1. Zhotovitel vypracuje a Objednateli v souladu s ustanovením 2.15 a souvisejícími dle této Smlouvy předá Realizační projekt. Pro písemné schválení Realizačního projektu Objednatel vystaví protokol o schválení a zašle jej elektronickou poštou Zhotoviteli na adresu [REDAKCE]. Obdržení protokolu o schválení Realizačního projektu je pokynem pro Zhotovitele k zahájení prací na díle podle schváleného podrobného harmonogramu plnění. Po dokončení testů a odstranění podstatných vad a nedodělků vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí pracoviště.
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli pracoviště v místě realizace díla na základě výzvy (zápisu) Objednatele k převzetí pracoviště Zhotovitelem. O předání a převzetí pracoviště bude vyhotoven protokol o předání a převzetí pracoviště.
- 4.3. Pokud se Zhotovitel k převzetí pracoviště nedostaví a nedostaví se ani v náhradním termínu stanoveném Objednatelem, má se za to, že pracoviště v náhradním termínu převzal, není-li písemně dohodnuto něco jiného. Právní domněnka převzetí pracoviště se uplatní, pokud Objednatel neuplatní právo od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu nepřevzetí pracoviště Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od Zhotovitele požadovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a kromě toho nahradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4. Zhotovitel je povinen provádět práce pouze ve vytyčeném obvodu pracoviště.
- 4.5. Zhotovitel odpovídá za zjištění a ochranu veškerých inženýrských sítí a zařízení na pracovišti.

- 4.6. Dílo v místě plnění bude prováděno za provozu skladů a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu nákladů na opatření k dodržování předpisů Objednatel platných v areálu skladu jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 4.7. V případě nutnosti odstávky zařízení Objednatel v místě provádění díla budou práce na díle v místě plnění prováděny výhradně v předem dohodnutých termínech uvedených v Realizačním projektu schváleném Objednatel. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepřekročil dohodnutou dobu odstávky. Délka naplánované odstávky nesmí být překročena, přičemž nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku ukončit ve stanoveném termínu. Za nedodržení termínu spojeného s vyklizením pracoviště a tím nedodržení stanoveného termínu nutného pro ukončení odstávky je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu požadovanou dle čl. 10 této Smlouvy.
- 4.8. Nebude-li Zhotovitelem dodržen podrobný harmonogram plnění v případě postupu prací a dodávek Zhotovitele naplánovaných během odstávky a činnosti (práce a dodávky) Zhotovitele nebudou řádně a včas Zhotovitelem provedeny, dokončení potřebných prací proběhne v další odstavce, která bude dohodnuta na základě návrhu Objednatel dle jeho obchodních priorit a bude nejprve schválena Objednatel. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatel a nezproštuje tedy Zhotovitel zodpovědnosti za splnění díla v řádné době plnění, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstavkou a odstavkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně Objednatel.
- 4.9. O průběhu realizace díla v místě plnění bude veden pracovní deník. Do pracovního deníku jsou oprávněni zapisovat pověřeni pracovníci každý samostatně.
- 4.10. Zhotovitel musí dbát na to, aby práce probíhaly pouze na určeném místě pracoviště.
- 4.11. Zhotovitel odpovídá za udržení pořádku na přiděleném pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatel vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k vyúčtování těchto nákladů zaslanou Objednatel Zhotoviteli na adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.

ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy. Provádění prací v místě plnění je Zhotovitel povinen započít v termínu podle schváleného podrobného harmonogramu plnění po vyrozumění o schválení Realizačního projektu Objednatel a převzetí pracoviště.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené celé dílo v rozsahu této smlouvy, tj. včetně dokladů podle této Smlouvy, nejpozději ve lhůtě:
- 5.2.1. Do 30. 6. 2017
- 5.2.2. Termín dokončení díla a jeho předání objednateli je dále rozlišen dle jednotlivých částí díla v závislosti na podmínkách pro uvádění díla do provozu. Tímto není jakkoliv dotčeno ustanovení 5.2.1. tohoto odstavce
- 5.3. Dílčí termíny pro provádění díla (každé jeho části) jsou stanoveny v Harmonogramu plnění, který je přílohou této Smlouvy, a dále jsou blíže rozpracovány v podrobném harmonogramu plnění, který tvoří součást Realizačního projektu, jenž je pro Zhotovitel po odsouhlasení ze strany Objednatel závazný.
- 5.4. V harmonogramu plnění jsou rovněž uvedeny lhůty pro provedení akceptačních testů, tj. tzv. zkušebního provozu. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí řádné, kompletní a bezvadné dokončení díla (části A až části G), provedení zkušebního provozu a uvedení díla/ všech dotčených částí do provozu Zhotovitelem.

ČI. 6. MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1. Místem plnění je:

Pro část A) díla ČEPRO, a.s., Produktovody Hněvice, Šachty s PLC na produktovodních trasách a koncová zařízení skladů ČEPRO

Pro část B) díla ČEPRO, a.s., sklad Klobouky

Pro část C) díla ČEPRO, a.s., sklad Nové Město u Kolína

Pro část D) díla ČEPRO, a.s., sklad Potěhy

Pro část E) díla ČEPRO, a.s., sklad Litvínov

Pro část F) díla ČEPRO, a.s., Produktovody Hněvice

S výjimkou činností, jež je Zhotovitel v rámci díla oprávněn provádět vzdáleným přístupem a/nebo v provozovně Zhotovitele.

- 6.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo i umístění díla v souladu se Smlouvou. Místo plnění uvedené výše v předchozím ustanovení tohoto článku Smlouvy je místem předání a převzetí díla, resp. dotčené části díla.

ČI. 7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA

- 7.1. Plněním povinností v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na pracovišti mezi zaměstnanci Objednatele a zaměstnanci Zhotovitele jsou za Objednatele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřeny osoby uvedené v článku 1 této smlouvy. Zároveň se obě strany dohodly, že tyto osoby budou plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 7.2. Plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na pracovišti mezi zaměstnanci Zhotovitele a zaměstnanci Objednatele je za Zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen pan [REDACTED]

ČI. 8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Převzetí a předání díla dle této Smlouvy bude provedeno způsobem dle této Smlouvy a příslušných ustanovení Všeobecných obchodních podmínek (dále též jen „VOP“).
- 8.2. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem elektronickou poštou na adresu osob, uvedených v čl. 1 této Smlouvy jako oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech technických a realizace díla.
- 8.3. Předběžné předání a převzetí díla se uskuteční v souladu s touto Smlouvou dle termínu uvedeném v podrobném harmonogramu plnění pro každou část díla samostatně. Po dokončení všech jednotlivých částí díla budou následovat komplexní zkoušky a komplexní převzetí díla, po jehož dokončení bude možno považovat za ukončené předání a převzetí jednotlivých částí díla. Pro účely převzetí části díla a před převzetím je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady a není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v počtu 2 (slovy: dvou) vyhotovení:
- 8.3.1. Dodací listy instalovaných zařízení
 - 8.3.2. Návodů k obsluze a další doklady nezbytné k užívání instalovaných zařízení dle právních a technických předpisů v ČR
 - 8.3.3. Záruční listy
 - 8.3.4. Protokoly o provedených testech (laboratorní, provozní), doklady o provedených zkouškách a revizích, protokol o provedení akceptačních testů (zkušebního provozu)
 - 8.3.5. ES prohlášení o shodě k výrobkům dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

- 8.3.6. Manuál pro obsluhu Objednatele v počtu vyhotovení 4x v tištěné formě a 4x v elektronické formě ve formátech pdf, docx.
 - 8.3.7. Protokol o provedení zaškolení obsluhy (dokument stvrzující provedená školení příslušných pracovníků Objednatele)
 - 8.3.8. Doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
 - 8.3.9. Licenční oprávnění k dodávanému softwaru
 - 8.3.10. Dokumentaci o skutečném stavu provedení díla v počtu 4paré v tištěné podobě a 4x na CD/DVD v elektronické formě (pdf a zdrojových formátů dwg, vsd, xlsx, docx)., přičemž tato dokumentace bude obsahovat technickou zprávu obsahující popis technického řešení včetně popisu funkcionality instalovaného software, seznam instalovaného software, dokumentaci hardware včetně výkresu architektury řídicího systému, technické schéma umístění komponent v dotčených datových rozvaděčích, zapojovací schémata (ucelený/kompletní balík dokumentace pro dotčené rozvaděče DT), seznam signálů a jejich konfigurace včetně nastavení alarmů v xlsx a pdf formátu, výtisk mimik, výtisk reportů s popisem výpočtů a legendou
 - 8.3.11. 4xCD/DVD se zálohami aplikačního software a konfiguračního software ve zdrojových formátech
 - 8.3.12. Pracovní deník
 - 8.3.13. Další nezbytné doklady potřebné dle právních a technických předpisů českého právního řádu
- 8.4. Veškerá dokumentace musí být objednateli předána v českém nebo slovenském jazyce. Bez výše uvedených dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele dle této Smlouvy za splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění dle této Smlouvy nebylo řádné, tj. bez vad.

ČI. 9. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo Objednateli záruku za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti sjednané v této Smlouvě (jejich součástech i přílohách), stanovené v právních a technických předpisech. Záruční doba se sjednává v délce trvání 36 měsíců, s výjimkou hardware instalovaných Zhotovitelem, pro nějž je sjednána záruční doba (vyjma subdodávek, u nichž je záruční doba zachována delší dle Závazných podkladů). Záruční doba počíná termínem podpisu komplexního převzetí díla.
- 9.2. Zhotovitel přejímá záruku za to, že dílo podle této Smlouvy bude během záruční lhůty dle této Smlouvy:
- 9.2.1. bez vad;
 - 9.2.2. splňovat všechny požadavky stanovené Smlouvou;
 - 9.2.3. splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům;
 - 9.2.4. nebude obsahovat chyby a nedostatky.
- 9.3. Vady díla projevené a/nebo které Objednatel zjistí v záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli do konce záruční doby. Nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli probíhá písemně či elektronicky na e-mail servis@hima.com. Vadu, nahlášenou Objednatelem Zhotoviteli odstraní Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od nahlášení, pokud si nedohodne s Objednatelem písemně lhůtu jinou.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje po záruční dobu bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich následků, tj. opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady a na své nebezpečí jakékoli vadné součásti díla. Pro odstoupení od Smlouvy z důvodu vad plnění Zhotovitele platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li sjednáno mezi Smluvními stranami dále odlišně.

- 9.5. Práva Objednatele z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této Smlouvě výslovně stanoven postup odlišný.
- 9.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. Záruční doba dále neběží po dobu ode dne, kdy Objednatel uplatní na Zhotoviteli oprávněné nároky z vad, do dne, kdy Zhotovitel Objednateli uplatněné nároky z oznámené vady zcela neuspokojí.
- 9.7. Kromě povinností Zhotovitele vyplývajících výše je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním Zhotovitele.

ČI. 10. SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 10.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedeného, bezvadného, funkčního a provozuschopného díla nebo dotčené části díla dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny díla včetně DPH, uvedené v ustanovení 3.1. této Smlouvy, za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. Za nesplnění lhůty nebo termínu odstranění vad a nedodělků dle této Smlouvy nebo za prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla, reklamované v záruční době, ve lhůtě dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za každou vadu či nedodělek, s jejichž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.
- 10.3. V případě neplnění stanoveného Harmonogramu plnění a/nebo podrobného harmonogramu plnění Zhotovitelem je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s postupovým termínem. Za postupový termín se považuje každý termín v Harmonogramu plnění či v podrobném harmonogramu plnění sjednaném podle této Smlouvy.
- 10.4. Neodevzdá-li Zhotovitel Objednateli řádně vyklizené pracoviště, prosté všech pozůstatků činnosti Zhotovitele a odpovídající této Smlouvě, do 5 dnů po předání díla, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.5. Jestliže Zhotovitel nedodrží harmonogram odstávky dle plánovaných postupových termínů, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli za každý započatý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč.
- 10.6. V případě porušení podmínek BOZP a v případě porušení vnitřních předpisů Objednatele je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 10.7. Pro všechny smluvní pokuty sjednané mezi stranami v tomto článku Smlouvy a jinde ve Smlouvě platí:
- 10.7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 10.7.2. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 10.7.3. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 10.7.4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.
- 10.8. Smluvní strany se dohodly na omezení maximální celkové výšky smluvních pokud na 10% celkové smluvní ceny díla.

ČI. 11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. K řádnému provedení díla Zhotovitelem se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost:

11.1.1. Objednatel zajistí zejména:

- a) zajištění vzdáleného přístupu na stávající SW zařízení a fyzického vstupu pracovníků Zhotovitele do areálů skladů ČEPRO, a.s. – místa plnění,
- b) školení osob na straně Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele,
- c) součinnost osob Objednatele při provádění díla a jeho vyzkoušení (zejména zaměstnanců Objednatele z provozního úseku a z odboru informačních technologií).

11.2. Funkcí technického dozoru jsou pověřeny osoby, uvedené v úvodní části, tj. v čl. 1 této Smlouvy jako osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech technických a realizace díla, každý je oprávněn jednat samostatně, není-li uvedeno jinak.

11.2.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně tyto osoby změnit. Změna je vůči Zhotoviteli účinná dnem písemného oznámení zápisem v pracovním deníku.

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 25 000 000,- Kč.
- pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 25 000 000,- Kč

11.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

11.3.2. Nezakládá-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění ve výše uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

11.4. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnou legislativou. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.

Čl. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

12.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její částí, či Smlouvu jako celek třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

12.3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že žádná ze Smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí z této Smlouvy či z jejího porušení do podoby cenného papíru. Tato Smlouva není převoditelná rubropisem.


- 12.5. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 12.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- 12.6.1. Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele
- 12.6.2. Příloha č. 2 – Harmonogram plnění
- 12.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 12.8. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 12.9. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>.
- 12.9.1. Na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou se neuplatní ustanovení čl. 6.3 VOP.

V Praze dne: 17. 12. 2015

V HITE... dne: 17. 12. 2015

Objednatel:

Za ČEPRO, a.s.



.....
pěva
avenstva

.....
Ing. Ladislav Štánek
člen představenstva

Zhotovitel:

Za HIMA Slovakia, s.r.o.



.....
Ing. Robert Hulák, MBA
jednatel




HIMA Slovakia s.r.o.
Vodná 23, 949 01 Nitra

	Popis	Cena [CZK]
1000	Materiál	5 565 330
2000	Subkontrakty	950 056
3000	Práce	4 046 914
4000	Cestovné	465 343
5000	Balenie a doprava	0
5100	Záruky	514 897
5200	Finančné zabezpečenie	0
5300	Ostatné výdavky	0
5400	Licencie (FLOWorX)	557 489
Suma:		12 100 029



HIMA Slovakia s.r.o.
Vodná 23, 949 01 Nitra

R06								
	Popis	Materiál [CZK]	Subdodávky [CZK]	Práce [CZK]	Cestovné [CZK]	Ostatné [CZK]		
1	Upgrade SCADA	5 234 247	778 832	4 029 512	465 343	479 729	557 489	11 545 152
2		0	0	0	0	0		0
3	OPCIA 1 - záložný server	178 755	16 647	17 401	0	35 168		247 971
4		0	0	0	0	0		0
5	OPCIA 2 - Prístup do podnikovej siete	152 329	154 577	0	0	0		306 906
Spolu:		5 565 330	950 056	4 046 914	465 343	514 897	557 489	12 100 029



HS2916-OF01-R06
CEPRO - Upgrade RS - Produktovody



HIMA Slovakia s.r.o.
Vočná 23, 949 01 Nitra

00 Materiál																	
Kód	Sub Kód					Oby. kód	Název / Deduktor	HIMA	Hnevica	Slapanov	Klobouky	Potehy	N.Mesto	Litvinov	Počet MJ	Jedn. cena (CZK)	
																Spolu:	5 363 330



Kód	Sub Kód	Popis	Dodávateľ	HIMA	Hnevce	Slapanov	Klobouky	Potehy	N.Mesto	Litvinov	Poččet	MJ	Jedn. cena [CZK]	Celková
2000														627,16
	1	SCADA servis support			240						240		2 378,11	570 746,88
											0		0,00	0,00
	3	SCADA servis support			2						2		2 378,11	4 756,22
											0		0,00	0,00
	5	SCADA servis support			40						40		2 378,11	95 124,48
											0		0,00	0,00
2100														428,16
	1	Systémový administrátor support			280						280		743,16	208 084,80
											0		0,00	0,00
	3	Systémový administrátor support			16						16		743,16	11 890,56
											0		0,00	0,00
	5	Systémový administrátor support			80						80		743,16	59 452,80
											0		0,00	0,00
2200														
2300														
2400														
2500														
Spolu:														950 056



			HIMA	Hnevce	Slapanov	Klobouky	Potehy	N.Mesto	Litvinov			
3000												
3001	1	Vedenie projektu	240							240	1 772,35	425 363,38
3010	1	Technický dohľad	160							160	1 772,35	283 575,59
3020		Iné								0	1 772,35	0,00
3030		Iné								0	1 772,35	0,00
3040		Iné								0	1 772,35	0,00
3090		Nezhody								0	1 772,35	0,00
3100												
3101	1	Špecifikácia funkčnosti systému (FDS)	160							160	1 087,58	174 012,29
3110	1	Detailná špecifikácia systému (DDS)								0	1 087,58	0,00
3115	1	Definícia a špecifikácia hardvéru (HDS)								0	1 087,58	0,00
3120	1	Špecifikácia SCADA systému								0	1 087,58	0,00
3125	1	Návrh hardvéru								0	1 087,58	0,00
3130	1	V/V databáza								0	1 087,58	0,00
3140	1	Nákup materiálu								0	1 087,58	0,00
3145	1	Riadenie výroby								0	1 087,58	0,00
3150	1	Vývoj a konfigurácia PLC/RTU softvéru								0	1 087,58	0,00
3160	1	Konfigurácia SCADA softvéru	640							640	1 087,58	696 049,17
3170	1	Konfigurácia SCADA databázy	120							120	1 087,58	130 509,22
3175	1	Konfigurácia SCADA grafiky	380							380	1 087,58	413 279,19
3177	1	Konfigurácia SCADA Historian	160							160	1 087,58	174 012,29
3180	1	Inštalácia a konfigurácia HW	160							160	1 087,58	174 012,29
3180										0	1 087,58	0,00
3180	3	Inštalácia a konfigurácia HW	8							8	1 087,58	8 700,61
3190	1	Hardvérové testy	40							40	1 087,58	43 503,07
3190										0	1 087,58	0,00
3190	3	Hardvérové testy	8							8	1 087,58	8 700,61
3200	1	Softvérové testy	40							40	1 087,58	43 503,07
3205	1	Interný test (IT)	80							80	1 087,58	87 006,15
3205										0	1 087,58	0,00
3205	3	Interný test (IT)	0							0	1 087,58	0,00
3210	1	Továrenský test (FAT)	80							80	1 087,58	87 006,15



		Aktivita	HIMA	Hnevce	Slapanov	Klobouky	Potehy	N.Mesto	Litvinov	Hodiny	Jedn. cena [CZK]	Čelko [CZK]
3215	1	Specifikácia testovania	80							80	1 087,58	87 006,15
3220	1	Tvorba dokumentácia (manuály...)	80							80	1 087,58	87 006,15
3225	1	Plán kvality								0	1 087,58	0,00
3230	1	Iná dokumentácia	40							40	1 087,58	43 503,07
3235	1	Schôdze so zákazníkom								0	1 087,58	0,00
3240	1	Príprava školenia	40							40	1 087,58	43 503,07
3250	1	Školenie zákazníka								0	1 087,58	0,00
3255	1	Príprava inštalácie								0	1 087,58	0,00
3290		Nezhody								0	1 087,58	0,00
3401	1	Konfigurácia Embedded PC		16					16	32	805,61	25 779,60
3445		Nezhody								0	805,61	0,00
3501		Specifikácia funkčnosti systému pre SW								0	1 087,58	0,00
3510	1	Systémová analýza	40							40	1 087,58	43 503,07
3520	1	Tvorba softvéru	160							160	1 087,58	174 012,29
3530		Testovanie softvéru								0	1 087,58	0,00
3540		Dokumentácia softvéru								0	1 087,58	0,00
3550		Školenia zákazníka pre softvér								0	1 087,58	0,00
3560		Iné								0	1 087,58	0,00
3570		Iné								0	1 087,58	0,00
3580		Iné								0	1 087,58	0,00
3590		Nezhody								0	1 087,58	0,00
3601	1	Vedenie projektu		40		16	16	16	16	104	1 772,35	184 324,13
3601										0	1 772,35	0,00
3610		Technický dohľad								0	1 772,35	0,00
3620		Iné								0	1 772,35	0,00



3000 Práce												
Kód	Sub Kód	Aktivita	HIMA	Hnevce	Slapanov	Klobouky	Potehy	N.Mesto	Litvinov	Hodiny	Jedn. cena [CZK]	Celková cena [CZK]
3630		Iné								0	1 772,35	0,00
3640		Iné								0	1 772,35	0,00
3645		Nezhody								0	1 772,35	0,00
3700		Práca Inžiniering - vonku								560		602 848,00
3701		Obhliadka v mieste inštalácie								0	1 087,58	0,00
3705		Dohľad nad montážnymi prácami								0	1 087,58	0,00
3710	1	Inštalčné práce		40		8	8	8	8	72	1 087,58	78 305,53
3715										0	1 087,58	0,00
3720		Schôdzo so zákazníkom								0	1 087,58	0,00
3730	1	Individuálne skúšky systému		160		16	16	16	16	224	1 087,58	243 617,21
3740	1	Komplexné skúšky/nábeh systému		80		8	8	8	8	112	1 087,58	121 808,60
3750	1	Poľný test (SAT)		80		12	12	12	12	128	1 087,58	139 209,83
3760		Skúšobná prevádzka								0	1 087,58	0,00
3770	1	Asistencia pri prevádzke systému								0	1 087,58	0,00
3775	1	Školenie zákazníka		8		4	4	4	4	24	1 087,58	26 101,84
3780		Čas strávený cestovaním								0	1 087,58	0,00
3790		Nezhody								0	1 087,58	0,00
3800		Výroba - vonku								0		0,00
3850		Ostatné práce - vonku								0		0,00
3900		Servis a údržba - vonku								0		0,00
3940		Vývoj softvéru - vonku								0		0,00
										3 412	Spolu:	4 046 914




Kód	Sub Kód	Popis	HIMA	Hnevce	Slapanov	Klobouky	Potehy	N.Mesto	Litvinov	Počet	MJ	Jedn. cena [CZK]	Celková cena [CZK]
4000	1	Diéty		51		8	8	8	8	83	deň	630,00	52 290,00
4000					0					0	deň	0,00	0,00
4010		Cestovné - letenky								0		0,00	0,00
4020	1	Cestovné - automobil		20400		1600	2133	2667	3733	30533	km	10,81	330 053,12
4020					0					0	km	0,00	0,00
4030		Prenájom automobilu								0		0,00	0,00
4040	1	Ubytovanie		51	0	8	8	8	8	83	noc	1 000,00	83 000,00
4040					0					0	noc	0,00	0,00
4050		Iné								0		0,00	0,00
4060		Iné								0		0,00	0,00
4070		Iné								0		0,00	0,00
4080		Iné								0		0,00	0,00
4090		Iné								0		0,00	0,00
4990		Nezhody								0		0,00	0,00
Spolu:													465 343



HINIA Slovakia s.r.o.
Vodná 23, 949 01 Nitra

[illegible]

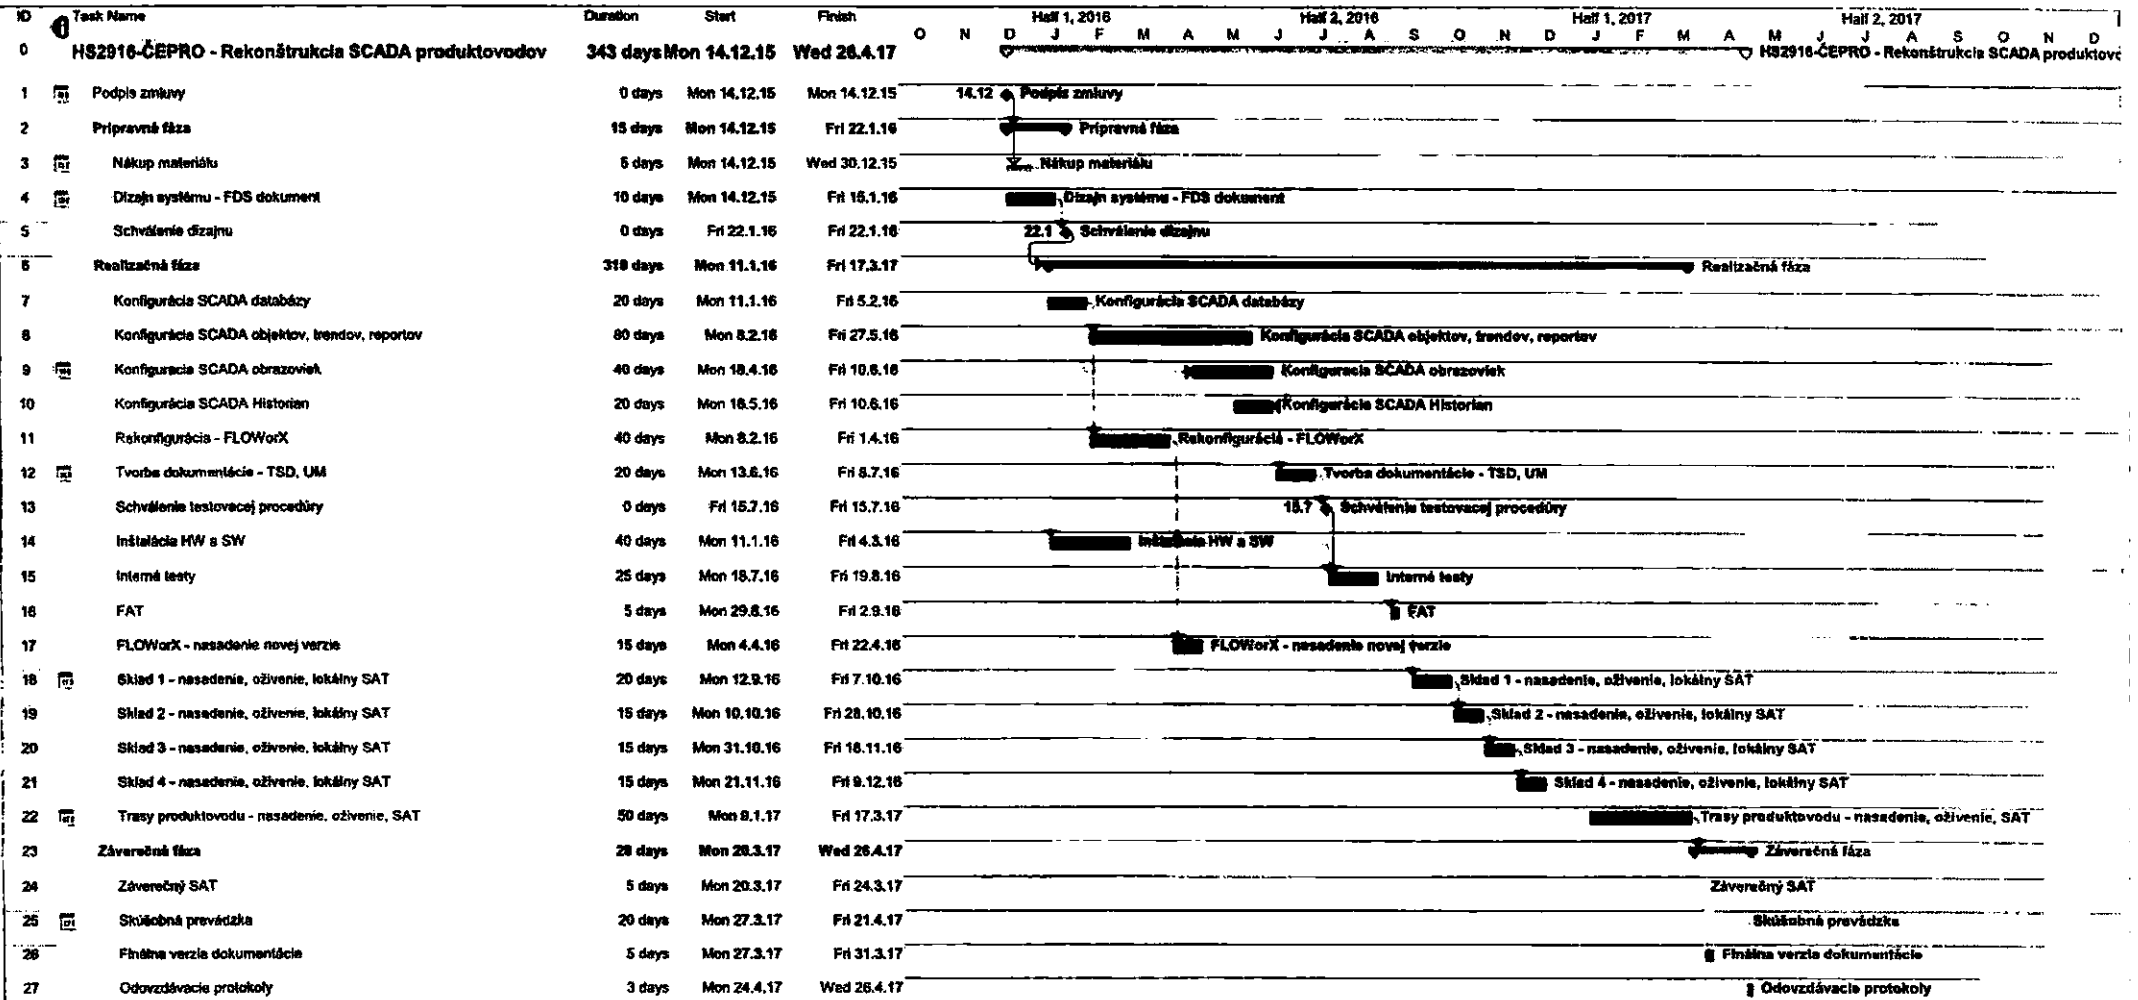

Project: HS2916-ČEPRO - Rekonštrukcia Date: Mon 7.12.15	Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Progress
	Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Deadline
	Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	
	Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	
