



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000466

Číslo smlouvy Poskytovatele: 17UL12006

ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín, aktualizace vyjádření vlastníků Inženýrských sítí**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

██████████, generální ředitel

██████████, vedoucí odboru investiční přípravy a realizace

a

Valbek, spol. s r.o

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,
400 03 Ústí nad Labem

482 66 230

CZ48266230

Krajský soud v Ústí nad Labem, v oddíle C,
vložce 4487

společnost s ručením omezeným

██████████, ředitel střediska Ústí nad
Labem na základě plné moci ze dne 11.1.2018

Ing. ██████████

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: Ředitelství silnic a dálnic ČR, adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, GŘ, úsek výstavby, Čerčanská 2023/12, 140 00, Praha 4.
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV. této Smlouvy.
4. Je-li součástí plnění Poskytovatele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Poskytovatel Objednateli nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. IV Smlouvy.
5. Neuplatňuje se

III.

Doba plnění

1. Zahájení plnění: dnem účinnosti Smlouvy.

2. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.6.2018.

IV. Cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

Cena bez DPH: 62 400,- Kč

DPH: 13 104,- Kč

Cena včetně DPH: 75 504,- Kč

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na následující fakturační adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4.
2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému rozpisu Ceny Služeb uvedenému v Příloze č. 2 Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

VI. Odpovědnost za vady

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.
2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.
3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.
4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.
5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Vytčení vady.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.
7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.
8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.
9. Neuplatňuje se.

VII.

Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové Ceny Služeb, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

VIII.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
5. Neuplatňuje se
6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.
7. Neuplatňuje se.

IX.

Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

Příloha č. 3 – Výpis vyjádření na úseku 16 a 17 k DSP

V Praze dne 14. 02. 2018

Podpis oprávněné osoby



V Ústí nad Labem dne 9.2.2018

Za Poskytovatele:

ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné
moci ze dne 11.1.2018

Podpis oprávněné osoby

Valbek

Valbek, spol. s r.o.
středisko Ústí
Děčínská 717/21
400 03 Ústí n. L.
IČO _____
DIČ _____6230

01

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Poskytovatel zajistí aktualizaci stanovisek vlastníků a správců inženýrských sítí tak, aby byla platná nejméně do 03/2019 (nejzazší předpokládaný termín předání staveniště zhotoviteli stavby D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín).

Poskytovatel předá Objednateli výstup v 3x papírové formě a 3x na CD včetně otevřené formy a tabulku (ve formátu *.xls) se seznamem vyjádření, datem vydání vyjádření a datem platnosti vyjádření.

Poskytovatel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny Smlouvy, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Poskytovatel je povinen se řídit pokyny závaznými objednatele. Poskytovatel je povinen úzce spolupracovat s projektovým týmem D1, správcem a technickým dozorem investora dané stavby.

Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost.

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

Akce: D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín, aktualizace vyjádření vlastníků IS

	měrná jednotka	počet jednotek	Kč/hod	Kč celkem
Seznámení s podklady	hod	1	██████	██████
zajištění aktualizace stanovisek vlastníků a správců inženýrských sítí (z důvodu ukončení platnosti původních dokladů)	ks	1	██████	██████
kompletace všech obdržených vyjádření a stanovisek, reprografie	hod	1	██████	██████
celkem bez DPH				62 400 Kč
DPH 21%				13 104 Kč
celkem s DPH				75 504 Kč

V Ústí nad Labem dne 9.2.2018

Podpis oprávněné osoby uchazeče

Jméno: ██████████


Funkce:

ředitel střediska Ústí nad Labem

Valbek

V
s
s
i
di

01

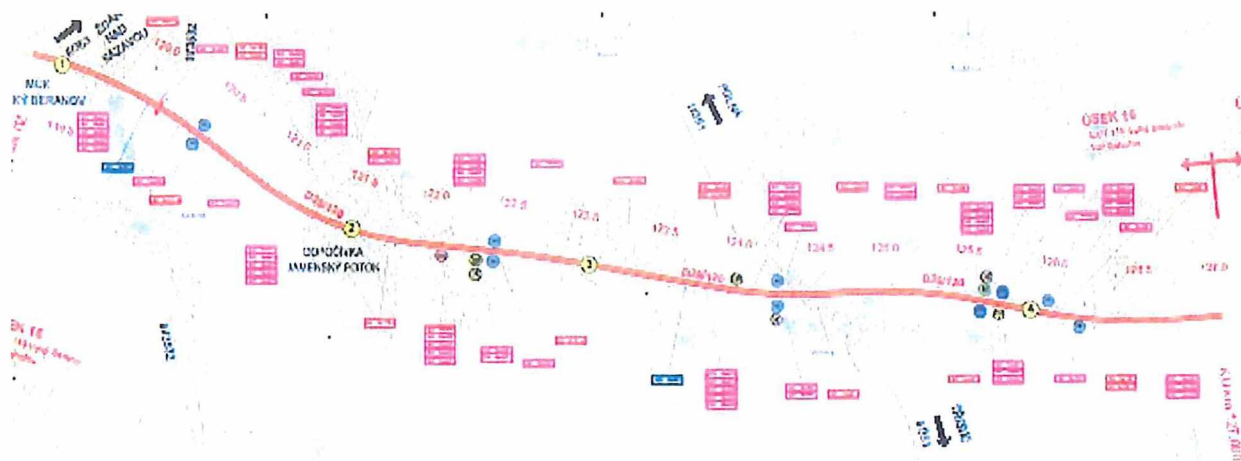

INŽENÝRSKÁ ČINNOST 2016

Vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců
inženýrských sítí a majetkoprávní příprava stavby

D1 MODERNIZACE – ÚSEK 16 EXIT 119 Velký Beranov – 127 Řehořov	
Název stavby :	D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – 127 Řehořov
Investor:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Zpracovatel dokumentace:	Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 hlavní inženýr projektu – Ing. Karel Nejedlý
Místo stavby :	Kraj Vysočina
Katastrální území :	Rytířsko, Kozlov u Jihlavy, Řehořov, Rybné, Věžnice, Meziříčko u Jihlavy
Druh stavby :	modernizace dálnice

D1 Modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - km 127 Řehořov
DOTČENÉ ORGÁNY A VLASTNÍCI A SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Pořadové číslo	Název organizace	Vydáno	Značka/číslo jednací	Obsah	Stanovisko projektanta
1	MěPolná	16.1.2013	MUPO-OVŽP/212/2013	souhlas dle § 15	
2	MěstysLuka	16.1.2013	2013/81/12-2	souhlas dle § 15	
3	MěVelké Meziříčí	24.1.2013	VÝST/1370/2013/143/2013-pacal	souhlas dle § 15	
4	MěPolná	30.1.2013	MUPO-OVŽP/381/2013	sdělení k 422,481 (předmětné SO nevyžadují ÚR ani SP)	předmětné SO nevyžadují ÚR ani SP
5	MěstysLuka	30.1.2013	2013/191/40-2	sdělení k 452	předmětné SO nevyžaduje ÚR ani SP
6	MěPolná	18.2.2013	MUPO-OVŽP/617/2013	sdělení k 451	předmětné SO nevyžaduje ÚR
7	MěstysLuka	19.2.2013	2013/315/70-2	sdělení k 451	předmětné SO nevyžaduje ÚR ani SP
8	MěPolná	30.12.2013	MUPO-OVŽP/4732/2013	sdělení k 981, 196	předmětné SO nevyžadují ÚR
9	Ministerstvo dopravy	23.1.2015	7/2015-120-TN/2	stanovisko k odchýlnému řešení od ČSN	souhlasné stanovisko, slouží jako podklad pro RSD pro vydání stanoviska s odchýlným řešením; byly provedeny různé možnosti řešení bodů 2, 3 (sklon přejezdu SDP a výsledný sklon), jako technicky a finančně nejvhodnější bylo zvoleno řešení uvedené ve vyjádření RSD, č.j. 2977/18200/2015
10	Ředitelství silnic a dálnic ČR	5.3.2015	2977/18200/2015	souhlas s odchýlným řešením	souhlasné vyjádření s odchýlným řešením dle bodů A,B, C, D uvedených v tomto vyjádření a ve smyslu vyjádření MD, č.j. 7/2015-120-TN/2
11	Ředitelství silnic a dálnic ČR	2.1.2014	23 981/18100/2013	požadavek na doplnění žádosti o souhlas s odchýlným řešením	nahrazuje jej vyjádření 10
12	Ministerstvo dopravy	17.12.2015	276/2015-120-OST/2	vyjádření k PD ve stupni DPS	Souhlasné vyjádření s požadavkem na uvedení definitivního dopravního značení do souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. - změny vyplývající z této vyhlášky (vešla v platnost po vydání projektové dokumentace) budou zohledněny při návrhu DZ v rámci PDPS a RDS (v RDS bude DZ navrženo v detailech pro výrobu), resp. definitivní návrh DZ bude upraven a předložen ke stanovení před zahájením výstavby
13	Ministerstvo životního prostředí	26.8.2015	45237/ENV/15	vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.	souhlas bez připomínek
14	Ministerstvo životního prostředí	1.2.2013	5887/ENV/13	vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.	záměr nepodléhá posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
15	Ministerstvo vnitra, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství	29.7.2015	MV-112115-2/OBP-2015	stanovisko	souhlasné vyjádření za splnění podmínek týkajících se úpravy DZ a DIO. Tyto podmínky budou spolu s dalšími od MD a MV zohledněny při návrhu DZ v dalších stupních PD (v RDS bude svislé DZ navrženo v detailech pro výrobu), resp. definitivní návrh DZ a DIO bude upraven dle platné legislativy a předložen ke stanovení před zahájením výstavby. Požadované změny nemají vliv na technické řešení stavby nebo záborny stavebních pozemků.
16	Ministerstvo vnitra, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství	21.2.2013	MV-24304-2/OBP-2013	stanovisko	nahrazeno vyjádřením č.j. MV-112115-2/OBP-2015
17	Ministerstvo dopravy	18.6.2013	367/2013-120-STSP/3	rozhodnutí o zrušení služebního sjezdu	zohledněno v PD, sjezd zrušen
18	Krajský úřad kraje Vysočina OŽP	22.9.2015	KUJI 62983/2015 OZPZ 157/2015 Go	vyjádření	ad 1.) úprava dna je uvedena v podélném řezu; do TZ bude doplněno v dalším stupni PD; ostatní požadavky z dřívějších vyjádření jsou v dokumentaci zapracovány ad 2.) v souladu s PD ad 3.) informaci o uložení výkopového
19	Krajský úřad kraje Vysočina OŽP	16.9.2014	KUJI/62148/2014 OZPZ/2562/2014/Slo	stanoviska- preventivní opatření vyjádření nadřízeného orgánu	neukládá žádnou povinnost k PD
20	Krajský úřad kraje Vysočina OŽP	17.9.2014	KUJI 62611/2014 OZPZ 1105/2014 Mor/24	významných lokalit a plačích oblastí (§ 45i odst. 1)	neukládá žádnou povinnost k PD
21	Krajský úřad kraje Vysočina OŽP	7.2.2013	KUJI 2403/2013 OZP 13/2013/Vac	vyjádření	požadavky splněny, vyjádření aktualizováno 22.9.2015, č.j. KUJI 62983/2015 OZPZ 157/2015 Go
22	Kraj Vysočina, OŽP	8.10.2014	KUJI/66784/2014 OZPZ/2562/2014/Slo	lesního hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny	bez připomínek
23	MM Jihlava, OŽP	13.7.2015	MMJ/OZP/6221/2015 115645/2015/MMJ	vyjádření	souhlas - podmínky nakládání s odpady týkající se realizace stavby
24	MM Jihlava, OŽP	1.2.2013	MMJ/OZP/707/2013/137 56/2013/MMJ	koordinované stanovisko	souhlas - podmínky nakládání s odpady týkající se realizace stavby

Pořadové číslo	Název organizace	Vydáno	Značka/číslo jednací	Obsah	Stanovisko projektanta
25	MM Jihlava, OŽP	15.7.2015	MMJ/OŽP/6220/2015 117063/2015/MMJ	souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa	závažné stanovisko - podmínky týkající se realizace stavby
26	MM Jihlava, OŽP	8.2.2013	MMJ/OŽP/709/2013/175 92/2013/MMJ	souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa	závažné stanovisko - podmínky týkající se realizace stavby
27	MM Jihlava, OŽP	10.7.2015	MMJ/OŽP/6312/2015 JID: 114957/2015/MMJ	VKP	požadavek splněn, po obou stranách mostu navržený bermý š. 75 cm
28	MM Jihlava, OŽP	11.2.2013	MMJ/OŽP/708/2013/182 81/2013/MMJ	VKP	Souhlasné stanovisko, podmínky uložené ve vyjádření jsou splněny.
29	MM Jihlava, OŽP	16.9.2015	MMJ/OŽP/7822/2015 149947/2015/MMJ	§18 vodního zákona	souhlas za podmínek, které byly zohledněny v PD a o nařízení vyjádření bylo požádáno
30	MM Jihlava, OŽP	11.9.2013	MMJ/OŽP/706/2013/239 10/2013/MMJ	§18 vodního zákona	souhlas za podmínek, které byly zohledněny v PD a o nařízení vyjádření bylo požádáno
31	MM Jihlava, OŽP	23.11.2015	MMJ/OŽP/9270/2015-3 188376/2015/MMJ	§17 vodního zákona	připomínky zohledněny v PD
32	MM Jihlava, OŽP	11.12.2013	MMJ/OŽP/8161/2013-3 161194/2013/MMJ	§17 vodního zákona	připomínky zohledněny v PD
33	MěVelké Mezitíči, OD	8.7.2015	DOP/26120/2015/16/201 5-krej	vyjádření k dokumentaci	souhlas - připomínky projednány a zohledněno v PD
34	MěVelké Mezitíči	22.1.2013	DOP/1368/2013/147/201 3-krej	vyjádření k dokumentaci	souhlas - připomínky projednány a zohledněno v PD
35	Obec Rybné	28.6.2015	x	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	souhlas bez podmínek
36	Obec Rybné	17.4.2013	x	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	souhlas bez podmínek
37	Obec Jamné	23.7.2015	JAM/344/2015/ML	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	souhlas bez podmínek
38	Obec Jamné	11.2.2013	JAM/43/2013/ML	vyjádření k projektové dokumentaci	souhlas bez podmínek
39	Obec Kozlov	9.7.2015	223/2015/LBR	vyjádření k projektové dokumentaci	souhlas bez podmínek
40	Obec Kozlov	17.4.2013	x	vyjádření k projektové dokumentaci	souhlas bez podmínek
41	Obec Věžnice	22.7.2015	x	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	souhlas bez podmínek
42	Obec Věžnice	16.1.2013	x	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	souhlas bez podmínek
43	Krajská správa a údržba silnic Vysočina	31.7.2015	KSAÚSVPO/007328/20 15/02	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	podmínky obsažené ve vyjádření jsou v PD splněny
44	Krajská správa a údržba silnic Vysočina	31.1.2013	000454/2013	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	podmínky obsažené ve vyjádření jsou v PD splněny
45	Krajská správa a údržba silnic Vysočina	29.10.2013	KSAÚSVPO/011907/201 3	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	podmínky obsažené ve vyjádření jsou v PD splněny
46	ARCHAIA Brno	24.1.2013	x	vyjádření k projektové dokumentaci	souhlas - podmínky pro realizaci stavby
47	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	26.8.2015	02458/ZV/15	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	detaily budou v souladu s textem vyjádření doplněny v PDPS; informace o obetnování dna roury bude rovněž uvedena v dalším stupni PD
48	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	15.4.2013	01493/ZV/2012	vyjádření k dalšičnímu mostu D1-154	podmínky v PD splněny
49	HZS Jihlava	15.7.2015	HSJI-242-5/P-2013	souhlasné závažné stanovisko	souhlas - požadují předložit další stupeň PD; podmínky pro realizaci stavby
50	HZS Jihlava	30.1.2013	HSJI-242-3/P-2013	souhlasné závažné stanovisko	souhlas - požadují předložit další stupeň PD; podmínky pro realizaci stavby
51	KHS Jihlava	2.7.2015	KHSV/13346/2015/JI/HO K/Sme	souhlasné závažné stanovisko	souhlas - podmínky k PD zohledněny v PD; podmínky pro realizaci stavby
52	KHS Jihlava	27.3.2013	KHSV/00667/2013/JI/HO K/Sme	souhlasné závažné stanovisko	souhlas - podmínky k PD zohledněny v PD; podmínky pro realizaci stavby
53	Policie Jihlava	31.8.2015	KRPJ-69713-5/ČJ-2015- 160706	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	souhlas - podmínky pro realizaci stavby
54	Policie Jihlava	22.3.2013	KRPT-4597-5/ČJ-2013- 160706	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	souhlas - podmínky pro realizaci stavby
55	Povodí Moravy	11.8.2015	PM035332/2015-203/Fi	stanovisko	ad I.a) souhlasné vyjádření ad I.b) požadavky na dodavatele stavby ad II. 1) splněno 2) V km cca 126,8 se nenachází žádná vodoteč, pouze vyústění dešťové kanalizace do náhonu; popsáno v SO 301 nejbližší propust je v km cca 127,2 na úseku 17 3) Hydrotechnický výpočet bude doložen Ostatní připomínky se týkají zhotovitele stavby.
57	Povodí Vltavy	22.7.2015	37749/2015-411	stanovisko	souhlasné vyjádření ke změnám dokumentace, ke kterým došlo mezi 1. a 2. podáním žádosti o vyjádření
58	Povodí Vltavy	5.9.2013	4709/2013-411	stanovisko	souhlas za podmínky - v PDPS vypracovat povodňový plán
59	Národní památkový ústav	18.2.2013	NPÚ-372/3897/2013	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	souhlas - podmínky pro realizaci stavby

Pořadové číslo	Název organizace	Vydáno	Značka/číslo jednací	Obsah	Stanovisko projektanta
60	Lesy ČR	13.7.2015	LCR952/002953/2015	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	připomínky k vlastnictví toků zohledněny v PD, vlastník a správce toků (Povodí Moravy) o vyjádření k PD požádán
62	Ředitelství silnic a dálnic ČR	10.5.2016	PEM-924-2/15110/2016	vyjádření k aktualizaci PD	Podmínky uvedené ve vyjádření PD splňuje.
63	Kapsch Telematic Services spol. s r.o.	5.2.2013	012/2013/KTS	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	Podmínky uvedené ve vyjádření PD splňuje, vyjádření se vztahuje ke konceptu PD.
64	České dráhy, a.s.	2.4.2015	737/2015-RSMBRNO	stanovisko	nedojde k dotčení
65	Regionální úřad vojenské dopravy Olomouc	1.7.2015	31-2/2015-5512OL	stanovisko	podmínky pro realizaci stavby
66	Regionální úřad vojenské dopravy Olomouc	24.1.2013	36-14/2013-1445	stanovisko	podmínky pro realizaci stavby
68	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková	31.7.2015	MOCR 10592-715/2015-6440 31808/2015-8201-ÚOZ-ČB	závažné stanovisko	souhlas za podmínek pro realizaci stavby
70	E.ON Česká republika, s.r.o.	16.1.2013	J14077-Z061301781	souhlas se stavbou v ochranném pásmu	podmínky pro realizaci stavby
71	Telefónica Czech Republic, a.s.	7.3.2013	VPS/5011/13	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	podmínky pro realizaci stavby
72	Best Food	20.8.2015	x	vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DPS	podmínky pro realizaci stavby
73	BestFood	12.4.2013	x	vyjádření k oznámení o uzavírací odpočívky	podmínky pro realizaci stavby

D1 Modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - km 127 Řehořov

VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - DOTČENÍ

Pořadové číslo	Název organizace	Vydáno	Značka/číslo jednací	Obsah	Stanovisko projektanta
76	Best food	30.4.2012	x	vyjádření k existenci sítí	dojde k dotčení
80	RWE	25.5.2016	6001305898	vyjádření k PD pro SP	dojde k dotčení
82	ŘSD	25.4.2012	3965/12-12260	vyjádření k existenci sítí	dojde k dotčení
83	ŘSD	10.4.2012	PEM-620/15110/2012	vyjádření k existenci sítí	dojde k dotčení
84	CETIN	12.5.2016	606024/16	vyjádření k existenci sítí	dojde k dotčení
85	Telefónica Czech Republic, a.s.	21.3.2013	VPS/5016/13	vyjádření k PD pro SP	souhlas s PD
86	Telefónica Czech Republic, a.s.	7.3.2013	VPS/5011/13	vyjádření k PD pro SP	souhlas s PD
88	Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště české Budějovice	27.3.2012	ZVHS/901/12/ÚPČB	vyjádření k existenci sítí	dojde k dotčení
89	Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Brno	16.3.2012	ZVHS ÚPB 561/12	vyjádření k existenci sítí	dojde k dotčení
90	Obec Věžnice	e-mail	x	poskytnutí údajů	dojde k dotčení
91	Kapsch	e-mail	x	poskytnutí údajů	dojde k dotčení
92	Povodí Moravy	4.5.2012	PM024138/2012-203/Fi	vyjádření k existenci sítí	dojde k dotčení
93	Kraj vysočina	5.4.2012		vyjádření k existenci sítí	dojde k dotčení

SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - NEDOTČENÍ

Pořadové číslo	Název organizace	Vydáno	Značka/číslo jednací	Obsah	Stanovisko projektanta
94	KSÚS	29.3.2012	2767/12	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
95	ČEZ Distribuce	9.5.2016	0100589699, 0100589706	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
96	ČEZ ICT Services	9.5.2016	0200447038, 0200447044	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
97	ČEZ ICT Services, a.s.	20.3.2012	x	situace k existenci sítí	nedojde k dotčení
99	Ministerstvo obrany ČR - VUŠS Pardubice	15.5.2012	2988/20085-ÚP/2012-1420	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
100	Obec Kozlov	16.5.2016	184/20016/LBr	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
101	Obec Kozlov	8.3.2012	x	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
102	Obec Jamné	4.4.2012	JAM/2012/ML	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
103	Obec Rybné	10.5.2016	x	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení

Pořadové číslo	Název organizace	Vydáno	Značka/číslo jednací	Obsah	Stanovisko projektanta
104	Obec Rybné	3.5.2012	x	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
105	Městys Kamenice	9.3.2012	x	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
106	BigBoard	18.5.2016	mail	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
107	BigBoard	29.4.2013	x	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
111	ČEPS, a.s.	30.3.2012	496/12/KOC/Ha/6	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
112	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	13.7.2015	721/016815/2015/Dku	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
114	Bohemiatel s.r.o.	8.7.2015	x	situace k existenci sítí	nedojde k dotčení
118	Dopravní podnik města Brna	10.5.2016	mail	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
119	Dopravní podnik města Brna	15.3.2012	3063/2012/5073	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
121	T-mobile	24.8.2015	E18352/15	vyjádření k PD pro SP	nedojde k dotčení
124	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina	3.5.2012	KRPT-1168-65/ČJ-2012-1600MN	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
125	Dial Telecom a.s.	9.5.2016	CR397392	vyjádření k PD pro SP	nedojde k dotčení
127	OPTOKON	9.5.2016	x	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
129	Sitel	14.7.2015	1111503119	vyjádření k PD pro SP	nedojde k dotčení
132	Itself	17.5.2016	16/001889	vyjádření k existenci sítí	optický kabel nebude stavbou dotčen, bude zanesen v PDPS
134	SATT a.s.	16.7.2015	x	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
138	PORR	10.5.2016	mail	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
139	PSVS a.s.	3.5.2012	OU/Nov/223/2012	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
140	První telefonní a.s.	10.5.2016	x	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
144	outdoor akzent s.r.o.	x	x	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
145	SMART Comp a.s.	22.7.2015	V-514/2015/MJ	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
148	Telia Sonera	14.7.2015	1311501803	vyjádření k PD pro SP	nedojde k dotčení
151	vodafone	12.5.2016	IIG/12/5/2016/JIMYS	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
153	TranSoft	9.5.2016		vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení
154	MERO ČR a.s.	9.5.2016	2016/000586/1	vyjádření k existenci sítí	nedojde k dotčení

Dálnice D1 modernizace – úsek 17, km 127 Řehořov - exit 134 Měřín

SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			
Pořadové číslo	Název organizace	Č.j.	Vydáno
1a	ČEZ Distribuce	0100498375 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
1b	ČEZ Distribuce	0100498376 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
1c	ČEZ Distribuce	0100498377 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
1d	ČEZ Distribuce	0100498378 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
1e	ČEZ Distribuce	0100498379 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
1f	ČEZ Distribuce	0100498380 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
1g	ČEZ Distribuce	0100498381 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
1h	ČEZ Distribuce	0100498382 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
1i	ČEZ Distribuce	0100498383 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
1j	ČEZ Distribuce	0100498384 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
1k	ČEZ Distribuce	0100498385 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
2a	ČEZ ICT	0200386369 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
2b	ČEZ ICT	0200386370 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
2c	ČEZ ICT	0200386371 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
2d	ČEZ ICT	0200386372 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
2e	ČEZ ICT	0200386373 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
2f	ČEZ ICT	0200386374 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
2g	ČEZ ICT	0200386376 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
2h	ČEZ ICT	0200386376 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
2i	ČEZ ICT	0200386377 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
2j	ČEZ ICT	0200386378 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015

2k	ČEZ ICT	0200386379 - sdělení + situační výkres	30. listopadu 2015
3.	CETIN	741528/15 + přílohy	24. listopadu 2015
4.	ČEPS	10496	23. listopadu 2015
5.	CONTENT	02/06/12	20. června 2012
6.	České radiokomunikace	UPTS/OS/127359/2015	18. prosince 2015
7.	České dráhy	2195/2015-RSMBRNO	1. prosince 2015
8.	České dráhy - Telematika	22966/2015	24. listopadu 2015
9.	Dial Telecom	CR356097	23. listopadu 2015
10.	T Mobile CR	E25944/15	23. listopadu 2015
11.	EON	D8626-16090773	15. prosince 2015
12.	itself	15/000989a	1. prosince 20145
13.	itself	15/004152	18. prosince 2015
14.	M-SOFT	159377	25. listopadu 2015
15.	MERO	2015/001045/1	23. listopadu 2015
16.	Ministerstvo obrany ČR	47206/2015-8201-OÚZ- PCE	1. prosince 2015
17.	NET4GAS	8549/15/OVP/N	26. listopadu 2015
18.	RWE	5001217858	30. listopadu 2015
19.	ŘSD	PEM-989-1/1511082015	21. června 2012
20.	SŽDC	20866/2015-SŽDC-OŘ BNO-OPS	25. listopadu 2015
21.	UPC ČR		23. listopadu 2015
22.	Vodárenská – divize Jihlava	511/HI-Dvoř./12	26. června 2012
23.	Vodárenská – divize Jihlava	DJI 3982/VTN-Dvoř./15	27. listopadu 2015
24.	Vodárenská – divize Žďár n/S	57784/2012-Še	3. července 2012
25.	OPTILINE	1411501682 + situační výkres	24. listopadu 2015
26.	SITEL	1111505064 + situační výkres	24. listopadu 2015

27.	TeliaSonera	1311502924 + situační výkres	24. listopadu 2015
28.	Západomoravská distribuční	159377	
29.	Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor informatiky		26. června 2012
30.	Městys Kamenice u Jihlavy		20.7.2012
31.	Městys Měřín		3.7.2012
32.	Obec Meziříčko		17. 7.2012
33.	Lesy ČR – Lesní správa Nové Město na Moravě	LCR 154/000764/2012	25. června 2012



PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného [REDACTED], aby jménem společnosti Valbek, spol. s r.o. – IČO 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r.o. v Ústí nad Labem, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem související včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska Valbek, spol. s r.o. Ústí nad Labem.

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce - jednatel.

V Liberci 11.01.2018

Platnost této plné moci je 3 roky.

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 485 103 336, IDDS: bebs53h
www.valbek.cz
