

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD (SMLOUVA)

SMLOUVA č. 06EU-001054 (číslo smlouvy ŘSD ČR)

Tento Souhrn smluvních dohod (dále rovněž jen „Smlouva“) byl uzavřen

dne: 22 -10- 2012

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným:
bankovní spojení: číslo účtu
IČO: **5993390** DIČ: **CZ5993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem: Sdružení **INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805**

INFRAM a.s. – vedoucí sdružení
se sídlem v Pelušková 1407, 198 00, Praha 9 - Kyje
zastoupená
bankovní spojení:
č.ú.:
IČ: 250 702 82 DIČ: CZ 25070282
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

HBH Projekt spol. s r.o. – účastník sdružení
se sídlem v Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupená
bankovní spojení:
č.ú.:
IČ: 449 619 44 DIČ: CZ 44961944
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem v Ptašínského 10/313. 602 00 Brno
zastoupená

bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 494 46 703 DIČ: CZ 49446703

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„D8, stavba 805, A-F, TDI“

ISPROFIN: 3272231005, 3272231006, 3272231007, 3272231008, 3272231009,
3272231010

byla realizována konzultantem, přijal nabídku konzultanta na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

a. Nabídková cena bez DPH	=	79 551 900 Kč
b. DPH	=	15 910 380 Kč
c. <u>nabídková cena celkem (a + b)</u>	=	95 462 280 Kč

V termínu dokončení dle Zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací.

kteřé mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,

dohodli se objednatel a konzultant takto:

1. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008 s účinností od 1. května 2008 v platném znění, na které dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
 - a) Souhrn smluvních dohod
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně
Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem
Přílohy C – Platby a platební podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
 - f) Technické podmínky, jmenovitě: Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění
 - g) Nabídka
 - h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby,

Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby. Tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti.

3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit konzultantovi, se konzultant zavazuje provést řádně všechny služby podle Smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit konzultantovi za provedení všech služeb cenu podle nabídky konzultanta, nebo jinou cenu, na kterou bude mít konzultant nárok podle podmínek Smlouvy, v termínech a způsobem podle Smlouvy.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za konzultanta:

Datum: 22. 10. 2012

Datum: 21.10. 2012

PŘÍLOHA A
ROZSAH SLUŽEB

PŘÍLOHA B

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY OD TŘETÍCH STRAN ZAJIŠTĚNÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál konsultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden na formuláři 3.8 Personál pro zakázku, který je součástí této Přílohy B.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně následující dokumentaci:

- Nabídka vítězného uchazeče
- Dokumentace zadání stavby
- Realizační dokumentace stavby
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby D8- 0805

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi na staveništi bezplatně:

- kancelář
- archiv
- konferenční místnost
- pevná telefonní přípojka (bez ceny za provoz telefonu a internetu)

3. Služby od třetích stran

Objednatel na své náklady nezajistí žádné služby od třetích stran.

PŘÍLOHA C

ÚHRADY A PLATBY

1. Úhrada služeb

1.1 Oceňování

Služby (odpracovaná doba) budou oceňovány denními sazbami a v případě mimořádných služeb též na základě skutečných výdajů. Denní sazby se vztahují na 8 odpracovaných hodin bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv. Odpracovanou dobu a výdaje eviduje konsultant podle článku 25 Podmínek provádění služeb. Při oceňování se vychází z toho, že denní sazby uvedené v Příloze A pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb podle smlouvy.

2. Platby

2.1 Měsíční prohlášení

Konsultant předá po ukončení každého měsíce objednateli prohlášení obsahující fakturu, v němž uvede částky, které považuje na základě ocenění za oprávněné, spolu se zprávou o postupu služeb a o jejich programu na příští měsíc ve vztahu k rozsahu služeb, potvrzené vedoucím TDS stavby D8- 0805.

2.1 Dílčí platba

Do 60 dnů od doručení každého prohlášení objednatel konsultantovi zaplatí částku uvedenou v prohlášení konsultanta minus jakoukoliv částku, pro níž objednatel uvedl důvody svého nesouhlasu v oznámení podle článku 34 Podmínek provádění služeb. Objednatel nebude vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou konsultantovi.

2.3 Konečná platba

Do 30 dnů od skončení služeb předloží konsultant objednateli závěrečné prohlášení obsahující fakturu spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu služeb.

Do 60 dnů od doručení závěrečné faktury objednatel konsultantovi zaplatí částku uvedenou v prohlášení konsultanta minus jakoukoliv částku, pro níž objednatel uvedl důvody svého nesouhlasu v oznámení podle článku 34 Podmínek provádění služeb

Materiální vybavení pracoviště a limitní ceny jednotkových položek v soupisu prací jsou uvedeny ve směrnici GR ŘSD ČR- Zásady pro zajištění výkonu stavebního dozoru na stavbách ŘSD ČR. Tato směrnice je uvedena v Části 5 této Zadávací dokumentace obchodní veřejné soutěže na zadání služeb.

Provádění technického dozoru na stavbách se bude řídit dle těchto dokumentů: Metodického pokynu MD ČR- Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací vydaného MD-OPK pod č.j. 254/06-120/RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5. 2006, dále dle Zvláštních obchodních podmínek pro stavbu D8- 0805 Lovosice- Řehlovice, Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, Zvláštních technických kvalitativních podmínek stavby D8-0805 Lovosice- Řehlovice, Technických kvalitativních podmínek, Souhrnu smluvních dohod, změn a doplňků těchto dokumentů a pokynů vedoucího TDS.

Stavební dozor **je oprávněn** při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou schvalovat/rozhodovat/jednat podle vlastního uvážení v souladu s pověřením vydaným správcem stavby.

Stavební dozor **není zmocněn** při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat tyto povinnosti.

Podpis osoby oprávněné podepisovat nabídku:

Datum: 1.4.2008

B. DODATEČNÉ ČLÁNKY

37.4 zní:

„Povinnosti zhotovitele ve věcech smluv s podzhotoviteli se rozšiřují o závazky uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. K návrhu smlouvy s podzhotovitelem se objednatel vyjádří nejpozději do 30 dnů od jejich předložení. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce.“

40. Oznámení:

Adresa objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

tel:

fax:

identifikační číslo : 65993390

daňové identifikační číslo : CZ65993390

jméno a příjmení statutárního orgánu :

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa konzultanta :

Sídlo vedoucího účastníka sdružení **INFRAM/Valbek – TDI D8, 0805**

INFRAM a.s.

Pelušková 1407

198 00 Praha 9 – Kyje

Tel.:

Fax:

E-mail:

identifikační číslo : 250 702 82

daňové identifikační číslo : CZ25070282

jméno a příjmení statutárního orgánu:

Zástupce konzultanta ve věcech smluvních a cenových:

Tel.

fax:

e-mail:

PŘÍLOHY

A – Rozsah služeb

B – Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

C – Platby a platební podmínky

ZVLASTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

1. Název zakázky: **Výkon stavebního dozoru na stavbě D8- 0805 Lovosice- Řehlovice dálnice D8**

2.3 Technické podmínky jsou: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací MD ČR, Technické podmínky MD ČR, Vzorové listy staveb pozemních komunikací
Ostatní dokumenty jsou: Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.

5. Způsob informování o průběhu provádění služeb:

19. Druh a výše požadovaného pojištění:

<i>Druh pojištění</i>	<i>Výše Kč</i>
Pojištění odpovědnosti za škodu	50 000 000

22. Zahájení služeb: 05/2008

Termín nebo lhůta pro dokončení: 07/2011

Dílní termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb:

Popis části služeb	Termín (lhůta) dokončení

22.2 Dokumenty předané při dokončení služeb (nebo jejich části): měsíční prohlášení

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb: 1% za každý den prodlení

31. Lhůta splatnosti faktur: 60 dní

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení

Úroková sazba z nezaplacené platby:

35. Jazyk smlouvy: Jazyk český

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9



HBH Projekt, spol. s r.o.
Kabátníkova 5
602 00 Brno



AMBERG Engineering Brno, a.s.
Ptašinského 10
602 00 Brno



Sdružení INFRAM / HBH / TDI st.805

Nabídka na veřejnou zakázku na služby:

D8, stavba 805, A-F, TDI



Zadavatel :



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56 145 05 P r a h a 4

KOPIE

Říjen 2012

1. Obsah nabídky

1. Obsah nabídky

Oddíl žádosti/kapitola		Formulář č.	Str.
1.	Obsah nabídky		2
2.	Dopis nabídky		4
3.	Zvláštní příloha k nabídce		7
4.	Potvrzení o přijetí dodatků k ZD		9
5.	Doklad o poskytnutí jistoty – kopie		11
6.	Dokumentace pro splnění jiných zadávacích podmínek		13
	6.1. Všeobecné informace o uchazeči a organizační struktura	1.1.	14
	Všeobecné informace o uchazeči INFRAM a.s.		15
	Schéma organizační struktury INFRAM a.s.		17
	Všeobecné informace o uchazeči HBH Projekt spol. s.r.o.		18
	Schéma organizační struktury HBH Projekt spol. s.r.o.		20
	Všeobecné informace o uchazeči AMBERG Engineering Brno, a.s.		22
	Schéma organizační struktury AMBERG Engineering Brno, a.s.		24
	6.2. Závazek integrity	1.2.	25
	Závazek integrity INFRAM a.s.		26
	Závazek integrity HBH Projekt spol. s.r.o.		28
	Závazek integrity AMBERG Engineering Brno, a.s.		30
	6.3. Přehled plných mocí vč. příloh	1.3.	32
	Přehled plných mocí vč. příloh - INFRAM a.s.		33
	Přehled plných mocí vč. příloh - HBH Projekt spol. s.r.o.		34
	Přehled plných mocí vč. příloh - AMBERG Engineering Brno, a.s.		36
	6.4. Zadání části služeb vč. příloh	1.4.	38
	6.5. Prohlášení o spolehlivosti	1.5.	53
	Prohlášení o spolehlivosti INFRAM a.s.		54
	Prohlášení o spolehlivosti HBH Projekt spol. s.r.o.		55
	Prohlášení o spolehlivosti AMBERG Engineering Brno, a.s.		56
	6.6. Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně	1.6.	57
	6.7. Prohlášení k zamezení střetu zájmů	1.7.	64
	Prohlášení k zamezení střetu zájmů INFRAM a.s.		65
	Prohlášení k zamezení střetu zájmů HBH Projekt spol. s.r.o.		66
	Prohlášení k zamezení střetu zájmů AMBERG Engineering Brno, a.s.		67
7.	Oceněný rozpis služeb		68
8.	Přílohy – případné další dokumenty dodavatele – NETÝKÁ SE - dodavatel nepřikládá žádné další dokumenty		70
9.	Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Zvláštní obchodní podmínky vč. příloh: A-Rozsah služeb B-Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem C- Platby a platební podmínky Smlouva		71
10.	CD – pouze v originále nabídky		105

2. Dopis nabídky

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: D8, stavba 805, A-F, TDI

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D8, stavba 805, A-F, TDI“, včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále „Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a Dodatečné informace č.1 k zadávací dokumentaci ze dne 24.8.2012, vedené pod č.j. 4424/12-33300.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Celková nabídková cena bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
D8, stavba 805, A-F, TDI	(a) 79 551 900	(b) 15 910 380	(c) = (a) + (b) 95 462 280

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří přílohu tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky
- (d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
- (e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
- (f) Technické podmínky, jmenovitě Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění

- (g) Nabídka
(h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby. Tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 části I. až III. zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

řádně oprávněn podat nabídku jménem sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805, na základě plných mocí HBH Projekt spol. s.r.o. a AMBERG Engineering Brno, a.s. ze dne 27.4. 2012

Pelušková 1407, Praha 9, 198 00

V Praze dne 01.10. 2012

Tento dopis nabídky obsahuje následující přílohy:
Zvláštní příloha k nabídce

3. Zvláštní příloha k nabídce

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: D8, stavba 805, A-F, TDI

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D8, stavba 805, A-F, TDI“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Za vlastní kapacity se pro účely této přílohy považují (a) osoby v pracovním poměru nebo jiném obdobném vztahu k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro poskytování služeb, jež jsou předmětem této zakázky.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů, výkon minimálně 70% všech odborných pozic realizačního týmu. Následující činnosti (výkon odborných pozic) musí být zajištěny výhradně vlastními kapacitami dodavatele, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů: (i) činnost asistenta správce stavby, (ii) činnost rozpočtáře, (iii) inženýring a (iv) činnost specialisty pro kontrolu jakosti. V rámci výkonu odborné pozice (i) specialisty pro pozemní komunikace a (ii) specialisty pro mostní konstrukce musí dodavatel alespoň 1 osobu na každé z těchto pozic zajistit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování všech subdodavatelských smluv v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlžením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 částí I. až III. této zadávací dokumentace.

rádně oprávněn podat nabídku jménem sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805,
na základě plných mocí HBH Projekt spol. s.r.o. a AMBERG Engineering Brno, a.s. ze dne 27.4. 2012

V Praze dne 01.10. 2012

4. Potvrzení o přijetí dodatků k ZD

Potvrzení o přijetí dodatků k zadávací dokumentaci

NÁZEV ZAKÁZKY: D8, stavba 805, A-F, TDI

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Potvrzujeme tímto, že jsme přijali dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci ze dne 24.8. 2012 s číslem jednacím 4424/12-33300.

řádně oprávněn podat nabídku jménem sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805,
na základě plných mocí HBH Projekt spol. s.r.o. a AMBERG Engineering Brno, a.s. ze dne 27.4. 2012

Pelušková 1407, Praha 9, 198 00

V Praze dne 01.10. 2012

5. Doklad o poskytnutí jistoty - kopie

6. Dokumentace pro splnění jiných zadávacích podmínek

6.1. Všeobecné informace o uchazeči a organizační struktura

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: **INFRAM a.s. – vedoucí účastník sdružení**
INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

Sídlo: Pelušková 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00,

IČ: 250 70 282,

DIČ: CZ 250 70 282

Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 4235

Telefon / Fax:

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):

- projektová činnost ve výstavbě
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výkon zeměměřičských činností
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): NETÝKÁ SE

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 16 let, z toho

- v České republice: 16 let
- v zemi registrace: 16 let
- v zahraničí: 12 let

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 87,8

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské / jiné společnosti):

Obchodní firma: **HBH Projekt spol. s.r.o.**
Sídlo: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Vztah k účastníkovi: jiná společnost – člen sdružení

Obchodní firma: **AMBERG Engineering Brno, a.s.**
Sídlo: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno
Vztah k účastníkovi: jiná společnost – člen sdružení

Obchodní firma: **Ing. Pavel Gerych**
Sídlo: Veveří 2207/112, 616 00 Brno
Vztah k účastníkovi: subdodavatel

Obchodní firma: **KONTROL SERVIS s.r.o.**
Sídlo: Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek - Místek
Vztah k účastníkovi: subdodavatel

Obchodní firma: **JUROS, s.r.o.**
Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 - Podolí
Vztah k účastníkovi: subdodavatel

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): [NETÝKÁ SE]

4. Organizační struktura


Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.

V Praze dne 01.10. 2012

INFRAM a.s.



Organizační struktura INFRAM a.s.

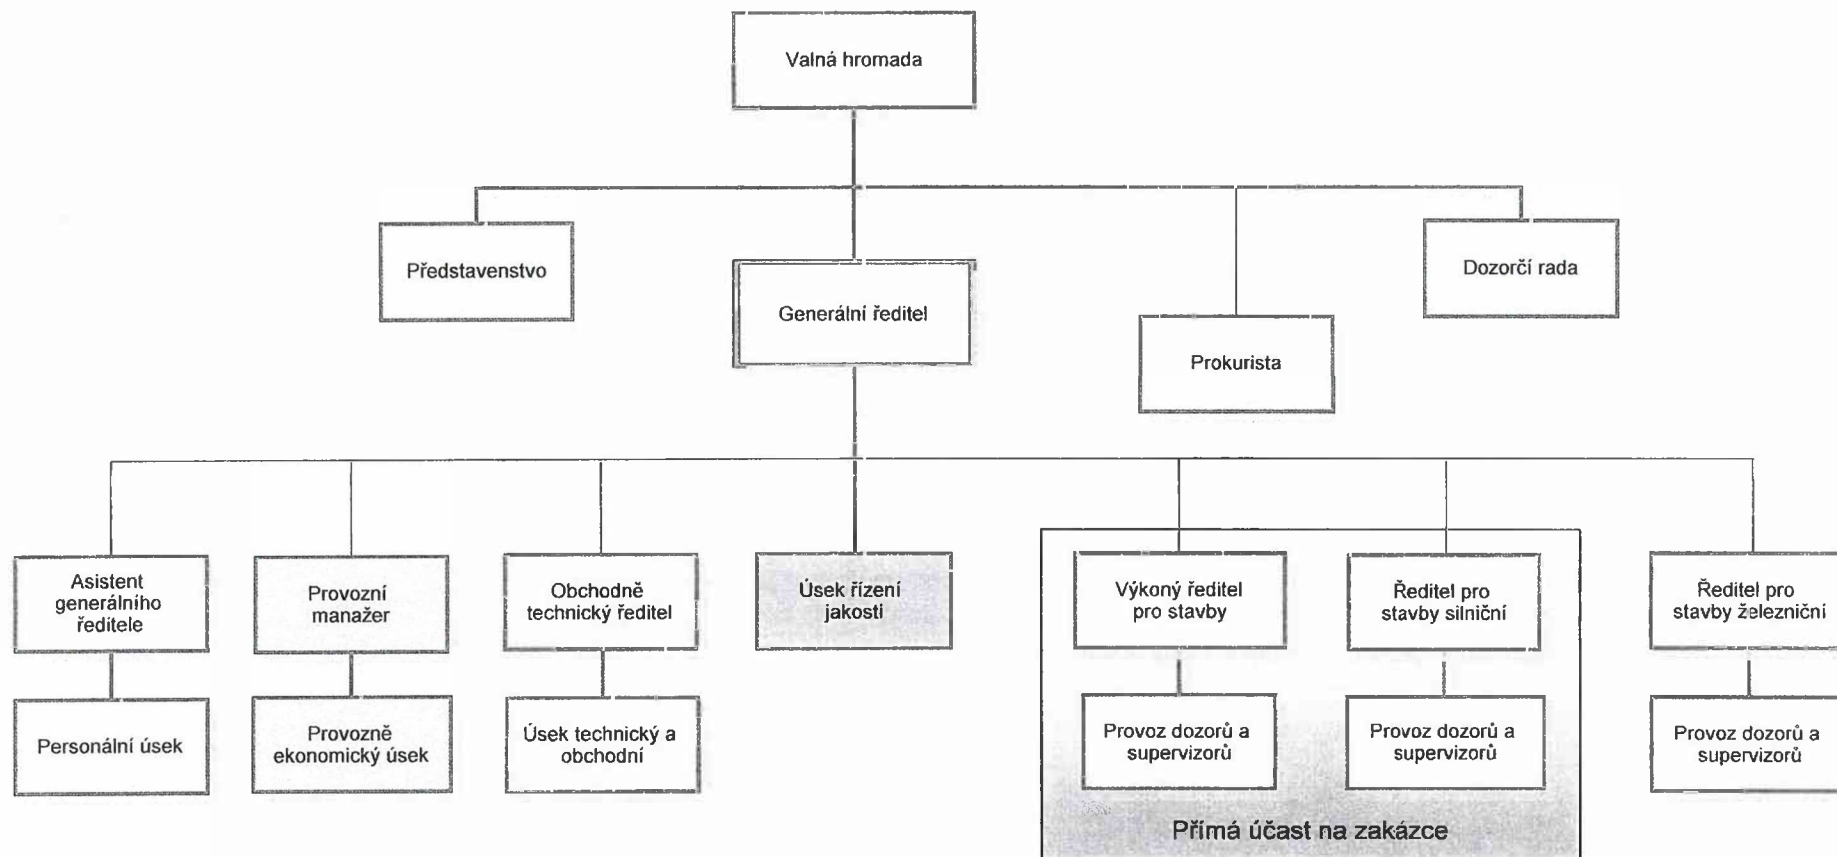

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: **HBH Projekt spol. s r.o. - člen** sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI
st. 805

Sídlo: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,

IČ: 44961944,

DIČ: CZ44961944,

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3996

Telefon / Fax:

Právní forma uchazeče je: společnost s ručením omezeným

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):

- projektová činnost ve výstavbě
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výkon zeměměřických činností
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): „Netýká se“.

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 20 let, z toho

- v České republice: 20 let
- v zemi registrace: 20 let
- v zahraničí: 8 let

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 12 %

INFRAM a.s., se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 / vedoucí člen sdružení

GEOTest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno (subdodavatel)

KLIMAKOM, spol. s r.o., Zámecká 4, 643 00 Brno – Chrlice (subdodavatel)

Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, 602 00 Brno (subdodavatel)


Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): „Netýká se“.


4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.

V Brně dne 17. 9. 2012

HBH/Projekt spol. s r.o.

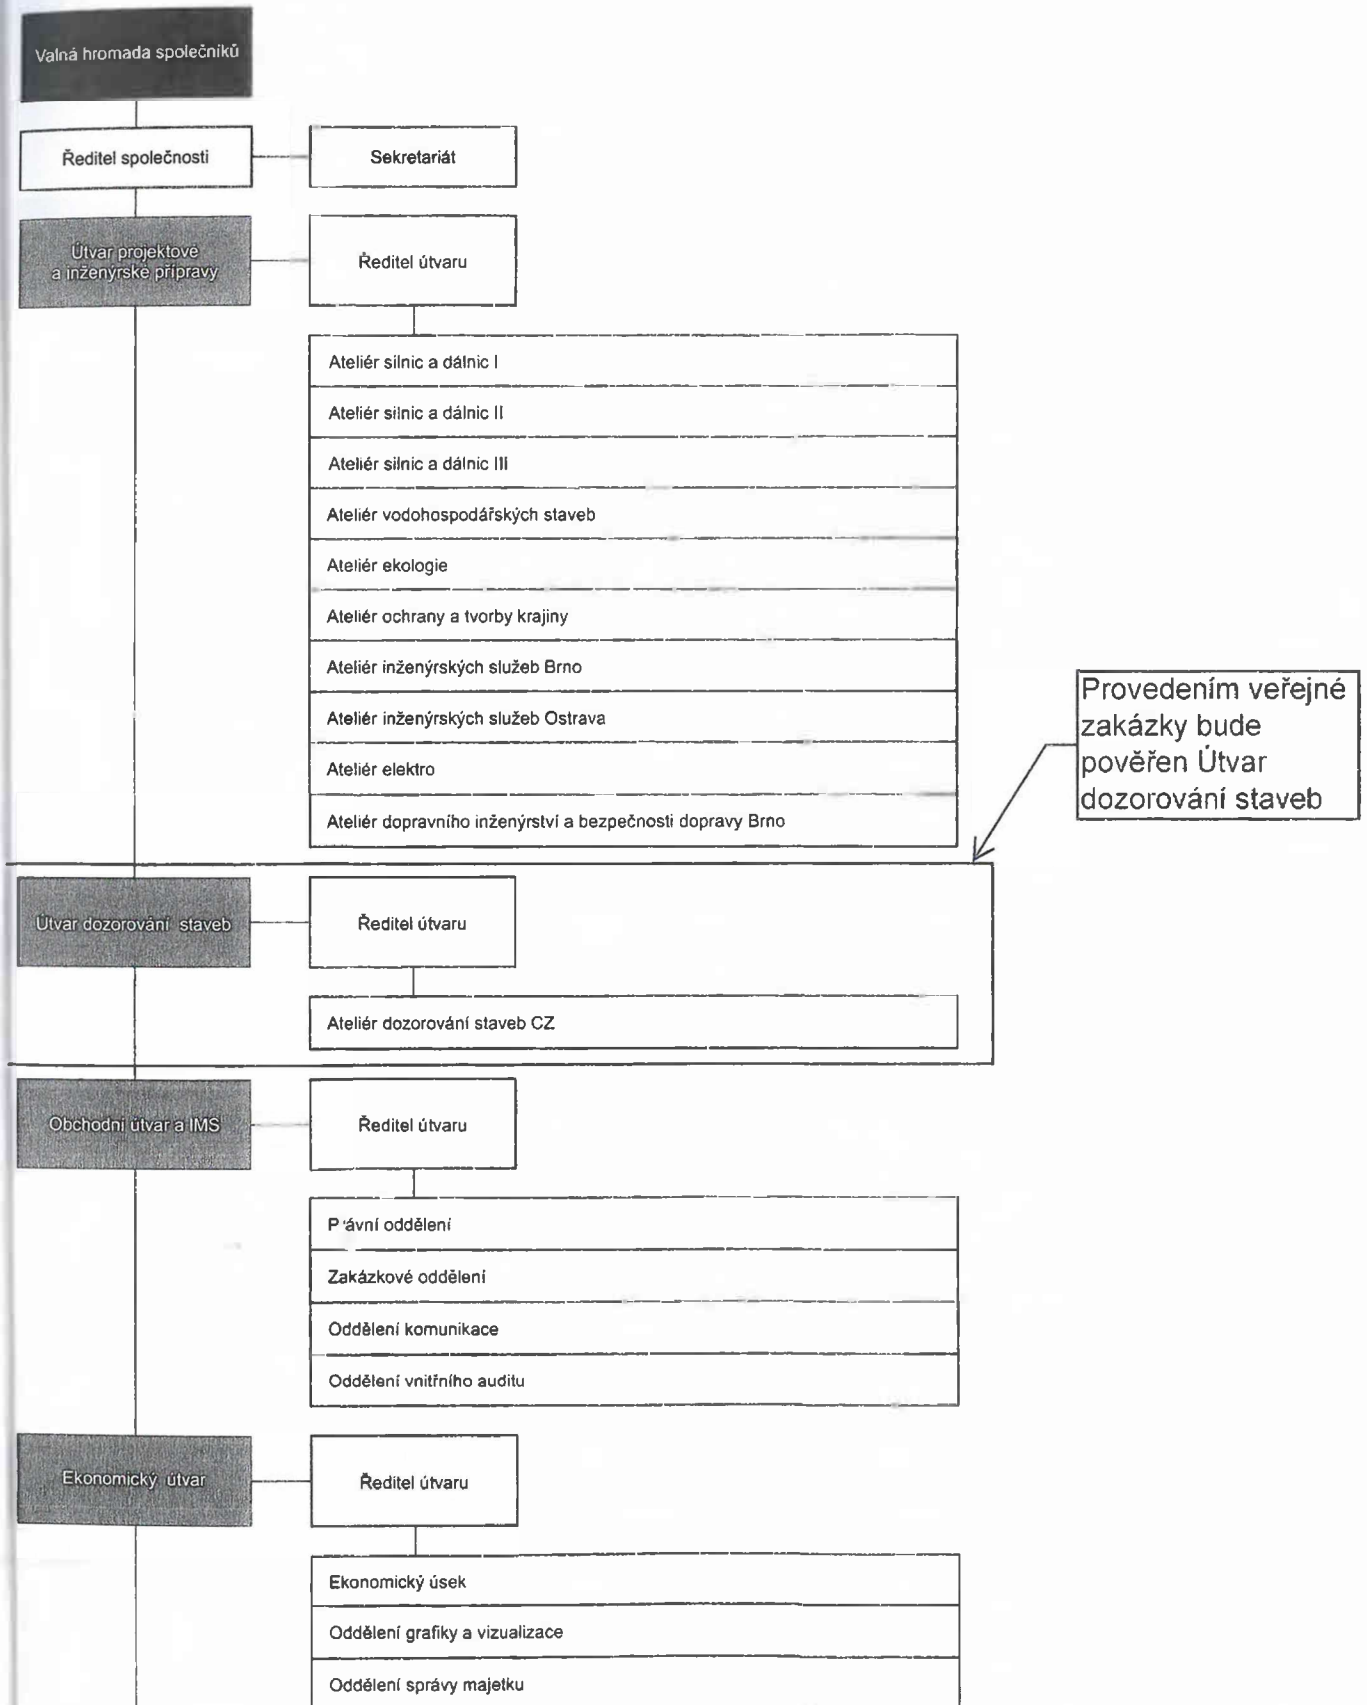

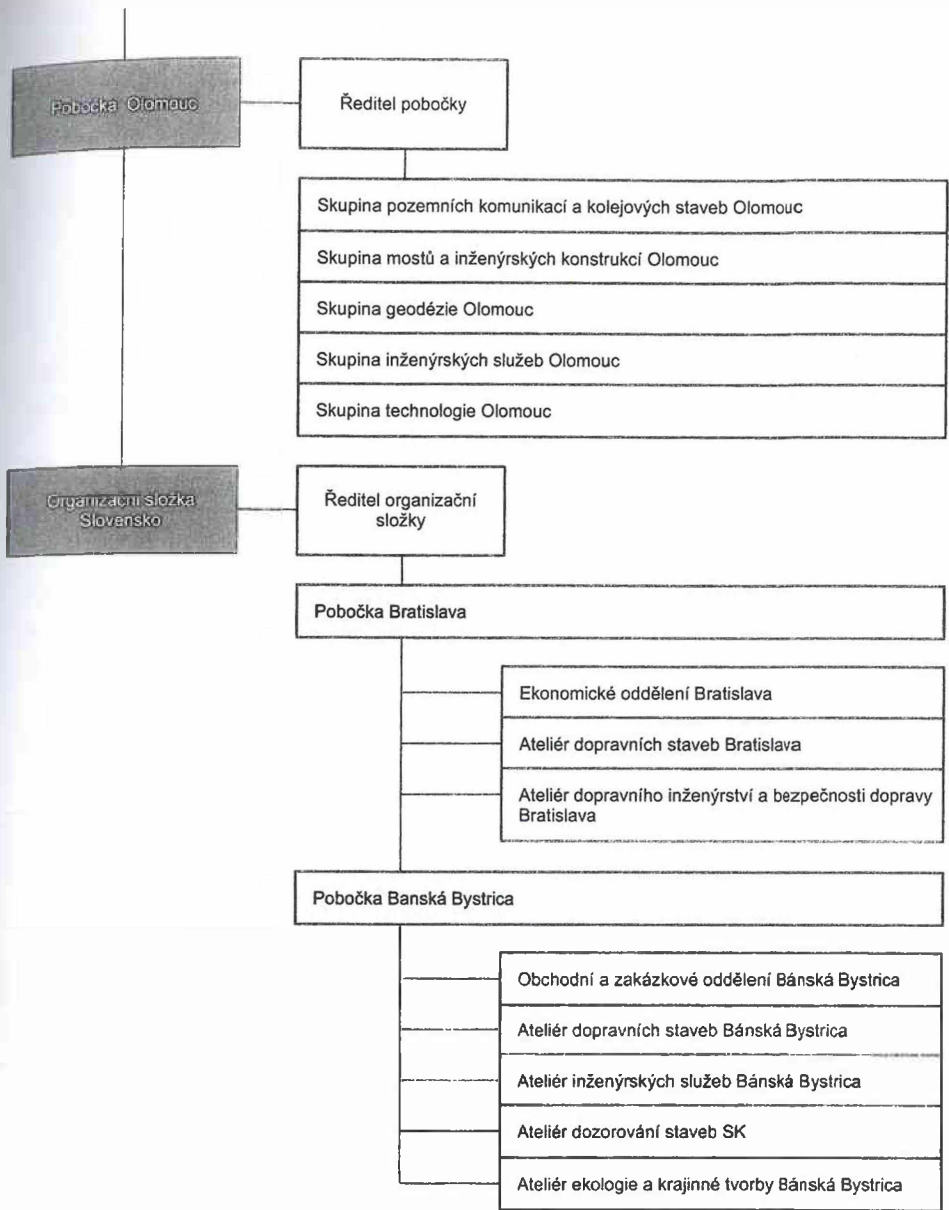

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: **AMBERG Engineering Brno, a.s. – účastník sdružení**
INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

Sídlo: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

IČ: 494 46 703,

DIČ: CZ 49446703

Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1120

Telefon / Fax:

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):

Projektová činnost ve výstavbě

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): NETÝKA SE

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a
státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 20 let, z toho

- v České republice: 20 let
- v zemi registrace: 20 let
- v zahraničí: 20 let

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 0,2%

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní
firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné /
subdodavatelské / jiné společnosti):

Obchodní firma: **INFRAM a.s.**
Sídlo: Peluškova 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00
Vztah k účastníkovi: jiná společnost – vedoucí účastník sdružení

Obchodní firma: **HBH Projekt spol. s.r.o.**
Sídlo: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Vztah k účastníkovi: jiná společnost – člen sdružení

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): NE

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.


V Brně dne: 25. 9. 2012

AMBERG Engineering Brno a.s.

AMBERG Engineering Brno a.s.

**Organizační
struktura firmy**

AMBERG Engineering Brno. a.s.
Členové představenstva:

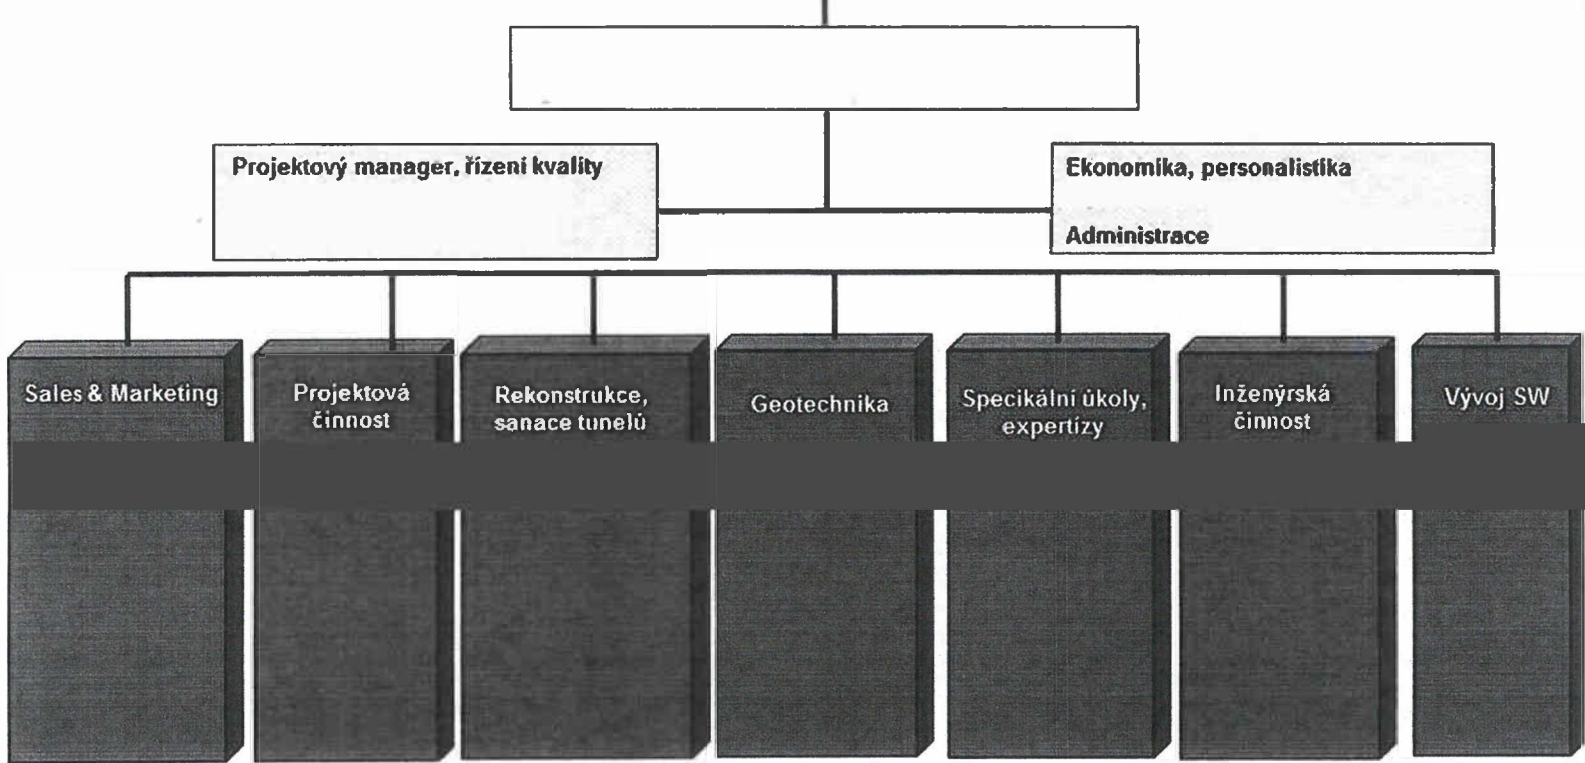

6.2. Závazek integrity

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: INFRAM a.s. – vedoucího účastníka sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

Pelušková 1407, Praha 9 - Kyje, 198 00

Prohlašujeme tímto, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění.

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatel o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 01.10. 2012

INFRAM a.s.

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4**

Od: **HBH Projekt spol. s r.o., IČ: 44961944, sídlo: Kabátňkova 216/5, 602 00 Brno - člen sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805**

Prohlašujeme tímto, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění.

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoli zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 17. 9. 2012

HBH/Projekt spol. s r.o.

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: AMBERG Engineering Brno, a.s., Ptašinského 10/313, 602 00 Brno,
člena sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI / st. 805

Prohlašujeme tímto, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění.

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně dne: 25. 9. 2012

AMBERG Engineering Brno a.s.

AMBERG Engineering Brno a.s.

6.3. Přehled plných mocí vč. příloh

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.3

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00,
IČ: 250 70 282,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

jakožto **vedoucí účastník sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805** uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 („uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

NETÝKÁ SE

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 01.10. 2012

INFRAM a.s.

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.3

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.,
se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno,
IČ: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 („uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

INFRAM a.s.,
Se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČ: 25070282
Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4235,
Zastoupenou , jakožto
vedoucího účastníka sdružení s názvem: INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

k zastupování a ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat účastníky sdružení v souvislosti s účastí v užším řízení na tuto veřejnou zakázku a ke všem smluvním jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s plněním této veřejné zakázky. Zmocnění rovněž zahrnuje podpis smlouvy se zadavatelem a smluvních dodatků na realizaci předmětné veřejné zakázky za zmocnitele, jednání a podpis ostatních právních úkonů, které souvisí s naplňováním účelu sdružení vystupujícího pod názvem INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805, dále přijímání pokynů i plateb jménem zmocnitele.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Brně dne 17.9. 2012

HBH Projekt spol. s r.o.

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.3

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.,
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
IČ: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 („uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

INFRAM a.s.,
Se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČ: 25070282

Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4235,

Zastoupenou

jakožto

vedoucího účastníka sdružení s názvem: INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

k zastupování a ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat účastníky sdružení v souvislosti s účastí v užším řízení na tuto veřejnou zakázku a ke všem smluvním jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.

Zmocnění rovněž zahrnuje podpis smlouvy se zadavatelem a smluvních dodatků na realizaci předmětné veřejné zakázky za zmocnitele, jednání a podpis ostatních právních úkonů, které souvisí s naplňováním účelu sdružení vystupujícího pod názvem INFRAM /HBH/AMBERG/TDI st. 805, dále přijímání pokynů i plateb jménem zmocnitele.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Brně dne 17.9. 2012

HBH Projekt spol. s r.o.

PLNÁ MOC

HBH Projekt spol. s r.o.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČ: 449 61 944

zastoupená
jakožto účastník sdružení s názvem

INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

z mocňuje tímto:

INFRAM a.s.,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČ: 250 702 82

zastoupenou
jakožto vedoucího účastníka sdružení s názvem

INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

a zmocňuje

k zastupování a ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat účastníky sdružení v souvislosti s účastí v uzavřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**D8, stavba 805, A-F, TDI**“ (dále jen „veřejnou zakázku“) vyhlášeném zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 (dále též jen „zadavatel“) ke všem smluvním jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.

Zmocnění rovněž zahrnuje podpis smlouvy se zadavatelem a smluvních dodatků na realizaci předmětné veřejné zakázky za zmocnitele, jednání a podpis ostatních právních úkonů, které souvisí s naplňováním účelu sdružení vystupujícího pod názvem **INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805**, dále přijímání pokynů i plateb jménem zmocnitele.

V Praze: 27.4.2012

Za zmocnitele **HBH Projekt spol. s r.o.**

Plnou moc v celém rozsahu přijímám za zmocněnce **INFRAM a.s.**

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.3

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost **AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: : Ptašínského 10/313, 602 00 Brno,

IČ: 494 46 703,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120

jakožto **účastník sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805** uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 („uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

společnost INFRAM a.s., jako vedoucího účastníka sdružení s názvem INFRAM/HBH/AMBERG/TDI st. 805.

V souladu s Výpisem z obchodního rejstříku za společnost INFRAM a.s. jedná a podepisuje

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Brně dne: 25. 9. 2019

AMBERG Engineering Brno a.s.

AMBERG Engineering Brno a.s.

PLNÁ MOC

AMBERG Engineering Brno, a.s.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120
Ptašinského 10/313, 602 00 Brno
IČ: 494 46 703

zastoupená

jakožto účastník sdružení s názvem

INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

z m o c ň u j e t í m t o :

INFRAM a.s.,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČ: 250 702 82

zastoupenou

jakožto vedoucího účastníka sdružení s názvem

INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

a zmocněnce

k zastupování a ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat účastníky sdružení v souvislosti s účastí v uzavřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**D8, stavba 805, A-F, TDI**“ (dále jen „veřejnou zakázku“) vyhlášeném zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Parkráci 56, 140 00 Praha 4 (dále též jen „zadavatel“) ke všem smluvním jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.

Zmocnění rovněž zahrnuje podpis smlouvy se zadavatelem a smluvních dodatků na realizaci předmětné veřejné zakázky za zmocnitele, jednání a podpis ostatních právních úkonů, které souvisí s naplňováním účelu sdružení vystupujícího pod názvem **INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805**, dále přijímání pokynů i plateb jménem zmocnitele.

V Praze: 27.4.2012

Za zmocnitele **AMBERG Engineering Brno, a.s.**

Přijímá moc v celém rozsahu přijímám za zmocněnce **INFRAM a.s.**

6.4. Zadání části služeb vč. příloh

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Sdružení: **INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805**

INFRAM a.s. – vedoucí účastník sdružení
se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00,
IČ: 250 70 282,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074, tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Označení (název) odborné pozice realizačního týmu, která má být vykonávána subdodavatelem	Popis obsahu odborné pozice realizačního týmu (služby zadávané subdodavatelem)	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% ze všech odborných pozic realizačního týmu veřejné zakázky	Zkušenosti s poskytováním služeb TDI a/nebo asistenta správce stavby (uvést detaily)
Expert v oboru elektrotechnika	Služby v oboru elektrotechnika	Ing. Pavel Gerych	0,09	

Označení (název) odborné pozice realizačního týmu, která má být vykonávána subdodavateli	Popis obsahu odborné pozice realizačního týmu (služby zadávané subdodavateli)	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% ze všech odborných pozic realizačního týmu veřejné zakázky	Zkušenosti s poskytováním služeb TDI a/nebo asistenta správce stavby (uvést detaily)
Expert – životní prostředí	Služby v oboru životního prostředí	Juros, s.r.o. Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 - Podolí	0,12	
Specialista PKO	Služby v oboru protikorozní ochrany	KONTROL SERVIS s.r.o. Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek - Místek	3,02	
Expert – inženýrská geologie	Služby v oboru geologické práce	GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112, 627 Brno	0,09	
Expert - pozemní stavby	Služby v oboru technického dozoru staveb komunikací a přeložek	Pečák a partner, s.r.o. Náměstí 28. Října 17, 602 00 Brno	0,03	
Expert – technická zařízení	Služby v oboru technika prostředí staveb – specializace technická zařízení	KLIMAKOM, spol. s r.o. Zámecká 4, 643 00 Brno - Chrlice	0,25	
CELKEM % ZE VŠECH ODBORNÝCH POZIC REALIZAČNÍHO TÝMU			3,6	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb (výkonu odborných pozic realizačního týmu), což uchazeč dokládá stejnopisy či úředně ověřenými kopiemi jejich příslušného písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb (výkonu odborných pozic realizačního týmu) se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 01.10.2012

řádně oprávněn podat nabídku jménem sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805,
na základě plných mocí HBH Projekt spol. s.r.o. a AMBERG Engineering Brno, a.s. ze dne 27.4. 2012

Smlouva o budoucí spolupráci

podle ustanovení § 289 a násl. obchodního zákoníku a § 51 odst. (4) zákona č. 137 /2006 Sb. o veřejných zakázkách

I. Smluvní strany

1.1 Budoucí dodavatel

Název: **INFRAM a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

Sídlo: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9

Zastoupena:

IČO: 250 70 282

DIČ: CZ25070282

1.2 Budoucí subdodavatel

Ing. Pavel Gerych

Sídlo:

Zastoupena:

Zapsaná v živnostenském rejstříku Magistr. Města Brna č.j. 9967/2001/04 a ev.č. 370203-8824-00

IČO: 474 07 191

DIČ:

II. Předmět a účel smlouvy

2.1 Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/55, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, (dále jen „Veřejný zadavatel“), vyhlásil užší řízení na uzavření smlouvy na služby na veřejnou zakázku pod názvem „**D8, stavba 805, A-F, TDI**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Předmět díla je specifikován v kvalifikační dokumentaci, kterou budoucí objednatel v souladu s podmínkami oznámení o zakázce řádně obdržel.

2.2 Budoucí subdodavatel se zavazuje, že jestliže budoucí dodavatel získá výše uvedenou zakázku, uzavře s ním subdodavatelskou smlouvu a poskytne mu následující inženýrské výkony určené k plnění této veřejné zakázky budoucím dodavatelem:

- **služby v oboru elektrotechnika**

2.3 Budoucí subdodavatel souhlasí, aby budoucí dodavatel jeho prostřednictvím prokázal splnění následující(ch) části(i) kvalifikace požadované zadavatelem a disponoval s nimi v rámci plnění veřejné zakázky:

v rámci prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:

- **Autorizaci v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení**

v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů:

- **Kvalifikaci pracovníka týmu TD na pozici Expert v oboru elektrotechnika**

2.4 Budoucí subdodavatel prohlašuje, že se neúčastní žádné jiné nabídky pro přidělení této veřejné zakázky.

III. Trvání a zánik smlouvy

3.1 **Tato smlouva** se uzavírá na dobu určitou do doby uzavření smlouvy dle čl. II.

3.2 **Smlouva zaniká** splněním účelu stanoveného v čl. II. této smlouvy, pro který byla sjednána. Smlouva zaniká též, pokud budoucí dodavatel nebude vybrán k realizaci zakázky.

IV. Ostatní ujednání

4.1 **V ostatním** se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku v plném znění a lze ji změnit pouze písemnými dodatky.

4.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží

- jeden výtisk budoucí dodavatel
- jeden výtisk budoucí poddodavatel
- jeden výtisk zadavatel v nabídce budoucího dodavatele

Za budoucího dodavatele:

V Praze dne: 30.4. 2012

Za budoucího subdodavatele:

V Praze dne:30.4.2012

Smlouva o budoucí spolupráci
podle ustanovení § 289 a násl. obchodního zákoníku a § 51 odst. (4) zákona č. 137 /2006 Sb. o
veřejných zakázkách

I.
Smluvní strany

1.1 Budoucí dodavatel

Název: **INFRAM a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

Sídlo: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9

Zastoupena:

IČO: 250 70 282

DIČ: CZ25070282

1.2 Budoucí subdodavatel

Název: **JUROS, s.r.o.**

Zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158616

Zastoupena:

Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 - Podolí

IČO: 25423363

II.
Předmět a účel smlouvy

2.1 Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/55, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, (dále jen „Veřejný zadavatel“), vyhlásil užší řízení na uzavření smlouvy na služby na veřejnou zakázku pod názvem „**D8, stavba 805, A-F, TDI**“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Předmět díla je specifikován v kvalifikační dokumentaci, kterou budoucí objednatel v souladu s podmínkami oznámení o zakázce řádně obdržel.

2.2 Budoucí subdodavatel se zavazuje, že jestliže budoucí dodavatel získá výše uvedenou zakázku, uzavře s ním subdodavatelskou smlouvu a poskytne mu následující inženýrské výkony určené k plnění této veřejné zakázky budoucím dodavatelem:

- **služby v oboru životního prostředí**

2.3 Budoucí subdodavatel souhlasí, aby budoucí dodavatel jeho prostřednictvím prokázal splnění následující(ch) části(i) kvalifikace požadované zadavatelem a disponoval s nimi v rámci plnění veřejné zakázky:

v rámci prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:

- **Autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku podle §19 zákona č.100/2001 Sb.**

v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů:

- **Kvalifikaci pracovníka týmu TD na pozici Expert – životní prostředí**

Smlouva o budoucí spolupráci

podle ustanovení § 289 a násl. obchodního zákoníku a § 51 odst. (4) zákona č. 137 /2006 Sb. o veřejných zakázkách

I.

Smluvní strany

1.1 Budoucí dodavatel

Název: **INFRAM a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

Sídlo: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9

Zastoupena:

IČO: 250 70 282

DIČ: CZ25070282

1.2 Budoucí subdodavatel

Název: **KONTROL SERVIS s.r.o.**

Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20165

Zastoupena:

Sídlo: Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25186116

II.

Předmět a účel smlouvy

2.1 Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/55, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, (dále jen „Veřejný zadavatel“), vyhlásil užší řízení na uzavření smlouvy na služby na veřejnou zakázku pod názvem „**D8, stavba 805, A-F, TDI**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Předmět díla je specifikován v kvalifikační dokumentaci, kterou budoucí objednatel v souladu s podmínkami oznámení o zakázce řádně obdržel.

2.2 Budoucí subdodavatel se zavazuje, že jestliže budoucí dodavatel získá výše uvedenou zakázku, uzavře s ním subdodavatelskou smlouvu a poskytne mu následující inženýrské výkony určené k plnění této veřejné zakázky budoucím dodavatelem:

- **služby v oboru protikorozní ochrany**

2.3 Budoucí subdodavatel souhlasí, aby budoucí dodavatel jeho prostřednictvím prokázal splnění následující(ch) části(i) kvalifikace požadované zadavatelem a disponoval s nimi v rámci plnění veřejné zakázky:

v rámci prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:

- **Certifikát o způsobilosti pracovníka pro protikorozní ochranu**

v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů:

- **Kvalifikaci pracovníka týmu TD na pozici Specialista PKO**

2.4 Budoucí subdodavatel prohlašuje, že se neúčastní žádné jiné nabídky pro přidělení této veřejné zakázky.

III. Trvání a zánik smlouvy

3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby uzavření smlouvy dle čl. II.

3.2 Smlouva zaniká splněním účelu stanoveného v čl. II. této smlouvy, pro který byla sjednána. Smlouva zaniká též, pokud budoucí dodavatel nebude vybrán k realizaci zakázky.

IV. Ostatní ujednání

4.1 V ostatním se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku v plném znění a lze ji změnit pouze písemnými dodatky.

4.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží

- jeden výtisk budoucí dodavatel
- jeden výtisk budoucí poddodavatel
- jeden výtisk zadavatel v nabídce budoucího dodavatele

Za budoucího dodavatele:

V Praze dne: 30.4. 2012

Za budoucího subdodavatele:

Ve Frýdku – Místku dne: 23.4.2012

Smlouva o smlouvě budoucí

uzavřená ve smyslu § 51 odst. (4) zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
podle § 289 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění
pro akci

„D8, stavba 805, A – F, TDI“

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Strana oprávněná:** **HBH Projekt spol. s r.o.**
Sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Zastoupená:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
IČ : 44961944
DIČ : CZ44961944
(dále jen Oprávněný)

- 1.2. Strana zavázaná:** **GEOtest, a.s.**
Sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zastoupená:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
IČ : 46344942
DIČ : CZ46344942
(dále jen Zavázaný)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek strany zavázané uzavřít ve stanovené době smlouvu o dílo na zabezpečení výkonů v oboru geotechnika a geologické práce na výše uvedené veřejné zakázce.
- 2.2. Zavázaný souhlasí, aby oprávněný prokázal jeho prostřednictvím splnění následujících kvalifikačních předpokladů - oprávnění k podnikání v oboru geologické práce; zabezpečení odborné způsobilosti v oboru expert – inženýrská geologie v rozsahu uvedeném v kvalifikační dokumentaci; a doložení dokladů o certifikaci řízení z hlediska jakosti, ochrany ŽP a BOZP v oboru geotechnická činnost Zavázaným v rámci užšího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

Článek 3. Lhůta k plnění

- 3.1. Zavázaný je povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy o dílo a uzavřít smlouvu o dílo s výše určeným předmětem plnění bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Oprávněného. Oprávněný učiní výzvu k uzavření smlouvy o dílo ve lhůtě 45 dní od definitivního přidělení zakázky jejím zadavatelem Oprávněnému, respektive od data prokazatelného obdržení smlouvy uzavřené na plnění předmětné veřejné zakázky.

- 3.2. Předmět plnění určený čl. 2.2 této smlouvy bude Zavázaným pro Oprávněného realizován v termínu upřesněném a sjednaném ve smlouvě o dílo.

**Článek 4.
Ostatní ujednání**

- 4.1. Zavázaný prohlašuje, že disponuje veškerým technickým, materiálním a personálním vybavením potřebným k provedení předmětu plnění a že je k tomuto plně finančně a ekonomicky způsobilý.

**Článek 5.
Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb. v platném znění.
- 5.3. Smlouva je vypracována ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Oprávněný obdrží dvě vyhotovení této smlouvy o smlouvě budoucí, zavázaný obdrží jedno vyhotovení.
- 5.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním smlouvy, a na důkaz souhlasu s jejím zněním připojují své podpisy.

V Brně dne 25. 4. 2012

V Brně dne 25. 4. 2012

Za Oprávněného: **HBH Projekt spol. s r.o.**

Za Zavázaného: **GEOtest, a.s.**

Smlouva o smlouvě budoucí

uzavřená ve smyslu § 51 odst. (4) zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
podle § 289 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění
pro akci

„D8, stavba 805, A-F, TDI“

Článek 1. Smluvní strany

1.1. **Strana oprávněná:** HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlem: Kabátůvkova 216/5, 602 00 Brno
Zastoupená:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
IČ : 44961944
DIČ : CZ44961944

(dále jen Oprávněný)

1.2. **Strana zavázaná:** Pelčák a partner, s.r.o.
Sídlem: Náměstí 28. října 17, 602 00 Brno
Zastoupená:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57671
IČ : 28270355
DIČ : CZ28270355

(dále jen Zavázaný)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek strany zavázané uzavřít ve stanovené době smlouvu o dílo s dále určeným předmětem plnění a na tomto základě toto plnění Oprávněnému poskytnout.
- 2.2. Předmětem plnění je zabezpečení odborné způsobilosti v oboru expert – pozemní stavby a osoba provádějící projekční práce v oboru pozemní stavby v rozsahu prací oceněném Zavázaným v rámci nabídkového řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

Článek 3. Lhůta k plnění

- 3.1. Zavázaný je povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy o dílo a uzavřít smlouvu o dílo s výše určeným předmětem plnění bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Oprávněného. Oprávněný učiní výzvu k uzavření smlouvy o dílo ve lhůtě 45 dní od definitivního přidělení zakázky jejím zadavatelem Oprávněnému, respektive od data prokazatelného obdržení smlouvy uzavřené na plnění předmětné veřejné zakázky.

- 3.2. Předmět plnění určený čl. 2.2 této smlouvy bude Zavázaným pro Oprávněného realizován v termínu upřesněném a sjednaném ve smlouvě o dílo.

**Článek 4.
Ostatní ujednání**

- 4.1. Zavázaný prohlašuje, že disponuje veškerým technickým, materiálním a personálním vybavením potřebným k provedení předmětu plnění a že je k tomuto plně finančně a ekonomicky způsobilý.

**Článek 5.
Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb. v platném znění.
- 5.3. Smlouva je vypracována ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Oprávněný obdrží dvě vyhotovení této smlouvy o smlouvě budoucí, zavázaný obdrží jedno vyhotovení.
- 5.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním smlouvy, a na důkaz souhlasu s jejím zněním připojují své podpisy.

V Brně dne 25. 4. 2012

V Brně dne 23. 4. 2012

Za Oprávněného:

Za Zavázaného:

Smlouva o smlouvě budoucí

uzavřená ve smyslu § 51 odst. (4) zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
podle § 289 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění
pro akci

„D8, stavba 805, A-F, TDI“

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Strana oprávněná:** **HBH Projekt spol. s r.o.**
Sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
Zastoupená:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
IČ : 44961944
DIČ : CZ44961944
(*dále jen Oprávněný*)

- 1.2. Strana zavázaná:** **KLIMAKOM, spol. s r.o.**
Sídlem: Zámecká 4, 64300 Brno - Chrlice
Zastoupená:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsána v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 39204
IČ : 26239248
DIČ : CZ26239248
(*dále jen Zavázaný*)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek strany zavázané uzavřít ve stanovené době smlouvu o dílo s dále určeným předmětem plnění a na tomto základě toto plnění Oprávněnému poskytnout.
- 2.2. Předmětem plnění je zabezpečení odborné způsobilosti jako expert - technická zařízení v rozsahu prací oceněném Zavázaným v rámci nabídkového řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

Článek 3. Lhůta k plnění

- 3.1. Zavázaný je povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy o dílo a uzavřít smlouvu o dílo s výše určeným předmětem plnění bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Oprávněného. Oprávněný učiní výzvu k uzavření smlouvy o dílo ve lhůtě 45 dní od definitivního přidělení zakázky jejím zadavatelem Oprávněnému, respektive od data prokazatelného obdržení smlouvy uzavřené na plnění předmětné veřejné zakázky.

- 3.2. Předmět plnění určený čl. 2.2 této smlouvy bude Zavázaným pro Oprávněného realizován v termínu upřesněném a sjednaném ve smlouvě o dílo.

**Článek 4.
Ostatní ujednání**

- 4.1. Zavázaný prohlašuje, že disponuje veškerým technickým, materiálním a personálním vybavením potřebným k provedení předmětu plnění a že je k tomuto plně finančně a ekonomicky způsobilý.

**Článek 5.
Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb. v platném znění.
- 5.3. Smlouva je vypracována ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Oprávněný obdrží dvě vyhotovení této smlouvy o smlouvě budoucí, zavázaný obdrží jedno vyhotovení.
- 5.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním smlouvy, a na důkaz souhlasu s jejím zněním připojují své podpisy.

V Brně dne 26/4/2012

V Brně dne 26/4/2012

Za Oprávněného:

Za Zavázaného:

6.5. Prohlášení o spolehlivosti

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.5 PROHLÁŠENÍ O SPOLEHLIVOSTI

Společnost **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00,

IČ: 250 70 282,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

jakožto vedoucí účastník sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805 uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 („uchazeč“), tímto výslovně prohlašuje, že

uchazeči v uplynulých třech (3) letech nebyla ze strany České republiky (včetně kterékoliv její organizační složky) nebo kterékoliv české státní organizace (včetně státních organizací s právní subjektivitou) uložena nebo proti němu uplatněna žádná veřejnoprávní sankce ani smluvní sankce v důsledku porušení právní povinnosti při plnění veřejné zakázky na služby.

V Praze dne 01.10. 2012

INFRAM a.s.

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.5 PROHLÁŠENÍ O SPOLEHLIVOSTI

Společnost HBH Projekt spol. s r.o. - člen sdružení INFRAM / HBH / AMBERG/ TDI st. 805,
se sídlem: Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno,
IČ: 44961944,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“,
zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k
uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 („uchazeč“), tímto
výslovně prohlašuje, že

***uchazeči v uplynulých třech (3) letech nebyla ze strany České republiky (včetně kterékoliv její
organizační složky) nebo kterékoliv české státní organizace (včetně státních organizací s
právní subjektivitou) uložena nebo proti němu uplatněna žádná veřejnoprávní sankce ani
smluvní sankce v důsledku porušení právní povinnosti při plnění veřejné zakázky na služby.***

V Brně dne 17. 9. 2012

HBH Projekt spol. s r.o.

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
PROHLÁŠENÍ O SPOLEHLIVOSTI**

Společnost **AMBERG Engineering Brno, a.s.**
se sídlem: : Ptašinského 10/313, 602 00 Brno,
IČ: 494 46 703,
zapsaná v obchodním rejstříku zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1120

jakožto účastník sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805 uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 („uchazeč“), tímto výslovně prohlašuje, že

uchazeči v uplynulých třech (3) letech nebyla ze strany České republiky (včetně kterékoliv její organizační složky) nebo kterékoliv české státní organizace (včetně státních organizací s právní subjektivitou) uložena nebo proti němu uplatněna žádná veřejnoprávní sankce ani smluvní sankce v důsledku porušení právní povinnosti při plnění veřejné zakázky na služby.

V Brně dne: 25.9.2012

AMBERG Engineering Brno a.s.

AMBERG Engineering Brno a.s.

6.6. Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.6

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: **INFRAM a.s.**

Sídlo vedoucího účastníka: Peluškova 1407 Praha 9 – Kyje, 198 00

IČ 250 702 82 DIČ CZ 25070282

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
[NETÝKÁ SE]

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: [NETÝKÁ SE]

Telefon / Fax [NETÝKÁ SE] / [NETÝKÁ SE]

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) HBH Projekt spol. s r.o.
- ii) AMBERG Engineering Brno, a.s.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 30.4. 2012
- ii) Místo: Praha
- iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

Účastník sdružení	Předpokládaný podíl na zakázce v %	Druh služeb
INFRAM a.s. -vedoucí účastník sdružení	87,8	Asistent správce stavby, Rozpočtář, Adm. pracovník, Právník <i>Specialisté:</i> geotechnik, pro pozemní komunikace, pro mostní konstrukce, elektrotechnik, kontrola jakosti, tunelové stavby, PKO <i>Expert:</i> elektrotechnika, ŽP, Auditor bezpečnosti PK
HBH Projekt spol. s r.o. - účastník sdružení	12	Inženýring <i>Specialisté:</i> pozemní komunikace, produktovody, v oboru technická zařízení staveb <i>Expert:</i> inž. geologie, pozemní komunikace, mosty a inž. kce, technická zařízení, produktovody, pozemní stavby
AMBERG Engineering Brno a.s. , - účastník sdružení	0,2	<i>Expert:</i> pro tunelové stavby

řádně oprávněn podat nabídku jménem sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805, na základě plných mocí HBH Projekt spol. s r.o. a AMBERG Engineering Brno, a.s. ze dne 27.4. 2012

Pelušková 1407, Praha 9, 198 00

V Praze dne 01.10. 2012

Smlouva o sdružení
(dále též „smlouva o seskupení“)
uzavřená dle § 829 a násl. občanského zákoníku

Čl. 1 Smluvní strany – účastníci sdružení

1.1 INFRAM a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

Sídlo: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9

Zastoupena:

IČ: 250 70 282

DIČ: CZ25070282

1.2 HBH Projekt spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

Sídlo: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

Zastoupena:

IČ: 449 61 944

DIČ: CZ44961944

1.3 AMBERG Engineering Brno, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120

Sídlo: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

Zastoupena

IČ: 494 46 703

DIČ: CZ49446703

uzavírají tuto smlouvu

Čl. 2 - Předmět smlouvy

2.1 Výše uvedení smluvní strany (dále jen „účastníci sdružení“) se dohodli v této smlouvě o sdružení uzavřené dle § 829 a násl. zák. 40/1964 občanského zákoníku ve znění pozdějším, že:

- a) společně podají žádost o účast v užším zadávacím řízení na veřejnou zakázku **D8, stavba 805, A-F, TDI** (dále jen „veřejnou zakázku“) vyhlášeném pod ev. č. VZ 7202011013074 prostřednictvím uveřejňovacího subsystému Informačního systému o veřejných zakázkách (dále též jen „veřejné zakázky“) zadavatelem **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) a
- b) pokud budou zadavatelem vyzváni k podání nabídky podají společnou nabídku
- c) uzavře-li s nimi zadavatel smlouvu na poskytnutí služeb na základě společné nabídky účastníků sdružení, budou se níže vymezeným způsobem účastnit na plnění veřejné zakázky **D8, stavba 805, A-F, TDI** a poskytnou případná další plnění požadovaná zadavatelem v zadávací dokumentaci otevřeného řízení na zadání této veřejné zakázky.

Účelem sdružení je:

- získat právo k společné realizaci veřejné zakázky účastníky sdružení a za tím účelem podat nabídku společně,
- účastnit se společně níže uvedeným způsobem na realizaci veřejné zakázky v případě, že zadavatel uzavře smlouvu na poskytnutí služeb s účastníky sdružení.

2.2 Účastníci se dohodli na názvu sdružení:

INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805

2.3 Sídlem sdružení je:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9, tj. sídlo společnosti INFRAM a.s.

Čl. 3 - Zastupování účastníků sdružení, vedoucí účastník sdružení, rozhodování účastníků sdružení

3.1 Účastníky sdružení bude zastupovat účastník **INFRAM a.s.** (dále též jen „**vedoucí účastník sdružení**“). Vedoucí účastník sdružení je tak oprávněn, k veškerým jednáním a právním úkonům činěným v souvislosti:

- s účastí účastníků sdružení v předmětném zadávacím řízení; vedoucí účastník sdružení je tak zejména oprávněn podepsat nabídku jménem všech účastníků sdružení, jakož i činit veškeré jiné právní úkony spojené s účastí účastníků sdružení v rámci předmětného zadávacího řízení
- s realizací veřejné zakázky účastníky sdružení; vedoucí účastník sdružení je tak zejména samostatně oprávněn:
 - se zadavatelem jménem všech účastníků sdružení uzavřít se zadavatelem smlouvu na poskytnutí nabízených služeb a případné dodatky k této smlouvě.
 - se subdodavatelem jménem všech účastníků sdružení uzavřít se subdodavatelskou smlouvu na poskytnutí vybraných služeb a případné dodatky k této smlouvě.

3.2 Při zastupování bude vedoucí účastník sdružení jednat v souladu s oprávněnými zájmy všech účastníků sdružení.

3.3 Účastníci sdružení rozhodují ve všech věcech jednomyslně dle § 836 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Vedoucí účastník je odpovědný za provedení zakázky včetně plateb ve vztahu vůči zadavateli a dále je oprávněn přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky sdružení. Tím není dotčena:

- společná a nerozdílná závaznost všech účastníků sdružení dle § 835 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a § 51 odst. (6) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, z jakýchkoliv závazků vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i podobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky
- vzájemná odpovědnost za škodu mezi účastníky sdružení; každý z účastníků odpovídá ostatním účastníkům za skutečnou škodu i ušlý zisk, způsobené porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanových povinností nebo způsobenou ztrátou kvalifikačních předpokladů.

3.5 Platby od zadavatele budou poukazovány na účet vedoucího účastníka zřízený u banky. Částku poskytnutou zadavatelem, jež bude určena ostatním účastníkům sdružení, bude

vedoucí účastník zasílat tomuto účastníku vždy do 7 dnů po obdržení takových prostředků na uvedeném účtu.

Čl. 4. – Závazky a povinnosti účastníků sdružení

- 4.1 Náklady na součinnost nutnou ke společné účasti v zadávacím řízení nese každý účastník ze svého.
- 4.2 Ze závazků vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení a ze závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a účastníky sdružení, jsou účastníci sdružení ve vztahu k zadavateli zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
- 4.3 Účastníci sdružení se dohodli též na těchto dalších povinnostech:
 - účastník sdružení **INFRAM a.s.** zajistí v případě vyzvání Zadavatelem k podání nabídky poskytnutí jistoty vyžadované zadavatelem k účasti v zadávacím řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; tuto jistotu poskytne formou bankovní záruky, a to v plné výši za všechny účastníky sdružení,

V případě získání veřejné zakázky budou účastníci sdružení zavázáni realizovat všechny výkony, potřebné ke splnění smlouvy uzavřené se zadavatelem společně a nerozdílně.

Čl. 5. - Další ujednání

- 5.1 Vedoucí účastník podepíše a předá zadavateli za účastníky sdružení nabídku v rámci předmětného zadávacího řízení. Účastníci v rámci nabídky předloží veškeré doklady požadované zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Zadávací dokumentace otevřeného řízení na zadání výše uvedené veřejné zakázky.
- 5.2 Účastníci se zavazují, že budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by byl tento společný zájem ohrožen, zejména že nebudou jednat s jiným zájemcem nebo uchazečem o případné budoucí účasti na veřejné zakázce.
- 5.3 Všechny informace, které si účastníci vzájemně poskytnou o sobě a které získají v průběhu dohodnuté spolupráce v rámci tohoto sdružení, nesmějí využít zejména ve fázi přípravy společné nabídky ke škodě jiného účastníka sdružení, zejména nesmí dojít k využití informací ve prospěch ostatních společností, které nejsou účastníky sdružení.
- 5.4 Každý z účastníků odpovídá ostatním účastníkům za škodu a ušlý zisk, způsobené porušením smluvně převzatých nebo právními předpisy stanovených povinností anebo způsobených ztrátou kvalifikačních předpokladů.
- 5.5 Účastníci sdružení se zavazují dodatkem této smlouvy o sdružení, uzavřeným po podpisu smlouvy na poskytnutí nabízených služeb se zadavatelem, dohodnout mezi sebou podrobnou úpravu společné realizace veřejné zakázky, financování a rozdělení majetku získaného při výkonu společné činnosti.

Článek 6. - Závěrečná ustanovení

- 6.1 Smlouva o sdružení pozbývá účinnosti v případě (vedle jiných důvodů vymezených zákonem), že:
- bude uzavřena příslušná smlouva, jejímž předmětem bude plnění veřejné zakázky, s jinou osobou, než s účastníky sdružení
 - předmětné zadávací řízení bude zrušeno,
 - splněním zaniknou veškerá práva a povinnosti ze smlouvy, jejímž předmětem bude plnění veřejné zakázky, pokud bude uzavřena mezi zadavatelem a účastníky sdružení.
- 6.2 Spory z této smlouvy bude rozhodovat Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Místem rozhodčího řízení bude sudiště Brno.
- 6.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom. Jedno vyhotovení bude předloženo v nabídce účastníků sdružení podávané v rámci předmětného zadávacího řízení.
- 6.4 Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat pouze formou písemných dodatků.

V Praze dne: 30.4.2012

Za **KÍFRAM a.s.**

Za **HBH Projekt spol. s.r.o.**

Za **AMBERG Engineering Brno, a.s.**

6.7. Prohlášení k zamezení střetu zájmu

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.7
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00,

IČ: 250 70 282,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

jakožto vedoucí účastník sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805 uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 („uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Praze dne 01.10.2012

INFRAM a.s.



DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.7 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o. - člen sdružení INFRAM / HBH / AMBERG/ TDI st. 805,
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
IČ: 44961944,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“,
zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k
uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 („uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude
on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podléjících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet
se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potenciálního nebo konkrétního
stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí
Smlouvy.

V Brně dne 17. 9. 2012

HBH Projekt spol. s r.o.

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.7
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost **AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: : Ptašinského 10/313, 602 00 Brno,

IČ: 494 46 703,

zapsaná v obchodním rejstříku zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1120

jakožto účastník sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805 uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D8, stavba 805, A-F, TDI“, zahájeném zadavatelem dne 23. března 2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. 213074 („uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Brně dne: 25.9.2012

AMBERG Engineering Brno a.s.

AMBERG Engineering Brno a.s.

7. Oceněný rozpis služeb



Oceněný rozpis služeb

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou stanoveny v Kč bez DPH.

Celkem (bez DPH)		79 551 900
DPH (20%)	20%	15 910 380
Celkem vč. DPH		95 462 280

8. Přílohy - případné další dokumenty dodavatele

**NETÝKÁ SE - dodavatel nepřikládá
žádné další dokumenty**

9. Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Zvláštní obchodní podmínky vč.
příloh: A, B, C
Smlouva

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR INFRASTRUKTURY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB PRO
STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PŘÍLOHY A, B, C
VZOR SMLOUVY

Schváleno: MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1
ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008,
se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování
konzultačních služeb pro stavby PK, schválených
MD-OPK č.j. 636/03-120 – RS/1 ze dne 19. 12. 2003

Praha, duben 2008

OBSAH

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. DEFINICE
2. VÝKLAD POJMŮ

POVINNOSTI KONZULTANTA

- 3.1 ROZSAH SLUŽEB
- 3.2 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
4. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
5. POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE – DOSTATEČNOST NABÍDKY
– DŮVĚRNOST

POVINNOSTI OBJEDNATELE

7. INFORMACE
8. ROZHODOVÁNÍ
9. POSKYTNUTÍ POMOCI
10. PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB
11. POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

PERSONÁL

13. PERSONÁL KONZULTANTA
14. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
15. ZMĚNY PERSONÁLU

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY –
NÁHRADA ŠKODY
17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
18. ODPOVĚDNOST KONZULTANTA
19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
20. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

21. PLATNOST SMLOUVY
22. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
23. ZMĚNY
24. DALŠÍ NÁVRHY
25. ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB, SMLUVNÍ POKUTY
PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA
26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI – VYŠŠÍ MOC
27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 - 27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
 - 27.2 OZNÁMENÍM KONZULTANTA
28. MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PLATBY

30. PLATBY KONZULTANTOVI
31. TERMÍNY PLATEB
32. MĚNA PLATEB
33. SPORNÉ PLATBY
34. KONTROLA OBJEDNATELE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 35. JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY**
- 36. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ**
- 37. PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT**
- 38. VLASTNICKÁ PRÁVA**
- 39. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY**
- 40. OZNÁMENÍ**
- 41. PUBLIKACE**

ŘEŠENÍ SPORŮ

- 42.1 SMÍRNÉ ŘEŠENÍ**
- 42.2 ROZHODČÍ ŘÍZENÍ**

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘÍLOHY

- A – Rozsah služeb**
- B – Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem**
- C – Platby a platební podmínky**

III. VZOR SMLOUVY

PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací se skládají ze dvou částí.

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“ – (VOP-S), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.

Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“ (ZOP-S) – obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-S a ostatní specifické podmínky, vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články Všeobecných obchodních podmínek dle potřeby změnit, doplnit anebo vypustit. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:

- rozsah služeb včetně jejich ocenění (Příloha A),
- personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
- platby a platební podmínky (Příloha C).

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky a do Smlouvy, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě, kde spolu s dalšími dokumenty definují požadované služby.

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců.

Jako pomůcka je připojen vzor Smlouvy.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

- 1.1 „Zakázka“** znamená zakázku nebo její část, určenou ve zvláštních obchodních podmínkách, pro kterou mají být služby provedeny.
- 1.2 „Konzultační služby“** jsou činnosti, které má provést konzultant v souladu se Smlouvou a zahrnují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Služby vyžádané objednatelem podle Smlouvy jsou „konkrétní služby“. Příkladem konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací je výkon inženýrských činností ve výstavbě zahrnující zařízení záležitostí v souvislosti s přípravou a realizací staveb, výkon stavebního dozoru nebo supervize, provedení odborné expertízy apod.
- 1.3 „Objednatel“** znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, která přijala nabídku nebo objednala provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel zároveň zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
- 1.4 „Konzultant“** znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fázi zadání veřejné zakázky je konzultant dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
- 1.5 „Sub-konzultant“** znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě nebo jinou osobu určenou jako sub-konzultant, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních předpisů a je pověřena konzultantem provedením částí služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání zakázky je sub-konzultant subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
- 1.6 „Strana“ a „Strany“** znamená objednatele a konzultanta a „třetí strana“ – znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

- 1.7 „Smlouva“ je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního zákoníku. Součástí Smlouvy je Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, Obchodní podmínky ((Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Úhrady a platby)), Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a Související dokumenty specifikované ve Zvláštních obchodních podmínkách a ve Smlouvě.
- 1.8 „Den“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnočními.
- 1.9 „Sazba“ je jednotková cena nabídnutá konzultantem, která se může měnit pouze za podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 1.10 „Stavební dozor“ je činnost zajišťující kontrolu prováděných prací a dohled objednatele/správce stavby nad plněním závazků zhotovitele v rozsahu daném Smlouvou o dílo. Zahrnuje technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona. Není totožný s pojmem „stavební dozor“ ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
- 1.11 „Supervizí“ se rozumí zvláštní dozor objednatele nad prováděním stavby (pokud je vyžadován) z hlediska dodržení obecných a technických a kvalitativních podmínek a předpisů a monitorování časového postupu stavby a finančního a objemového plnění.
- 1.12 „Expertizou“ se rozumí odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatelem.
- 1.13 „Dopis o přijetí nabídky“ znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Na základě něj bude oběma stranami podepsána Smlouva.
- 1.14 „Dopis nabídky“ znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven konzultantem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení služby včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.
- 1.15 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky.
- 1.16 „Zvláštní příloha k nabídce“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást“.

VÝKLAD

- 2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
- 2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje.
- 2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
- Smlouva
 - Dopis o přijetí nabídky
 - Dopis nabídky
 - Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
 - Všeobecné obchodní podmínky
 - Zvláštní technické podmínky pro provedení služeb
 - Technické podmínky (pokud pro poskytované služby existují)
 - Související dokumenty tvořící součást Smlouvy a uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách
- Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.

POVINNOSTI KONZULTANTA

ROZSAH SLUŽEB

3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

3.2 Konzultant předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY.

4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.

4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.

4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však konzultant musí provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE

5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy.

5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi objednatelem a třetí stranou, konzultant:

- bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v Příloze A ,
- je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu objednatele,
- upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany.

5.3 V případě potřeby objednatel vydá konzultantovi příslušné plné moci.

5.4 Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o průběhu služeb. Způsob informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití konzultantem zůstane ve vlastnictví objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY

6.2 Předpokládá se, že se konzultant před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb.

DŮVĚRNOST

6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Konzultant není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Konzultant je povinen zajistit, aby služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE

7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá konzultantovi v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ

8.1 Na písemné dotazy konzultanta objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI

9.1 Objednatel bude konzultantovi nápomocen při:

- zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
- zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB

10.1 Objednatel dá konzultantovi bezplatně k dispozici podklady k provedení služeb, uvedené v Příloze B. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatel a budou mu vráceny konzultantem při dokončení nebo předčasném ukončení služeb.

10.2 Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně rovněž vybavení uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

11.1 V dohodě s konzultantem objednatel poskytne konzultantovi na své náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi konzultanta.

11.2 Personál poskytnutý objednatel v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro konzultanta.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a konzultant bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.

12.2 Jestliže závazky objednatel podle čl. 11.1. nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí konzultant jejich provedení jako dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL KONZULTANTA

13.1 Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatel.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy.

ZMĚNY PERSONÁLU

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, konzultant zařídí ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese konzultant. V případě, že náhrada je požadována objednatel

- (i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,

- (ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným porušením povinností určených Smlouvou.

NÁHRADA ŠKODY

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle následujících podmínek:

- a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností,
- b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl odpovídající podílu zavinění.

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

17.1 Objednatel ani konzultant nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST KONZULTANTA

18.1 Konzultant odpovídá za řádné provedení služeb podle Smlouvy.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat pojištění

- odpovědnosti za škody,
- odpovědnosti vůči třetím osobám,
- případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A Odstoupení od smlouvy

PLATNOST SMLOUVY

21.1 Smlouva je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ

22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle této Smlouvy.

- 22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této Smlouvy (Zvláštních obchodních podmínek) objednateli.
- 22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, budou tyto dokumenty konzultantem předány v místě sídla objednatele proti potvrzení.

ZMĚNY

- 23.1 Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou formou dodatku ke Smlouvě.
- 23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Konzultant je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
 - c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY

- 24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží konzultant návrhy na změnu služeb. Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB

- 25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb konzultanta s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
- a) konzultant bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
 - b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
 - c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA

- 25.2 Jestliže konzultant neprovádí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách.
- 25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje konzultanta povinností provádět služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI

- 26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není konzultant odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve službách v souladu se Smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli.
- 26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, rozhodne objednatel o dalším postupu plnění Smlouvy.
- Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu vynucenou příslušnými okolnostmi, dohodnutou mezi objednatelem a konzultantem.

VYŠŠÍ MOC

- 26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:
- které se vymykají kontrole smluvní strany,
 - před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy,
 - které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
 - kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO Odstoupení od Smlouvy

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE

- 27.1** Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy písemným oznámením konzultantovi. Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.
- 27.1.1** Usoudí-li objednatel, že konzultant bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí konzultantovi své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.
- 27.1.2** Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, uhradí objednatel konzultantovi částku odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném konzultantem a odsouhlaseném objednatel.

OZNÁMENÍM KONZULTANTA

- 27.2** Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může konzultant dalším oznámením se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jejich části:
- a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo
 - b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní.
- 27.2.1** Odstoupí-li konzultant od Smlouvy podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, že objednatel uhradí konzultantovi kromě částky odpovídající provedeným službám také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

- 28.1** V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb nebo při odstoupení od Smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná činnost nebo náklady konzultanta nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby.
- 28.2** Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují konzultanta k čerpání času a platbám za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 29.1** Práva a nároky vyplývající ze Smlouvy zůstávají v platnosti i po odstoupení od Smlouvy Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY KONZULTANTOVI

- 30.1** Objednatel zaplatí konzultantovi za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem uvedeným v Příloze C. Cena se určí jako součin potřebné doby a sazby podle nabídky.
- 30.2** Sazby se zvyšují na podkladě státem vymezené míry inflace postupem dle Přílohy C.
- 30.3** Dodatečné služby zaplatí konzultantovi cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.
- 30.4** Jestliže není ve Smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel konzultantovi za mimořádné služby:
- a) stejně jako za dodatečné služby, cena se určí na základě potřebné doby konzultanta na provedení mimořádných služeb, a dále
 - b) skutečná vydání odsouhlasená objednatel, která musel konzultant vynaložit při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB

- 31.1** Platby, na které má konzultant nárok, budou uhrazovány v termínech dle Zvláštních obchodních podmínek na základě prohlášení, jehož součástí bude faktura a výkaz potvrzený oběma smluvními stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách.
- 31.2** Peněžítý závazek objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu konzultanta.
- 31.3** Jestliže konzultant neobdrží platbu v termínu splatnosti, zaplatí objednatel konzultantovi smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou za každý den prodlení z nezaplacené platby (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách, počítáno od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje konzultanta práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB

- 32.1** Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY

- 33.1** Jestliže bude jakákoliv položka faktury konzultanta objednatelem zpochybněna, objednatel vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být konzultantovi proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.
- 33.2** Nebude-li doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE

- 34.1** Konzultant povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje spojené se službami. Objednatel může do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmi denní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY

- 35.1** Jazykem Smlouvy je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak.
- 35.2** Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

- 36.1** Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení služeb dohodou mezi objednatelem a konzultantem.

PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT

- 37.1** Objednatel ani konzultant nepřevědou závazky plynoucí ze Smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.
- 37.2** Konzultant bez písemného souhlasu objednatele neuzavře se sub-konzultantem smlouvu na provedení části služeb, přesahujících limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem se považuje přijetí nabídky

konzultanta, v níž jsou sub-konzultanti jmenovitě uvedeni, pokud objednatel s některým z nich nevysloví nesouhlas.

37.3 Konzultant bude odpovídat objednateli za služby sub-konzultantů, stejně jakoby je prováděl sám.

38. VLASTNICKÁ PRÁVA – Nepoužito.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY

39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti konzultantovi podle právních předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, že konzultant porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že konzultant se dopustil nesprávného jednání:

- (i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
- (ii) zkraslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ

40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenkou nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE

41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může konzultant sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle Smlouvy či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo do takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

1. Název zakázky: „**D8, stavba 805, A-F, TDI**“
- 1.3 Konzultant je povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny objednatele a Správce stavby. Výkonem funkce Správce stavby může být objednatelem pověřena i osoba odlišná od objednatele. O určení osoby Správce stavby, případně o změně v osobě Správce stavby, objednatel konzultanta bezodkladně písemně vyrozumí. Pakliže nebyl určen Správce stavby, vykonává jeho působnost objednatel.
- 2.3 Technické podmínky jsou: Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění.
Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby. Tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti.
- 5.2 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
V případě uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou
 - a) konzultant bude jednat v souladu s touto smlouvou, i když nejsou tyto pravomoci a povinnosti detailně uvedeny v Příloze A,
 - b) jestliže je konzultant dle této Smlouvy nebo pokynů objednatele oprávněn schvalovat, rozhodovat nebo jednat podle vlastního uvážení, bude jednat s péčí řádného hospodáře jako odborník na základě své zkušenosti a úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
 - c) je-li tak konzultant zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít významný vliv na ceny nebo kvalitu nebo termíny služeb jen po předchozím písemném souhlasu objednatele (s výjimkou případů, kdy je opatření konzultanta naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a konzultant nemůže včas obdržet jeho souhlas; v takovém případě bude konzultant o provedených opatřeních neprodleně informovat objednatele),
 - d) veškerá případná rozhodnutí konzultanta mohou být uplatněna pouze prostřednictvím stálých pracovníků nebo specialistů delegovaných trvale na stavbu, resp. po jejich schválení Správcem stavby,
 - e) v případě překročení pravomocí stálých pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub-konzultanta delegovaných trvale na stavbu je objednatel oprávněn požadovat jejich odvolání ze stavby. Opakované překročení pravomocí stálých pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub-konzultanta může mít za následek odvolání příslušného sub-konzultanta z poskytování služeb dle této smlouvy objednatelem a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy objednatelem pro podstatné porušení povinnosti ze strany konzultanta.

5.4 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Způsob informování o průběhu provádění služeb: zejména zápisy ve stavebním deníku, pravidelnými měsíčními zprávami o výkonu služeb, vedením měřických deníků, vedením záznamů a protokolů o provedených zkouškách, protokoly o geodetickém zaměření.

11.1 Toto ustanovení VOP se ruší.

11.2 Toto ustanovení VOP se ruší.

13.1 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být zdravotně vyšetřen a shledán způsobilým pro poskytování daných služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

Veškerý pracovní personál delegovaný jako trvalý na tuto stavbu (včetně specialistů) bude mít na starosti pouze stavbu či stavby, které jsou předmětem této Smlouvy, tj. bude plně k dispozici pro plnění této Smlouvy a nebude konzultantem či jinou osobou pověřován jinými úkoly.

Konzultant je povinen vykonávat svou činnost pouze prostřednictvím osob delegovaných trvale na stavbu, nebude-li stranami písemně dohodnuto jinak. Výběr navržených osob delegovaných trvale na stavbu podléhá schválení objednatele. V případě, že objednatel neschválí konkrétního pracovníka, je konzultant povinen navrhnout objednateli bezodkladně ke schválení jinou osobu s odpovídajícími zkušenostmi a odborností.

Požadavky na minimální počet stálých pracovníků a specialistů trvale přítomných na stavbě jsou uvedeny v „Příloze A – rozsah služeb“, oceněném rozpisu služeb. Konzultant je oprávněn zvýšit počet pracovníků nad minimální počet uvedený v „Příloze A – rozsah služeb“, oceněném rozpisu služeb, pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tím není dotčen následný postup výběru navržených osob delegovaných trvale na stavbu.

Objednatel má právo upravit interval poskytování služeb jednotlivci personálu konzultanta podle potřeby, a to výhradně v souvislosti s jejich vytižením při realizaci stavebních prací a potřebách objednatele/technické dozorcí správy (TDS).

15.2 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu konzultanta, v případě nespokojenosti objednatele s kvalitou služeb poskytovaných konzultantem nebo v případě porušování povinností ze strany konzultanta, požadovat výměnu konkrétního pracovníka konzultanta za jiného pracovníka konzultanta. Výměna musí být konzultantem provedena na náklady konzultanta, a to nejpozději do 30 dnů od prvního dne v měsíci, který následuje po dni předání požadavku objednatele na výměnu tohoto pracovníka. Současně s touto výměnou (a rovněž v případě jakéhokoliv jiného případu výměny pracovníka) konzultant objednateli doloží skutečnost, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník, v případě expertů/specialistů pak konzultant doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu.

19.1. Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy	pro každou jednu škodnou událost minimálně 100.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: **nejpozději před podpisem Smlouvy**. Pokud je Smlouva uzavřena s více konzultanty (tj. konzultant podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmukoli z konzultantů. Splnění tohoto požadavku musí vyplývat buď ze samotné pojistné smlouvy, nebo z pojistné smlouvy a smlouvy o sdružení předkládané sdružením konzultanta dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání bezodkladně doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je konzultant povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatel.

22.1 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení: **50 měsíců od písemné výzvy objednatele (písemného pokynu objednatele), z toho 38 měsíců je lhůta výstavby a 12 měsíců technická pomoc v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby (předpoklad do 30.11.2015).**

Termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro realizaci stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy se zhotovitelem stavby. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před dokončením stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny pokynem objednatele.

22.2 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Zejména se jedná o přejímací protokoly, seznamy stavebních deníků včetně předání stavebních deníků, konzultantem odsouhlasené dokumentace skutečného provedení (dokumentaci bude vyhotovovat zhotovitel stavby nikoli konzultant, který ji bude připomínkovat a odsouhlasovat), vyhodnocené Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti (SZZZJ) a případně další dokumenty požadované objednatel.

- teré vzniknou při poskytování služeb a budou nezbytné pro řádné poskytování služeb. Konzultant odpovídá za úplnost a správnost předávaných dokumentů.
- 22.3** Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
Dokumenty budou konzultantem předány s detailním soupisem předávaných dokumentů.
- 23.2.** Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb se vychází z jednotkových cen, které nebudou již dále upravovány. Konzultant se zavazuje v případě souvisejícího zadávacího řízení kalkulovat nabídkovou cenu víceprací dle jednotkových cen nabídnutých v rámci této veřejné zakázky. Konzultant je povinen reagovat na požadavek objednatele do 30 dnů s odmítnutím, které řádně zdůvodní, nebo akceptováním s termínem změny rozsahu služeb (i) ne delším než 60 dnů od zaslání požadavku objednatele v případě méněprací nebo (ii) dnem podepsání dodatku na změnu rozsahu služeb v případě víceprací.
- 25.2** Smluvní pokuta za nedodržení termínu provádění služeb: 1 % z celkové ceny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 31.1** Lhůta splatnosti faktur: 90 kalendářních dnů.
- 31.3** Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 1% z neuhrazené částky.
- 37.2** Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem: Souhlas objednatele je nezbytný pro uzavření všech smluv konzultanta se sub-konzultanty.
- 39.1** Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
(iii) úmyslným nevykonáváním stavebního dozoru nebo zkrácením činnosti stavebního dozoru ke škodě objednatele u smlouvy na zhotovení díla uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
- 40.** Oznámení
Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Závod Praha, k rukám
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Tel.:
Fax:
E-mail:
Adresa konzultanta: INFRAM a.s. – vedoucí účastník sdružení INFRAM / HBH / AMBERG /TDI st. 805
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
Tel.:
Fax:
E-mail:

Případné další zvláštní obchodní podmínky (včetně zvláštních obchodních podmínek, stanovených oproti Všeobecným obchodním podmínkám jinak):

- 17.1** Smluvní strany ve smyslu § 401 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají prodloužení promlčecí doby práva objednatele na náhradu škody způsobené konzultantem v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené konzultantem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom,

kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

- 27.1** Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi k přerušování poskytování služeb, a to i bez udání důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi k přerušování poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatel, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Konzultant je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušování poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 35.1** Jazyk Smlouvy: ČESKÝ.
- 37.4.** Část plnění realizovaná vlastními kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím sub-konzultantů: výkon minimálně 70% všech odborných pozic realizačního týmu. Následující činnosti (výkon odborných pozic) musí být zajištěny výhradně vlastními kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím sub-konzultantů: (i) činnost asistenta správce stavby, (ii) činnost rozpočtáře, (iii) inženýring a (iv) činnost specialisty pro kontrolu jakosti. V rámci výkonu odborné pozice (i) specialisty pro pozemní komunikace a (ii) specialisty pro mostní konstrukce musí konzultant alespoň 1 osobu na každé z těchto pozic zajistit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím sub-konzultantů. V případě porušení této povinnosti konzultanta má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.
- 39.2** Smluvní pokuta za přípravu nebo podílení se na přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.

B. DODATEČNÉ ČLÁNKY

Článek 3.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Konzultant nejpozději před podpisem Smlouvy objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah	Činnost
Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 9001: 2009 v platném znění nebo osvědčení o akreditaci vydané po splnění požadavků EN ISO/IEC 17025:2000 v platném znění/ ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 v platném znění Českým institutem pro akreditaci	- inženýrská a konzultační činnost ve výstavbě, - geotechnická činnost, - průzkumné a diagnostické práce ve smyslu části II/2 SJ-PK
Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění	- inženýrská a konzultační činnost ve výstavbě, - geotechnická činnost, - průzkumné a diagnostické práce
Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění	- inženýrská a konzultační činnost ve výstavbě, - geotechnická činnost, - provádění průzkumných a diagnostických prací

Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.

Pakliže konzultant v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je konzultant povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě. Konzultant je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě.

Článek 5.5 Všeobecných obchodních podmínek zní:

Konzultant je povinen při plnění Smlouvy komunikovat se Zhotovitelem stavby, s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy konzultanta dle této Smlouvy musí být v českém jazyce.

Článek 13.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Do doby, než Ministerstvo dopravy (MD) zahájí vydávání „Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ („Oprávnění“) podle Dodatku

č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění, který upravuje Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006, nemá konzultant povinnost zajistit, aby jeho personál tímto Oprávněním disponoval. V případě zahájení udělování Oprávnění MD je však konzultant povinen zajistit, aby jeho personál měl uvedené Oprávnění do 12 měsíců od zahájení vydávání Oprávnění MD. Porušení této povinnosti představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta.“

Článek 15.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) podílely na plnění Smlouvy. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 ZOP. V případě, že se na straně konzultanta vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného konzultantem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením konzultant objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta/specialisty, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu. Porušení povinnosti konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů/specialistů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta/specialisty splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta.“

Články 19 a 20 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat pojištění

- odpovědnosti za škodu ve smyslu § 43 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění; a
- případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění ve prospěch objednatele proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant

objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.“

Článek 25.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Objednatel bude mít vůči konzultantovi právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny bez DPH, za každý níže uvedený případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 1 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, jestliže:

- a) v důsledku prodlení konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde k prodloužení termínu realizace stavby;
- b) konzultant nezajistí nepřetržitou platnost pojištění v rozsahu dle článku 19.1. ZOP nebo existenci pojištění objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě;
- c) konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.3. ZOP nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě;
- d) konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
- e) konzultant v rozporu se Smlouvou neposkytne objednateli, Správci stavby nebo jiné osobě přístup na staveniště;
- f) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy - Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 – kap. 4.7 Kontrola kvality;
- g) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy – Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 – kap. 4.8 Fakturace provedených prací;
- h) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy – Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 – kap. 5 Výkon činnosti při přejímacím řízení;
- i) personál konzultanta bude v rozporu s čl. 13.1 VOP, ve znění ZOP, pověřen jinými úkoly
- j) konzultant poruší povinnost dle článku 5.5. VOP.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti konzultantem, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty.

Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených konzultantem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne částku 20 % z celkové ceny bez DPH.“

Článek 37.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Povinnosti konzultanta ve věcech smluv se sub-konzultanty se rozšiřují o závazky uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. K návrhu smlouvy se sub-konzultantem se objednatel vyjádří nejpozději do 30 dnů od jejího předložení. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku konzultanta, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce.“

Článek 38.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Strany prohlašují, že žádné z plnění konzultanta či sub-konzultanta na základě Smlouvy nenaplnuje definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

Článek 39.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Konzultant ani žádný z jeho sub-konzultantů podílejících se na plnění Smlouvy nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Porušení této povinnosti konzultantem nebo sub-konzultantem představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta. V případě porušení této povinnosti konzultantem nebo sub-konzultantem zaplatí konzultant objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy.“

Příloha A

ROZSAH SLUŽEB

Výkon technického dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění a v souladu s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, schválených MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

Rozsah služeb je stanoven v Příloze A. Jako podklad pro stanovení ceny za tzv. běžné služby slouží PDPS.

Součástí přílohy A je rozpis služeb stanovený objednatelem a oceněný konzultantem.

Povinností konzultanta je dohlížení a zajištění toho, aby:

- prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, technologické zařízení stavby a použité materiály a jejich jakost byly v souladu s dokumentací stavby,
- práce probíhaly dle dohodnutého harmonogramu prací,
- byla dosažena kvalita prací předepsaná v TKP a ZTKP stavby,
- změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované funkce a respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek,
- fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými výměrami a specifikacemi prací a ve správném časovém období,
- byly plněny podmínky stavebních povolení,
- byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění prací.

Součástí běžných služeb konzultanta jsou zejména následující činnosti a povinnosti:

- 1) Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí
- 2) Podrobná znalost obsahu smlouvy o dílo na zhotovení stavby, zejména dokumentů
 - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK č.j. 475/02-120-RS/1 (na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book), a to Všeobecných OP i Zvláštních OP zpracovaných pro jmenovanou stavbu
 - Nabídka zhotovitele stavby vč. oceněného soupisu prací
 - Dokumentace pro zadání stavby (DZS)
 - následně zpracovaná Realizační dokumentace stavby (RDS)
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby.
- 3) Detailní znalost podmínek ve stanoviscích a rozhodnutích státních orgánů (územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení atp.), správců sítí a jiných orgánů či

organizací; znalost veškerých se zakázkou souvisejících technických, právních a jiných předpisů.

- 4) Zpracování podrobného plánu (prováděcího programu) výkonu technického stavebního dozoru v souladu s harmonogramem výstavby. Dodržení dílčích postupových termínů, zajišťujících plynulost výstavby a smluvní termín ukončení stavby s vazbou na dodržení finančních objemů zhotovitele stavby dle souhrnu smluvních dohod (SSD) mezi stavebním zhotovitelem a objednatelem pro příslušné objekty, bude závazné.
- 5) Odsouhlasení programu prací zhotovitele stavby. Monitorování fyzického a finančního postupu stavebních prací, kontrola souladu s předloženým programem a smlouvou, podněty pro aktualizaci, návrh opatření umožňujících dodržení termínů dokončení stavby. Vyhodnocování informací o průběžných finančních potřebách stavby a jejich včasné předávání Správci stavby.
- 6) Posouzení a odsouhlasení RDS, dílenské dokumentace, výkresů pro dočasné práce, technologických postupů a veškerých následných změn dokumentace stavby - vše v součinnosti se Správcem stavby a zpracovatelem zadávacích výkresů stavby (ZVS) – u těchto činností se jedná pouze o přípravu podkladů. Rozhodující je stanovisko Správce stavby a vedoucího technické dozorce správy (TDS) ve spolupráci se specialisty objednatele – vlastních zaměstnanců nebo smluvně zajištěných.
Vedení knihy dokumentace provedení díla (změny ZVS, RDS, dodatky atp.), odsouhlasení konečného souboru dokumentace skutečného provedení.
- 7) Schvalování zahájení realizace objektů, udělování pokynů zhotoviteli stavby v tomto ohledu. Kontrola zhotovitelem stavby prováděného ohlášení zahájení stavebních prací stavebním úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy, uvědomění Správce stavby (předání kopie vyrozumění o zahájení stavby).
- 8) Koordinace stavby cizích investorů s realizovanou stavbou - v součinnosti se Správcem stavby.
- 9) Kontrola, schvalování a provádění dohledu nad dopravním omezením během stavby a zajištěním doby přerušení silničního provozu na minimum.
- 10) Kontrola před zahájením jednotlivých prací – správnost vytyčení, soulad materiálů a stavebních postupů se smlouvou o dílo, kontrola prací zakrývaných dalším postupem.
- 11) Odsouhlasení prací – množství prací (měřením, výpočtem objemu prací z výkresů a porovnáním objemu se skutečností; porovnání a odsouhlasení výměr zakrývaných prací), kvality prací, odsouhlasení prací před zakrytím či odstraněním (tvaru a polohy, objemu; správné odebrání vzorků aj.).
- 12) Kontrola dodržování TKP a ZTKP stavby - kontrola kvality materiálů, stavebních dílů, technologických zařízení, technologických postupů a prací vč. plnění předepsaných zkoušek, kontrola souladu s technickými specifikacemi, kontrola a schvalování Kontrolních zkušebních plánů, vyhodnocení výsledků zkoušek a kvality prací před jejich převzetím. Sestavení dokumentace kdykoliv následně prokazující vlastnosti materiálů do díla zabudovaných.

Speciální pozornost musí být věnována následujícím činnostem, zajišťovaným zkušeným kvalifikovaným specialistou konzultanta:

- Jakostní přejímky plechů pro výrobu ocelové části nosné konstrukce mostů u výrobce;
- Dílenské přejímky ocelové části nosné konstrukce mostů a zábradlí ve výrobnách;
- Montážní prohlídky nosné konstrukce mostů;
- Dílenské přejímky mostních dilatačních závěrů;
- Přejímky nátěrů ocelové části nosné konstrukce mostů vč. zábradlí a protikorozních systémů;

- Přejímky izolací nosných konstrukcí mostů;
 - Přejímky ložisek pro nosné konstrukce mostů.
- 13) Sledování bezpečnostních aspektů stavby a prací s cílem zajištění dodržování požadavků projektu na ochranu životního prostředí a dodržování předpisů z hlediska ochrany života a majetku.
 - 14) Posuzování a dokumentace změn, dodatků a zrušení prací (nutnost, přiměřenost změn, určení nositele nákladů, způsob ocenění a cenový dopad, vliv na následnost a časový harmonogram prací) - ve spolupráci se Správcem stavby a zpracovatelem DZS. Prověřování všech požadavků zhotovitele stavby v souvislosti s prodloužením lhůty výstavby a s možnými nároky na různé druhy kompenzací. Vydávání a dokumentace souvisejících instrukcí odsouhlasených Správcem stavby, koordinace a dohlížení na všechny změny s cílem včasné kompletace stavby.
 - 15) Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby a jejich předložení Správci stavby k uplatnění.
 - 16) Ověření a kontrola průběžné fakturace (správnosti množství skutečně provedených prací, oprávněnosti zařazení dodatečných plateb, správnosti použití cen a sazeb, podkladů pro čerpání provizorních položek a prací za denní sazby, numerické správnosti výpočtů, zúčtování záloh aj.). Kontrola celkového finančního nároku a závěrečného prohlášení (veškerých nároků, pohledávek či závazků ve vztahu k předchozím platbám a smluvní ceně díla), vydání Potvrzení konečné platby. Schvalování veškeré fakturace může konzultant provádět až po konzultaci se Správcem stavby.
 - 17) Zajišťování pravidelných koordinačních (operativních) porad a kontrolních dnů na staveništi vč. přípravy zpráv s projednanými opatřeními. Regulérní projednávání činnosti se Správcem stavby a jeho včasné informování o vzniklých či možných problémech v souvislosti s plněním Smlouvy a doporučení možných řešení. Zpracování veškerých nezbytných Správcem stavby vyžádaných zpráv o stavu postupu výstavby či kvalitě prací a prognózách čerpání nákladů.
 - 18) Projednávání prací s organizacemi účastnicími se výstavby nebo výstavbou dotčenými, vyřizování připomínek a stížností obecních úřadů a občanů dotčených stavbou. Závažnější problémy řešit v součinnosti se Správcem stavby. Stížnosti musí být vyřízeny v termínech dle příslušné interní směrnice objednatele.
 - 19) Při převzetí ucelených prací, úseku nebo objektu – posouzení schopnosti sloužit účelu, kompletnosti dokumentace zhotovitele stavby, souladu se smlouvou o dílo na zhotovení stavby, dostatečnosti prokázání kvality prací. Kompletace veškerých podkladů a dokladů zhotovitele stavby a konzultanta, jejich předání Správci stavby k dalšímu řízení (kolaudačnímu či jinému).
 - 20) Zajištění, kontrola, doplnění a kompletace veškerých podkladů a dokumentace skutečného provedení díla (vč. mostních listů, DZZZJ, SZZZJ, určených podkladů pro vyvedení stavby majetkovému správci silnice a pro aktualizaci údajů v silniční síti silniční databankou, vč. podkladů pro zpracování smluv o převodu práva hospodaření jednotlivých objektů stavby správcům a budoucím uživatelům), jejich předání Správci stavby k dalšímu řízení.
 - 21) Předávání pozemků dočasných záborů jednotlivým vlastníkům v součinnosti se zhotovitelem stavby na základě informací Správce stavby o uzavřených smlouvách s vlastníky.
 - 22) Administrativa výkonu technického stavebního dozoru – zajištění jasného přehledu o průběhu a stavu provádění díla a splnění požadavků vyplývajících z právních a technických předpisů. Vedení veškeré související agendy a evidence, včetně evidence zachycující monitoring provedených prací, požadavků, pohledávek (skutečně provedené

práce a potvrzené platby, podklady pro úpravu cen, požadavky zhotovitele stavby na jiné platby, zadržené platby, platby požadované na zhotoviteli stavby objednatelem aj.), evidence sporů a evidence dokončených, převzatých a kolaudovaných objektů, záruční doby, odstraňování vad a nedodělků (po dobu trvání kontraktu konzultanta). Řádná archivace dokumentů.

23) Součinnost při odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem stavby po dobu trvání kontraktu konzultanta.

24) Informační povinnost konzultanta ve vztahu ke Správci stavby o všech skutečnostech a termínech souvisejících s výkonem běžných služeb rozhodných pro plnění smlouvy.

Další běžné služby:

- Veškeré vybavení vlastních pracovníků IT a spojovací technikou, PC, centrální PC serverem, sítí, měřicími přístroji a dopravními prostředky. Tato cena je součástí jednotkových denních sazeb. Součástí jednotkových denních sazeb jsou rovněž veškeré související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností pracovníků (jedná se zejména o ubytování, kanceláře nad rozsah kanceláří poskytnutých objednatelem – viz příloha B Zvláštních obchodních podmínek, stravné, cestovné, automobil apod.).

- Pro potřeby kontroly prostavěnosti, sledování změn během výstavby (ZBV), fakturaci, průběžné a závěrečné finanční vyhodnocení stavby konzultant zajistí:

- Aplikaci systému umožňujícího kompatibilitu s formátem .XC4 v rozsahu definovaném příslušnými směrnicemi objednatele.
- Aplikaci interního systému objednatele pro sledování dokumentace k položkám výkazu výměr.
- Aplikaci interního systému objednatele pro sledování a průběžné vyhodnocování změn během výstavby.
- Zpřístupnění datového úložiště TDS objednateli.
- Informační podporu objednatele v rozsahu na TDS používaných systémů.
- Synchronizaci databází objednatele v rozsahu použitých systémů (server GR ŘSD a ŘSD ČR - Závod Praha, pracoviště HIR, vedoucí TDI a Správce stavby).

Tato činnost je oceněna jako součást jednotkových denních sazeb.

- Podmínky práce s prostředky IT na TDS:

- TDI je povinen zajistit (a do denních sazeb zahrnout) napojení IT infrastruktury TDI na stávající technickou infrastrukturu sítě TDI-D1 zapojením do privátní sítě D1 s využitím veřejné sítě.
- TDI je povinen umožnit objednateli (resp. osobám určeným objednatelem) plnou kontrolu a správu IT prostředků používaných na TDS osobám pověřeným objednatelem.
- TDI je povinen zajistit (a do denních sazeb zahrnout) rutinní správu a údržbu prostředků IT používaných na TDS.
- TDI je povinen zajistit zabezpečení e-mailové komunikace dle pravidel stanovených objednatelem (jednotné adresy, domény, centrální I/O bod).
- Pracovníci TDI budou standardně vybaveni 1ks stolního PC trvale umístěného na TDS (výjimky povoluje objednatel).
- Pracovníci TDI jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT stanovenými objednatelem.

ROZPIS SLUŽEB SLOUŽÍCÍ K NACENĚNÍ

Konzultant se zavazuje poskytovat objednateli služby dle této Smlouvy za níže uvedené **denní sazby** jednotlivých pracovníků konzultanta. Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv.

Počet dní celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu služeb, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě **denních sazeb** jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených níže, a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem služeb nemá žádný vliv na výši denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb podle Smlouvy.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou stanoveny v Kč bez DPH.

Celkem (bez DPH)		79 551 900
DPH (20%)		15 910 380
Celkem vč. DPH		95 462 280

Provádění TDI a asistenta správce stavby se bude řídit:

Příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, VOP a ZOP

„Konzultant/personál konzultanta není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat jakékoliv povinnosti třetí strany, pakliže tak není výslovně stanoveno v této Smlouvě.“

řádně oprávněn podat nabídku jménem sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805,
na základě plné moci HBH Projekt spol s r.o. ze dne 27.4. 2012

V Praze dne 01.10. 2012

Příloha B

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

1. Personál

1.1 Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v Příloze A.

Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu s Přílohou A.

Konzultant/personál konzultanta není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat povinnosti třetí strany.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- DSP a DZS (PDPS) - 1 paré
- Kopie pravomocných stavebních povolení - 2 paré
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní předávané dokumentace – technické podmínky: TKP a ZTKP, soupis prací a dokumentaci stavby: PDPS, průzkumy igp a ostatní dosažitelné, veškerá SP na danou stavbu, veškerá vyjádření úřadů, EIA a související vyjádření, speciální relevantní dokumenty pokud jsou – popílek, recyklace apod.) - 1 paré
- Kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (zejména Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby), nabídku zhotovitele stavby, vč. oceněného soupisu prací - 1 paré

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: vybavení kanceláři, které budou mít pouze přípojku telefonu a osvětlení. Bude zpřístupněno WC a volná parkovací místa u TDS (kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby).

3. Služby od třetích stran

Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespádající do kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplývá z průběhu realizace stavby.

Příloha C

ÚHRADY A PLATBY

Platby a platební podmínky

Objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě **denních sazeb** jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených v příloze A Zvláštních obchodních podmínek.

Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin, bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník neodpracoval celých 8 hodin, lze tyto odpracované hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný den či dnech. Cena za poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosažení součtu 8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je konzultant povinen přehledně vyznačit v evidenci odpracované doby a ve faktuře – daňovém dokladu (viz níže).

1. Zálohy - nebudou objednatelem poskytovány

2. Termíny plateb, doba splatnosti

Fakturace: bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované služby (odpracovaná doba) budou oceňovány denními sazbami příslušných pracovníků konzultanta. Odpracovanou dobu a případné výdaje (pakliže na ně má dle této Smlouvy nárok) eviduje konzultant a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury konzultanta.

Lhůta splatnosti: Do 90 dnů

3. Způsob plateb:

Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli evidenci odpracované doby, která obsahuje rovněž způsob výpočtu ceny za poskytované služby, spolu se zprávou o postupu služeb a o jejich programu na příští měsíc ve vztahu k rozsahu služeb. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu.

Faktura – daňový doklad – vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Fakturace pro jednotlivé stavby, tj. 1. ISPROFIN 3272231005, D8 0805 A - Trasa dálnice, 2. ISPROFIN 3272231006, D8 0805 B - Most Vchynice, 3. ISPROFIN 3272231007, D8 0805 C - Most Oparno, 4. ISPROFIN 3272231008, D8 0805 D - Most Dobkovičky, 5. ISPROFIN 3272231009, D8 0805 E - Tunel Prackovice, 6. ISPROFIN 3272231010, D8 0805 F - Tunel Radejčín, bude probíhat odděleně. Konzultant bude vystavovat pro jednotlivé stavby samostatné faktury, obsahující příslušné číslo ISPROFIN.

Faktura je splatná do 90 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 60 dní před její splatností na adresu objednatele:

ŘSD ČR - Závod Praha, k rukám
4

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

4. Úpravy cen v důsledku inflace

Nebude prováděna

5. DPH – Bude připočtena dle platných právních předpisů.

III. VZOR SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD (SMLOUVY)

SMLOUVA č. xxxxx/12

Tento Souhrn smluvních dohod (dále rovněž jen „Smlouva“) byl uzavřen

dne roku

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu

IČO: **5993390** DIČ: **CZ5993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem: Sdružení **INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805**

INFRAM a.s. – vedoucí sdružení

se sídlem v Pelušková 1407, 198 00, Praha 9 - Kyje

zastoupená

bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 250 702 82 DIČ: CZ 25070282

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

HBH Projekt spol. s r.o. – účastník sdružení

se sídlem v Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupená

bankovní spojení:

č.ú.

IČ: 449 619 44 DIČ: CZ 44961944

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem v Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

zastoupená

bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 494 46 703 DIČ: CZ 49446703

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění

- g) Nabídka
 - h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby. Tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti.
3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit konzultantovi, se konzultant zavazuje provést řádně všechny služby podle Smlouvy.
 4. Objednatel se zavazuje zaplatit konzultantovi za provedení všech služeb cenu podle nabídky konzultanta, nebo jinou cenu, na kterou bude mít konzultant nárok podle podmínek Smlouvy, v termínech a způsobem podle Smlouvy.
 5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele:

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: _____

PODEPSÁN
za konzultanta:

řádně oprávněn podat nabídku jménem sdružení
INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805,
na základě plných mocí HBH Projekt spol. s.r.o. a
AMBERG Engineering Brno, a.s. ze dne 27.4. 2012

Datum: 01.10. 2012

10 . CD

DODATEK č. 1

ke

Smlouvě o konzultačních službách uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 (dále jen „Smlouvě“)

Z důvodu požadavku objednatele na poskytnutí dodatečných služeb při výkonu technického dozoru investora a asistenta správce stavby „**D8, stavba 805, A-F**“ úpravě termínu na dokončení těchto služeb a v souladu s ustanovením kap. 23. ZMĚNY čl. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek Smlouvy

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 5993390 DIČ: CZ5993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatel: **Sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805**

INFRAM a.s. – vedoucí sdružení

se sídlem v Peluškova 1407, 198 00, Praha 9 - Kyje

zastoupená

bankovní spojení:

č.ú.:

IČO: 250 702 82 DIČ: CZ 25070282

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

HBH Projekt spol. s r.o. – účastník sdružení

se sídlem v Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupená

bankovní spojení:

č.ú.:

IČO: 449 619 44 DIČ: CZ 44961944

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem v Ptašinského 10/313, 602 00 Brno

zastoupená

bankovní spojení:

č.ú.:

IČO: 494 46 703 DIČ: CZ 49446703

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jednající prostřednictvím společnosti **INFRAM a.s.**, vedoucího účastníka sdružení, zplnomocněného ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat všechny účastníky sdružení na základě plných mocí ze dne 27.4.2012

(dále jen „konzultant“) na straně druhé,

tento dodatek ke Smlouvě o konzultačních službách:

I. Rozhodné skutečnosti

- 1.1 Shora označené smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.10.2012 Smlouvu o konzultačních službách na výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a asistenta správce stavby

„D8, stavba 805, A-F“

**ISPROFIN 3272231005, 3272231006, 3272231007, 3272231008, 3272231009,
3272231010**

- 1.2 Smluvní strany se mezi sebou dohodly na změně smlouvy v důsledku změny termínu dokončení stavby (k prodloužení termínu dokončení stavby došlo na základě Dodatku č. 6 k Souhrnu smluvních dohod ze dne 25.9.2007 o zhotovení dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem stavby dne 9.12.2016)
- 1.3 Nejedná se o Změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

II. Změna smlouvy

Z důvodu prodloužení doby pro dokončení stavby se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1 V Preambuli Smlouvy se řádky a. až c. nahrazují novým zněním:

a. Cena služeb bez DPH	95.295.700,00 Kč
b. z toho základ daně DPH 20% (plnění do 31.12.2012)	4.532.160,00 Kč
z toho základ daně DPH 21% (plnění od 1.1.2013)	90.763.540,00 Kč
k tomu DPH 20%	906.432,00 Kč
k tomu DPH 21%	19.060.343,00 Kč
c. Celkem cena vč. DPH	115.262.475,00 Kč

- 2.2 Ustanovení kap. **ZAHÁJENÍ a DOKONČENÍ** čl. 22.1 Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy se mění a nahrazuje následovným textem:

Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby

objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení: **84 měsíců od písemné výzvy objednatele (písemného pokynu objednatele), z toho 72 měsíců je lhůta výstavby a 12 měsíců technická pomoc v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby (předpoklad do 30.09.2018).**

Termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro realizaci stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy se zhotovitelem stavby. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před dokončením stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny pokynem objednatele.

- 2.3 Příloha A – Rozsah služeb se nahrazuje novou doplněnou přílohou, viz příloha č. 1 tohoto Dodatku - Rozsah služeb.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Příloha A – Rozsah služeb.
- 3.3 Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel a oba konzultanti po dvou výtiscích.
- 3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

za objednatele:

za konzultanta:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

řádně oprávněn jednat jménem sdružení
INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805,
na základě plných mocí HBH Projekt spol. s.r.o. a
AMBERG Engineering Brno, a.s. ze dne 27.4. 2012

Datum: 21. 12. 2016

Datum: 12. 12. 2016

Celkem (bez DPH)			95 295 700
z toho základ pro výpočet DPH 20% (Plnění do 31.12.2012)			4 532 160
z toho základ pro výpočet DPH 21% (Plnění od 1.1.2013)			90 763 540
DPH do 31.12.2012		20%	906 432
DPH od 1.1.2013		21%	19 060 343
Celkem vč./DPH			115 262 475

V Praze dne:

12. 12. 2016
