






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

|                             |                                                                                                      |        |  |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------|
| Název dokumentu:            | Aktualizace prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/602 v úseku Jihlava – Velký Beranov |        |  |             |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje                                                                   |        |  |             |
| Schváleno:                  |                                                                                                      | Datum: |  | Č.usnesení: |
| Dokument uložen u:          | ODSH                                                                                                 |        |  |             |
| Počet vyhotovení:           | 5                                                                                                    |        |  |             |
| Adresát:                    | AF-CITYPLAN s.r.o.                                                                                   |        |  |             |
| Smluvní částka: 1)          | 94380.00                                                                                             |        |  |             |
| Odpovědný odbor: 2)         | odbor dopravy a silničního hospodářství                                                              |        |  |             |
| Podpis zajistit do:         | neprodleně                                                                                           |        |  |             |

|                                                   |                   | Pracoviště/pracovník | Datum    | Podpis                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracoval:                                        |                   | ODSH/R.Žižka         | 4.4.2018 |    |
| Projednáno s:                                     |                   | ODSH/R.Handa         | 4.4.2018 |   |
| Právní kontrola:                                  |                   | ODSH/A.Mládek        | 4.4.2018 |  |
| Předkládá:                                        |                   | ODSH/H.Strnadová     | 4.4.2018 |  |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) |                   | ODSH/H.Strnadová     | 4.4.2018 |                                                                                       |
| Zodpovídá:                                        | Příkazce operace: | ODSH/H.Strnadová     | 4.4.2018 |  |
|                                                   | Správce rozpočtu: | OE/H.Sošková         | 4.4.2018 |                                                                                       |

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: žizka, datum ověření: 19.03.2018 08:00:39):

Předmětem plnění zakázky je zpracování dokumentu Aktualizace prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/602 v úseku Jihlava – Velký Beranov.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 78000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 0001786000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



2335/18

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
pro „Aktualizaci prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/602 v úseku Jihlava  
– Velký Beranov“

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený  
hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem,  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje  
zástupce pro věci technické: Radek Handa  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 580 984/6800  
IČO: 70890749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4,  
zastoupený Ing. Petrem Košanem, jednatelem,  
Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem,  
Ing. Janem Škaloudem, jednatelem,  
Ing. Ivo Šimkem, jednatelem  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Košan  
zástupce pro věci technické: Ing. Zuzana Volfová  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 482851413/0300  
IČO: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 25005  
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění zakázky je aktualizace prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/602 ve vybraném úseku Jihlava – Velký Beranov při respektování rozvoje území a komunikační sítě města Jihlavy dle návrhu územního plánu. Prognóza bude provedena v dopravním modelu, který bude zahrnovat již zpracovaný dopravní model města Jihlavy, který bude rozšířen o řešené území tahu silnice II/602. V dopravním modelu budou zhodnoceny krajské a republikové dopravní vazby, a to včetně rozvoje silniční a dálniční sítě ve výhledových obdobích. Výstupy z dopravního modelu umožní posouzení plánovaných záměrů:

- II/602 Jihlava – JV obchvat
- II/353 Velký Beranov – obchvat

Výstupem bude výpočet výhledových intenzit dopravy v nulové a aktivní variantě na ovlivněné silniční síti dle přiložené nabídky.

Všechny tabulky výhledových intenzit dopravy v nulové a aktivní variantě budou zpracovány v následující struktuře:

| Rok  | Osobní vozidla | Motocykly | Lehká nákladní vozidla | Ostatní nákladní vozidla* | Autobusy** |
|------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------|
| 2019 |                |           |                        |                           |            |
| 2020 |                |           |                        |                           |            |
| 2021 |                |           |                        |                           |            |
| 2022 |                |           |                        |                           |            |
| 2023 |                |           |                        |                           |            |
| 2024 |                |           |                        |                           |            |
| 2025 |                |           |                        |                           |            |
| 2026 |                |           |                        |                           |            |
| 2027 |                |           |                        |                           |            |
| 2028 |                |           |                        |                           |            |
| 2029 |                |           |                        |                           |            |
| 2030 |                |           |                        |                           |            |
| 2031 |                |           |                        |                           |            |
| 2032 |                |           |                        |                           |            |
| 2033 |                |           |                        |                           |            |
| 2034 |                |           |                        |                           |            |
| 2035 |                |           |                        |                           |            |
| 2036 |                |           |                        |                           |            |
| 2037 |                |           |                        |                           |            |
| 2038 |                |           |                        |                           |            |
| 2039 |                |           |                        |                           |            |
| 2040 |                |           |                        |                           |            |
| 2041 |                |           |                        |                           |            |
| 2042 |                |           |                        |                           |            |
| 2043 |                |           |                        |                           |            |
| 2044 |                |           |                        |                           |            |
| 2045 |                |           |                        |                           |            |
| 2046 |                |           |                        |                           |            |
| 2047 |                |           |                        |                           |            |
| 2048 |                |           |                        |                           |            |
| 2049 |                |           |                        |                           |            |
| 2050 |                |           |                        |                           |            |
| 2051 |                |           |                        |                           |            |
| 2052 |                |           |                        |                           |            |
| 2053 |                |           |                        |                           |            |

\* Ostatní nákladní vozidla (TN = SN+TN+TR+TRP+SNP+TNP+NSN dle celostátního sčítání dopravy)

\*\* Autobusy (A = A+AK dle celostátního sčítání dopravy)

2.2. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dopravního modelu v plném rozsahu, a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.4. Kromě objednatele není zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část žádnému subjektu

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

### **Článek 3 – termín plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

|                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy – předpoklad do:                                                                                          | 29. 3. 2018 |
| Vypracování a předání dokumentu "Aktualizace prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/602 v úseku Jihlava – Velký Beranov" nejpozději do: | 17. 9. 2018 |

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dopravního modelu v plném rozsahu, a to nejpozději do 3. 9. 2018.

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený dopravní model převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

### **Článek 4 – Cenové ujednání**

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

**Cena za dílo:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>cena celkem bez DPH:</b>    | <b>78 000,- Kč</b> |
| <b>DPH 21%:</b>                | <b>16 380,- Kč</b> |
| <b>cena celkem včetně DPH:</b> | <b>94 380,- Kč</b> |

(slovy: devadesátčtyřtisícetřistaosmdesát korun českých)

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány.
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

### **Článek 5 – Platební podmínky**

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednatelem.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „Aktualizace prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/602 v úseku Jihlava – Velký Beranov“.

5.8. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

### **Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky**

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

### **Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody**

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7.9. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

## **Článek 8 – Součinnost objednatele a zhotovitele**

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je

povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

8.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zadavatelem na vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k dokumentu Aktualizace prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/602 ve vybraném úseku Jihlava – Velký Beranov.

### **Článek 9 – Odstoupení od smlouvy**

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatel přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- 9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 9.4.4. vstoupí do likvidace.

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatel.



9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

## **Článek 10 – Další ujednání**

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této

smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

### **Článek 11 – Závěrečná ustanovení**

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění.

11.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

11.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

11.12. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

11.15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

11.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

11.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.


11.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová nabídka.

V Jihlavě dne 04. 04. 2018

V Praze dne

22-03-2018

**Objednatel:**



MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje

  
**Kraj Vysočina**

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

23

**Zhotovitel:**

  
Ing. Petr Košan  
jednatel

**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: QZ47307218 14

# NABÍDKA



Datum:  
12. 3. 2018  
Naše značka:  
288/18  
Číslo nabídky:  
90/2018  
Odpovědná osoba / telefon:  
Volfová/602275815

Adresa:  
Krajský úřad Kraje Vysočina  
Oddělení projektového řízení  
Radek Handa  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava

## NABÍDKA: Aktualizace prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/602 v úseku Jihlava – Velký Beranov

Na základě Vaší poptávky Vám nabízíme zpracování aktualizace dopravní prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/602 v úseku Jihlava – Velký Beranov.

### 1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je aktualizace a kalibrace dopravního modelu, aktualizace prognózy dopravního zatížení na vybraném úseku silnice II/602 při respektování rozvoje území a komunikační sítě města Jihlavy dle návrhu územního plánu.

Prognóza bude provedena v dopravním modelu, který bude zahrnovat již zpracovaný dopravní model města Jihlavy, který je rozšířen o řešené území tahu silnice II/602 a II/353. V dopravním modelu budou zhodnoceny krajské a republikové dopravní vazby, a to včetně rozvoje silniční a dálniční sítě ve výhledových obdobích. Výstupy z dopravního modelu umožní posouzení obchvatu Velkého Beranova a jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Tabulkové hodnoty intenzit pro jednotlivé roky od 2019 do 2053 budou zpracovány pro všechny úseky dle obrázků ovlivněné silniční sítě (viz 2. Podklady).

Prognóza bude vycházet z původní optimistické varianty rozvoje dopravní infrastruktury a pro každý horizont budou vytvořeny dvě varianty:

- nulový stav,
- aktivní varianta.

Prognóza bude provedena pro výhledové roky 2019, 2020, 2025 a 2053. Celkem bude vypočteno tedy 7 variant + bude doložen stávající stav. Jednotlivé scénáře prognózy, tedy kombinace variant rozvoje a roku prognózy jsou uvedeny v následující tabulce.

| stavba                                                                             | 2019 - nulová | 2020 - nulová | 2020 - aktivní | 2025 - nulová | 2025 - aktivní | 2053 - nulová | 2053 - aktivní |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| vnitřní okruh Žižkova – Telečská                                                   |               |               |                |               |                | X             | X              |
| vnitřní okruh v úseku Telečská – Znojemská                                         |               |               |                |               |                | X             | X              |
| vnitřní okruh v úseku Brtnická – Kosovská                                          |               |               |                |               |                | X             | X              |
| vnitřní okruh v úseku Kosovská – Brněnská                                          |               | X             | X              | X             | X              | X             | X              |
| obchvat Velkého Beranova (II/602)                                                  |               |               | X              |               | X              |               | X              |
| JV obchvat Jihlavy (II/602)                                                        |               |               | X              |               | X              |               | X              |
| propojení ulic Havlíčkova – U Hl. nádraží – Sokolovská                             |               |               |                |               |                | X             | X              |
| propojení OK Havlíčkova x Pražská – Legionářů – Jiráskova                          |               |               |                | X             | X              | X             | X              |
| Sjezd z 1/38 na ulici Romana Havelky – doplnění sjezdového ramena ve směru od jihu |               | X             | X              | X             | X              | X             | X              |

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika;  
E-mail: cityplan@afconsult.com; Telefon: +420 277 005 500; www.afconsult.com; www.af-cityplan.cz;  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005  
IČ: 473 07 218; DIČ: CZ473 07 218; ID schránky: wxnvyhk

## 2. Podklady

Ovlivněná silniční síť – již předáno.

Termín zhotovení je stanoven na 3. 9. 2018 koncept a 17. 9. 2018 čistopis. Koncept bude odevzdán v elektronické formě, čistopis v papírové podobě v počtu 3 paré a v elektronické podobě na CD.


Cena díla je stanovena v členění dle následující tabulky v Kč bez DPH.

## 5. Obecné podmínky

- a. Podmínky fakturace: po předání závěrečné zprávy.
- b. Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.
- c. Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení. Ve smlouvě prosím uvádějte veškeré náležitosti fakturace.

*Bob Koda*

AE-CITYPL 20 a.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ07307218 17

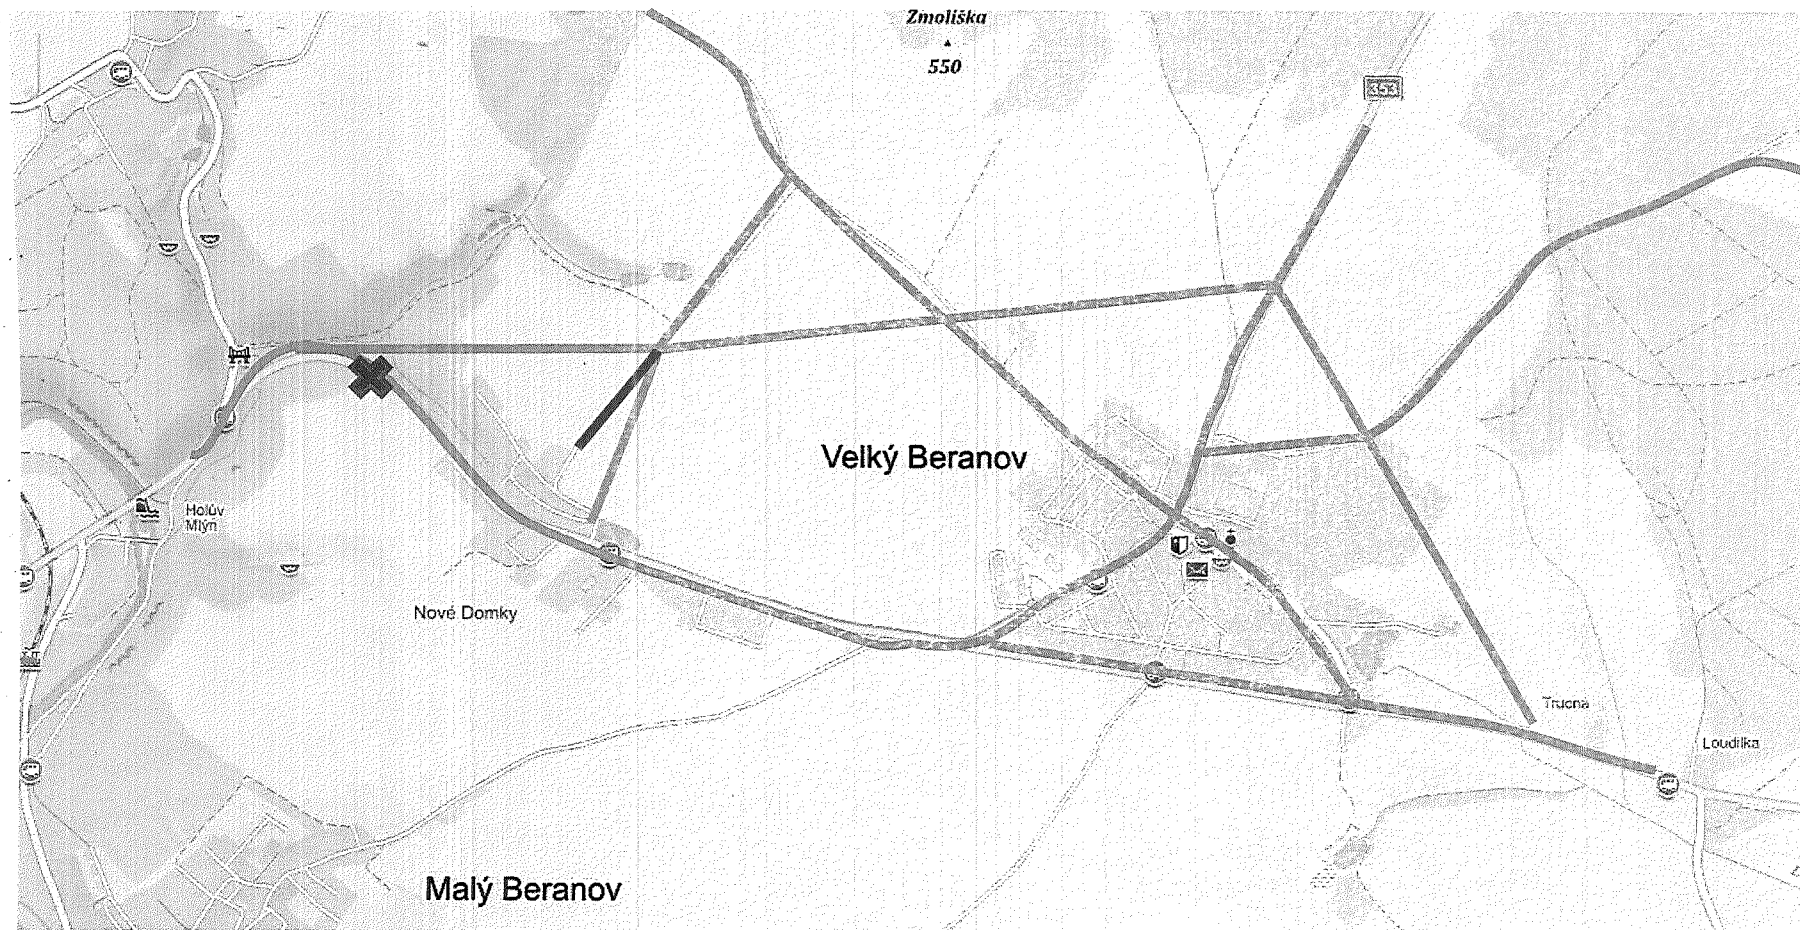


zaslepení stávající komunikace po dokončení obchvatu




ovlivněná silniční síť  
rekultivace

umožněn průjezd po místní komunikaci na skládku

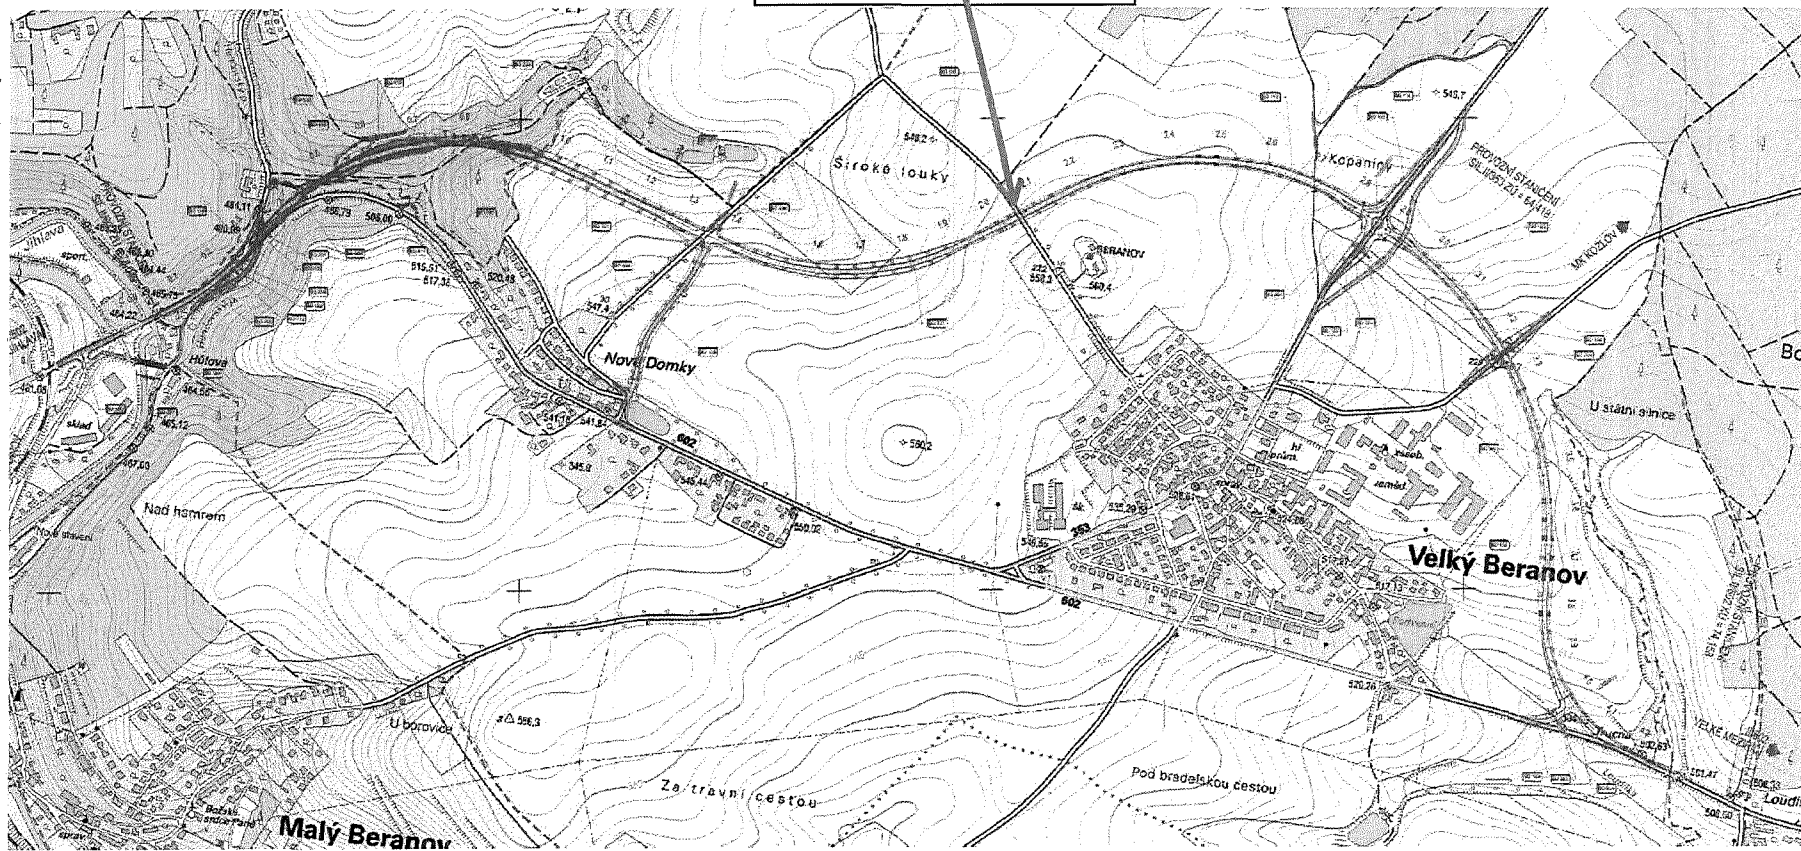



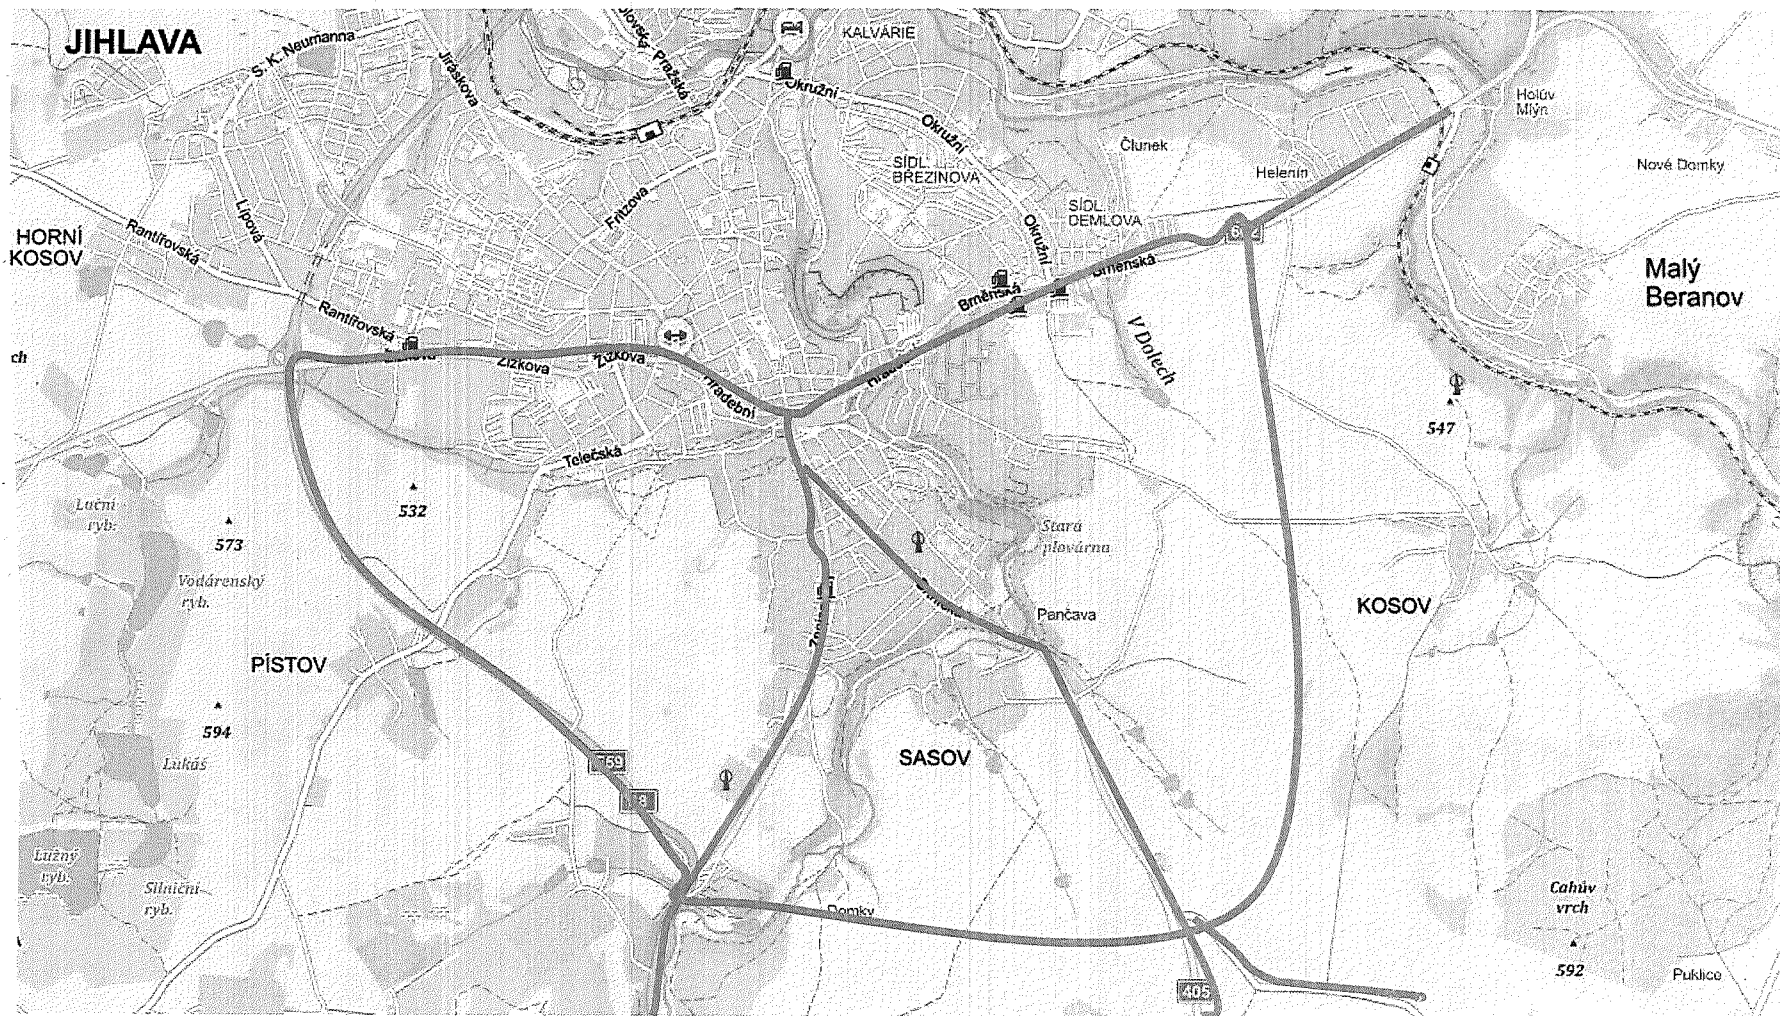

— ovlivněná silniční síť
