

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. Stavika s.r.o.

se sídlem: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11758

IČ: 49432991 DIČ: CZ49432991

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Jednatel ve věcech smluvních i technických: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

bankovní spojení: [REDAKCE]

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Bc. Karlem Svobodou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla

„Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce sociálního zařízení“

za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

1.2 Bude v souladu se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce sociálního zařízení (Výzva k podání nabídky ze dne 15.02.2018), projektovou dokumentací, zpracovanou Michalem Stehlíkem, Javorová 836/8, 693 01 Hustopeče, datum 09/2017, nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 05.04.2018 a oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, provedena rekonstrukce sociálních zařízení pokojů v budově hotelu Formanka, na adrese Hustopeče, Šafaříkova 21 - budova č.p. 448 - občanská vybavenost na pozemku parc. č. 882 v k. ú. Hustopeče u Brna.

1.3 Součástí předmětu díla bude:

V případě potřeby vypracování realizační projektové dokumentace do detailů potřebných k provedení díla.

Likvidace všech vzniklých odpadů a suti v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli).

Veškeré vedlejší náklady stavby.

Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, stavebního povolení a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.

Dokumentace skutečného provedení 2x (v rozsahu realizační dokumentace), včetně digitálního zpracování na CD ve formátu *.PDF popř. *.dgn nebo *.dwg

Certifikáty a atesty na použité materiály 2x

Zajištění el. energie a vody pro výstavbu

Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby

1.4 Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy převzal a seznámil se s projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví dílo dle předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se smlouvou.

1.5 Poskytnutím projektové dokumentace a soupisu prací zhotoviteli objednatel neposkytuje oprávnění k jakémukoliv užití projektové dokumentace a soupisu prací než pro účely zhotovení tohoto díla. Zhotovitel není zejména oprávněn projektovou dokumentací a soupis prací využít pro vlastní obchodní aktivity, jakkoliv rozmnožovat či šířit.

1.6 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla a které musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení, které jsou zároveň v souladu s právním řádem České republiky. Soulad použitých materiálů, výrobků a technického vybavení s výše uvedeným zhotovitel prokáže objednateli nebo technickému dozoru objednatele dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je zhotovitel povinen předložit objednateli před zabudováním příslušných materiálů do díla. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

1.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu. Pokud nebudou materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard provedení úplně specifikovány v projektové dokumentaci, musí být tyto v každém případě vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno ve smlouvě nebo jak z ní vyplývá a v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými právními předpisy a normami, účinnými v době provádění díla.

1.8 Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke smlouvě, nestanoví-li smlouva jinak.

II. Čas plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění předmětu smlouvy:

1. etapa:	část vlevo od schodiště I.NP+2NP	20.10.2018 – 21.12.2018
2. etapa:	část vpravo od schodiště I.NP+2NP	01.02.2019 – 31.03.2019

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy stavebních prací.

2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není porušením smlouvy).

2.3 Lhůta plnění díla může být prodloužena o dobu rovnající se době, po kterou stavební práce na díle nemohly být prováděny dle technologických pravidel (např. technických norem apod.), vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele a nemajících původ v jeho činnosti (např. vyšší moc apod.) a v důsledku zastavení prací na díle nezávislým orgánem nebo orgánem státní správy, případně zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění této smlouvy a jejichž příčina není na straně zhotovitele.

2.4 Objednatel se zavazuje, že úplné a dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 05.04.2018 činí:

cena bez DPH	2.910.543,- Kč
DPH 21 %	611.214,- Kč
celková cena včetně DPH	3.521.757,- Kč

slovy: tři miliony pět set dvacet jeden tisíc sedm set padesát sedm korun českých

Součástí ceny je rezerva ve výši 2% z celkové ceny díla.

3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.

3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.4 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na předmět díla, ale nad jeho rámec, vyvolaných prováděním díla.

3.5 Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontrolním dnu, přičemž pro určení jejich rozsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pokud nabídka tyto ceny neobsahuje, bude použit ceník stavebních prací jako pro zpracování nabídky. Obdobným způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovaných prací a dodávek zahrnutých do ceny díla, kde bude cena těchto prací odečtena ve výši, v jaké byla zahrnuta do rozpočtu.

IV. Platební podmínky

4.1 Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury po převzetí celého díla.

4.2 Fakturace proběhne měsíčně v průběhu provádění díla po odsouhlasení provedených

prací se splatností faktury 30 dnů. Konečná faktura bude uhrazena do výše 90% ceny díla, posledních 10% do 30 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků.

4.3 Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o poskytnutí stavebních nebo montážních prací v režimu přenesené daňové povinnosti. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací.

4.4 Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě faktury. Zaplacení faktury v dohodnuté lhůtě je podstatnou náležitostí smlouvy. Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zasílána poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání.

4.5 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:

- neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
- neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
- obsahuje nesprávné cenové údaje,
- byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.

4.7 Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny finanční prostředky a zavazuje se, že v případě, že dojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí ve lhůtě 14 dní od tohoto odstoupení zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených prací (položkového rozpočtu). Toto ustanovení nemá vliv na případnou náhradu jiné škody, která by zhotoviteli vznikla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

V. Staveniště, práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště odpovídajícího rozsahu. Předání bude provedeno nejpozději poslední pracovní den před termínem, ve kterém zhotovitel dle svého písemného oznámení zahájí práce. Včasné předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy. Pozdní předání staveniště nebo jeho částí prodlužuje lhůtu plnění díla o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis.

5.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle smlouvy.

5.3 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednateli, zajišťuje a hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatel odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. Zhotovitel po celou dobu provádění díla odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění díla po celou dobu od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku převzetí díla objednatel, příp. při odstraňování vad a nedodělků i po dobu tohoto odstraňování a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.4 Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

5.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.6 Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

5.7 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.

5.8 Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.

5.9 Zhotovitel na staveništi odpovídá za vykládku, přemísťování a dopravu veškerého materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s prováděním díla.

5.10 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a za řízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.

5.11 Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.

5.12 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hluchnosti způsobené jeho činností na staveništi, která jsou regulována příslušnými účinnými právními předpisy nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Nehledě na povinnosti zhotovitele vyplývající z takových právních předpisů nebo správních rozhodnutí, Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění díla co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí staveniště.

5.13 Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

5.14 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.

5.15 Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

5.16 Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na staveništi pracuje. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

5.17 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

5.18 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy.

5.19 Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů objednatele,

poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s čl. 6.5 této smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5.20 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2,000.000,- Kč.

5.21 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel v součinnosti s objednatelem, kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou nutnou součinnost, která je v jejich možnostech.

VI. Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností z této smlouvy o dílo pouze třetí osobu uvedenou jako poddávatel ve své nabídce na veřejnou zakázku „Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce sociálního zařízení“ ze dne 05.04.2018. Zhotovitel odpovídá za plnění poddávatele tak, jako by plnil sám.

6.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddávatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddávatelem objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy, jestliže poddávatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá

6.3 Změna poddávatele, který je uveden v seznamu poddávatelů, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Souhlas objednatele může být vyjádřen prostřednictvím e-mailu (karel.svoboda@hustopece.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Za poddávatele, který podléhá odsouhlasení objednatele, se považuje takový poddávatel, který se na plnění díla podílí z více jak 10% z celkové ceny díla bez DPH.

6.4 Změna poddávatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddávatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní poddávatel.

VII. Ukončení prací, záruční doba

7.1 Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 31.03.2019 pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak. O termínu předání díla uvědomí zhotovitel objednatele písemně nejpozději 3 dny předem. O předání díla bude sepsán protokol, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělků. Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělků budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

7.2 Objednatel zahájí převzetí díla do jednoho týdne od vyzvání k převzetí a je povinen provést převzetí díla do sedmi dnů od zahájení převzetí, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Vady a nedodělků budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

7.3 V případě, že obecně závazné právní předpisy, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

7.4 Závazek zhotovitele provést dílo podle smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
- doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
- originál stavebního deníku;
- návody k obsluze a návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
- dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, a 1x v datové formě (na CD ROM) ve formátu PDF a DWG.

7.5 Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu. Pokud zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

7.6 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

7.7 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce minimálně 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců materiálů. Výrobky nebo zařízení s kratší záruční lhůtou jsou s uvedením délky záruk na tyto výrobky uvedeny v příloze k této smlouvě.

7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, užívání v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatel na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

7.9 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, zda požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nelze-li dodržet lhůtu uvedenou v tomto odstavci, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstranit nejpozději do deseti dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

7.10 Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii,

je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou

7.11 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

7.12 O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

7.13 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

7.14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro dílo zpracuje a podá objednatel. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a to ke dni závěrečné kontrolní prohlídky pro dílo.

VIII. Sankce

8.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty

a) Při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč každý i započatý den prodlení.

b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.

c) pro případ, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení.

d) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

8.2 Uplatní-li jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní strana povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení příslušného vyrozumění.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu, nebo bude-li zhotovitel svým zaviněním v prodlení se zahájením prací oproti počátku lhůty uvedené v čl. 2.1. o čtrnáct dnů nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním dílo ani do čtrnácti dnů po uplynutí sjednané lhůty. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto

stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

9.2 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takového odstoupení povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.

9.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy i v případě opakovaného prodlení objednatele s předáním staveniště, na které byl objednatel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu.

9.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a případným újmám na zdraví osob.

9.5 V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele má zhotovitel nárok na úhradu nákladů prokazatelně a oprávněně vynaložených na plnění a přípravu díla.

9.6 Zhotovitel je povinen v případě takového předčasného ukončení závazku ze smlouvy předat objednateli zejména projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (respektive jeho dokončené části) a veškeré záruční listy, technickou a správní dokumentaci ohledně díla, apod., nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, jinak je objednatel oprávněn zadržet kteroukoliv část splatné ceny díla až do obdržení výše uvedeného. Zhotovitel potvrzuje a souhlasí, že není oprávněn k uplatnění jakéhokoli zadržovacího práva v této souvislosti.

X. Závěrečná ujednání

10.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

10.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

10.3 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

10.4 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

10.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.


10.6 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitanice za částečné plnění a vrácení dlužných úpisů s účinky kvitanice jsou vyloučeny.

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

10.8 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

1209 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávní osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 11.04.2018



.....
za objednatele

V Břeclavi, dne 13.04.2018




Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 11.04.2018



PaedDr. Hana I
starostka

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 05.04.2018

Položkový rozpočet

Seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou

KRYCÍ LIST NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce sociálního zařízení

ZADAVATEL: Město Hustopeče

DODAVATEL:



Obchodní firma/název dodavatele	STAVIKA s.r.o.
Sídlo	J.Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Adresa pro poštovní styk	J.Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Právní forma	S ručením omezeným
IČ / DIČ, bylo-li přiděleno	49432991/CZ49432991
Statutární zástupce	Miroslav Svoboda
Kontaktní osoba	Miroslav Svoboda
Telefon, e-mail	

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:

Celková nabídková cena dle položkového rozpočtu bez DPH	2.910.543,-	v Kč
Výše DPH	611.214,-	v Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	3.521.757,-	v Kč


Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím zde uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této zakázky. Uvedená cena obsahuje veškeré náklady k realizaci této zakázky.

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:

Podpis, razítko	  STAVIKA s.r.o. J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991 www.stavika.cz, tel.: 519 321 446
Titul, jméno, příjmení	Miroslav Svoboda
Funkce	Jednatel společnosti Stavika s.r.o.
Datum, místo podpisu	5.4.2018, Břeclav

Soupis cenových nabídek na akci:
Hotel Formanka Hustopeče - rekonstrukce soc. zařízení

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Stavební část	1 163 769	244 391	1 408 160
Zdravotechnika	1 181 387	248 091	1 429 478
Topení	81 759	17 169	98 928
Elektroinstalace	483 628	101 562	585 190
Rezerva 2%	58 211	12 224	70 435
Cena celkem	2 910 543	611 214	3 521 757

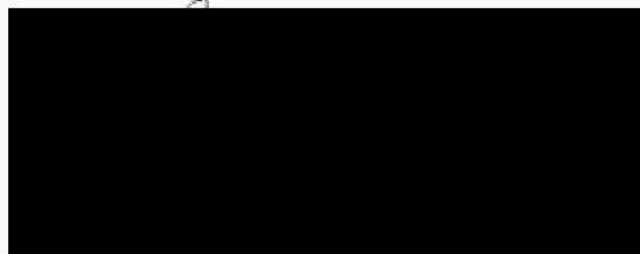

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0901 Hotel Formanka Hustopeče
Objekt: 01 Rekonstrukce sociálního zařízení
Rozpočet: 01 Rekonstrukce sociálního zařízení

Objednatel: _____ **IČ:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: Stavika, s.r.o. **IČ: 49432991**
J. Opletala 2403/10 **DIČ: CZ49432991**
690 02 Břeclav


Rozpis ceny	Celkem
HSV	546 014,40
PSV	581 668,31
MON	0,00
Vedlejší náklady	36 085,85
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 163 768,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 163 768,56 CZK
Základní DPH	21 %	244 391,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 408 159,95 CZK

v _____ dne **11.4.2018**
 **STAVIKA s.r.o.**
 I. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
 IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 527,19	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			16 937,05	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			212 766,34	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 880,86	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			53 449,92	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 900,10	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 279,12	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			54 058,88	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			62 566,34	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 819,07	1
711	Izolace proti vodě	PSV			196 894,49	17
725	Zařizovací předměty	PSV			10 747,20	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 560,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			76 461,59	7
776	Podlahy povlakové	PSV			23 573,77	2
781	Obklady keramické	PSV			234 400,28	21
783	Nátěry	PSV			19 406,40	2
784	Malby	PSV			9 624,58	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			54 829,53	5
Cena celkem					1 127 682,71	100

Položkový rozpočet

S:	0901	Hotel Formanka Hustopeče
O:	01	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	01	Rekonstrukce sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				58 527,19
	1	139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3, vč zapravení výkopku	m3	20,76000	1 900,00	39 444,00
	2	162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	83,00000	160,00	13 280,00
	3	167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,30000	169,00	1 402,70
	4	171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	8,30000	15,10	125,33
	5	174201101 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	12,45600	110,00	1 370,16
	6	199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,30000	350,00	2 905,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				16 937,05
	7	273321311 Železobeton základových desek C 16/20, vč navrtání tmů do původní desky. pro zmonolitnění	m3	3,11400	5 439,00	16 937,05
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				212 766,34
	8	342263420 Montáž revizních dvířek do SDK	kus	24,00000	275,00	6 600,00
	9	342264513 Revizní dvířka do obkladu vč dodávky	kus	24,00000	1 400,00	33 600,00
	10	342255024 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	37,50000	609,00	22 837,50
	11	342255028 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	27,50000	836,00	22 990,00
	12	342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	157,56000	589,00	92 802,84
	13	28349010 Dvířka revizní plná 100x100 mm	kus	24,00000	1 414,00	33 936,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 880,86
	14	451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,07600	906,00	1 880,86
Díl:	61	Upřavy povrchů vnitřní				53 449,92
	15	602022111 Omítka stěn jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm, na Ytong	m2	60,00000	266,00	15 960,00
	16	612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	57,60000	152,00	8 755,20
	17	612431111 Omítka sádrokarton Feinputz	m2	151,44000	168,00	25 441,92
	18	612473182 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	9,60000	237,00	2 275,20
	19	612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	9,60000	106,00	1 017,60
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 900,10
	20	631416221 Mazanina PROFÍ samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm, 20 MPa. anhydritová	m3	1,66080	10 778,00	17 900,10
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 279,12
	21	941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	73,44000	85,50	6 279,12
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				54 058,88
	22	952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	165,96000	82,90	13 758,08
	23	953946111 Osazení ventilačních mřížek VZT	kus	24,00000	106,00	2 544,00
	24	95001PC Ochrana podlahy, předpoklad OSB desky, vč demontáže, předstih pokoiů	m2	60,48000	510,00	30 844,80
	25	95002PC Zakryvání výplní vnitřních otvorů, skříní, pokoje	m2	192,00000	36,00	6 912,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				62 566,34
	26	961055111 Bourání základových desek železobetonových	m3	3,11400	5 440,00	16 940,16
	27	962031132 Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	120,00000	81,80	9 816,00
	28	965042121 Bourání mazanin betonových , roznášecí vrstva, předpoklad tl. 5 - 8 cm	m3	1,66080	3 330,00	5 530,46
	29	965081713 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	65,70000	66,00	4 336,20
	30	968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel	kus	48,00000	12,00	576,00
	31	978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	309,36000	82,00	25 367,52

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 819,07
32	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	26,53333	257,00	6 819,07
Díl:	711	Izolace proti vodě				196 894,49
33	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	20,76000	8,50	176,46
34	711140101	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst, vyřezání	m2	20,76000	80,00	1 660,80
35	711151111	Izolace proti vlhk vodorovná samolepicím pásem, včetně pásu Glastek 30 sticker	m2	27,68000	182,00	5 037,76
36	711212001	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	393,14400	456,00	179 273,66
37	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	168,00000	59,60	10 012,80
38	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,79589	921,00	733,01
Díl:	725	Zařizovací předměty				10 747,20
39	722211814	Demontáž armatur umyvadlových	kus	24,00000	99,80	2 395,20
40	722211815	Demontáž armatur vodov. sprchových	kus	24,00000	105,00	2 520,00
41	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	24,00000	133,00	3 192,00
42	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	24,00000	110,00	2 640,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				10 560,00
43	766664121	Zpětná montáž dveří, oc. zárubeň, š. do 1 m	kus	48,00000	220,00	10 560,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				76 461,59
44	771575102	Montáž podlah keramické, tmel, 10x10 cm, Keraflex (lepidlo), Ceresit (spár.hmota)	m2	73,44000	371,00	27 246,24
45	771575109	Montáž podlah keramické, tmel, 30x30 cm, Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	5,22000	399,00	2 082,78
46	597623080	Dlažba 98,5x98,5 mm, šedá mat, dle specifikace investora	m2	88,12800	500,00	44 064,00
47	597642031	Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm, dle specifikace investora	m2	6,26400	360,00	2 255,04
48	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,62705	500,00	813,53
Díl:	776	Podlahy povlakové				23 573,77
49	776431010	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	44,50000	49,50	2 202,75
50	776511820	Odstranění koberců lepených vč soklíků, zátěžový chodba	m2	43,45000	55,00	2 389,75
51	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátěžového koberce	m2	43,45000	418,00	18 162,10
52	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	227,54600	3,60	819,17
Díl:	781	Obklady keramické				234 400,28
53	781475111	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm, Keraflex (lepidlo), Ceresit (spár.hmota)	m2	237,62400	449,00	106 693,18
54	597813600	Obklad 98,5x98,5 mm, bílá mat, dle specifikace investora	m2	285,15600	440,00	125 468,64
55	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	4,47692	500,00	2 238,46
Díl:	783	Nátěry				19 406,40
56	783122111	Nátěr syntetický ocelové zárubně , matný email 2 x	m2	36,00000	106,00	3 816,00
57	783561010	Lakování dřevěných dveří	m2	67,20000	232,00	15 590,40
Díl:	784	Malby				9 624,58
58	784195412	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	150,38400	64,00	9 624,58
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				54 829,53
59	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	48,92000	159,00	7 778,28
60	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,92000	349,00	17 073,08
61	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 20 km	t	978,40000	13,20	12 914,88
62	979990101	Poplatek za skládku stavební suti	t	53,32279	320,00	17 063,29

Celkem

1 127 682,71


Poznámky uchazeče k zadání

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZTI	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	ZTI - KANALIZACE + VODOVOD		Měrná jednotka	
Stavba	Hustopeče parc. č.882		Počet jednotek	0
	HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE		Náklady na m.j.	0
Projektant	Cabalová Zuzana		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Cabalová Zuzana			
Investor:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče			
Dodavatel			Zakázkové číslo	31/2017
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	31 452	
Z	PSV celkem	1 042 536	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 073 988	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 073 988	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 181 387	Ostatní náklady celkem
			107 399
			107 399

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>MILAN ŠTUBA</i>	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 181 387 Kč
DPH	21,0 %		248 091 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 429 479 Kč

Poznámka :


Stavba :	HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE	Rozpočet :	ZTI
Objekt :	001 ZTI - KANALIZACE + VODOVOD		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	31 452	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	108 890	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	191 544	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	742 102	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 452	1 042 536	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva		10,0	1 073 988	107 399
CELKEM VRN				107 399



Položkový rozpočet

Stavba :	HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE	Rozpočet: ZTI
Objekt :	001 ZTI - KANALIZACE + VODOVOD	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Zemní práce				
1	T00 01	Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3	m3	19,00	880,00	16 720,00
2	T00 02	Vodorovné přemístění výkopku	m3	19,00	160,00	3 040,00
3	T00 03	Nakládání výkopku hor.1-4 do 100m3	m3	6,00	169,00	1 014,00
4	T00 04	Uložení výkopku na skládku	m3	6,00	15,10	90,60
5	T00 05	Poplatek za skládku	m3	6,00	350,00	2 100,00
6	T00 06	Zásyp jam, rýh šachet se zhutněním	m3	13,00	279,00	3 627,00
7	T00 07	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,00	360,00	2 160,00
8	T00 08	Písek 0-8mm	m3	6,00	450,00	2 700,00
	Celkem za	001 Zemní práce				31 451,60
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
9	721153310R01	Trubka s hrdlem KG DN 110	m		267,00	
10	721153310R00	Trubka s hrdlem KG DN 125	m	25,00	315,00	7 875,00
11	721153312R00	Trubka s hrdlem KG DN 160	m	32,00	542,00	17 344,00
12	721176103R00	Potrubí HT DN 40	m		158,00	
13	721176103R00	Potrubí HT DN 50	m	80,00	164,00	13 120,00
14	721176104R00	Potrubí HT DN 75	m	10,00	226,00	2 260,00
15	721176105R00	Potrubí HT DN 100	m	80,00	267,00	21 360,00
16	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 + D75	kus	52,00	36,80	1 913,60
17	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	26,00	53,60	1 393,60
18	721290111R00	Zkouška TĚSNOSTI KANAL. VODOU	m	57,00	11,60	661,20
19	HL	Přívzdušňovací ventil HL 900	kus	8,00	1 058,00	8 464,00
20	M+D	Revizní čistící kus HT 110(kruhový uzávěr)	kus	8,00	104,00	832,00
21	725256823R00	Dvířka PVC s rámem 600x600 (V ROZP. STAVEBNÍM)	soubor			
22	HL	větrací hlavice DN 110 HL 805	kus	1,00	777,00	777,00
23	HZS	HZS sekání drážek	hod	110,00	299,00	32 890,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				108 890,40
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
24	M + D	Izolace návleková 10/75	m	12,00	108,00	1 296,00
25	M + D	Izolace návleková 10/54	m	12,00	64,10	769,20
26	M + D	Izolace návleková 10/42	m		62,00	
27	M + D	Izolace návleková 10/35	m	15,00	47,30	709,50
28	M + D	Izolace návleková 10/25	m	30,00	43,10	1 293,00
29	M + D	Izolace návleková 10/20	m	80,00	41,00	3 280,00
30	M + D	Izolace návleková 20/54	m	30,00	65,10	1 953,00
31	M + D	Izolace návleková 20/35	m	5,00	55,70	278,50
32	M + D	Izolace návleková 20/25	m	85,00	51,50	4 377,50
33	M + D	Izolace návleková 20/20	m	75,00	47,30	3 547,50
34	722175211R00	Potrubí FIBER 20x2.8 vč. tvarovek	m	155,00	159,00	24 645,00
35	722175212R00	Potrubí FIBER 25x3.5 vč. tvarovek	m	115,00	191,00	21 965,00
36	722175213R00	Potrubí FIBER 32x4.4 vč. tvarovek	m	20,00	251,00	5 020,00
37	722175211R00	Potrubí FIBER 40x5.5 vč. tvarovek	m		381,00	
38	722175211R00	Potrubí FIBER 50x6.9 vč. tvarovek	m	42,00	470,00	19 740,00
39	722175211R00	Potrubí PPr STABI 75x10.3 vč. tvarovek	m	12,00	944,00	11 328,00
40	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	131,00	96,60	12 654,60
41	722220111R00	Nástěnka K 247 G 1/2	kus	131,00	99,80	13 073,80
42	722230103R00	Kulový kohout vody G 1/2" s vypouštěním	kus	2,00	197,00	394,00
43	722230103R00	Kulový kohout vody G 3/4" s vypouštěním	kus	28,00	248,00	6 944,00
44	722230103R00	Kulový kohout vody G 1" s vyp.	kus	1,00	306,00	306,00
45	722230103R00	Kulový kohout vody G 5/4" s vyp.	kus	2,00	405,00	810,00

Položkový rozpočet

Stavba :	HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE	Rozpočet: ZTI
Objekt :	001 ZTI - KANALIZACE + VODOVOD	

46	722230103R00	Kulový kohout vody G 3"	kus	1,00	2 174,00	2 174,00
47	M+D	dvířka s rámečkem 300x300mm	soubor	2,00	160,00	320,00
48	M+D	litinová redukce přírubová R 100/50	kus	1,00	3 266,00	3 266,00
49	M+D	Litinový T kus přírubový 50/50/50	soubor	1,00	3 154,00	3 154,00
50	M+D	litinová příruba přechod na závit .DN50/2"	soubor	2,00	2 173,00	4 346,00
51	M+D	mosazná vsuvka 2"	ks	2,00	1 015,00	2 030,00
52	M+D	VENTIL VODOVODNÍ 2"	ks	2,00	721,00	1 442,00
53	M+D	ISIFLO SPOJKA 63	ks	2,00	1 522,00	3 044,00
54	HZS	demontáž stávajících nefunkčních armatur v šachtě	hod	6,00	299,00	1 794,00
55	M+D	Dvířka PVC s rámem 300*300mm	soubor	2,00	160,00	320,00
56	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"-5/4"	kus	33,00	65,10	2 148,30
57	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3"	kus	1,00	376,00	376,00
58	M+D	Objímka potrubí	ks	80,00	16,80	1 344,00
59	M+D	konzola stěnová	hod	15,00	299,00	4 485,00
60	HZS	Demontáž stáv. Vodovod. ocel.potrubí	hod	12,00	299,00	3 588,00
61	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	344,00	24,20	8 324,80
62	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	344,00	15,80	5 435,20
63	HZS	HZS sekání drážek	hod	32,00	299,00	9 568,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				191 543,90
	725	Zařizovací předměty				
64	725013148R00	Ovládání wc	soubor	25,00	854,00	21 350,00
65	725112121U00	WC závěsné + sedátko	soubor	25,00	2 388,00	59 700,00
66	725112181U00	Předstěnový systém k WC kombifix	soubor	25,00	4 122,00	103 050,00
67	725119306R00	Montáž závěsného modulu vč. WC	soubor	25,00	1 022,00	25 550,00
68	725212265R00	Umyvadlo 55x45	soubor	25,00	737,00	18 425,00
69	725212265R00	Výlevka závěsná s mříží	soubor	1,00	9 485,00	9 485,00
70	M+D	Sprchová vanička litý mramor 900x900 + sifon	ks	25,00	4 807,00	120 175,00
71	M+D	Sprchová zástěna+dveře	soubor	25,00	9 516,00	237 900,00
72	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	25,00	516,00	12 900,00
73	725219401R00	Montáž -usazení sprch. Vaničky + sifon	soubor	25,00	960,00	24 000,00
74	725219401R00	Montáž výlevky	soubor	1,00	535,00	535,00
75	725751313R00	Rohový kohout s fitrem	kus	77,00	132,00	10 164,00
76	725751323R00	Hadice flexi nerez 1/2-3/8	kus	77,00	69,30	5 336,10
77	725820801R00	Baterie umyvadlová a dřezová stojánková	soubor	25,00	1 153,00	28 825,00
78	725823111U00	Montáž baterie umyvadlové stojánové	soubor	25,00	277,00	6 925,00
79	725823112U00	Baterie nástěnná -rameno 250mm	soubor	1,00	1 130,00	1 130,00
80	725823112U00	Baterie sprchová nástěnná+sprcha+hadice	soubor	25,00	1 675,00	41 875,00
81	725823121U00	Montáž baterie sprch.k výlevce	soubor	1,00	277,00	277,00
82	725860220R00	Sifon umyvadlový	kus	25,00	134,00	3 350,00
83	725258226R00	Souprava pro připoj. umyvadla	kus	25,00	180,00	4 500,00
84	725258227R00	Souprava pro připojení WC	kus	25,00	266,00	6 650,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				742 102,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	031 VYTÁPĚNÍ	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	VYTÁPĚNÍ	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby Hustopeče parc.č. 882	Počet jednotek	
00000543	HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE	Náklady na m.j.	
Projektant	Zuzana Cabalová	Typ rozpočtu	
Investor	Město Hustopeče, Dukelské nám 2/2, 69301 Hustopeče		
Dodavatel	Dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			0,00
PSV			81 758,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			81 758,60
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>HROŠKA SVĚTOŠ</i>	Jméno :
Datum :			Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		81 758,60 CZK
DPH	21 %		17 169,31 CZK
Zaokrouhlení			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			98 927,91 CZK

Popis :

Stavba :	00000543 HOTEL FORMANKA HUSTOPECE	Rozpočet :	031
Objekt :	01 VYTAPENI	VYTAPENI	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílů		Celkem
733	Rozvod potrubí	PSV		40 777,09
734	Armatury	PSV		2 978,51
735	Otopná tělesa	PSV		13 206,00
783	Nátěry	PSV		3 825,00
799	Ostatní	PSV		20 972,00
	CELKEM OBJEKT			81 758,60



Položkový rozpočet

S:	00031	HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE
O:	01	Rekonstrukce
R:	0841	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	celkem
Díl:	799	Ostatní				20 972,00
	1 112 T00	Topná zkouška, odvodušnění	hod	48,00000	299,00	14 352,00
	2 800T00	Nezměřitelné práce	hod	20,00000	331,00	6 620,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				40 777,09
	3 733111123R00	Demont.Potrubí závit. bežešvé běžné niz./středoll.,DN 15	m	125,00000	198,00	24 750,00
	8 733190106R00	Tlaková zkouška potrubí	hod	8,00000	299,00	2 392,00
	9 733191923R00	Zavaření odboček na potrubí, DN odbočky 15	kus	50,00000	249,00	12 450,00
	10 998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	566,48780	2,09	1 185,09
Díl:	734	Armatury				2 978,51
	23 734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	50,00000	58,80	2 940,00
	25 998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1 925,56340	0,02	38,51
Díl:	735	Otopná tělesa				13 206,00
	26 735	Demontáž ocelových těles článkových	kus	25,00000	155,00	3 875,00
	27 735	Odřezání konzol	kus	50,00000	6,30	315,00
	28 735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	hod	8,00000	299,00	2 392,00
	29 735494811R00	Vypuštění vody z otop. Systému.	m2	8,00000	828,00	6 624,00
Díl:	783	Nátěry				3 825,00
	30 783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	75,00000	51,00	3 825,00

VÝKAZ VÝMĚR

Akce : Město Hustopeče
Hustopeče u Brna, parc.č. 882
HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Investor : Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 69317 Hustopeče

ELEKTROINSTALACE 418 665,1 Kč

ROZVODNICE 64 962,8 Kč

CELKEM : 483 627,93 Kč bez DPH

V Hustopečích 09/2017

Město Hustopeče									
Hustopeče u Brna, parc.č. 882									
HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ									
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.	MONTÁŽE	MONTÁŽE		MONTÁŽE		MONTÁŽE		MONTÁŽE	
		montáže celkem		montáže celkem		materiál celkem		CELKEM	
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ									
KRABICE KU 68/1-1901 (KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	48 KS	27,2	1305,6	5,2	249,6	1555,2			
KRABICE KO 68/1-1902 (KO68) - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	24 KS	60,1	1442,4	8,7	207,8	1650,2			
KRABICE KPR 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68	24 KS	60,1	1442,4	22,2	532,8	1975,2			
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY									
LIŠTA S VÍČKEM 100x40	110 M	85,40	9394,0	130,00	14300,0	23694,0			
ROZVODNICE A ROZVADĚČE									
ROZVODNICE RPX	24 KS	550,0	13200,0			13200,0			
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠNŮR									
UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2	216 KS	15,2	3272,4	0,0	0,0	3272,4			
UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 4MM2	144 KS	17,1	2455,2	0,0	0,0	2455,2			
UKOČENÍ KABELŮ DO 3X4	120 KS	72,0	8640,0	0,0	0,0	8640,0			
BEZŠŤROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2	72 KS	52,0	3744,0	3,2	230,4	3974,4			
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ									
SVORKA NA POTRUBÍ BERNARD CU PAS	48 KS	79,3	3804,0	24,0	1152,0	4956,0			
VODIČ CYA 4	72 M	15,0	1080,0	9,6	691,2	1771,2			

VODIČ CY 6	342 M	18,0	6156,0	14,6	4993,2	11149,2
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH						
KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2	446 M	18,9	8429,4	11,4	5102,2	13531,6
KABEL CYKY 3 X 2,5 MM2	230 M	18,9	4347,0	18,7	4301,0	8648,0
KABEL CYKY 3 X 4 MM2	342 M	18,9	6463,8	36,0	12312,0	18775,8
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI						
EL1 - Zápuštěné svítidlo MARJAL LED 30W 2940lm 3000K hliník bílá 230V IP44	24 KS	250,0	6000,0	1430,0	34320,0	40320,0
EL2 - SVĚTELNÝ VÝVOD 230V	24 KS	50,0	1200,0	20,0	480,0	1680,0
SPÍNAČE A ZÁSUVKY						
ABB 3559-A05345 PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE SÉRIOVÉHO	24 KS	50,6	1214,4	99,0	2376,0	3590,4
ABB Levit 3559H-A00652 62 KRYT SPÍNAČE KOLÉBKOVÉHO DĚLENÝ - bílá / kouřová černá	24 KS	10,0	240,0	52,5	1260,0	1500,0
ABB Levit 3901H-A05010 62 1-NÁSOBNÝ RÁMEČEK - bílá / kouřová černá	24 KS	10,0	240,0	30,0	720,0	960,0
ABB Levit 3901H-A05020 62 2-NÁSOBNÝ RÁMEČEK - bílá / kouřová černá	24 KS	10,0	240,0	52,8	1267,2	1507,2
ABB 3292U-A00003 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO UNIVERZÁLNÍ TERMOSTAT	24 KS	150,0	3600,0	557,0	13368,0	16968,0
ABB Levit 3292H-A10101 62 TERMOSTAT UNIVERZÁLNÍ OTOČNÝ (OVLÁDACÍ JEDNOTKA) - bílá / kouřová černá	24 KS	10,0	240,0	835,9	20060,6	20300,6
ABB 3292U-A90100 - SNÍMAČ TEPILOTY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	24 KS	150,0	3600,0	219,6	5270,4	8870,4
ABB Levit 5519H-A02357 62 ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V - bílá / kouřová černá	24 KS	98,0	2352,0	105,6	2534,4	4886,4
OSTATNÍ						
DEVimat™ DSVF-150 - Topený výkon 300W - Vyhřívaná plocha 2m2	24 KS	360,0	8640,0	2950,0	70800,0	79440,0
SMALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR SILENT 100 CRIZ	24 KS	150,0	3600,0	2637,6	63302,4	66902,4

PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - TOPNÁ ROHOŽ	24 KS	150,0	3600,0			3600,0
POMOCNÝ MATERIÁL	3 %				259831,3	7794,9
VRN	1,5 %				259831,3	3897,5
BOURACÍ PRÁCE						
RYHA 3X3 ZD. CIH.	240 M	38,7	9292,8			9292,8
KAPSA 10X10X5 ZD. CIH.	96 KS	33,0	3168,0			3168,0
PRŮRAZ ZDIVA DO 15 CM	48 KS	56,0	2688,0			2688,0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA						
VYHLEDÁNÍ A PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OKRUHŮ	95 H	150,0	14250,0			14250,0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	5 H	300,0	1500,0			1500,0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	10 H	300,0	3000,0			3000,0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	3 H	300,0	900,0			900,0
UVEDENÍ DO PROVOZU	8 H	300,0	2400,0			2400,0
ELEKTROINSTALACE CELKEM						418 665,1 Kč

Město Hustopeče									
Hustopeče u Brna, parc.č. 882									
HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ									
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.	MONTÁŽE	MONTÁŽE		MATERIÁL		CELKEM			
		montáže celkem		montáž celkem	materiál celkem				
Doplňnění rozvodnice R1									
Úprava rozvodnice	1 kpl	2000,0	2000,0			2000,0			
Proudový chránič PF7-25/2/003	9 ks	150,0	1350,0	1179,0	10611,0	11961,0			
Propoj PO	1 kpl	250,0	250,0	500,0	500,0	750,0			
Popis přístrojů	1 kpl	100,0	100,0	200,0	200,0	300,0			
Pomocný materiál	5 %				11311,0	565,6			
CELKEM						15576,6			
Doplňnění rozvodnice R2									
Úprava rozvodnice	1 kpl	2000,0	2000,0			2000,0			
Proudový chránič PF7-25/2/003	15 ks	150,0	2250,0	1179,0	17685,0	19935,0			
Propoj PO	1 kpl	250,0	250,0	500,0	500,0	750,0			
Popis přístrojů	1 kpl	100,0	100,0	200,0	200,0	300,0			
Pomocný materiál	5 %				18385,0	919,3			
CELKEM						23904,3			
Rozvodnice RPX									
Rozvodnice RP1 -1									
Rozvodnice BC-O-1/8-TW-ECO	1 ks	150,0	150,0	200,0	200,0	350,0			
Jistič PL7-10C/1	1 ks	65,0	65,0	65,0	65,0	130,0			
Jistič PL7- 16B/1	2 ks	65,0	130,0	65,0	130,0	260,0			
Svorčky 2,5mm2	9 ks	10,0	90,0	10,0	90,0	180,0			
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE	0,1 m	250,0	25,0	350,0	35,0	60,0			

Štítek výstražný	1 ks	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	
Popis přístrojů	1 kpl	30,0	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0	35,0	
Pomocný materiál	5 %					535,0		26,8	
CELKEM									1061,8
Rozvodnice RPX									
CELKEM	23 ks							24420,3	24420,3
ROZVODNICE - CELKEM									64 962,8 Kč

STAVIKA s.r.o. ©

