

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 64ZA-000698

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: č. p. 494, 251 01 Nupaky
IČO, DIČ: 25692810, CZ25692810
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **1.991.068,28 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9	1.991.068,28	418.124,34	2.409.192,62

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9**, číslo veřejné zakázky **64ZA-000698**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy¹

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

¹ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 24. 04. 2018

Datum: 23. 04. 2018

PODEPS

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:


Funkce:

za objed

Ředitelstv

za dodavatele/zhotovitele

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Náše zn.: 80-2/ŘSD/2018-12217

Číslo zakázky: 64ZA-000698

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

Vyřizuje: 

SEPER-KRETE CZECH s.r.o.

č. p. 494

251 01 Nupaky

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: č. p. 494, 251 01 Nupaky

IČO: 256 92 810

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Chotovinách dne 18. 4. 2018

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 – 75,9**


Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Príslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, SSÚD 17, Červené Záhory 207, 391 37 Chotoviny
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 10. 2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	„Nepoužije se.“
Sekce	1.1.26	„Nepoužije se.“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	„Nepoužije se.“
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„Nepožaduje se.“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„Nepožaduje se.“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	„Nepožaduje se.“
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	„Nepoužije se.“
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		zadavatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 5.138,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1.028,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 1.028,00 Kč za každý započatý den prodlení

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list (součást Přílohy)			
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: []			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek		Paré č. 1 2 3 4	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize
Iniciátor změny: [] Popis Změny: []			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		0,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV []	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2016573 - D3 Oprava mostu na základe mostných prohlídek v km 63,05 - 75,9

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:	1 991 068,28
OC + OPH:	2 409 192,62

Sazba 1	0
Sazba 2	15
Sazba 3	21

[illegible]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	2016573	D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
číslo a název SO	SO 101	D3-098..2
číslo a název rozpočtu:	SO 101	D3-098..2

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


Stavba	2016573
číslo a názov SO	SO 102
číslo a názov rozpočtu:	SO 102

D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
D3-099..1
D3-099..1

[illegible]

9		

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO

číslo a název rozpočtu:

2016573

SO 103

SO 103

D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9

D3-099.2

D3-099..2

[illegible]

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

2016573

D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63.05 - 75.9

číslo a název SO

SO 104

D3-100.1


číslo a název rozpočtu:

SO 104

D3-100.1

[illegible]

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	2016573	D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
číslo a název SO	SO 105	D3-100..2
číslo a název rozpočtu:	SO 105	D3-100..2

[illegible]

Přidružená stavební výroba

[illegible]

			[REDACTED]				
(b) (7)(C)	[REDACTED]		[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	(b) (7)(D)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

	9		
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			
Celkem			

[illegible]

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	2016573	D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
číslo a název SO	SO 106	D3-101..3
číslo a název rozpočtu:	SO 106	D3-101..3

[illegible]

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	2016573	D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
číslo a název SO	SO 107	D3-103..1
číslo a název rozpočtu:	SO 107	D3-103..1

[illegible]

7 [redacted] [redacted]

■	—		[redacted]	■	—	—	—
---	---	--	------------	---	---	---	---

■	—		[redacted]	■	—	—	—
---	---	--	------------	---	---	---	---

■	—		[redacted]	■	—	—	—
---	---	--	------------	---	---	---	---

8 [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

2016573
SO 108
SO 108

D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
D3-103..2
D3-103..2

[illegible]

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

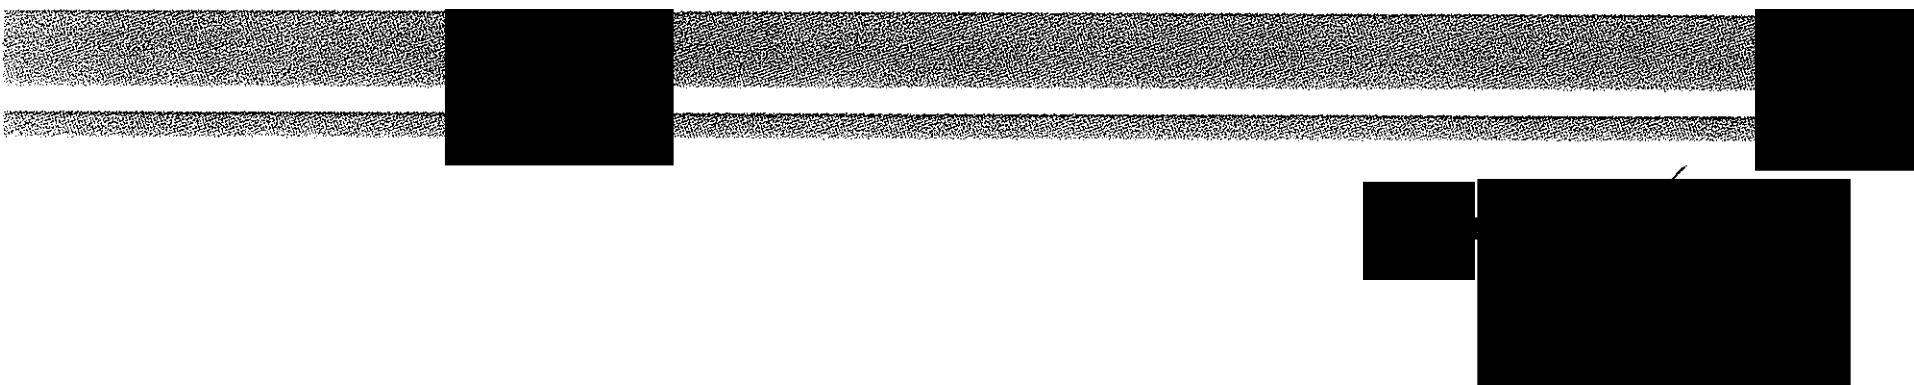

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	2016573	D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
číslo a název SO	SO 109	D3-106..1
číslo a název rozpočtu:	SO 109	D3-106..1

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2016573 D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
 číslo a název SO SO 110 D3-106..2
 číslo a název rozpočtu: SO 110 D3-106..2

Poř. č.poj.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
I							
I							
I							
2							
I							
I							

Ostatní ve výkazu			

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	2016573	D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
číslo a název SO	SO 111	D3-107..1
číslo a název rozpočtu:	SO 111	D3-107..1

[illegible]

9

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce


Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

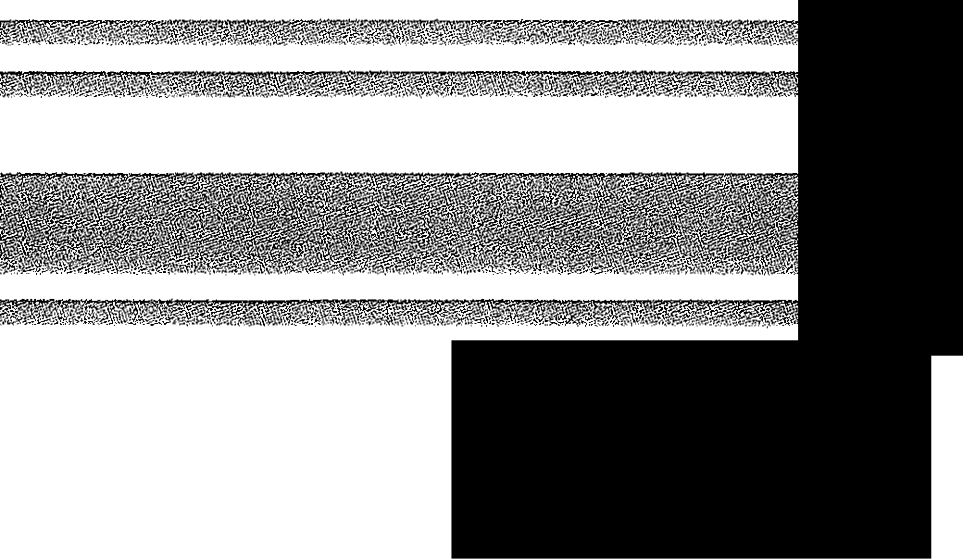

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	2016573	D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
číslo a název SO	SO 112	D3-107..2
číslo a název rozpočtu:	SO 112	D3-107..2

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2016573 D3 Oprava mostu na základě mostních prohlídek v km 63,05 - 75,9
 číslo a název SO SO 113 D3-115..2
 číslo a název rozpočtu: SO 113 D3-115..2

I	I	I					
0							
I							
I							
I							
I							
I							
I							
9							
8							
I							

9			
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce			

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace

Jedná se o mostní objekty na dálnici D3 s evidenčními čísly.

SO 101 – D3-098..2

Lokální sanace římsy v SDP (středním dělicím pásu).

Povrch římsy, kde je obnažená výztuž nebo dochází k oprýskávání krycí vrstvy betonu, bude otrýskán, výztuž bude ošetřena protikoročním nátěrem a římsa bude reprofilována.

SO 102 – D3-099..1

Sanace trhlin v koncových příčnicích a podhledu konzol u opěr mostu.

Povrch, kde se vyskytují trhliny, bude otrýskán, trhliny budou zainjektovány a otrýskaná část konstrukce bude povrchově reprofilovaná a přetřena pružným nátěrem.

SO 103 – D3-099..2

Výměna poškozeného krycího roštu v SDP a zabezpečení nezakryté části odvodnění na začátku mostu v SDP.

Poškozený kompozitový krycí rošt bude vyměněn za nový. Na začátku mostu v SDP budou na svislé stěny odvodňovacího žlabu připevněny nerezové L-profilý a otvor bude zakryt pochozím krycím roštem.

SO 104 – D3-100..1

Sanace betonových krycích desek v SDP, sanace obrubníkové části a horní plochy levé římsy.

Betonové krycí desky na začátku a konci mostu v SDP budou otrýskány. Místa, kde docházelo k výluhám koroze, budou ošetřena protikoročním nátěrem a povrch desek bude povrchově reprofilován.

Obrubníková část a horní plocha levé římsy bude otrýskána, trhliny budou zainjektovány a otrýskané části římsy budou z 5 % hloubkové a ze 100 % povrchově repropfilovány.

SO 105 – D3-100..2

Sanace obrubníkových částí a horní plochy říms.

Obrubníková část a horní plocha obou říms bude otrýskána, trhliny budou zainjektovány a otrýskané části římsy budou z 5 % hloubkové a ze 100 % povrchově repropfilovány.

SO 106 – D3-101..3

Oprava degradovaného podlití patních desek plastmaltou.

Degradované podlití z plastmalty bude po obvodu patních desek mechanicky odstraněno. Po obvodu patních desek, kde byla odstraněna degradovaná plastmalta, bude vytvořeno nové podlití z plastmalty.

SO 107 – D3-103..1

Sanace obrubníkových částí říms, obnova PKO protihlukové stěny.

Obrubníková část obou říms bude otrýskána a otrýskané části římsy budou povrchově repropfilovány.

Vnitřní strana ocelových prvků protihlukové stěny bude otrýskána a bude obnovena PKO.

SO 108 – D3-103..2

Obnova PKO kovových krycích desek v SDP.

Kovové krycí desky na začátku a konci mostu v SDP budou na horním povrchu mechanicky očištěny a bude obnovena PKO.

SO 109 – D3-106..1

Výměna prodloužení krajních odvodňovacích trubek u obou opěr + nové závěsy s objímkami.

Bude odstraněno stávající nevhodné prodloužení odvodňovacích trubek nad úložnými prahy, včetně korodujících závěsů s objímkami. Osazeno bude nové prodloužení z nerezových trubek, včetně nových závěsů s objímkami z nerezové oceli.

SO 110 – D3-106..2

Výměna prodloužení krajních odvodňovacích trubek u obou opěr + nové závěsy s objímkami. Výměna tyče vodorovné výplně ZS.

Bude odstraněno stávající nevhodné prodloužení odvodňovacích trubek nad úložnými prahy, včetně korodujících závěsů s objímkami. Osazeno bude nové prodloužení z nerezových trubek, včetně nových závěsů s objímkami z nerezové oceli. Příliš krátká tyč vodorovné výplně v pohyblivé části zábradelního svodidla v SDP na začátku mostu bude nahrazena tyčí odpovídající délky.

SO 111 – D3-107..1

Sanace obrubníkové části silně degradovaného úseku pravé římsy, výměna zemních vodičů zábradelního svodidla.

Obrubníková část silně degradovaného úseku pravé římsy bude otrýskána, trhliny budou zainjektovány a otrýskané části římsy budou hloubkově i povrchově reprofilovány. Zemní vodiče zábradelního svodidla, které vykazují známky koroze, budou vyměněny za nové.

SO 112 – D3-107..2

Výměna zemních vodičů zábradelního svodidla.

Zemní vodiče zábradelního svodidla, které vykazují známky koroze, budou vyměněny za nové.

SO 113 – D3-115..2

Obnovení podlití patních desek plastmaltou, obnova PKO svodidlových sloupků a zábradelního svodidla, výměna 1 ks uzemnění mostovky.

Degradované podlití z plastmalty bude po obvodu patních desek mechanicky odstraněno. Po obvodu patních desek, kde byla odstraněna degradovaná plastmalta, bude vytvořeno nové podlití z plastmalty.

Uzemnění mostovky, které podléhá korozi, bude odstraněno a vyměněno za nové.

Podrobná specifikace prováděných prací je uvedena v Souhrnné technické zprávě projektové dokumentace.

Na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy vztahující se na charakter prací a činnost na stavbě. Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci za provozu na pozemní komunikaci a v ochranných pásmech inženýrských sítí.

Práce naruší provoz na dálnici D3. Podle potřeb se na jednotlivé etapy uzavřou jízdní pruhy nebo odstavný, odbočovací či přípojovací pruh. Minimálně jeden jízdní pruh v daném směru bude stále průjezdný.

Před zahájením stavebních prací bude na příslušných pozemcích ŘSD GŘ zřízeno zařízení staveniště a dojde k osazení provizorního dopravního značení. Plocha dotčená stavebními pracemi bude uvedena do původního stavu, včetně odvozu stavební suti a likvidace veškerých jiných znečištění (drobné úniky provozních hmot ze stavebních strojů atd.) na náklady zhotovitele.

Dopravní zabezpečení (DIO) zajistí objednatel.

Výstavba bude prováděna postupně po jednotlivých stavebních objektech.

Termíny prací budou upřesněny technikem SSÚD 17 Chotoviny.

Fakturovány budou jen skutečně provedené práce.

Detailní harmonogram zpracuje zhotovitel stavby do 14 dnů od zahájení stavby.

Před zahájením prací bude doložen ke schválení Technologický předpis a Kontrolní zkušební plán Zhotovitele (platné vzory ŘSD).

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1

ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007

Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1

ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007

Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003

Praha, prosinec 2008

Kapitola 3 TKP - Dodatek č. 1

Schváleno: MD-OPK č.j. 275/2016-120-TN/12

ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 1. 4. 2017

Kapitola 10 TKP

Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010

se současným zrušením pátého znění této kapitoly

TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005

Praha, leden 2010

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2

ze dne 12. 1. 2016, s účinností od 15. 1. 2016

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005

Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

ČÁST A

Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3

ze dne 13. 4. 2015, s účinností od 23. 4. 2015

se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A

schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008

Praha, duben 2015

ČÁST B

Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1

ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008

Praha, prosinec 2013

Kapitola 21 TKP

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003

Praha, leden 2010

Kapitola 25 TKP

Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002

Praha, únor 2009

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1

ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008

se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999

Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.
