



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: [S-0823/DOP/2018], č. smlouvy zhotovitele: [.....])

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné


a

Zhotovitelem - Vedoucím účastníkem sdružení: **M + M: RS PP Středočeský kraj**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000


zastoupeným Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.úctu: 

IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Mgr. Kateřina Vokalová, 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail: 

tel.: 

ID: 

a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitelem – Členem sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957


a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477


a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558


a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

Zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto



Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace silnice č. II/115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce v rozsahu zpracování:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
 - Výkon autorského dozoru na stavbě

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).



Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 430.000,- Kč

DPH: 90.300,- Kč

včetně DPH: 520.300,- Kč

c. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 430.000,- Kč

DPH: 90.300,- Kč

včetně DPH: 520.300,- Kč

d. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 285.909,- Kč

DPH: 60.041,- Kč

včetně DPH: 345.950,- Kč

e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 380.000,- Kč

DPH: 79.800,- Kč

včetně DPH: 459.800,- Kč

f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 350.000,- Kč

DPH: 73.500,- Kč

včetně DPH: 423.500,- Kč

g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy

bez DPH: 800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb


Celkem bez DPH: 1.983.109,- Kč

DPH: 416.453,- Kč

Celkem vč. DPH: 2.399.562,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.



2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail: 
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):



Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V. Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace;
 2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 19 -04- 2018

V Praze dne 16 -04- 2018

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



MVDr. Josef Řihák.

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Společnost M + M: RS
PP Středočeský kraj**

M Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 884/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T: +420 221 432 800

Podpis: _____

Jméno: Ing. Rádko Bucek

Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jan Loško, Ph.D.

Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.


řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o

Technická specifikace

Název akce: „II/115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce“ – PD

Místo realizace akce:

- silnice II/115 ve stávající šíři, staničení km 4,858 – 13,379, mezi uzlovými body 1242B005 - 1242A227 – 1241A063 – 1241A004, okr. Praha-západ, středisko Zbraslav
Vynechat průtah městem Černošice v km 7,120 - 10,519, kde je připravena PD na rekonstrukci silnice v tomto úseku. **Celková délka silnice II/115 k rekonstrukci je 5,122 km (2,262 km a 2,860 km)**, okr. Praha-západ, středisko Zbraslav.

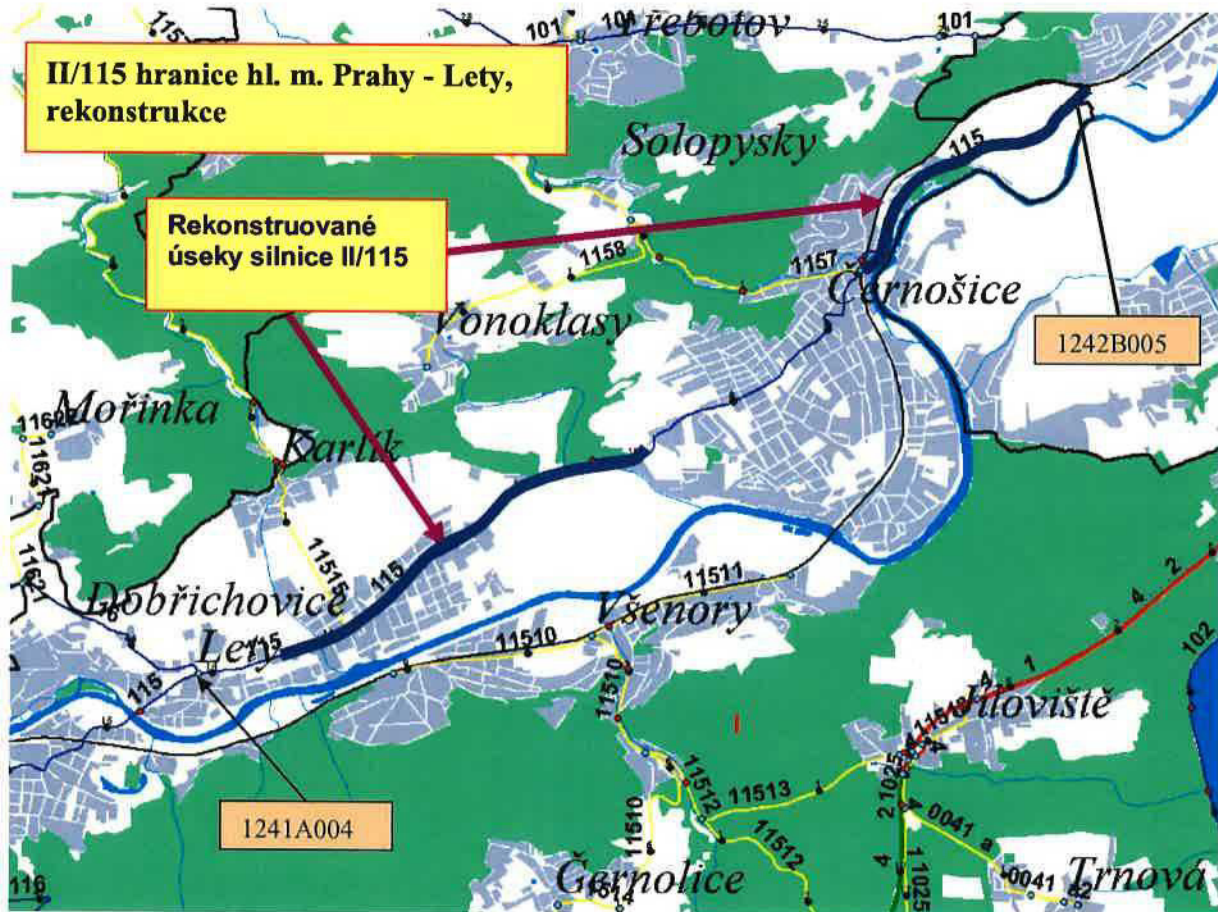

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci silnice včetně opravy mostního objektu ve stupni DÚR (dokumentace k územnímu rozhodnutí), DSP (dokumentace pro stavební povolení), PDPS (dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., v platném znění) a souvisejícího výkonu IČ k ÚR a IČ ke SP včetně majetkoprávní přípravy stavby. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 736101) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

Jde se o frekventovanou silnici II. třídy vedoucí kolem Berounky, komunikace propojuje obce v této oblasti s hl. m. Prahou. Konstrukce vozovky a podkladní vrstvy vykazují poruchy. Systém odvodnění není odpovídající již z části málo funkční (zanesené propustky).

PD na rekonstrukci komunikace lze rozdělit na dva úseky – **1. úsek hr. hl. m. Prahy - do města Černošice** k železničnímu přejezdu v km 4,858 - 7,120 a **2. úsek za městem Černošice (konec opravovaného úseku) – začátek obce Lety (k opravovanému úseku silnice) v km 10,519 - 13,379.**

Záměr zadání PD na rekonstrukci sil. II/115 bude vhodné projednat s dotčenými obcemi na sil. II/115 – tj. s městem Černošice a obcí Dobřichovice ohledně jejich připojení k tomuto projektu – řešení chodníků podél sil. II/115 nebo bezpečnostních prvků.

V 1. úseku rekonstrukce (hl. m. Praha – do města Černošice, staničení km 4,858 - 7,120 (proměnná šíře vozovky mimo obec 6,2 - 6,5 m a v obci 7,0 - 7,3 m), je třeba řešit následující okruhy:

- provést diagnostiku vozovky a dle výsledků navrhnout odpovídající řešení pro rekonstrukci silnice pro odpovídající hustotu a zatížení z provozu na této komunikaci
- řešit odvodnění silnice, pročistění příkop – zrušení nepovolených vjezdů na pole a v průtahu městem Černošice od začátku obce do místa propustku u Penny marketu zachovat odvodnění do příkopu a vsakování do zeleného pásu (v délce cca 700 m), tak aby měl celý rekonstruovaný úsek funkční systém odvodu dešťových vod z prostoru vozovky, v další části je odvodnění řešené
- řešit napojení vjezdů a nájezdů včetně stávajících odbočovacích pruhů.

Byly nalezeny následující propustky, které je třeba zkontrolovat, vyčistit a opravit:

Ve staničení km 6,560 u Penny marketu prověřit funkčnost zakrytého propustku – s návrhem na případné řešení.

Provést pasportizaci dopravního značení a navrhnout jeho úpravu (úpravy a doplnění stávajícího DZ, odstranění nadbytečného DZ). Rekonstruovaný úsek silnice opatřit VDZ (vodící čáry a dělicí čára).

V 2. úseku rekonstrukce za městem Černošice (konec opravovaného úseku) – začátek obce Lety (k opravovanému úseku silnice) v km 10,519 - 13,379 (proměnná šíře vozovky mimo obec 6,2 – 7,5 m a v obci 6,3 – 7,7 m). V tomto úseku silnice je třeba řešit následující okruhy:

- provést diagnostiku vozovky a dle výsledků navrhnout odpovídající řešení pro rekonstrukci silnice pro odpovídající hustotu a zatížení z provozu na této komunikaci
- v celém úseku prověřit stav svodidel včetně jejich ukotvení – navrhnout jejich potřebnou výměnu
- prověřit stabilitu svahu pod tělesem silnice u propustku v km 10,570
- řešit odvodnění silnice, pročistění příkop, v průtahu obcí Dobřichovice, od začátku obce po kruhovou křižovatku zachovat vsakování do zeleného pásu (cca 1,190 m), za křižovatkou na obec Karlík, ve směru na Lety od km cca 12,850, řešit odvodnění silnice dešťovou kanalizací s vyvedením do potoka u mostu v km 13,082, tak aby měl celý rekonstruovaný úsek funkční systém odvodu dešťových vod z prostoru vozovky.

V předmětném úseku silnice II/115 byly nalezeny následující propustky, které je třeba zkontrolovat, vyčistit a případně opravit:

*Ve staničení km 10,570 vyčistit a opravit propustek a zkapacitnění odvodnění ze silnice
Ve staničení km 11,090 vyčistit a opravit propustek.*

Provést pasportizaci dopravního značení a navrhnout jeho úpravu (úpravy a doplnění stávajícího DZ, odstranění nadbytečného DZ). Rekonstruovaný úsek silnice opatřit VDZ (vodící čáry a dělicí čára).

Do této PD zahrnout opravu mostních objektů na této silnici, v tomto úseku jde most ev. č. 115-009.

Mostní objekt ev. č. 115-009, staničení km 13,082:

Most přes Studený potok v obci Dobřichovice ev. č. 115-009 z roku 1959 v km 13,082, jehož stavební stav je uspokojivý, o délce přemostění 4,05 m.

Stavební stav: IV – uspokojivý

Zatížitelnost: normální Vn 30 t, výhradní Vr 54 t

Návrh řešení:

- přespárování zdiva

V rámci PD bude proveden diagnostika vozovky, geotechnický průzkum, dendrologický průzkum, hydrotechnické posouzení Q100 a geodetické zaměření.

Rekonstrukce bude prováděna za omezení dopravy, součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Kontakty:

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: [redacted] e-mail: [redacted]
Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: [redacted]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace:

1. úsek



2. úsek



propustek v km 10,570



propuastek v km 11,090



úsek s řešením kanalizace pro zvodnění silnice



"IV/115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce" - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkoppr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednatel (v Kč bez DPH/hodj)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
45,454,545	0.946%	0.836%	0.946%	0.770%	0.629%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	134	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	450,000	400,000	450,000	360,000	298,678	107,438	2,066,116
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	430,000	380,000	430,000	350,000	285,909	107,200	1,983,109
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	95.56%	95.00%	95.56%	97.22%	95.72%	99.78%	95.98%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednatel" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Blíží popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok.
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok.
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok.
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok.
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok.

V Praze dne

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Buček, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 150 00 Praha 1
IČ: 46698733
DIČ: CZ46698733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com

"II/115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce" - PD

žlutě ocení uchazeč

0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	
Předběžný GTP dle TP 76	
Průzkumy pro DÚR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	
Průzkumy DÚR celkem	
DÚR	
Průvodní zpráva	
Výkresová část	
Dokladová část	
DÚR celkem	
DUR celkem včetně průzkumů	
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	
Podrobný GTP dle TP 76	
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	
Průzkumy DSP celkem	
DSP	
Průvodní zpráva	
Souhrnné technické řešení	
Stavební část	
DIO	
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	
BOZP	
DSP celkem	
DSP celkem včetně průzkumů	
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	
majetkoprávní podklady	
podání žádosti bez poplatků	
IČ celkem	
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	
majetkoprávní podklady	
podání žádosti bez poplatků	
IČ celkem	
PDPS	
Technická zpráva	
Výkresová část	
ZTKP	
Soupis prací a rozpočet	
PDPS celkem	
celkem bez DPH	

V Praze dne

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

M

OT

M

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48685733
DIČ: CZ48685733
T +420 221 412 800
www.mottmaco.com

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

"II/115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce" - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby			
Cena AD celkem bez DPH			
Celkem			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	2
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	4
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	7
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	10
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	8
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přijímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	19
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: **Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

MOTT
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel
