

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016_0051

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená [REDACTED], Ředitelem, Přístupová síť dle Pověření ze dne 16.2.2016

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu [REDACTED]
(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Statutární město Hradec Králové

se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

zastoupený: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora

IČ : 00268810

DIČ : CZ00268810

Bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Hradec Králové

Číslo účtu : 426511/0100

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 18.2.2016 pod č. 538536/16 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

HK, Spojovací, SO451, překl., VPIC

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy (dále jen „Překládka“) bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předloženého cenově technického návrhu „HK, Spojovací, SO451, překl., VPIC“, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „CTN“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

HK, Spojovací, SO451, překl., VPIC

- zajistit vyhotovení Projektu,
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.
- po realizaci Překládky:
 - zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
 - Zajistit nezbytné geometrické plány s vyznačenými služebnostmi a vklad služebností inženýrské sítě do příslušného katastru nemovitostí

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
 - Zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
 - Zajistit koordinaci prací na staveništi
 - Zajistit DIO (dopravně inženýrské opatření) – včetně projektu
 - Oznámit společnosti CETIN nejpozději do 30 dnů před realizací Překládky stavební připravenost překládky zaměstnanci, který je určen pro dohled investiční zakázky - [REDACTED]
- Po právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), převést na společnost CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby dle vzoru viz příloha č. 3 této smlouvy) a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky **v koordinaci se Stavebníkem do 31.12.2018** a to za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Závazky (povinnosti) společností CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládky a záležitostí, jež Překládce předchází, jsou rozdělena do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „První etapa“) a bude považována za ukončenou dnem ukončení První etapy tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení První etapy. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa“) a považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **270 897,- Kč (bez DPH)**.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace Překládky (dále jen „Projekt“) na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).

5.3 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,

- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Platbu za náklady na Překládku dle Čl. 5 bodu 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 ve výši 28 460,- Kč (bez DPH) do 30 dnů od jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů. Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit vždy současně s platbami dle bodu 6.1 a), b) tohoto článku.

6.2 Daňový doklad dle bodu 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystaven do 15 dnů od ukončení První etapy, daňový doklad dle bodu 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystaven do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě jeho splatnosti.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností CETIN stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7

Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

b) Za stavebníka :

Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Zastoupeno: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora

IČ: 00268810

DIČ: CZ00268810

ve věcech technických: Ing. Valentýn Avramov, funkce: vedoucí investičního odboru
e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz tel. 495 707 680; 731 131 161

ve věcech technických: Ing. Šárka Kubcová funkce: investiční technik
e-mail: kubcovas@mmhk.cz tel. 495 707 687; 725 644 279

Čl. 9

Odstoupení od smlouvy

NEPOUŽÍJE SE

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy,

ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

11.14. Uzavření této smlouvy bylo projednáno v Radě města Hradec Králové dne 13. 9. 2016 pod číslem RM/2016/1029.

11.15. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.

11.16. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.


Přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. Specifikace první etapy Překládky
4. Vzor Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
5. Pověření fa CETIN
6. Pověření nebo plná moc stavebníka (příp. výpis z OR)

Číslo smlouvy vlastníka HK 2016_0051
Číslo smlouvy stavebníka 2016/1983


SRM 8020003598

V Praze dne



V Hradci Králové dne


14 -10- 2016



TEMO-TELEKOMUNIKACE,a.s. U Záb.zámku 233/15,

Praha10

projekce a výstavba telekomunikačních zařízení

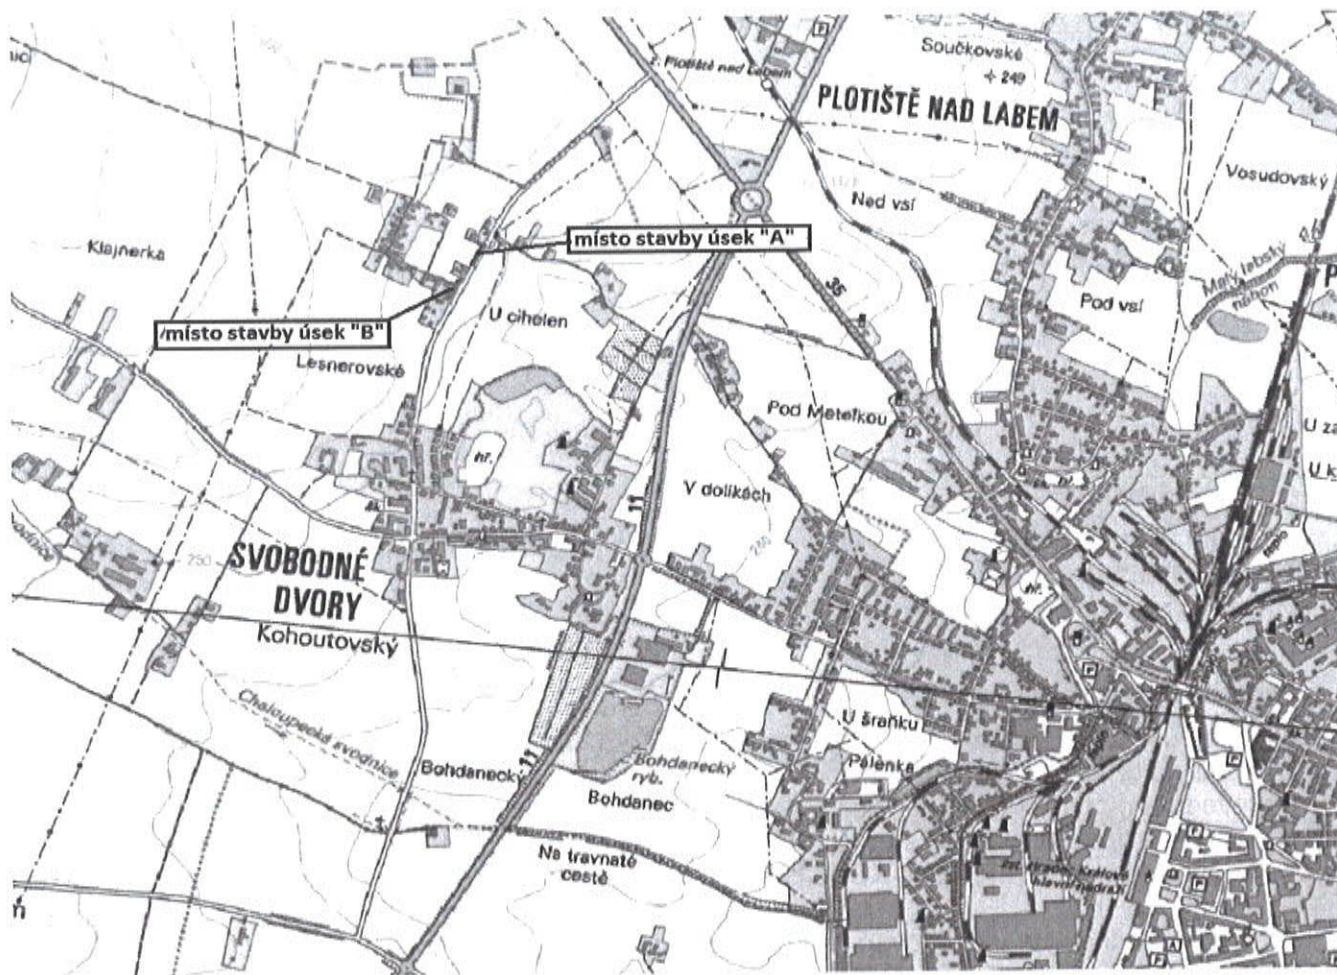

Hlavní projektant:			TEMO-TELEKOMUNIKACE U Záb. Zámku 233/15, Praha 10 Pracoviště: Záměl 169, 517 43 Potštejn 	
Zpracoval:				
Technická kontrola:				
Zodp. projektant:				
Kraj: Královéhradecký	Okres:Hradec Králové	Obec: Hradec Králové		
Investor	Cetin a.s.		Stupeň:	CTN
Akce: CTN Hr. Králové, Spojovací, SO451, překl., VPIC			Zak. č.:	
			Arch. č.:	
			Datum:	08/2016
			Formát:	
Objekt:	přeložení vedení SEK		Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah:	Technická zpráva k CTN			

11830/16/0030

Obsah:

1. Požadavek - stavebně technické řešení – technologie, montáž
2. Věcná břemena
3. rozpočet
4. kontakty
5. závěr

Výkresová část:

1. Přehledová mapa
2. situační schema ve formátu pdf od projektanta TRANSCONSULT s.r.o.
3. zákres do katastrální mapy v pdf od projektanta TRANSCONSULT s.r.o.
4. polohopisný plán ve formátu dgn společnosti CETIN a.s. s orientačním zákresem překládky

1. Požadavek

Předmětem cenového technického návrhu (CTN) je požadavek společnosti CETIN a.s. vyvolaný žádostí Statutárního města Hradec Králové na přeložení vedení SEK v oblasti Svobodné Dvory při výstavbě nového chodníku. Jedná se o úsek „A“ v délce 130m a úsek „B“ v délce 80m.

Stavebně technické řešení

V obou úsecích zástupce projektové kanceláře TRANSCONSULT s.r.o. a zástupce investora zřejmě po diskuzi se zástupcem vlastníka kabelové trasy společnosti CETIN a.s. počítají s provedením přeložky bez přerušení provozu – odkopáním kabelů ve stávající trase a jejich přenesením do nové trasy včetně chrániček, PE trubek průměru 110mm. K přeneseným chráničkám bude přiložena rezervní trubka KOPOFLEX 110.

K této skutečnosti je vypracován cenový technický návrh. V páteřní trase se nachází kabel FLEZE 50XN s přechodem v dělicí spojce na FLEZE 5XN a kabel odbočující z překládané trasy FLEZE 50XN. Získaná délka kabelů FLEZE se nedá stočit do rezervy, proto bude stávající dělicí spojka vyříznuta, kabely pokračeny a propojeny v nové dvouplášťové spojce XAGA500 75/15-400/Z-FT. Všechny zbývající kabely jsou kabely z účastnických rozvaděčů typu PPFL 3XN0,4 jejichž případnou „nadbytečnou“ délku lze smotat do rezervy..

Vzhledem k uvedené skutečnosti s délkou kabelu FLEZE se překládka **nedá provést bez přerušení provozu.**

Místa přeložek budou geodeticky předměřena. Provedené práce se geodeticky dozaměří s vypracováním geometrického plánu.

Před dokončovacími pracemi musí být požádáno o povolení k přerušení provozu..

2. Věcné břemeno

- v případě potřeby bude zřízení věcného břemene doplněno.

3. Rozpočet – viz příloha

4. kontakty


CETIN a.s. projektový koordinátor [REDAKCE]
Investor Magistrát města Hradec Králové ing. Šárka Kubcová – 725 644 279

5. závěr

CTN vychází z požadavku společnosti CETIN a.s. a poskytnuté dokumentace od projektanta stavební části společnost TRANSCONSULT s.r.o.

srpen 2016

TEMO-TELEKOMUNIKACE



Název stavby:

CTN HK, Spojovací, SO451, překl., VPIC

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

HK

HK

Technické údaje:

KMVYK:	0.402	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.024	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	26 608 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETIČKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETIČKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady:

28 460 Kč bez DPH

Číslo SAP	Stavební činnost	Seznam položek	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA					
	958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
	953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	22165.00 JV	22 165 Kč
			trasa 0,401-0,600km v zóně II		
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA					
	955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč

Název stavby:

CTN HK, Spojovací, SO451, překl., VPIC

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

HK

HK

Technické údaje:

KMVYK:	0.402	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.024	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	26 608 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	151 952 Kč
MONTÁŽ	35 947 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	9 708 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	20 405 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 617 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	20 809 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 270 897 Kč bez DPH

Číslo SAP	Stavební činnost	Seznam položek	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA					
	958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	4 443 Kč
	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		22165.00 JV	22 165 Kč
		trasa 0,401-0,600km v zóně II			
ZEMNÍ PRÁCE					
	954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		40.00 m	593 Kč
	952359 S	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70		22.00 m	11 134 Kč
	952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		328.00 m	90 689 Kč
	955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100		18.00 m	19 385 Kč
	955820 S	Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/100		6.00 m	6 741 Kč
	954956 S	Rýha vjezd kostky 35/70-90		28.00 m	19 838 Kč
	955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		402.00 m	3 574 Kč
MONTÁŽ					
	952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		10.00 ks	1 284 Kč
	952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		40.00 ks	1 185 Kč
	955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním		50.00 ks	1 235 Kč
	955280 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.		1.00 ks	1 876 Kč
	954980 S	Překládka trubky úložné		1608.00 m	24 426 Kč
	958469 S	Uvedení stavby do provozu		3720.00 JV	3 720 Kč
	958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m		1.00 ks	2 222 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA					
	956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km		402.00 m	5 511 Kč
	956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka		1.00 ks	4 197 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					

956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	402.00 m	4 667 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 197 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	5.00 ks	11 541 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 000 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 617 Kč

Číslo SAP		Stavební činnost	Limitka materiálu	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný						
	303838 S			Deska krycí plast. 150x1000 mm	350.00 ks	6 048 Kč
	303795 S			Fólie výstražná 220mm PE oranžová	48.00 m	178 Kč
	303813 S			Fólie výstražná 330mm PE oranžová	378.00 m	1 610 Kč
	302550 S			Mini Marker 1401 3M Ball	15.00 ks	3 552 Kč
	312425 S			Modul konektor. 9700-10P	20.00 ks	587 Kč
	320312 S			Souprava odbočovací BOKT-55-43/8-75/15	2.00 ks	299 Kč
	313741 S			Spojka kabelová XAGA 500 75/15-400/Z-FT	1.00 ks	6 959 Kč
	302423 S			Trubka vřapovaná 110/94 s lankem	40.00 m	1 576 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný						
	304267 S			Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená [REDAKCE], Senior specialistou pro výstavbu sítě, Výstavba přístupové sítě

Čechy dle Pověření ze dne 10.6.2016

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen „Nabyvatel“)

a

Statutární město Hradec Králové

se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

zastoupený: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora

IČ : 00268810

DIČ : CZ00268810

Bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Hradec Králové

Číslo účtu : 426511/0100

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“, kteréžto bylo vydáno dne , (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Hradci Králové dne

V dne

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:



Statutární město Hradec Králové :
PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D.,
náměstek primátora



CETIN

ČESKÁ
TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA

Evidenční číslo: PŘ/508/2016

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana



k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 10.6.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

