




Smlouva o dílo – Projektová dokumentace

uzavíraná dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

číslo smlouvy u objednatele: 2016002447
číslo smlouvy u zhotovitele: 45/2016/1594
číslo veřejné zakázky: 16172

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
statutárního města České Budějovice na základě plné
mocí udělené primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, pracovnící investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel** VH-TRES spol. s ro.
sídlo: Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Č.Budějovicích, odd.C, vložka 598
IČ: 15771822
DIČ: CZ15771822
zastoupen: Ing. Danielem Vaclíkem
kontaktní údaje: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

2. Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo –
zhotovení projektové dokumentace na stavbu – akci označenou objednatelem jako
Mánesova ul. (úsek most Kosmonautů – Novohradská) – stavební úpravy vodovodu a
kanalizace,
včetně zabezpečení vstupních podkladů (geodetické zaměření zájmového území a geologického
posouzení) a zajištění vydání příslušných rozhodnutí pro realizaci stavby (územní rozhodnutí –
dále jen ÚR, stavební povolení – dále jen SP) a výkon autorského dozoru (dále jen Dílo) a
závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotovitele sjednanou cenu.
- 2.2.** Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vyhotovena ve stupních dokumentace pro územní
rozhodnutí (dále jen DÚR), dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) a dokumentace
pro provedení stavby (dále jen DPS). Projektová dokumentace bude rozdělena na dva úseky, tj.
část A úsek most Kosmonautů – Čechova (DÚR, DSP, DPS)
část B úsek Čechova – Novohradská (DPS rovněž včetně inženýrské činnosti)

Geodetické zaměření (dotčeného prostoru pro budoucí staveniště a okolí) a výsledky z inženýrskogeologického průzkumu budou předány objednateli v počtu jednoho (1) výtisku a jednoho (1) nosiče CD.

Projektová dokumentace ve všech stupních bude provedena, tedy dokončena a protokolárně předána zhotovitelem objednateli, v počtu šesti (6) výtisků (z toho bude 5 výtisků kompletně autorizováno) a dvou (2) nosičů CD, z nichž jeden bude obsahovat příslušný stupeň kompletní projektové dokumentace ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu excel a textové části PD ve formátu WORD a druhý, který bude následně použitý jako podklad do výběrového řízení na zhotovitele, bude zazipován a bude obsahovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby a soupis prací s výkazem výměr. Rozpočet bude dodán v tištěné formě potvrzený odpovědným projektantem a rovněž zvlášť elektronický formát rozpočtu vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí být v souladu s aktuálními požadavky na formát rozpočtu požadovaný Integrovaným regionálním operačním programem.

- 2.3. Součástí předmětu plnění Díla je i provádění autorského dozoru projektanta při provádění stavby, jejíž PD je předmětem této smlouvy, vč. kvalitativního a kvantitativního dozoru konaného zhotovitelem ve fázi realizace díla dle bodu 2. 8. tohoto článku.
- 2.4. Objednatel stanovuje další požadavky na provedení díla. **Projektová dokumentace:**
 - 2.4.1. bude splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 - 2.4.2. bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především vyhláškou MPMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu v platném znění a MPMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, zejména jejich přílohy č. 1, č. 5 a č. 6,
 - 2.4.3. bude zpracován položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v členění po stavebních objektech dle vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění,
 - 2.4.4. stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) budou zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ a Klasifikace produkce „CZ-CPA“,
 - 2.4.5. ve fázi zpracování DÚR: V návrhu technického řešení bude uveden profil a materiál nového vodovodu. Dále bude součástí stupně DÚR i DSP propočet nákladů stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy vyhotovuje.
 - 2.4.6. bude obsahovat dopravně inženýrské opatření (DIO)
- 2.5. Zhotovitel je povinen a zavazuje se při provádění Díla dle této smlouvy a následně i při výkonu autorského dozoru projektanta, poskytovat potřebou součinnost vyžádanou koordinátorem BOZP, který bude stanoven objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen, na vyžádání koordinátora BOZP, poskytnout tomuto bez zbytečného prodlení podkladu ke zpracování Plánu BOZP pro přípravu
- 2.6. Zhotovitel je dále povinen
 - 2.6.1. svolat do 20 pracovních dnů od zahájení prací na díle dle bodu 3.1.1. této smlouvy v sídle objednatele, popř. provozovatele veřejného vodovodu (ČEVAK a. s. se sídlem Severní 8, České Budějovice) svolat a účastnit se vstupního výrobního výboru za účasti zástupců objednatele, vlastníka a správce komunikace (Jihočeský kraj a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje), provozovatele veřejného vodovodu, za účelem upřesnění předmětu díla při zahájení projektových prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě

- potřeby nebo na výzvu objednatele je zhotovitel povinen svolat výrobní výbory i ve stadiu rozpracovanosti díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen projednat **DÚR, DSP a DPS** (tj. všechny stupně projektové dokumentace) s objednatelem a provozovatelem veřejného vodovodu před jejím odevzdáním. Před odevzdáním kontrolního vyhotovení bude rovněž konán výrobní výbor.
- 2.6.2. poskytnout objednateli a provozovateli veřejného vodovodu (**ČEVAK a. s.**, se sídlem Severní 8, České Budějovice; IČ: 60849657) kontrolní vyhotovení projektové dokumentace stupně **DPS**, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to před odevzdáním konečné verze, k připomínkování objednatele i provozovatele veřejného vodovodu. Objednatel a provozovatel sdělí zhotoviteli své připomínky ke kontrolní dokumentaci dle předchozí věty, do 20 kalendářních dnů od poskytnutí kontrolní dokumentace; zhotovitel je povinen připomínky obdržené od objednatele a provozovatele veřejného vodovodu zapracovat do konečné verze projektové dokumentace, kterou odevzdá objednateli (a tím splní povinnost řádného dokončení díla) ve lhůtě dle bodu 3.1.7. této smlouvy;
- 2.6.3. vzít na vědomí, že objednatel může v průběhu provádění stavby, pro kterou se **PD** dle této smlouvy zhotovuje, požadovat po zhotoviteli další projekční práce, jejichž nutnost provedení vznikne z objektivních a nepředpokládaných důvodů při provádění samotné stavby. Tyto dodatečné projekční práce nesmí přesahovat rozsah prací nad 10 hodin a zadání těchto prací nesmí být v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Toto ustanovení se nevztahuje na opravy vad, chyb a nedodělků předmětů díla dle této smlouvy, které se stanou zjevnými teprve při provádění stavebních prací, pro které byla **PD** dle této smlouvy zpracována
- 2.7. Další požadavky na inženýrskou činnost:
Inženýrská činnost (dále IČ), tj. zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádostí o vydání potřebných rozhodnutí a získání pravomocných rozhodnutí a majetkoprávního vypořádání (popř. **ÚR, SP**, ohlášení, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku). **DPS** v úseku Čechova – Novohradská bude projednána se správci inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
- 2.8. Další požadavky na autorský dozor projektanta:
Součástí díla je i provedení autorského dozoru, který bude uplatněn pouze v případě, že stavba (pro kterou se **PD** dle této smlouvy zhotovuje) bude realizovaná. Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ukládá podle § 152 odstavce 4 stavebníkovi, který financuje stavbu z veřejného rozpočtu povinnost zajistit autorský dozor na provádění stavby. Autorský dozor bude vykonáván při kontrolních dnech stavby v maximálním počtu 30 hodin (15 + 15 hodin) po celou dobu výstavby. Specifikace rozsahu a způsobu provádění autorského dozoru je uvedena v Příloze č. 1. k této smlouvě.
- 2.9. Jakékoliv změny oproti sjednané lhůtě pro dokončení díla, případně změny rozsahu díla, které vyplnou z objektivních a objednatelem nepředpokládaných skutečností, mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.
- 2.10. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedených požadavků dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3. Lhůty plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje

- 3.1.1. zahájit práce na Díle: do 5-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy

část A. Podmínky pro úsek most Kosmonautů – Čechova:

- 3.1.2. předložit DÚR včetně geodetického zaměření a geologického posouzení a propočtu nákladů: do 120-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
- 3.1.3. podat žádost o vydání ÚR: do 180-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
- 3.1.4. předložit DSP včetně propočtu nákladů: do 30-ti dnů od vydání ÚR
- 3.1.5. podat žádost o vydání SP: do 75-ti kalendářních dnů od odevzdání DSP
- 3.1.6. předložit kontrolní vyhotovení DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli a provozovateli veřejného vodovodu k připomínkování: do 30-ti kalendářních dnů od odevzdání DSP
- 3.1.6.1. zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní vyhotovení DPS dle tohoto bodu nebude objednatel vracet zhotoviteli zpět
- 3.1.6.2. zhotovitel je povinen předat část Díla uvedeného v bodě 3.1.6 způsobem uvedeným v bodě 3.1.6.1 a v listinné podobě kontaktní osobě objednatele uvedené v bodě 1.1. této smlouvy a kontaktní osobě určené provozovatelem veřejného vodovodu, určené tímto provozovatelem na vstupním výrobním výboru dle bodu 2.4.7. této smlouvy;
- 3.1.7. zapracovat připomínky objednatele a provozovatele veřejného vodovodu a předat projektovou dokumentaci objednateli: do 20-ti kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele a provozovatele
- 3.1.8. vykonávat kompletní autorský dozor v průběhu realizace stavby dle příslušných právních předpisů dle bodu 2.8. této smlouvy

Část B Podmínky pro úsek Čechova – Novohradská:

- 3.1.9. předložit kontrolní vyhotovení DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli a provozovateli veřejného vodovodu k připomínkování: do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
- 3.1.9.1. zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní vyhotovení DPS dle tohoto bodu nebude objednatel vracet zhotoviteli zpět
- 3.1.9.2. zhotovitel je povinen předat část díla uvedeného v bodě 3.1.9 způsobem uvedeným v bodě 3.1.9.1 a v listinné podobě kontaktní osobě objednatele uvedené v bodě 1.1. této smlouvy a kontaktní osobě určené provozovatelem veřejného vodovodu, určené tímto provozovatelem na vstupním výrobním výboru dle bodu 2.4.7. této smlouvy;
- 3.1.10. zapracovat připomínky objednatele a provozovatele veřejného vodovodu a předat projektovou dokumentaci objednateli: do 20-ti kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele a provozovatele
- 3.1.11. podat žádost o vydání stanoviska vodoprávního úřadu: do 15-ti kalendářních dnů od předání finální verze DPS (dle bodu 3.1.10.)
- 3.1.12. vykonávat autorský dozor v průběhu realizace stavby dle příslušných právních předpisů dle bodu 2.8. této smlouvy

- 3.2. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy, je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po

obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel je ve smyslu § 2590 občanského zákoníku, oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

4. Způsob a místo předání díla

- 4.1. Dílo je považováno za řádně provedené, pokud je dokončené a předané **Objednateli**. Dílo musí být **Objednateli** předáno na základě oboustranně podepsaného **Zápisu o předání a převzetí díla** (předávacím protokolu). V tomto **Zápisu** Zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a **Objednatel** prohlásí, že jej přijímá. **Zápis o předání a převzetí díla** je součástí řádného provedení díla. K převzetí díla je Zhotovitel povinen vyzvat **Objednatele** písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem **Objednatel** je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny podstatné vady, tj. vady, které z funkčního nebo estetického důvodu právní užití díla.
- 4.2. Podmínky uvedené bodě 4. 1. této Smlouvy platí i pro **Dílčí předávací protokoly** pro případ, že dílo dle této Smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že Zhotovitel je povinen dílo předat pouze po částech a ve lhůtách, jak jsou blíže popsány v bodě 3.1. této Smlouvy, jinak **Objednatel** není povinen části díla převzít.
- 4.3. V případě, že Zhotovitel při převzetí díla (jeho částí dle čl. 4. 2. této Smlouvy) zjistí ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užití díla, určí **Objednatel** Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta nesmí být delší než **15 (patnáct) kalendářních dnů**.

5. Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši **1 140 000,-Kč bez DPH**
(slovy jedenmillionstočtyřicettisíckorun)

Celková cena za celé dílo se skládá z :

Část A) pro úsek most Kosmonautů – Čechova:

CELKOVÁ CENA za provedení projektové dokumentace v části A činí

711 000,-Kč bez DPH,

z čehož:

- a) za činnost dle bodu 3.1.2. **170 640,- Kč bez DPH**
(tato částka představuje 24% z ceny za projektovou dokumentaci)
- b) za činnost dle bodu 3.1.3. včetně zajištění územního rozhodnutí s doložkou právní moci **35 520,-Kč bez DPH**
(tato částka představuje 5% z ceny za projektovou dokumentaci)
- c) za činnost dle bodu 3.1.4. **227 520,-Kč bez DPH**
(tato částka představuje 32% z ceny za projektovou dokumentaci)
- d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5. **21 330,-Kč bez DPH**
(tato částka představuje 3% z ceny za projektovou dokumentaci)
- e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7. **255 960,-Kč bez DPH**
(tato částka představuje 36% z ceny za projektovou dokumentaci)
- f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této Smlouvy **9 000,-Kč bez DPH**
za 15 hod výkonu autorského dozoru
(**600,-Kč bez DPH za 1 hod výkonu autorského dozoru**)

CELKOVÁ CENA za dílo v části A činí (projektová dokumentace a výkon autorského dozoru)
720 000,-Kč bez DPH

Část B) pro úsek Čechova – Novohradská:

CELKOVÁ CENA za provedení projektové dokumentace v části B činí
411 000,-Kč bez DPH,

z čehož:

- g) za činnost dle bodu 3.1.9. a 3.1.10. 369 900,-Kč bez DPH
(tato částka představuje 90% z ceny za projektovou dokumentaci)
- h) za činnost dle bodu 3.1.11. včetně zajištění vydání stanoviska 41 100,-Kč bez DPH
(tato částka představuje 10% z ceny za projektovou dokumentaci)
- i) za činnost uvedenou v bodě 3.1.12. této Smlouvy 9 000,-Kč bez DPH
za 15 hod výkonu autorského dozoru
(600,-Kč bez DPH za 1 hod výkonu autorského dozoru)

CELKOVÁ CENA za dílo v části B činí (projektová dokumentace a výkon autorského dozoru)
420 000,-Kč bez DPH

Skutečná cena za provedení autorského dozoru Zhotovitele v maximálním rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za 1 hod dodatečných projekčních prací dle bodu 2.5.3. této smlouvy bude určena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách dodatečně.

- 5.2. Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady (přímé či nepřímé), které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy (poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady).
- 5.3. Cena díla může být měněna pouze v případě, že:
 - 5.3.1. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu díla
 - 5.3.2. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 5.4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

6. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu Díla účtovat vždy pouze po splnění činnosti dle bodu 3.1. a pouze v hodnotě uvedené v bodě 5.1. (písm. a) až i)) této smlouvy, když provedení autorského dozoru bude účtováno dle podmínek uvedených v bodě 5.1. písm. f) a i) této smlouvy.
- 6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu Díla na základě vyúčtování (faktury), které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 15-ti kalendářních dnů od splnění podmínky, na kterou se váže konkrétní finanční plnění v souladu s bodem 6.1. tohoto článku. Faktura bude obsahovat

náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

- 6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přerušuje se lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Odpovědnost za vady a sankční ujednání

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za vady Díla, a to po dobu 15-ti let ode dne převzetí díla objednatelem dle podmínek uvedených v této smlouvě. Odpovědnost za škodu bude trvat po dobu životnosti stavby, jejíž PD je předmětem díla dle této smlouvy. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Díla objednatelem.
- 7.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že Dílo dle této smlouvy bude úplné a bude možné podle něj vlastní stavbu řádně realizovat. V případě, že dodané Dílo dle této smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně a bezplatně tuto vadu odstranit a uhradit objednateli nebo třetím osobám veškerou škodu, která mu (jim) vadným planěním vznikla (prokazatelné vícenáklady stavby, škoda dle bodu 7.3. této smlouvy).
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté i právní, které má Dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl. 7.1 této smlouvy. Za vadu Díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst při realizaci stavby).
- 7.4. Odstranění případných vad Díla, bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách písemně sjednaných mezi smluvními stranami, po uplatnění vady Díla v záruční době (Zápis o uplatnění vad v záruční době) objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele. Nebude-li mezi účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace (Oznámení objednatele o vadách v záruční době). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.
- 7.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 250 000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.
- 7.6. Sankční ujednání:
- 7.6.1. v případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla bez DPH, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení (dle bodu 3.1.1 až 3.1.12.), to za každý započatý den tohoto prodlení.
- 7.6.2. v případě, že bude zhotovitel v prodlení se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků Díla uvedených v Zápise (Protokolu) o předání a převzetí díla dle čl. 4. nebo bude v prodlení se lhůtou pro odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době dle bodu 7. 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

- 7.6.3. v případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.7. Smluvní pokuty a smluvní úrok z prodlení jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení druhé smluvní straně.
- 7.8. Těmito ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jeho povinností.

8. Ukončení smluvního vztahu

- 8.1. Tuto smlouvu lze ukončit
 - 8.1.1. písemnou dohodou smluvních stran
 - 8.1.2. odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě
 - 8.1.3. výpovědí této smlouvy ze strany objednatele.
- 8.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámení uvedená smluvní strana dříve.
 - 8.2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy,
 - 8.2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu 5.1. této smlouvy.
- 8.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - 8.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují
 - 8.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
 - 8.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 8.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem pro nepodstatné porušení smlouvy (smluvních povinností) v případě, že Zhotovitele opakovaně porušuje zhotovitele požadovaných rozsah, způsob a formu provedení díla, provádí dílo v rozporu s příslušnými právními a technickými normami nebo je v prodlení delším, než-li 5 pracovních dnů s konáním výrobních výborů dle podmínek této smlouvy.
- 8.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní zhotovitel dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat ve výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na všechna opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli v souvislosti s nedokončením díla.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu.

9. Další ujednání

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat podmínky této smlouvy, obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

- 9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškození předmětu **Dílo**, přechází na objednatele předáním předmětu **Dílo**.
- 9.3. Zhotovitele je povinen reagovat na dotazy objednatele související s plněním **Dílo** dle této smlouvy bez zbytečného odkladu a informovat zhotovitele o všech podstatných skutečnostech souvisejících s prováděním **Dílo**.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat třetím osobám informace o provádění díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací právní nárok (kontrolní orgány apod.). Oceněný soupis prací je objednatelem považován za důvěrný.

10. Licenční a autorská ujednání

- 10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k **Dílu**, které je předmětem této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva **Dílo** užití (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní,
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d) množství rozsah této licence není nijak omezen,
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
- 10.3. Objednatel není povinen licenci využít.
- 10.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
- 10.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
 - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
 - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním **Díla**, s jakýmkoli úpravami a změnami **Díla**, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
- 10.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor **Díla** výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení **Díla** do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k **Dílu** a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
- 10.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotovitel nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
- 10.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání **Díla** třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.

- 10.11. Oprávnění objednatele užít Dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane Díl dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.
- 10.12. Práva zhotovitele oslovovat si autorství Díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy nejprve dohodou.
- 11.3. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně změnu jakéhokoliv kontaktních údaje uvedeného v bodě 1.1. či 1.2. nebo změnu pověření kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za změnu smlouvy. Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj. prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním k poskytování poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud takové místo smluvní strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných dokumentů (Podatelna)
- 11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 11.5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 11.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněn i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu objednatele jako zadavatele veřejné zakázky. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 11.7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

11.8. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění změn a doplňků schváleno usnesením RADY MĚSTA ze dne 26.9.2016 2016, č. 1383/2016

11.9. Nedílnou součástí této smlouvy je

Příloha č. 2 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení
Příloha č. 1 - Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

- 2 - 11 - 2016

V Českých Budějovicích dne

V Č. Budějovicích dne 25.10.2016

za objednatele



Ing. Petr Holický
náměstek primátora
statutární město České Budějovice



za zhotovitele



Ing. Daniel Vaclík
jednatel

VH-TRES spol. s r.o. ④
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Senovážné nám. 1
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 775 144

Příloha č. 1

Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

- I. **Zhotovitel je povinen v rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména tyto činnosti:**
 - účastnit se na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.
 - Účastnit se všech kontrolních dnů stavby a spolupracovat s ostatními subjekty (tj. koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka, zástupce investora, stavbyvedoucím zhotovitele stavby apod.) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.
 - Sleduje a kontroluje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.
 - poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.
 - dle pokynů investora (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.
 - Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; na výzvu investora se účastní případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu
 - poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a reklamačních řízeních
 - AD provádí kontroly stavebního deníku a pořizuje do něj zápisy.

- II. **V rámci kontroly realizace stavby s PD provádí zejména**
 - soulad realizace stavby s vydanými správními rozhodnutími
 - soulad realizace stavby s PD z hlediska autorského
 - soulad realizace stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo
 - vydává stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem k srovnávacím standardům

- III. **Zvláštní výkony (nadstandardní činnost)**
Řešení odchylek stavby - změny stavby
 - jednání o změnách vyvolaných investorem nebo zhotovitelem
 - vypracování alternativních řešení – technických, dispozičních, detailů a provedení
 - analýza důsledku změn
 - vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů
 - řešení změn stavby před dokončením
 - posouzení změn technického, materiálového a estetického charakteru dokumentace skutečného provedení

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: ČB, Mánesova (Novohradská - most Kosmonautů) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu

Charakteristika stavu:

Na rok 2018 připravuje Jihočeský kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic akci „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice v úseku most ev. č. 156-001b (most Kosmonautů nad řekou Malší) – Novohradská ulice“.

V polovině 90-tých let 20. století byla Jihočeským vodárenským svazem realizována rekonstrukce vodohospodářských sítí. Jednalo se o kanalizační sběrač z kameninových trub DN600 (v úseku Mlýnská stoka – Novohradská ul.). Stav tohoto sběrače, dle kamerového průzkumu uskutečněném v únoru 2016, je bez závad.

Kanalizační přípojky (v úseku most přes Malší – Novohradská ul.) byly kompletně vyměněny za kameninová potrubí DN 150 a DN 200.

Vodovodní přípojky (v úseku most přes Malší – Novohradská ul.) byly kompletně vyměněny za polyetylenová potrubí PE 32 mm až PE 63 mm.

Vodovodní řady DN 80, DN 100, DN 150 a DN 400 v Mánesově ulici pocházejí z poloviny 60-tých let 20. století. Tyto řady nebyly v rámci výše uvedené rekonstrukce komunikace v polovině 90-tých let obnoveny. Jen v posledním čtvrtroce byly zaznamenány na vodovodním řadu v tomto úseku 3 poruchy. Pouze dva krátké úseky řadu DN 400 uložené do chrániček v místě mostních přechodů řeky Malše a Mlýnské stoky byly v rámci rekonstrukce ulice v polovině 90-tých let vyměněny.

Kanalizační sběrače DN 300 a DN 600 v Mánesově ulici (v úseku mezi mostem přes řeku Malší a mostem přes Mlýnskou stoku) nebyly v rámci rekonstrukce ulice v polovině 90-tých let obnoveny. Tyto kanalizační sběrače jsou z počátku 20. století. Dle kamerové prohlídky jsou kanalizační sběrače za hranicí své životnosti.

V rámci rekonstrukce Dukelské ulice byly na křižovatce ulic Dukelská - Mánesova v roce 2008 položeny nové vodohospodářské sítě.

Návrh řešení:

Bude provedena obnova vodovodů DN 80, DN 100, DN 150 a DN 400 v celém úseku mezi řekou Malší a Novohradskou ul. (mimo úseky potrubí DN 400 v chráničkách obou mostů) včetně částí vodovodů vedoucích do postranních ulic.

V úseku mezi Dukelskou ul. a Mlýnskou stokou bude kanalizace zkapacitněna z DN 600 na DN 800 a bude snížena její niveleta. Nutno koordinovat (zejména podélný profil kanalizace) s akcí „České Budějovice, Vrchlického nábřeží (Čechova – Mánesova) – stavební úpravy“ - projekt firmy VH-TRES s.r.o. z března 2016 (levý břeh Mlýnské stoky).

Souběžná kanalizace DN300 bude v tomto úseku zrušena a přípojky přepojeny do hlavního sběrače.

Kanalizace v úseku mezi Dukelskou ulicí a řekou Malší (v dimenzích 600/900 a DN300) bude přeložena a v celém úseku navržena v jedné dimenzi DN300.

Provede se zkapacitnění kanalizace DN 500 a DN 700 v místě křížení Mánesovy ulice s Vrchlického nábřežím (pravý břeh Mlýnské stoky) za potrubí DN 800 v délce cca 86 m. Zkapacitnění kanalizačního sběrače je dle návrhu generelu stokových sítí, naváže se tak na rekonstrukci kanalizace DN 800 v Čechově ulici z r. 2012.

Dále bude provedena obnova částí kanalizace, které napojují přilehlé ulice a zasahují do plánovaného nového povrchu v Mánesově ulici. Jedná se o 2 podchody kanalizace 2 x DN400 délky cca 10 m pod kolektorem teplovodního potrubí z ulice U elektrárny a Čechova. Dále pak o kanalizační potrubí DN 600 délky cca 11 m z ulice Prokišova. V ulici Novohradská bude provedena obnova části kanalizačního sběrače BE 600/900 z počátku 20. století v délce cca 70 m. Předpokladem je náhrada vejčitého profilu za DN800 (možno použít i bezvýkopovou technologii).

Informace:


Návrh řešení v podkladu je pouze pro potřeby stanovení předpokládaného rozsahu díla. Finální koncepce řešení je plně v kompetenci projektanta.

Závazné požadavky:


- Projektová dokumentace bude řešit případné přeložky sítí.
- S ohledem na stávající teplovodní vedení v ul. Mánesova bude nové kanalizační a vodovodní

Grafická část

Situace s návrhem rozsahu obnovy VH sítě (1. etapa)

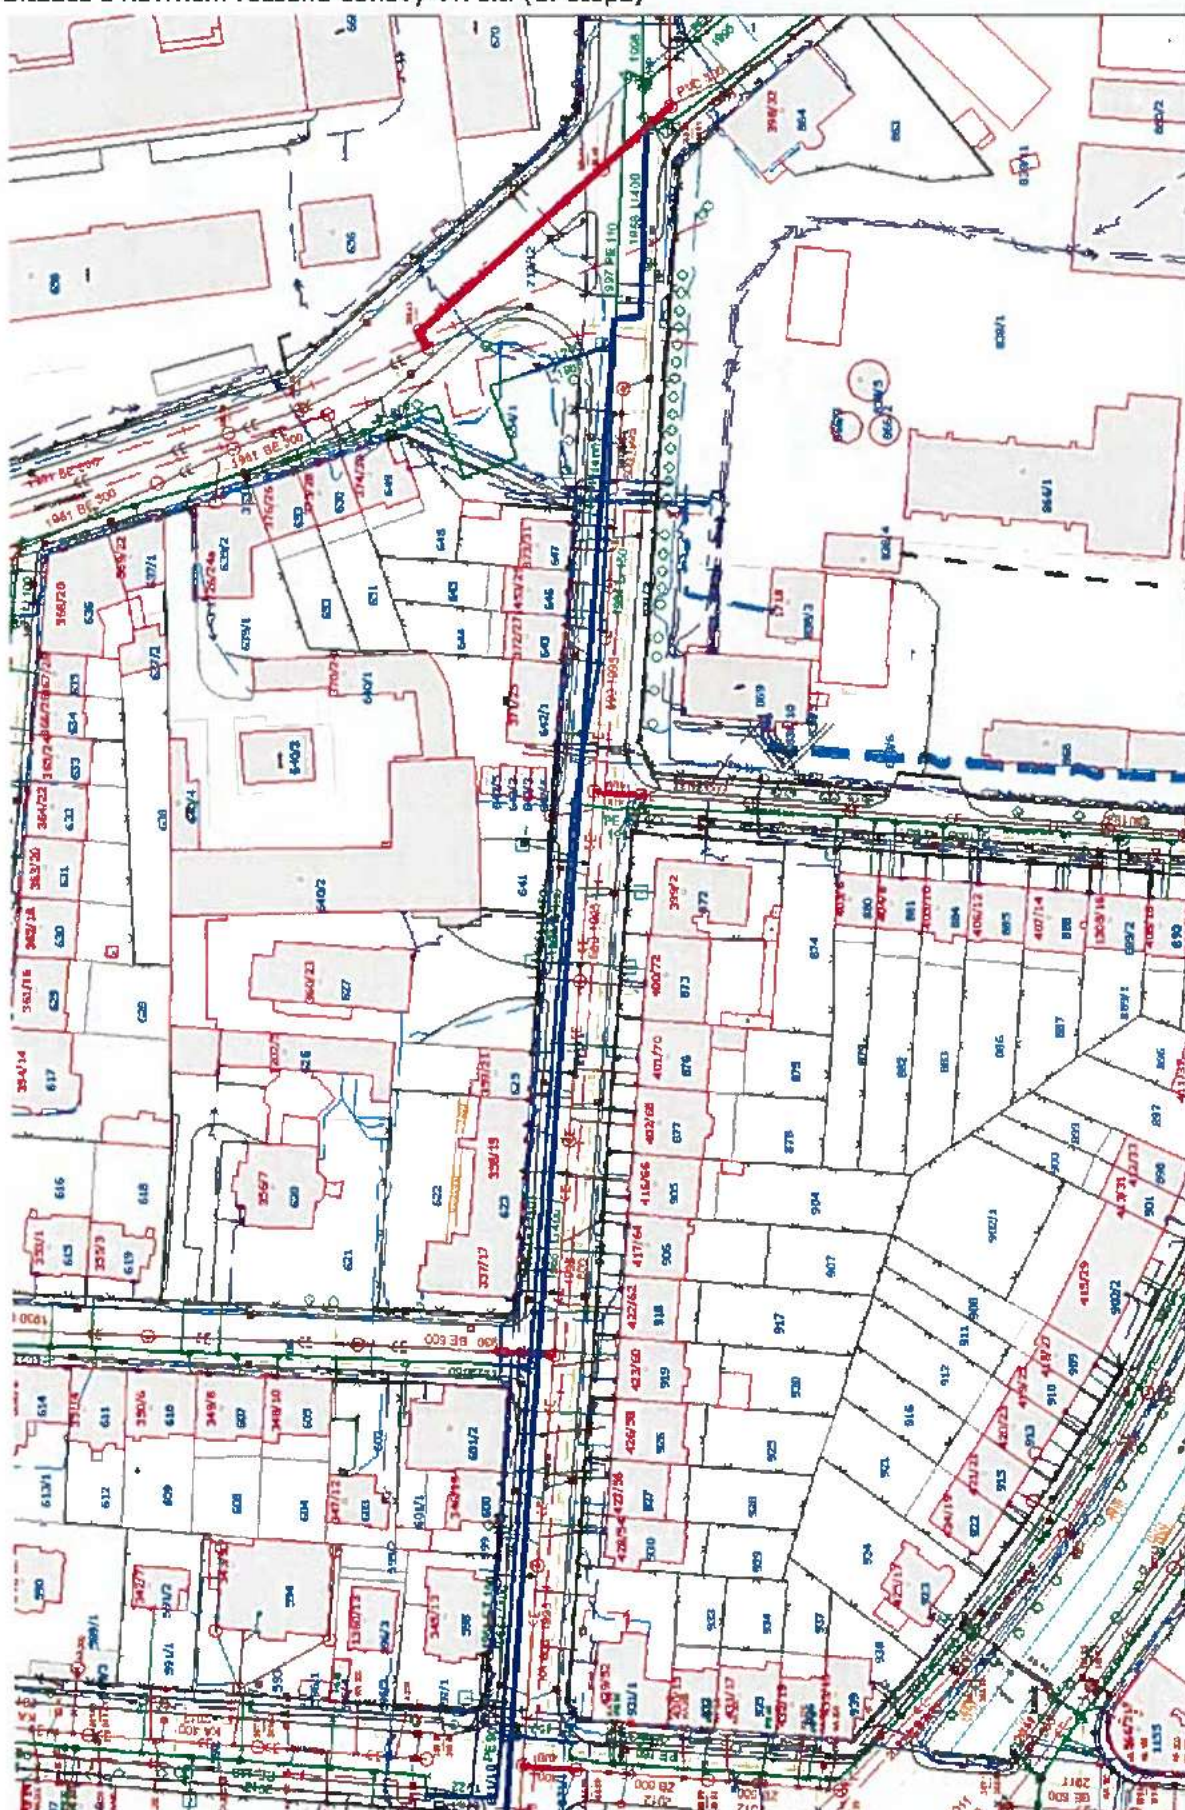

Situace s návrhem stavebních úprav VH sítě (2. etapa)

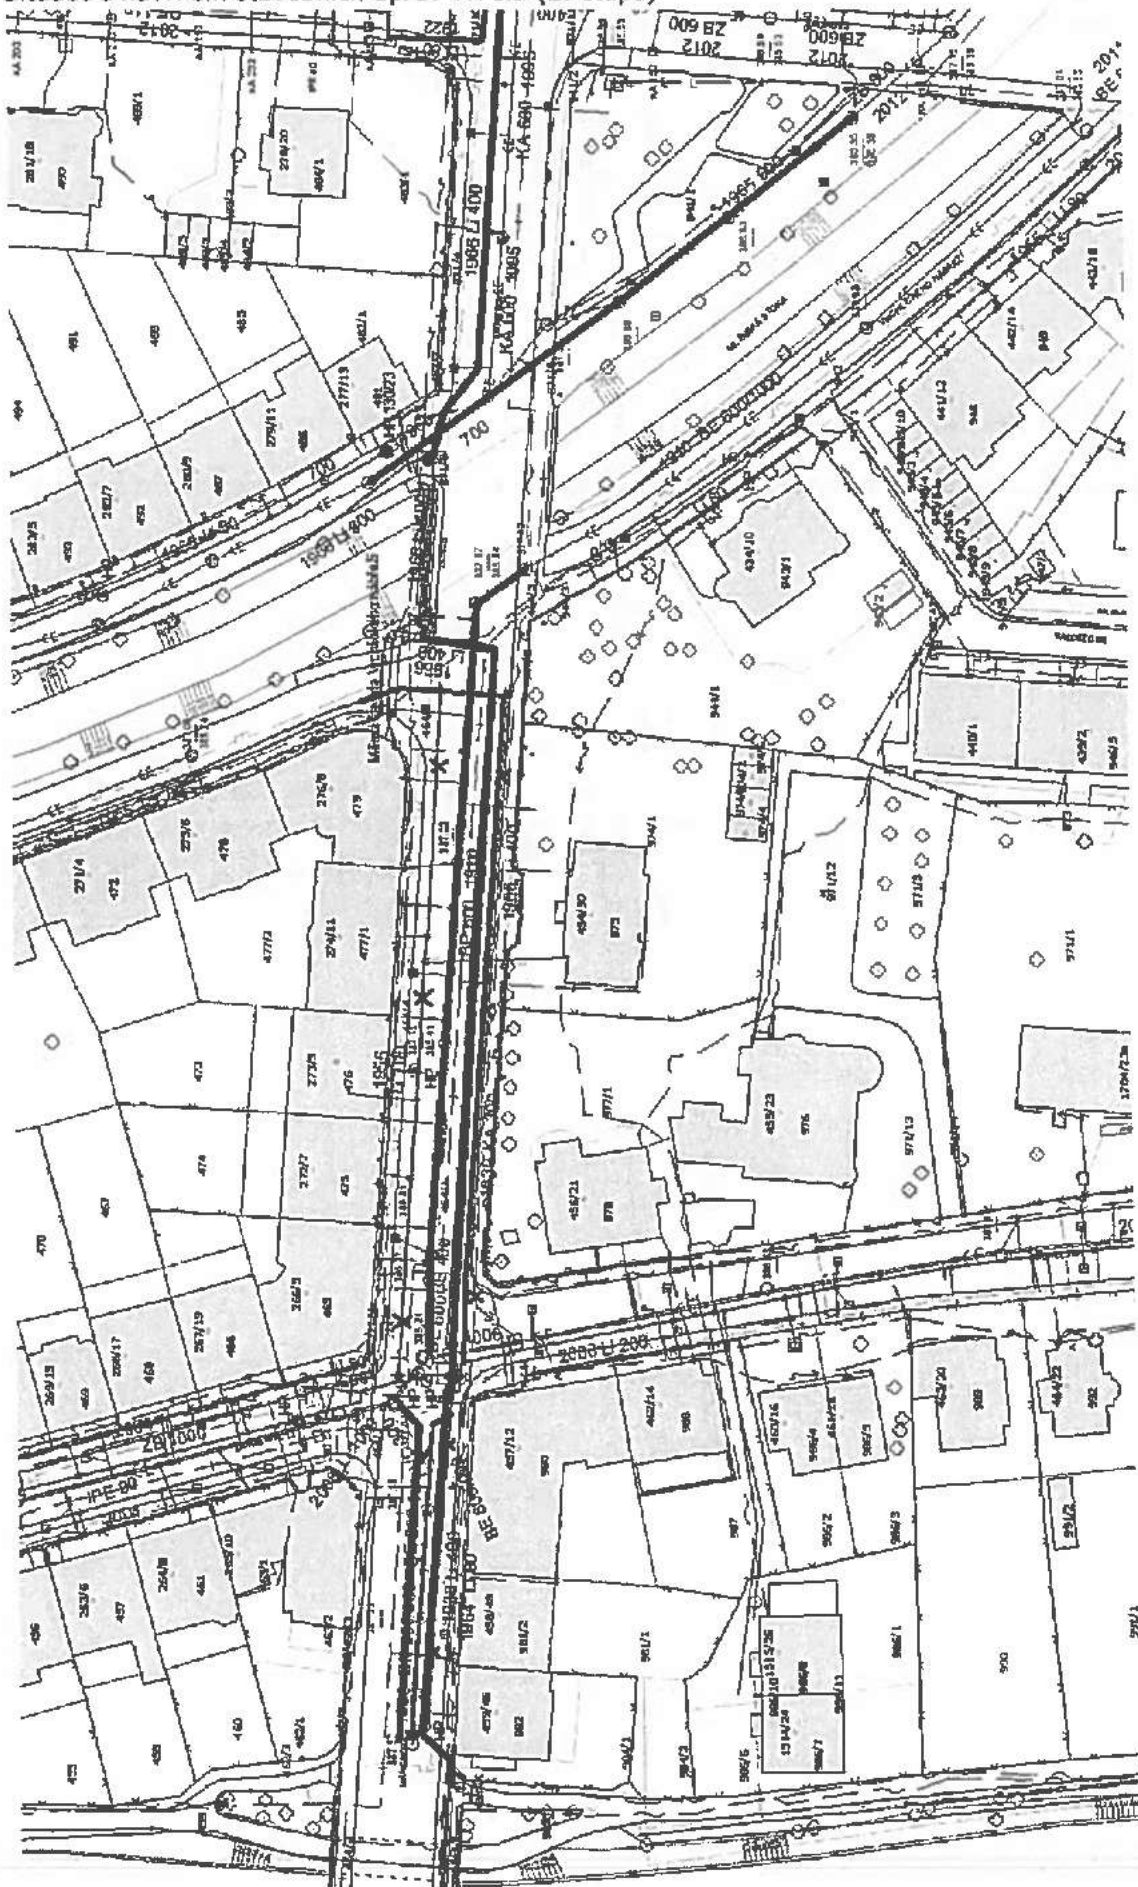

Vybrané snímky z kamerové prohlídky

Pohled z šachty Mánesova do kan. Prokišova



most Kosmonautů - Dukelská



Kanalizace Vrchlického nábř. - Dukelská



Podchod pod teplovodem



Fotodokumentace poruch na vodovodu



9.10.2016
MĚŘENÍ NA 150 Ø ØL
3. dílna v 2011
ØL 110 ØL

10.1.2016
MĚŘENÍ NA 17
3. dílna 17 + 17

10.1.2016
MĚŘENÍ NA 21
ØPĚŠŤA ØØL ØØ 150
