

Smlouva o dílo
na zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
„Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“

č. zhotovitele: 02-0-3886-7658/18

č. 588 /OIRM/2018

(na základě projednání v RM dne 09.04.2018, usnesení č.340/2018)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
zastoupená: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02, na základě plné moci
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo:

III.

Předmět díla

- 3.1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen DÚR a DSP), včetně inženýrské činnosti a dokumentace ve stupni DPS stavby „Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“. Rozsah projekční a inženýrské činnosti je podrobně popsán v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha: nabídka projekční a inženýrské činnosti na stavbu „Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“, ze dne 03.04.2018.

DPS bude zpracována v rozsahu:

- Podmínky pro provedení stavby (technické podmínky).
- Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, výkaz výměr.
- Dokumentace provedení stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Projektové dokumentace budou předány 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě (složky
dwg a pdf.)

Rozpočet bude předán v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls,.xlsx) a 2x v tištěné podobě.

Soupis prací s výkazem výměr bude předán v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, .xlsx, .xml).

- 3.2. Po předání objednateli se projektová dokumentace stane výlučným vlastnictvím objednatele, který s ní bude moci nakládat jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný. Zhotovitel si žádným způsobem nebude moci nárokovat zpracování dalších stupňů projektové přípravy.

PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

- 3.3. Každý stupeň projektové dokumentace bude v průběhu přípravy projednáván – musí proběhnout nejméně 3 kontrolní dny za účasti zhotovitele PD a objednatele.

- 3.4. Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel v součinnosti s objednatelem. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po podepsání smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli.
- 3.5. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV.

Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

Činnost	Termín plnění v měsících
A. Přípravné práce – základní hydraulická analýza	do 2 měsíců od účinnosti smlouvy
B. Přípravné práce – geodetické zaměření	do 2 měsíců od účinnosti smlouvy
C. Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů	do 3,5 měsíce od účinnosti smlouvy
D. Inženýrská činnost – společné územní a stavební řízení – společné povolení	do 7 měsíců od účinnosti smlouvy
E. Vypracování dokumentace k provedení stavby (DPS) se soupisem prací, výkazem výměr a rozpočtem	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

Termíny inženýrské činnosti jsou uvedeny vždy do fáze podání žádosti o správní rozhodnutí. Vlastní inženýrská činnost a její délka může být ovlivněna požadavky a nároky vlastníků

dotčených pozemků a požadavky dotčených organizací. Smluvní strany pro tento případ sjednávají možnost přerušení termínu plnění, a to na základě požadavku zhotovitele doloženého písemně objednateli – musí se jednat o objektivní skutečnosti, jež zhotovitel nezapříčinil. Objednatel posoudí oprávněnost požadavku. Po dobu přerušení termín neběží.

V.

Splnění díla

- 5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III., této smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.
- 5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a ten převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.
- 5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

VI.

Cena díla

- 6.1. Cena za dílo dle čl. III. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 6.2. Cena za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace a obsahuje veškeré náklady zhotovitele.

Činnost	Cena v Kč bez DPH
A. Přípravné práce - základní hydraulická analýza	32 000
B. Přípravné práce – polohopisné a výškopisné zaměření	10 000
C. Projektová dokumentace pro společné povolení	106 000
D. Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení – společné povolení	55 000
E. DPS se soupisem prací, s výkazem výměr a rozpočtem	43 000
Cena celkem	246 000

Cena celkem bez DPH **246 000 Kč**
DPH 21 % **51 660 Kč**
Cena celkem s DPH **297 660 Kč**

V tomto případě se jedná o přenesenou daňovou povinnost, proto DPH odvádí objednatel.

- 6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.
- 6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.
- 7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap plnění díla bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „Příbram II, Svatá Hora - návrh na zajištění tlakových poměrů“ – projekční a inženýrská činnost a číslo smlouvy objednatele.
- 7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu

objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- 7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny požadované náležitosti, odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit. Vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII.

Podmínky provedení díla

- 8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.
- 8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
 - a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky
 - b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
 - c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě
 - d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

- 8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
- 8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD s názvem „Příbram II, Svatá Hora – zajištění tlakových podmínek“ v počtu paré dle čl. III., okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo.
- 8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.
- 8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování PD jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

IX.

Záruky a reklamace

- 9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.
- 9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.
- 9.3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9. 2. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.
- 9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a soupisem prací včetně výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9. 1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9. 5. se čl. 9. 2. až 9. 4. použijí obdobně.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele, přestože objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.
- 10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10. 1., 10. 2. a 10. 3. smlouvy.
- 10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od

smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- 10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX., odst. 9. 2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání.

XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.

- 12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
- 12.5. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

příloha č. 1: nabídka - projekční a inženýrská činnost – Příbram II, Svatá Hora – návrh pro zajištění tlakových poměrů

příloha č. 2: plná moc Ing. Jana Cihláře

Za stranu objednatele:

Za stranu zhotovitele:

V Příbrami dne: 14. 05. 2018

V Praze dne: 11. 05. 2018


město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka - starosta


Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Ing. Jan Cihlár – ředitel divize 02



NABÍDKA

Projekční a inženýrská činnost



Příbram II, Svatá Hora – návrh pro
zajištění tlakových poměrů



Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost
Nábřeží 4, Praha 5, 150 56

Základní údaje

1

Obchodní jméno: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4, Praha 5, PSČ 150 56

IČO : 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5,
[redacted]

Finanční situace: od založení společnosti trvale solventní
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Kontakty:

Ing. František Smrčka
ředitel divize 03 Praha
Tel. : [redacted]
Mob : [redacted]
Email : smrcka@vrv.cz
www.vrv.cz

Ing. Lukáš Drbola
zástupce ředitele D03
Tel. : [redacted]
Mob : [redacted]
Email : drbola@vrv.cz

Předmět, nabídková cena a termíny plnění	2
--	---

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen DÚR+DSP), včetně inženýrské činnosti a dokumentace ve stupni DPS stavby „Příbram II, Svatá Hora – návrh zajištění tlakových poměrů“.

Předmětem je :

- ATS ve vodojemu Svatá Hora.
- z ATS navrhnout nový vodovodní řad min.DN 90 (z důvodu možného rozvoje) až ke stávajícímu vodovodnímu řadu PE DN 63, cca 100 m (na situaci vyznačeno červenou čarou).

Na navržený vodovodní řad PE DN 90 z ATS přepojit:


- stávající vodovodní řad PE DN 63, na situaci vyznačeno žlutě.
- stávající vodovodní přípojku DN 90 pro čp. 594 na situaci vyznačeno fialově (doporučení: na přípojce, v nejbližším místě za napojením, vybudovat vodoměrnou šachtu a přemístit vodoměr z objektu čp. 594, pozor na přípojce hydrant a v objektu domovní ATS).
- stávající vodovodní řad PE DN 63, na situaci vyznačeno modře.

Do vodojemu Svatá Hora je přiveden vodovodní řad L DN 150, (na situaci vyznačen silnější modrou čarou), který je napojen na tlakové pásmo ATS Husa, které je nutné celkově posoudit.

V případě realizace ATS v objektu vodojemu Svatá Hora připojení nového přenosu dat na dispečink pomocí rádia (stejná technologie jako na objektu Husa).

Přenos: rádio, měření průtoku, 2x tlak, chod a porucha čerpadel atd. Zvážit obnovení funkce vodojemu Svatá Hora jako akumulace navržené ATS.

Poznámka: před realizací doporučuji vyřešit redukované pásmo z ATS Husa a přenastavení výstupního tlaku z ATS Husa směr Nová Hospoda.

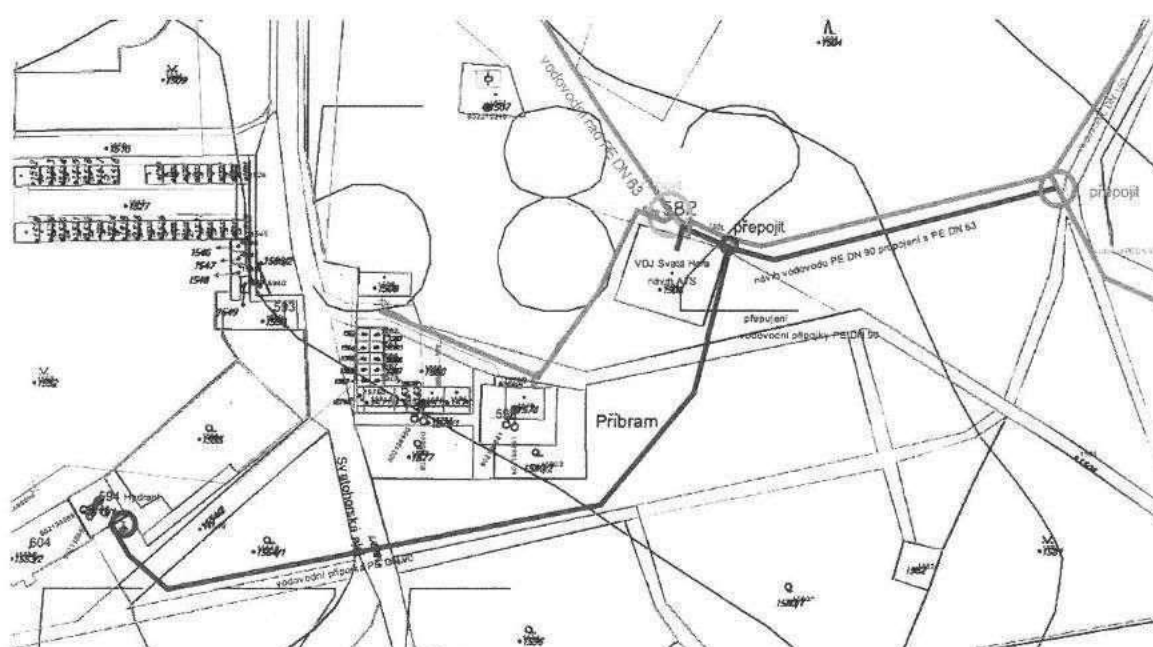

Obr. 1 Řešená situace zájmového území

Rozsah prací projekční a inženýrské činnosti:

A. Přípravné práce

A.1 Přípravné práce-základní hydraulická analýza

Součástí je základní hydraulická analýza. Jedná se o stanovení koncepce řešení v návaznosti na rozsah zadání. Předmětem není zpracování matematického modelu, řešení podrobných hydraulických výpočtů a řešení koncepce kompletní zásobované oblasti.

A.2 Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření

Bude provedeno geodetické zaměření v potřebném rozsahu (do 500 bm), které bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

B. Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.

Projektová dokumentace pro společné povolení na akci bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., v platném znění, v tomto rozsahu:

Rozsah dokumentace pro vydání společného povolení

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- F. Dokladová část

PD bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě.

C. Inženýrská činnost společné územní a stavební řízení – společné povolení.

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích a s vydáním společného rozhodnutí.

D. Vypracování dokumentace ve stupni DPS se soupisem prací, s výkazem výměr a rozpočtem

Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro provedení stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

DPS bude vycházet z dokumentace pro stavební povolení:

- Podmínky pro provedení stavby (technické podmínky).
- Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, výkaz výměr.
- Dokumentace provedení stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

DPS bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě (složky dwg a pdf).

Rozpočet bude předán v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls,xlsx) a 2x v tištěné podobě.

Soupis prací s výkazem výměr bude předán v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx, xml).

Ceny za vypracování předmětu díla jsou stanoveny na základě kalkulace a obsahují veškeré náklady zhotovitele.

Nabídková cena:

Činnost		Cena v Kč bez DPH
A.1	Přípravné práce – základní hydraulická analýza	32 000
A.2	Přípravné práce – polohopisné a výškopisné zaměření	10 000
B.	Projektová dokumentace pro společné povolení	106 000
C.	Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení – společné povolení	55 000
D.	DPS se soupisem prací, s výkazem výměr a rozpočtem	43 000
Cena celkem		246 000

Cena celkem bez DPH **246 000 Kč**
DPH 21 % **51 660 Kč**
Cena celkem s DPH **297 660 Kč**

Termíny plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

		Termín plnění:
Bod	Popis	
A.1	Přípravné práce-základní hydraulická analýza	do 2 měsíců od podpisu SoD
A.2	Přípravné práce-geodetické zaměření	do 2 měsíců od podpisu SoD
B.	Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů	do 3,5 měsíce od podpisu SoD
C.	Inženýrská činnost společné územní a stavební řízení – společné povolení	do 7 měsíců od podpisu SoD
D.	Vypracování dokumentace k provedení stavby (DPS) se soupisem prací, výkazem výměr a rozpočtem	do 2 měsíců od vydání společného povolení

Dne: 29.3.2018

Zpracoval:

Ing.
Lukáš
Drbola
Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Drbola
Datum:
2018.03.29
08:59:05 +02'00'

PLNÁ MOC

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společnosti, tímto

zmocňuje

svého zaměstnance **Ing. Jana Cihláře**, ředitele divize 02 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., bytem [redacted]

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené divize 02 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a podepisování návrhů klientům na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 02 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. .

V Praze dne 11. 7. 2014

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. :

Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva
datum nar. [redacted]
bytem [redacted]

Ing. Šárka Balšáňková
místopředseda představenstva
datum nar. [redacted]
bytem [redacted]

Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva
datum nar. [REDACTED]
bytem [REDACTED]

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
datum nar. [REDACTED]
bytem [REDACTED]

Ing. Jan Cihlář
člen představenstva
datum nar. [REDACTED]
bytem [REDACTED]

Podpis osoby přejímající zmocnění :

Ing. Jan Cihlář
Ředitel divize 02

Ověření - legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3605-3608/2014---
Ověřuji, že : -----
Ing. Jiří Valdhans, nar. [redacted]
bytem [redacted]

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----
V Praze dne : 11.07.2014

[redacted]

Ověření - legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3609-3612/2014---
Ověřuji, že : -----
Ing. Jiří Frýba, [redacted]
bytem [redacted]

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----
V Praze dne 11.07.2014

[redacted]

Ověření - legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3613-3616/2014---
Ověřuji, že : -----
Ing. Jan Cihlár, [redacted]
bytem [redacted]

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----
V Praze dne 11.07.2014

[redacted]

Ověření - legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3618-3621/2014---
Ověřuji, že : -----
Ing. Jan Plechatý, [redacted]
bytem [redacted]

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----
V Praze dne : 11.07.2014

[redacted]

šření - legalizace :
žné číslo ověřovací knihy: O/V/3622-3625/2014---
věruji, že : -----
ng. Šárka Balšánková, -----
bytem -----

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsala.
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----
V Praze dne : 11.07.2014

Ověření-vidimace
ověřuji, že tento výpis složený
z listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl
porizen, složenou z
listů.
V Praze dne

ILONA NOČOVÁ
notářka
SVOBODA ALBERT PRÁZE
notář



