

S-0843/DOPPO/2018

Číslo smlouvy VPI/PH/2018/005

Číslo smlouvy stavebníka:

1277/00066001/2018

SRM: 8020009631

Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. VPI/PH/2018/005**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Středočeský kraj

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

(dále „**CETIN**“)

a

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO : 70891095

DIČ : CZ70891095

Bankovní spojení PPF banka a.s. číslo účtu:4440009090/6000

zastoupená **Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO : 00066001

DIČ : CZ00066001

Zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

na základě usnesení č. 016-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Harmonogram je harmonogram, který koordinuje, zejména z časového hlediska jednotlivé úkony Stavby s jednotlivými úkony Překládky, který bude Smluvními stranami odsouhlasen dle čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 14.11.2016 vydané společností CETIN pod čj. 753796/16, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI, II/102, Štěchovice, rekonstrukce**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu
- ii) podat návrh o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) při realizaci Překládky:

- i) respektovat Smluvními stranami odsouhlasený Harmonogram

c) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“). Tato povinnost platí pro každou z etap Překládky samostatně (s výjimkou etapy č. 1 uvedené v čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy) s tím, že první Písemná výzva Stavebníka může být učiněna nejdříve 7 měsíců po uzavření této smlouvy.
- ii) současně s první Písemnou výzvou Stavebníka dle předchozího bodu zaslat společnosti CETIN návrh Harmonogramu k vyjádření.

b) při realizaci Překládky:

- i) respektovat Smluvními stranami odsouhlasený Harmonogram

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé etapy Překládky (i) do 7 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za

předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 7 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN. CETIN se zavazuje uvést připomínky k návrhu Harmonogramu do 30 dnů od jeho doručení Stavebníkem (spolu s první Písemnou výzvou Stavebníka). Vzájemně odsouhlasený Harmonogram ponese podpisy zástupců obou Smluvních stran.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 6 etap:

1. Projekt
2. SO451
3. SO452
4. SO453
5. SO454
6. SO457

Jednotlivé etapy jsou co do rozsahu stanoveny položkami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Jednotlivé etapy Překládky budou považovány za ukončené, vždy dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení té které etapy Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace té které etapy Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **1.359.581,-Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 5 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu (toto oznámení je považováno současně za oznámení o ukončení etapy č. 1 Překládky dle v čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy) a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucích na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,

- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady Překládky stanovené na základě Projektu ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci jednotlivých etap Překládky, a to vždy do 60 dnů od doručení každé jednotlivé faktury Stavebníkovi.
- 6.2 Faktury odst. 6.1 tohoto článku budou vystaveny vždy do 15 dnů od ukončení každé jednotlivé etapy Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy, tj. Středočeský kraj Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 21.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN



- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k

zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději 5.den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- a) v listinné podobě;
- b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 11.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

Číslo smlouvy VPI/PH/2018/005
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020009631
Registr smluv: ANO

11.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace jednotlivých etap Překládky


Příloha č. 3 - Usnesení č. 016-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014

CETIN:

Středočeský kraj

V Praze dne 25-04-2018

V Praze dne 04. 06. 2018



KS
Bc. ~~Lucie~~ ~~Státník~~
Ředitel

Příloha č. 1 - CTN

VPI, II/102, Štěchovice, rekonstrukce

Projekt	73 850.48 Kč
SO451	207 731.84 Kč
SO452	132 771.97 Kč
SO453	120 024.32 Kč
SO454	80 337.13 Kč
SO457	744 865.34 Kč
celkem	1 359 581.08 Kč

Příloha č. 2 - Specifikace jednotlivých etap Překládky

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Západ - ARN/SIN -
Položková 2017.12

Název stavby: VPI, II/102, Štěchovice, rekonstrukce - SO451

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 443,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	53 120,60 Kč
MONTÁŽ	27 037,01 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 909,54 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 416,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	60 800,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	48 004,57 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 207 731,84 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 137 578,82 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 70 153,02 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	24.00 m
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	54.00 m
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	18.00 m
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	128.00 m
954957 S		Rýha vjezd litý beton 35/70-90	6.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	152.00 m
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks
MONTÁŽ			
955015 S		Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	50.00 m
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	58.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	30.00 ks
955267 S		Montáž nadzemní tratě síťové	349.93 JV
úprava SR2			
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	4240.30 JV
zjištění trasy KA1 - sondy atd.			
koordinace se stavbou			
955296 S		Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks

954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	50.00 m
955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	105.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	162.00 m
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	37.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	3.00 ks
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	110.00 m
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	31.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	52.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	52.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	60800.00 JV

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
306577 S	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA		6.00 ks
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		128.00 ks
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m		2.00 kg
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		152.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		160.00 m
300116 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6		105.00 m
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6		162.00 m
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		9.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		6.00 ks
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m		24.00 kg
308707 S	Sběrnice zemnicí 6-ti pólová		1.00 ks
306382 S	Skříň rozvaděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup		1.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L		1.00 ks
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		1.00 ks
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm		1.00 ks
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400		8.00 ks
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		4.00 ks
309719 S	Vana mont. SID-C 100P 22175-100 CZ		1.00 ks
303204 S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35		4.00 ks
316282 S	Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342		1.00 ks
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000		1.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		1.00 ks

Číslo smlouvy VPI/PH/2018/005
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020009631
Registr smluv: ANO

301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	4.00 m



PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Západ - ARN/SIN - STAND. - 2
Položková 2017.12

Název stavby: VPI, II/102, Štěchovice, rekonstrukce - SO452

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 443,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	20 142,99 Kč
MONTÁŽ	50 641,21 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 196,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	10 000,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	36 842,90 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 132 771,97 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 114 131,87 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 18 640,10 Kč


Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S		Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks
954973 S		Povrchy nad rámec litý asfalt	2.00 m2
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	8.00 m
952346 S		Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	9.00 m
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	3.00 m
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	3.00 m
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	5.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	38.00 m
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks
MONTÁŽ			
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	90.00 m
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřk	18.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřk	237.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	12.00 ks
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	290.00 ks
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	50.00 ks
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	5310.67 JV
955282 S		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	9.00 ks
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	3.00 ks

954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	30.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	62.00 m
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks
955066 S	Zrušení spojky smršťitelné do 50 čtyř.	6.00 ks
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	93.00 m
955040 S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	46.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 10000.00 JV náhrady	

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	17.00 ks
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	10.00 m
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	17.00 m
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	30.00 m
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	60.00 m
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	60.00 m
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	62.00 m
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	68.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	12.00 ks
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	2.00 ks
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	3.00 ks
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	9.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný			
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	12.00 ks
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	12.00 ks

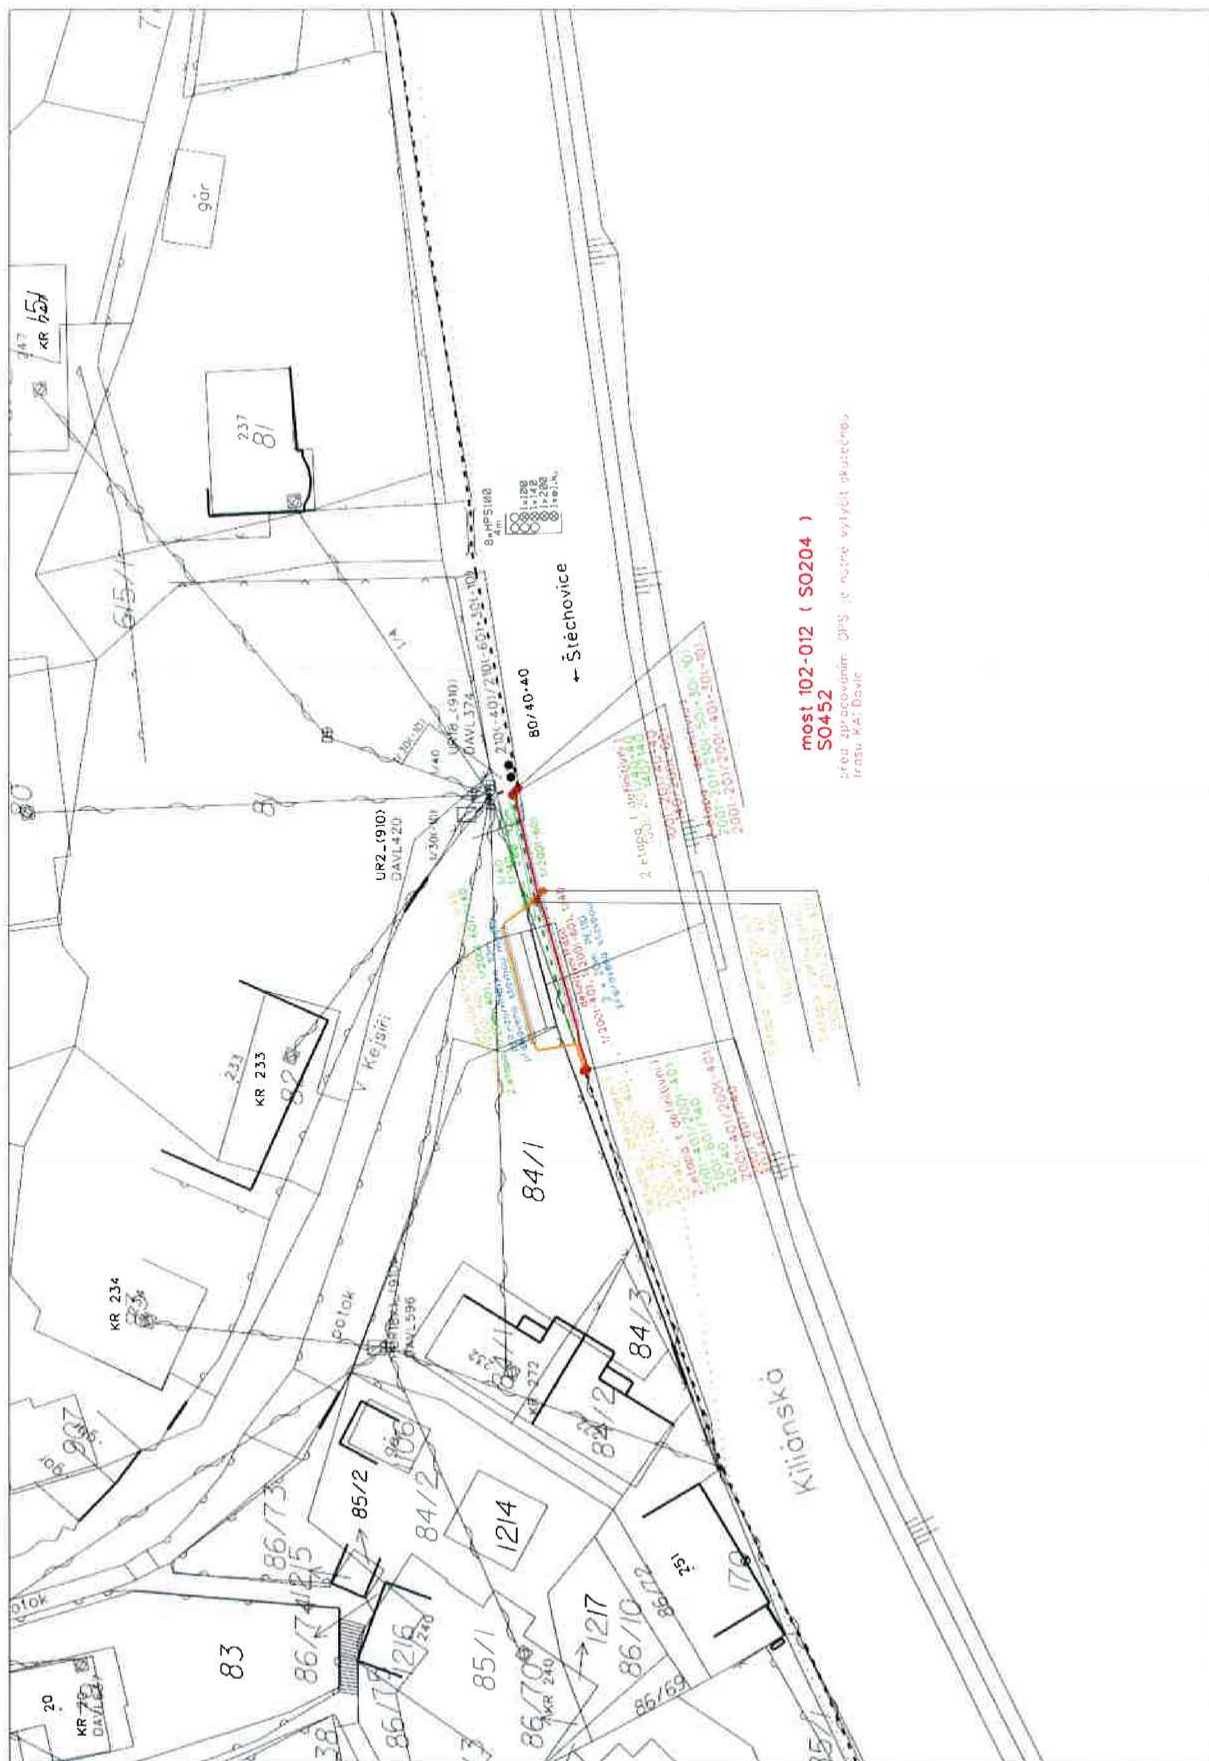

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Západ - ARN/SIN - STAND. - 2
Položková 2017.12

Název stavby: VPI, II/102, Štěchovice, rekonstrukce - SO453
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: ARANEA Network,a.s.
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.022	KMP:	10.560	bytových HTS:
KMVYK: voz.	0.002	KMMK:	0.144	podnik. HTS:
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:
		KMTRU:	0.000	PP HR:
		KMOK:	0.000	PP UR:
		KMVL:	0.000	
		KMTRK:	0.000	

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.		
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba 0.000 km Předměstí
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.		
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba 0.000 km Předměstí
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.		
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba 0.000 km Předměstí
4: Do 1 tis. obyv.		
Chráněná přírodní úze	0.000 km	Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 443,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	16 148,79 Kč
MONTÁŽ	48 307,60 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 196,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	7 500,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	32 923,06 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 120 024,32 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	103 884,22 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	16 140,10 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S	Paušál na zemní práce do 50 m		1.00 ks
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		2.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		12.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		8.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		9.00 m
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100		2.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		39.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		2.00 ks
MONTÁŽ			
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		45.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		18.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		237.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		12.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		340.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické		5310.67 JV
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek		8.00 ks
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		4.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		33.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN		66.00 m
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě		2.00 ks
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.		6.00 ks
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN		92.00 m
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN		45.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m		1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m		1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)		1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene		7500.00 JV
	náhrady		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		23.00 ks
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		4.00 m
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		63.00 m
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4		48.00 m
300109 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4		48.00 m
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6		48.00 m
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		4.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		68.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L		12.00 ks


Číslo smlouvy VPI/PH/2018/005

Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020009631

Registr smluv: ANO

312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	4.00 ks
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	8.00 ks
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	1.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	12.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	12.00 ks

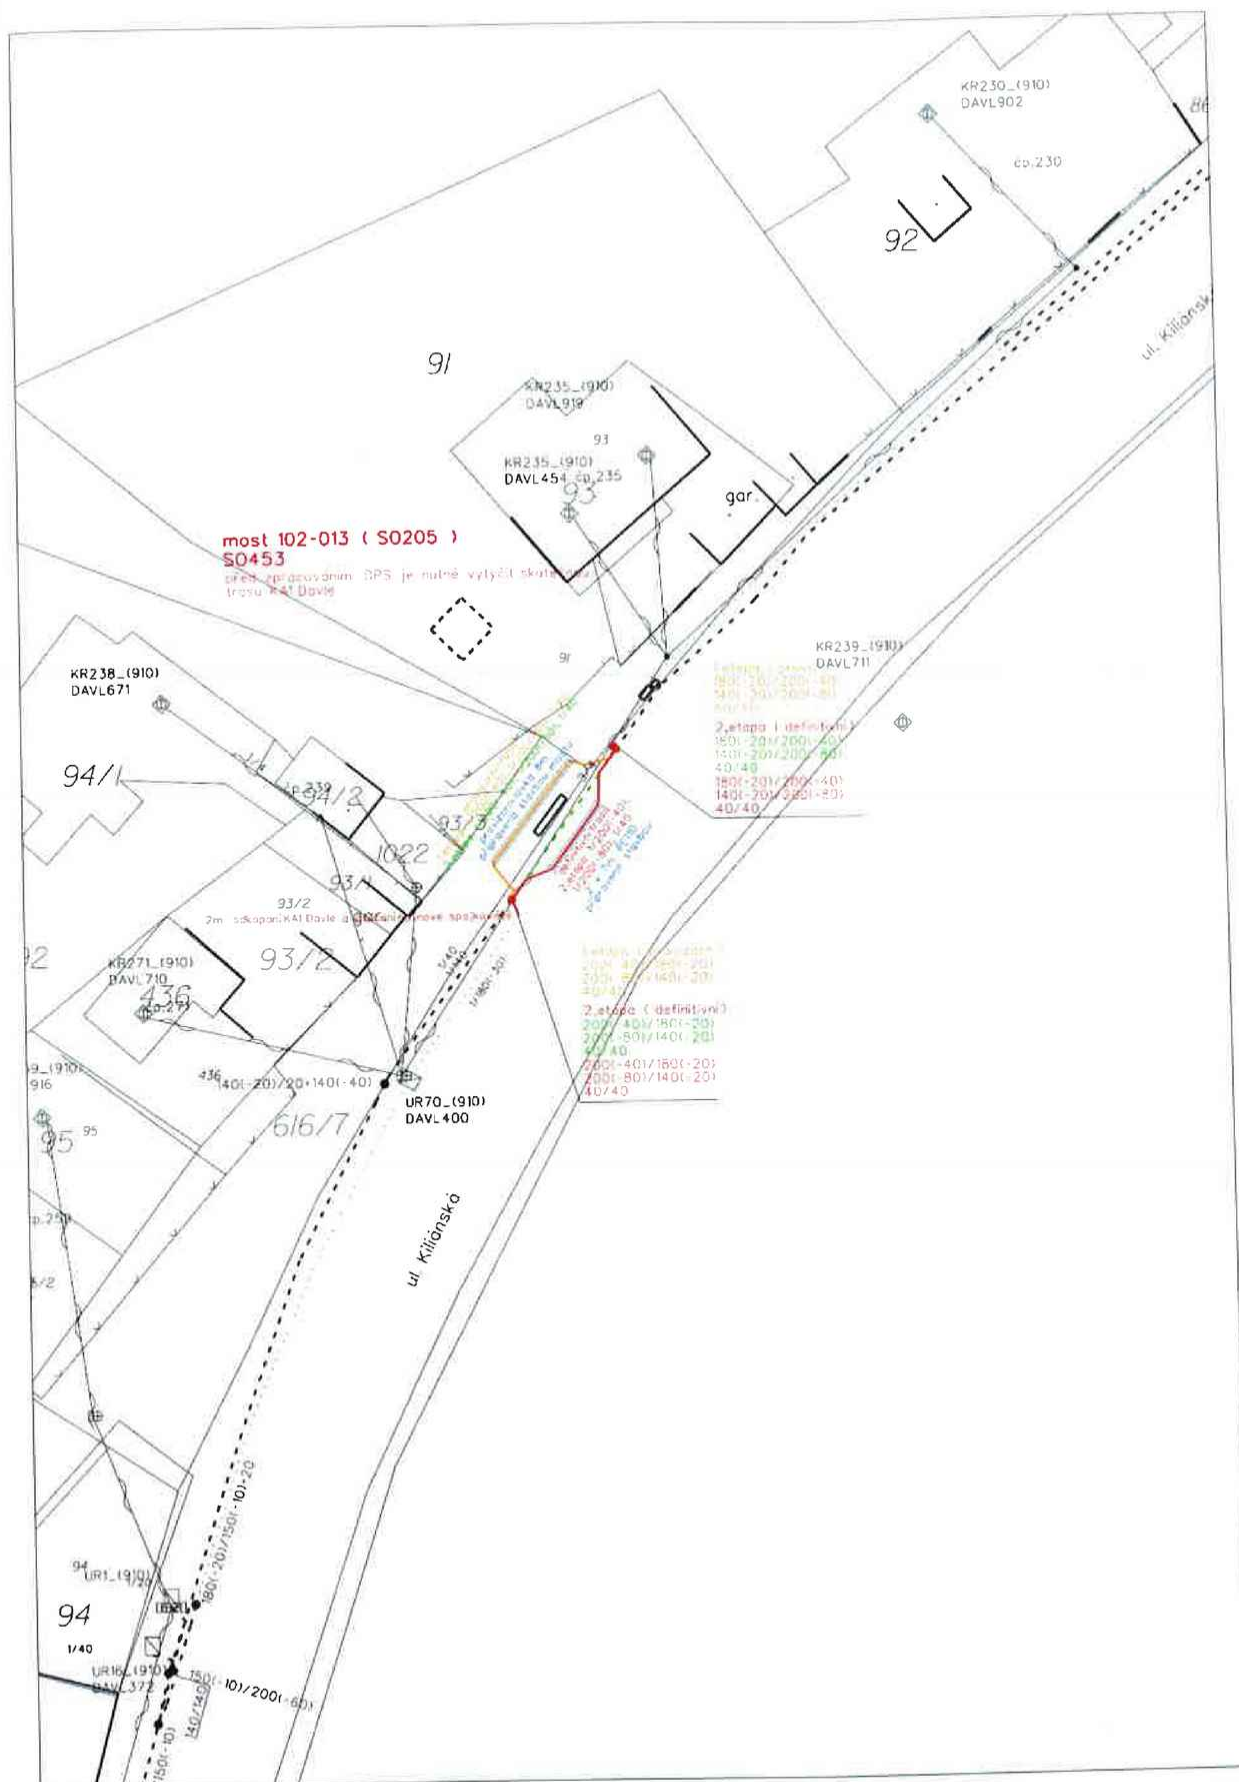

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: Západ - ARN/SIN - STAND. - 2017.
Položková 2017.12

Název stavby: VPI, II/102, Štěchovice, rekonstrukce - SO454
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: ARANEA Network,a.s.
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.023	KMP:	9.600	bytových HTS:
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.096	podnik. HTS:
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:
		KMTRU:	0.000	PP HR:
		KMOK:	0.000	PP UR:
		KMVL:	0.000	
		KMTRK:	0.000	

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.		
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb 0.000 km Předměstí
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.		
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb 0.000 km Předměstí
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.		
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb 0.000 km Předměstí
4: Do 1 tis. obyv.		
Chráněná přírodní úze	0.000 km	Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	3 600,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	9 855,80 Kč
MONTÁŽ	29 769,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	3 400,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 270,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 800,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	21 641,83 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 80 337,13 Kč


STAVEBNÍ ČINNOST	66 537,13 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	13 800,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S		Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	23.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	38.00 m
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks
MONTÁŽ			
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	30.00 m
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	9.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	186.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	6.00 ks
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	260.00 ks
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	4282.80 JV
955282 S		Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	8.00 ks
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	66.00 m
955630 S		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks
955066 S		Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	4.00 ks
955041 S		Zrušení úložných kabelů do 50 XN	94.00 m
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278		Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S		Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
955198 S		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	6800.00 JV
	náhrady		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	23.00 ks
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	23.00 m
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	40.00 m
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	48.00 m
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	48.00 m
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	52.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	8.00 ks
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	8.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný			
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mmx0,15mm černá	8.00 ks
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	8.00 ks

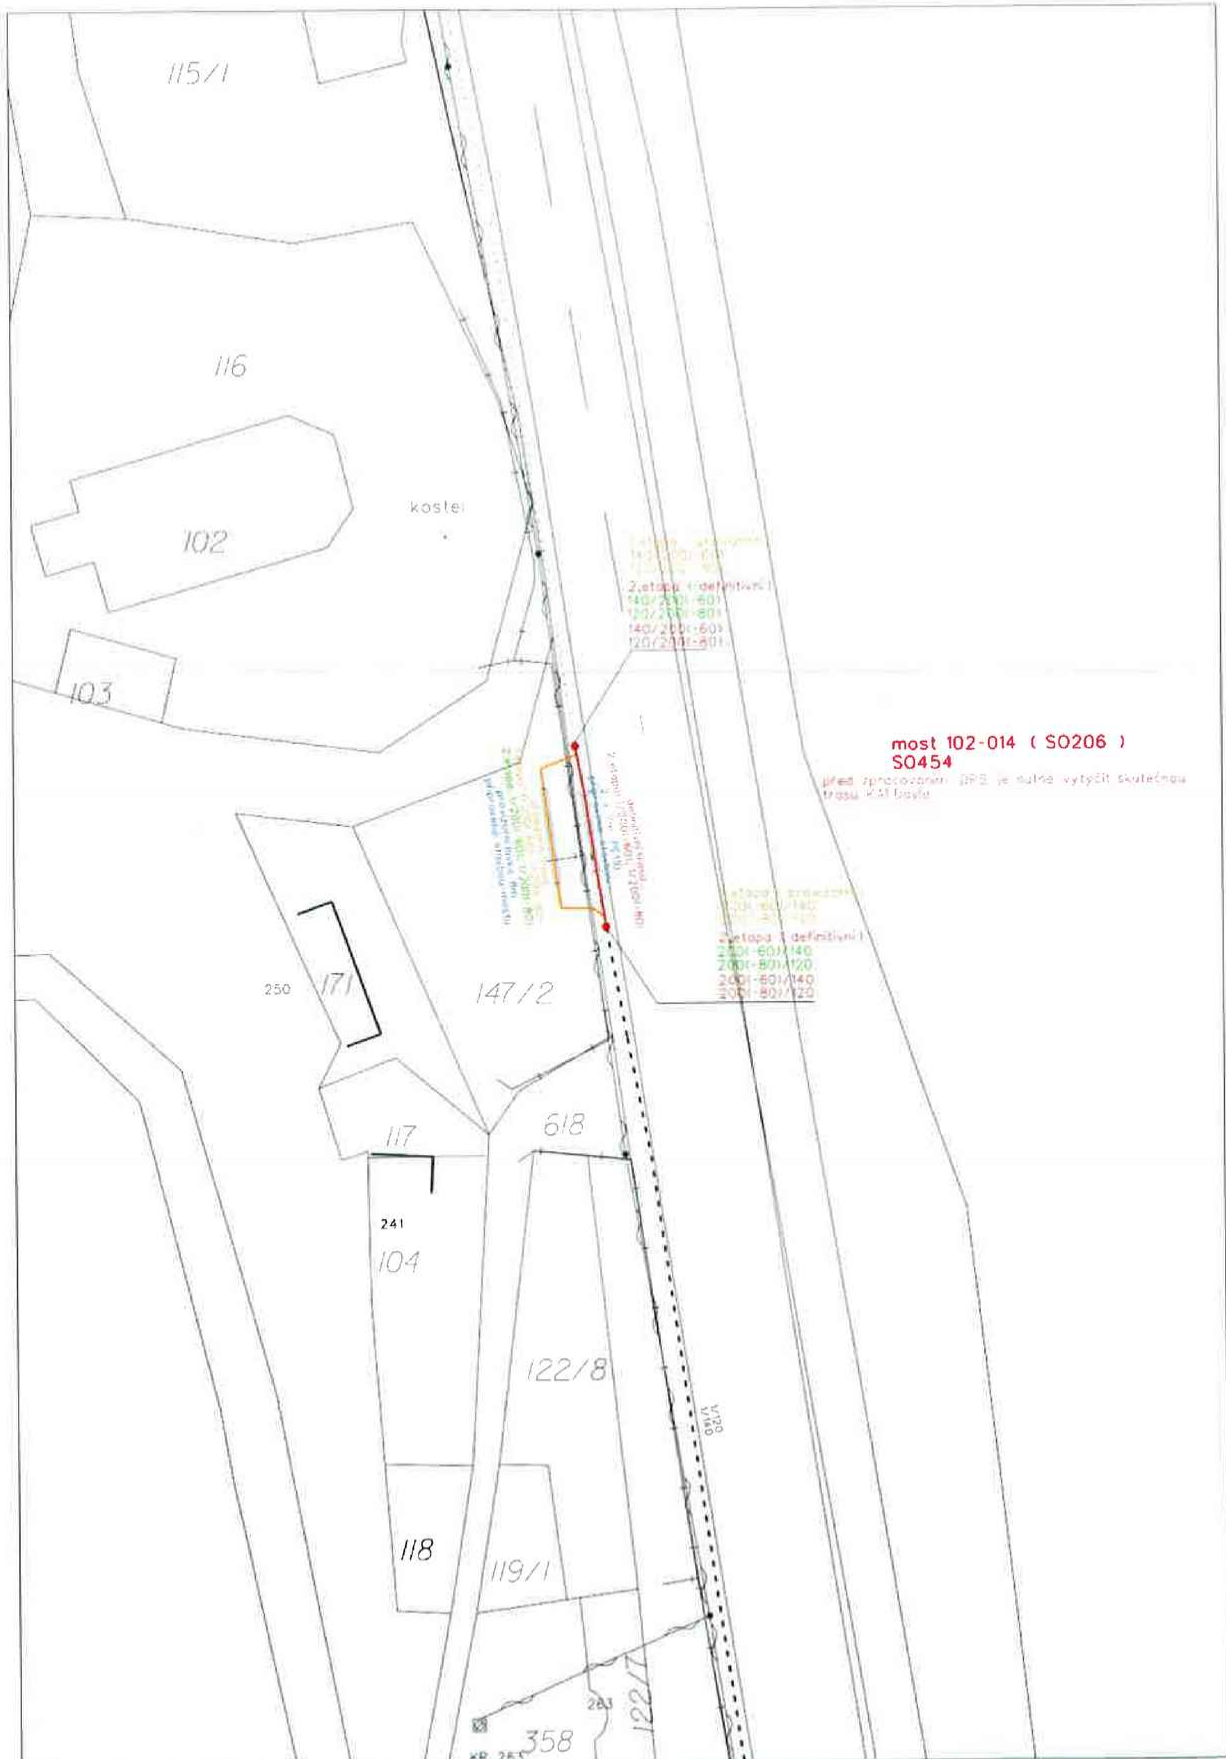

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Západ - ARN/SIN - STAND. - 2
Položková dat: 2017.12

Název stavby: VPI, II/102, Štěchovice, rekonstrukce - SO457

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	73 850,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	139 458,84 Kč
MONTÁŽ	259 163,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 580,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 416,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	70 766,50 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	257 776,07 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 818 715,82 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 665 815,44 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 152 900,38 Kč

Seznam položek


Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	22103.00 JV
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	11305.08 JV
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	31000.00 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	18.00 m
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	80.00 m
954973 S		Povrchy nad rámec litý asfalt	30.00 m2
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	40.00 m
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	42.00 m
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	89.00 m
954955 S		Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	12.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	280.00 m
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks
MONTÁŽ			
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	295.00 m
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	726.00 m
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) -	72.00 ks
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - st	72.00 ks
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	37.00 ks

952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	633.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	24.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	960.00 ks
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks
955288 S	Montáž koncovky SKH	3.00 ks
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	8521.78 JV
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	14.00 ks
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	8.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	276.00 m
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	312.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	135.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	308.00 m
958557 S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropoli	72.00 ks
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	18600.00 JV
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1260.00 m
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	12.00 ks
955067 S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	4.00 ks
955075 S	Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb	5.00 ks
955012 S	Zrušení úložné trubky	267.00 m
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	208.00 m
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	501.00 m
955040 S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	413.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	28.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	52.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	64200.00 JV
	náhrady	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		131.00 ks

303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	183.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	230.00 m
300218 S	Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu	565.00 m
300110 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	214.00 m
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	208.00 m
300128 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,8	212.00 m
300129 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	208.00 m
300130 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	208.00 m
400299 S	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	72.00 ks
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	1.00 ks
316541 S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	1.00 ks
316547 S	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	2.00 ks
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	4.00 ks
321714 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	1.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	16.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	192.00 ks
323051 S	Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm	24.00 ks
313249 S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	2.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L	22.00 ks
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	8.00 ks
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	14.00 ks
306732 S	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	1.00 ks
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	8.00 ks
300032 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	152.00 m
300031 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -černý pruh	62.00 m
300033 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -červený pruh	62.00 m
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	14.00 ks
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	3.00 ks
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	3.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	22.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	22.00 ks

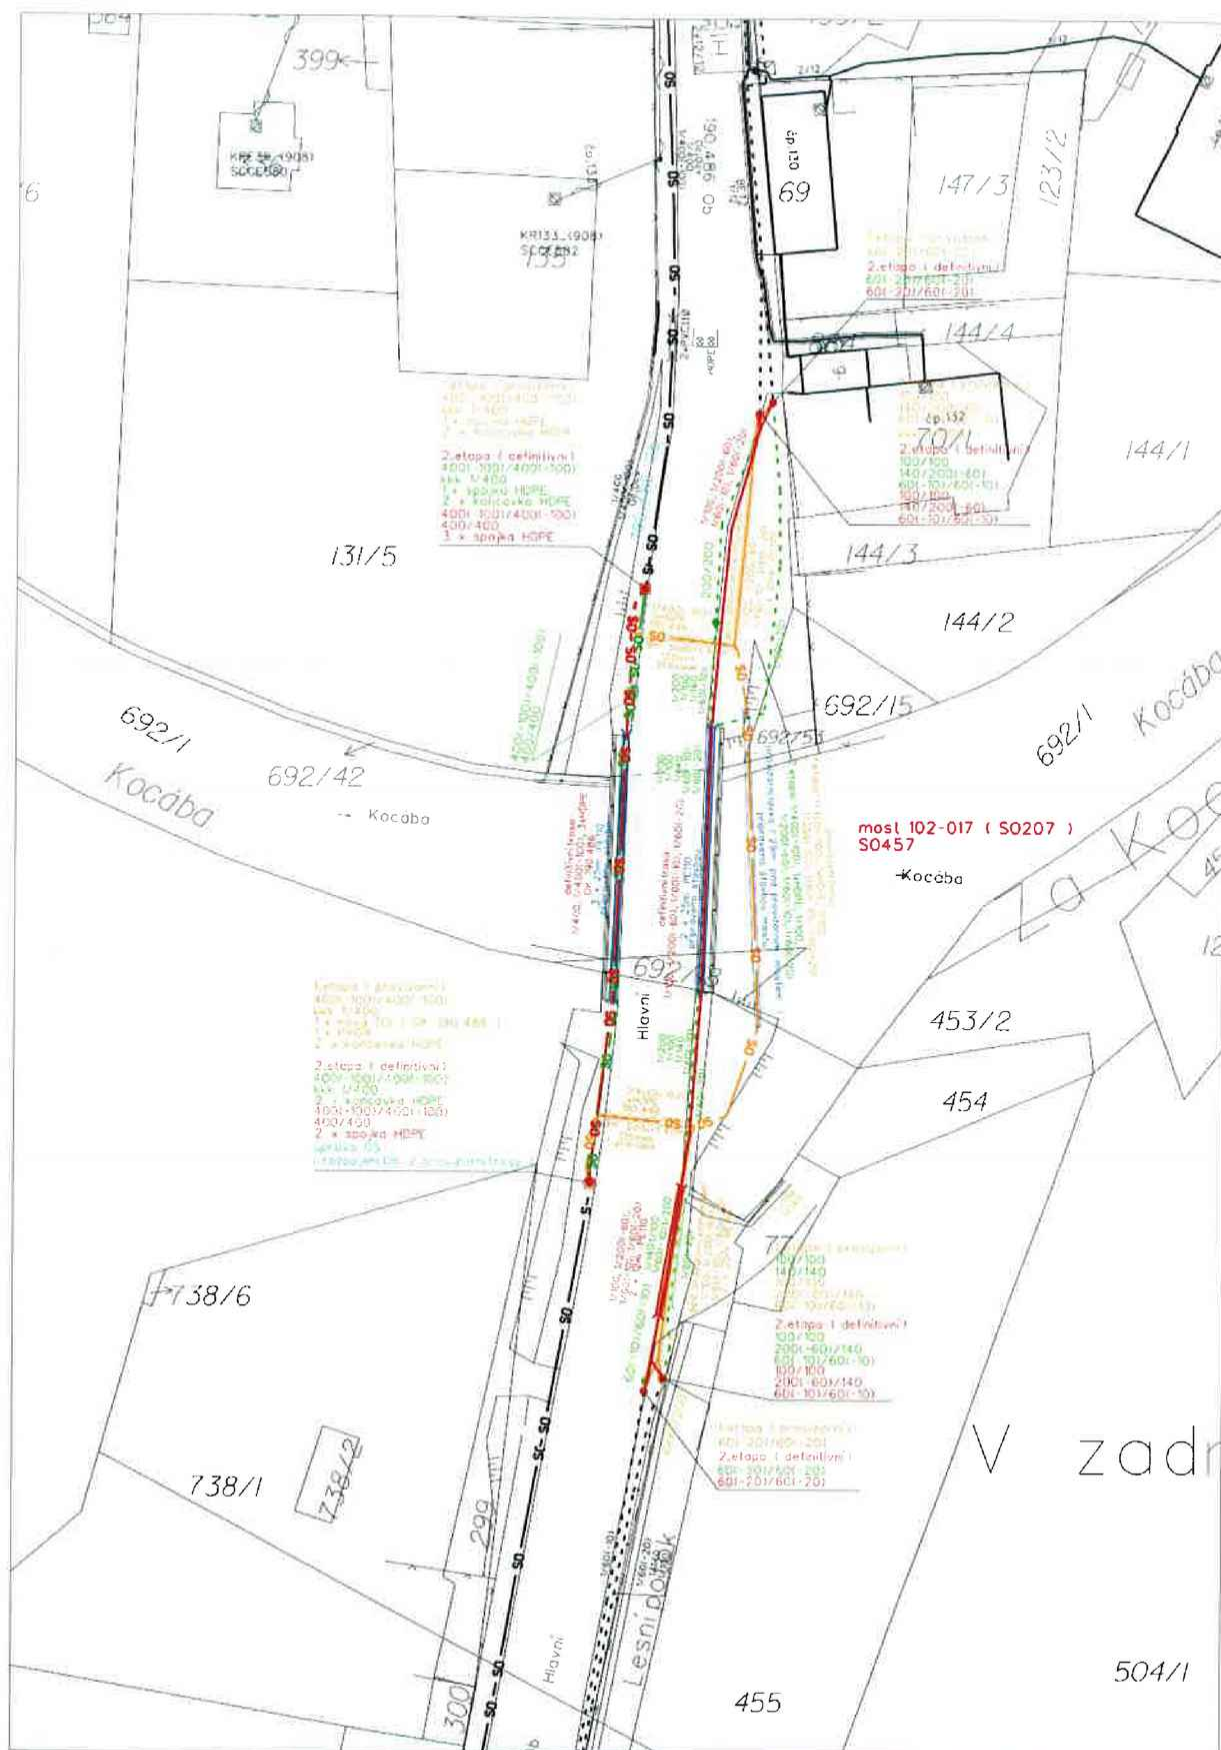

Příloha č. 3 - Usnesení č. 016-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014

USNESENÍ č. 016-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014

Zplnomocnění Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje k podpisu smluv nutných k realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje
Tisk č. 0448(2014)

Zastupitelstvo kraje po projednání

I. z m o c ň u j e

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje uzavírat a podepisovat smlouvy v rozsahu nutném pro investorskou přípravu staveb zahrnující výkon inženýrské činnosti vedoucí ke zlepšení stavebně-technického stavu silničního majetku ve vlastnictví kraje

- a) smlouvy s vlastníkem nemovitostí o právu provést stavbu na jeho pozemku
- b) smlouvy o výpůjčce
- c) smlouvy o zřízení služebnosti
- d) smlouvy o nájmu nemovitostí

II. u k l á d á

řediteli KSUS Bc. Zdeňku Dvořákovi zajistit, aby bylo ve smlouvách uvedeno určení kupní ceny pozemků u trvalých záborů znaleckým posudkem jako ceny v místě a čase obvyklé.

III. z m o c ň u j e

ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Bc. Zdeňka Dvořáka, k podpisu těchto smluv.

Toto Usnesení Zastupitelstva je dostupné na internetových stránkách Středočeského kraje na odkaze: <http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/usneseni-zastupitelstva>.

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto potvrzuje, že její zaměstnanec pan

k tomu, aby za Společnost.

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:


- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 2.2.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 2.2.2018



Ověření – legalizace

