

Číslo smlouvy vlastníka 50N10DSW/209/2016
CB 2016_0047
Číslo smlouvy stavebníka 010/16/168/03/00

SRM 8020003961



KUJCP019PYQN

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2106_0047

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená [REDAKCE], Manažerem, Výstavba fix dle Pověření ze dne 1.8.2016

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Jihočeský kraj

Se sídlem:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Zastoupený:

Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Č. Budějovice

Číslo účtu:

199783072/0300

Podpis smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0047
Číslo smlouvy stavebníka 010/16/168/03/00

SRM 8020003961

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne **29.9.2015** pod č. **699595/15** vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

VPI Rek sil III/1631 N.Pec-Z.Zvonková, 1.etapa (km 7,580 – kříž v km 12,530)

Název stavby dle stavebníka :

Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1.etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530) (okr. CK, PT)

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK **VPI Rek sil III/1631 N.Pec-Z.Zvonková, 1.etapa (km 7,580 – kříž v km 12,530)**, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložné SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

VPI Rek sil III/1631 N.Pec-Z.Zvonková, 1.etapa (km 7,580 – kříž v km 12,530)

2 z 8

- před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
- zajistit nezbytné geometrické plány služebnosti inženýrské sítě a vložení služebnosti inženýrské sítě na příslušné pracoviště Katastrálního úřadu.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- zajistit koordinaci prací
- oznámit společnosti CETIN nejpozději do 30 dnů před realizací Překládky stavební připravenost zaměstnanci, který je určen pro dohled investiční zakázky.- [REDACTED]
- Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby **Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1.etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530) (okr. CK, PT)**, č.j. HP-1550/2013 ze dne 29.5.2013, a to toliko práva k umístění resp. Přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN Czech Republic, a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v **koordinaci se Stavebníkem do 30.9.2018** a to za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí

uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí 275 735,00 Kč (bez DPH).

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace Překládky (dále jen Projekt“) na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační),

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN písemně oznámí do 2 měsíců od získání pravomocného ÚR Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o

omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),

- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vážnucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

6.2 Daňový doklad dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystaven do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho vystavení.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností CETIN stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: [redacted] funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [redacted] tel. [redacted]

ve věcech technických: [redacted] funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [redacted] tel. [redacted]

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Klása funkce : vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje
e-mail: klasa@kraj-jihocesky.cz tel.: [redacted] fax.: [redacted]

ve věcech technických: Jaroslav Mrázek funkce : technik ODSH
e-mail: [redacted] tel.: [redacted] fax.: [redacted]

Čl. 9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník smlouvu podstatným způsobem a společnost CETIN je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení.

9.2 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.3 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či



Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0047
Číslo smlouvy stavebníka 010/16/168/03/00

SRM 8020003961

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. Územní rozhodnutí - HP-1550/2013 ze dne 29.5.2013 , str1
4. Pověření fa CETIN


V Praze dne 4.10.2016


V Českých Budějovicích dne 25.10.2016


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Manažer, Výstavba fix

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2601/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
219



Jihočeský kraj
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje





VPI Rek sil III/1631 N.Pec-Z.Zvonková, 1.etapa (km 7,580 – křiž v km 12,530)

8-8

Přehledová mapa

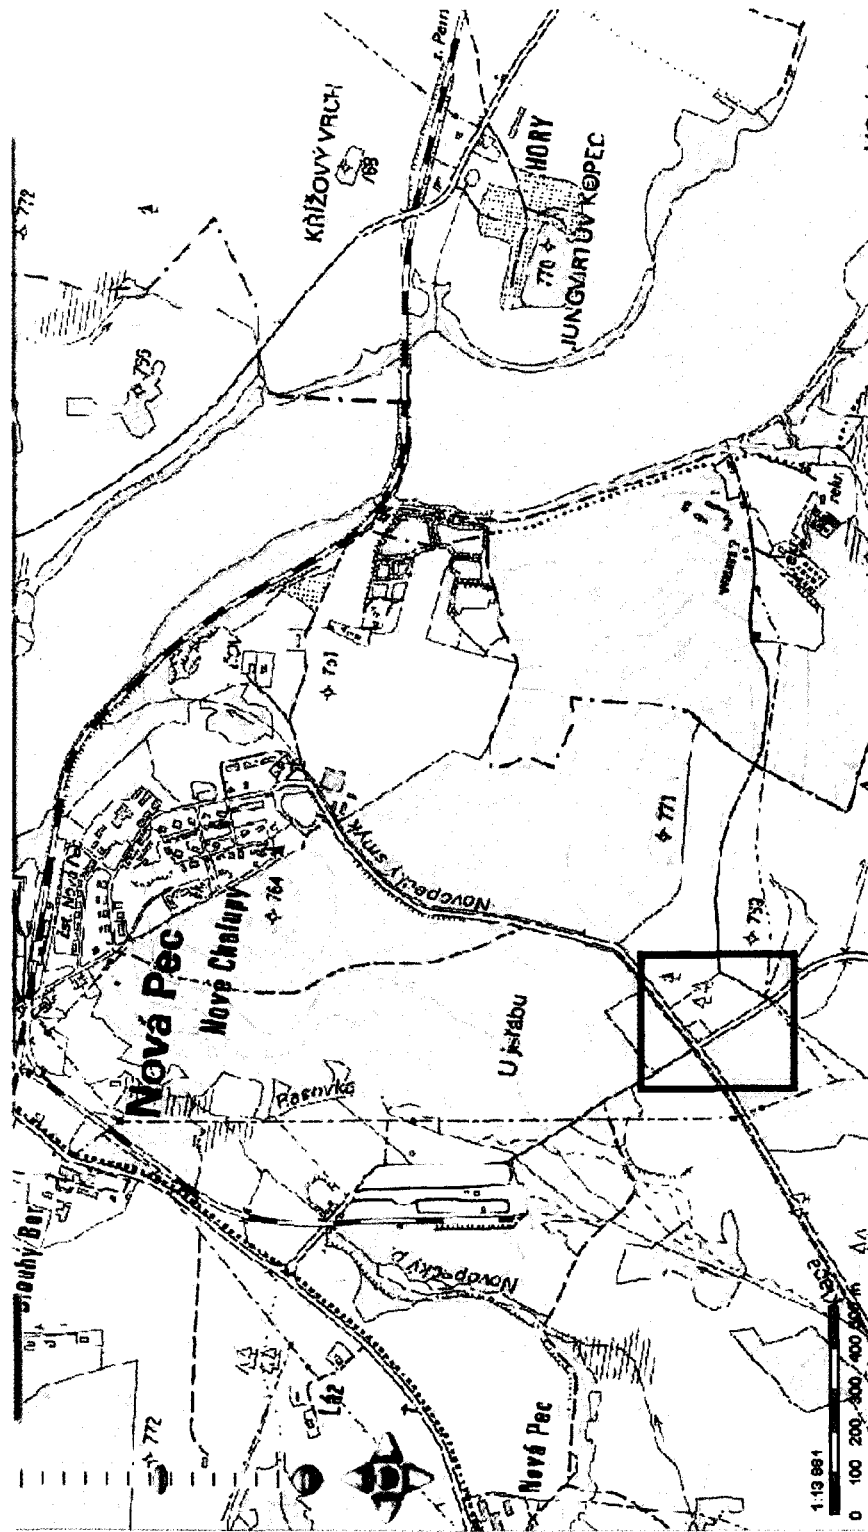

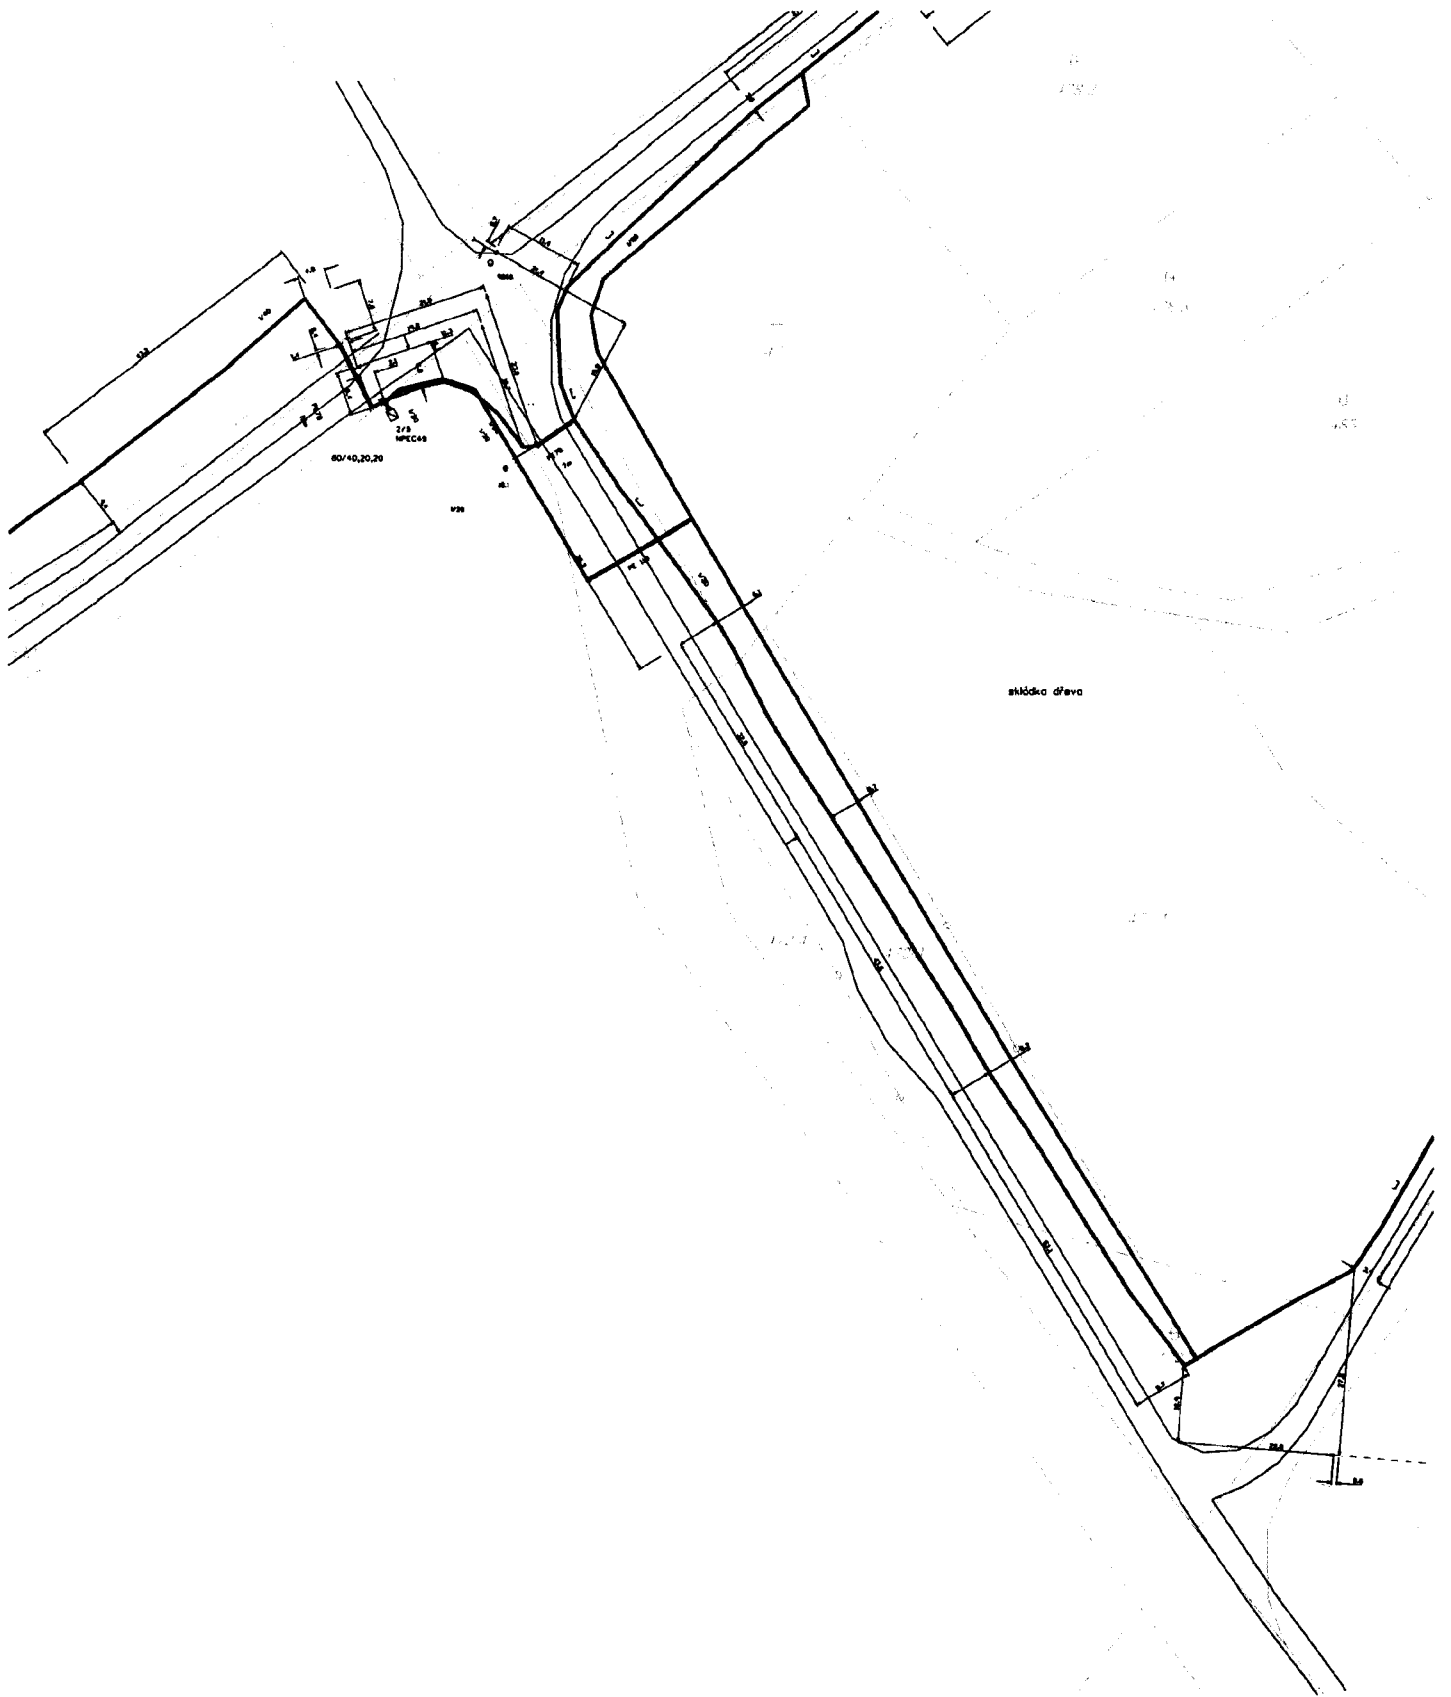

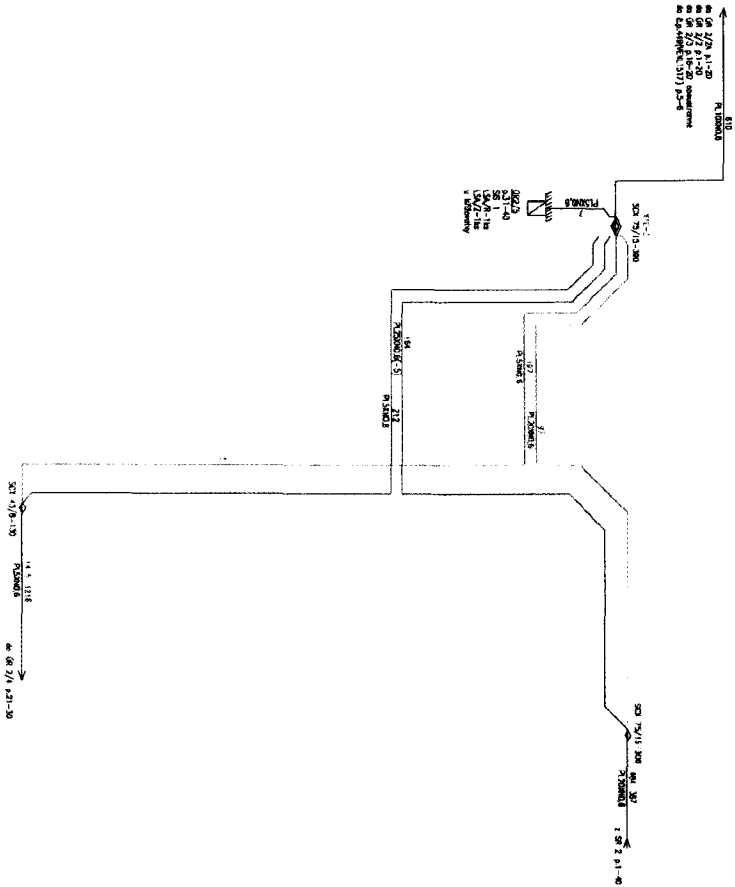

D

Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: BPV

Adresa: Čestá Budějovice - Ochotovo 726/50, 370 01 Čestá Budějovice - Tel: 386 303 211, Fax: 386 303 212, e-mail: mauboucka@pragoprojekt.cz
 Hlavní inženýr projektu: Radislav Soukup, Čestá Budějovice
 Ing. Zdeněk TRAVNÍČEK
 Inženýr koordinátor projektu: Ing. Karel BERTZAL
 Ing. Zdeněk TRAVNÍČEK
 PRAGOPROJEKT s.r.o., K Údolní 1868/16, 142 54 Praha 4
 projektov:

Osobní údaje:	Josef Chrt - INTEGREL, Josef Chrt OS.Š., Katedr. 400/12, 573 71 Roudnice - Tel: 775 671 960, e-mail: chr.josef@volny.cz	Zodpovědný projektant: Josef Chrt - INTEGREL, Josef Chrt OS.Š., Katedr. 400/12, 573 71 Roudnice
Hlavní inženýr projektu:	Josef Chrt, OS.Š.	Radislav Soukup, Čestá Budějovice
Podpora:	Josef Chrt, OS.Š.	Josef Chrt, OS.Š.
Technický kontrola:	Josef Chrt, OS.Š.	Josef Chrt, OS.Š.
Číslo zakázky:		

Kraj:	JIHODĚSKÝ	Čís. zakázky:	11-472-0-000
Okres:	HORNÍ PLÁNĚ, NOVÁ PĚC	Čís. okce:	04-001
Investor:	JIHODĚSKÝ KRAJ, U ZIMNÍHO STADIONU 1352/2, 370 76 Č. BUDĚJOVICE	Datum:	06/2012
Aut.:	Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Blížší Lhota km 7,580-krizovatka v km 12,530) VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	Forma:	ZYK4
Objekt:		Metriky:	
Průhon:	SCHEMA ZAPOJENÍ	Stupeň:	Souhrnný
		Čís. přílohy:	D 8.3

Název stavby: VPI kř III-1631 N.Pec-Bliž.Lhota,km12,3

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: ARANEA NETWORK a.s., [REDACTED]

KPO:

HOST: Prachatice

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.302	KMP:	10.320	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.376	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	20 684 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	168 687 Kč
MONTÁŽ	20 622 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 760 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 348 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 703 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 567 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	36 364 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 275 735 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 238 021 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 37 714 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	16240.28 JV	16 240 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	25.00 m	62 487 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	62.00 m	27 091 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	190.00 m	53 189 Kč
954956 S		Rýha vjezd kostky 35/70-90	25.00 m	17 928 Kč
954966 S		Rýha vjezd kostky 35/70-90rozš. o 10 cm	25.00 m	5 123 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice, železnice	287.00 m	2 870 Kč

Název stavby: VPI kř III-1631 N.Pec-Bliž.Lhota,km12,3

MONTÁŽ

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	254 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	28.00 ks	819 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	55.00 ks	1 344 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 730 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	926 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	212.00 m	3 506 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	164.00 m	3 360 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	644 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	197.00 m	2 701 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	197.00 m	2 116 Kč

GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	187.00 m	2 564 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 197 Kč

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	187.00 m	2 171 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 197 Kč
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	5 980 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 703 Kč
--------	--------------------------	---------	----------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	3 555 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 012 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	252.00 ks	9 233 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	277.00 m	1 180 Kč
300120 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	164.00 m	13 935 Kč
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	212.00 m	5 463 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks	1 184 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	11.00 ks	323 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-55-43/8-75/15	1.00 ks	149 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	419 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 462 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	4.00 ks	3 014 Kč



Městský úřad Horní Planá

Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail: stavebniurad@horniplana.cz


Spis. zn.: Výst./1236/13-Ra

Cj: HP - 1550/2013

Vyřizuje: [redacted]

Dne: 29.5.2013

*Město planá má
dne 4. 4. 2013*



**ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

Výroková část:

Městský úřad, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.4.2013 podal

Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 26 České Budějovice, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická č.p. 2133/10, 370 10 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby


Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa Bližší Lhota km 7,580 - křižovatka v km 12,530

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 709/1 (lesní pozemek), parc. č. 709/4 (lesní pozemek), parc. č. 709/5 (lesní pozemek), parc. č. 709/6 (ostatní plocha), parc. č. 709/8 (lesní pozemek), parc. č. 709/9 (lesní pozemek), parc. č. 709/10 (lesní pozemek), parc. č. 709/11 (lesní pozemek), parc. č. 709/12 (lesní pozemek), parc. č. 759/10 (ostatní plocha), parc. č. 759/11 (ostatní plocha), parc. č. 759/19 (lesní pozemek), parc. č. 759/37 (ostatní plocha), parc. č. 759/51 (lesní pozemek), parc. č. 759/316 (ostatní plocha), parc. č. 759/326 (ostatní plocha), parc. č. 1280/1 (lesní pozemek), parc. č. 1629/1 (lesní pozemek), parc. č. 1629/2 (orná půda), parc. č. 1629/4 (lesní pozemek), parc. č. 1629/5 (lesní pozemek), parc. č. 1630 (ostatní plocha), parc. č. 1631 (lesní pozemek), parc. č. 1632/3 (orná půda) v katastrálním území Zvonková

a na pozemcích parc. č. 453/2 (trvalý travní porost), parc. č. 456/1 (trvalý travní porost), parc. č. 464 (trvalý travní porost), parc. č. 467 (trvalý travní porost), parc. č. 470 (ostatní plocha), parc. č. 472/1 (orná půda), parc. č. 472/2 (ostatní plocha), parc. č. 477 (ostatní plocha), parc. č. 532 (ostatní plocha), parc. č. 533 (ostatní plocha), parc. č. 536 (trvalý travní porost), parc. č. 537 (trvalý travní porost), parc. č. 538 (lesní pozemek), parc. č. 546/1 (trvalý travní porost), parc. č. 548 (ostatní plocha), parc. č. 549/1 (trvalý travní porost), parc. č. 549/2 (trvalý travní porost), parc. č. 551 (lesní pozemek) v katastrálním území Nová Pec.

Druh a účel umísťované stavby:

- Účelem rekonstrukce silnice III/1631 a dalších navazujících úseků „Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková“ je odstranění havarijního stavu komunikace a dvou stávajících mostů přes vodoteče, úprava parametrů silnice na kategorii S 6,5/50 a především nutnost zvýšení bezpečnosti silničního



Evidenční číslo: PŘ/700/2016

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana



k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze sps. zn. B 20623

www.cetin.cz

s vystavením souhlasí: Petr Gazda, ředitel, Přístupová síť

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.7.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 1.8.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



předseda představenstva



místopředseda představenstva

