

SON/ODSH/208/2016

Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0038 SRM 8020003122

Číslo smlouvy stavebníka 010/16/155/03/00



KUJCP019PYRI

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2016_0038

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená ing. Petrem Gazdou, Ředitelem, Přístupová síť dle Pověření ze dne 16.2.2016

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Jihočeský kraj

Se sídlem : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76

zastoupený : Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje

IČ : 70890650

DIČ : CZ70890650

Bankovní spojení : ČSOB a.s., Č. Budějovice

Číslo účtu : 199783072/0300

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

VPI Němčice (PT) obchvat, přeložení SEK

1 z 7

Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0038
Číslo smlouvy stavebníka 010/16/155/03/00

SRM 8020003122

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

VPI Němčice (PT) obchvat, přeložení SEK

Překládka SEK je realizována v rámci akce s názvem dle stavebníka:

„Jižní obchvat Němčic, silnice II/145“

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

- 3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebně technickém) a na nemovitostech dle předložené CTN VPI Němčice (PT) obchvat, přeložení SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
 - zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva (to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje
 - před realizací Překládky:
 - zajistit vyhotovení Projektu

VPI Němčice (PT) obchvat, přeložení SEK

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.
- po realizaci Překládky:
 - zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky
 - zajistit nezbytné geometrické plány věcných břemen a vložení břemen na příslušné pracoviště Katastrálního úřadu.
- 4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje
 - před realizací Překládky:
 - zajistit koordinaci prací na staveništi oznámit společnosti CETIN nejpozději do 30 dnů před realizací Překládky stavební připravenost překládky zaměstnanci, který je určen pro dohled investiční zakázky - Josef Filípek, 602 109 715.
- 4.3 Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí: Č.j.: 387/2016/328/017/030 ze dne 30. 3. 2016 a to toliko práva k umístění resp. přeložení kabelů veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí. V případě, že trasa projednaná investorem dozná určitých změn, bude nutné požádat o vydání nového územního rozhodnutí.
- 4.4 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 31. 12. 2017 a to za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.5 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.6 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.
- 4.7 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

- 4.8 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

- 5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této smlouvy činí 212 618,00 Kč (bez DPH). Překládka na základě zákona č. 127/2005Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty .
- 5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.
- 5.4 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.
- 5.5 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vážnouch na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,

Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0038
Číslo smlouvy stavebníka 010/16/155/03/00

SRM 8020003122

- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
- 6.2 Daňový doklad dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystaven do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. IV bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě jeho splatnosti.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7

Sankce

- 7.1 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.3 Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.4 Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3 tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

VPI Němčice (PT) obchvat, přeložení SEK

5 z 7

Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních a technických: Josef Filípek, funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy
e-mail: josef.filipek@cetin.cz tel. 602 109 715

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

ve věcech technických: Mgr. Andrea Tetourová, ODSH Krajského úřadu - Jihočeského kraje
e-mail: tetourova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 132

Čl. 9

Odstoupení od smlouvy

NEPOUŽÍJE SE

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

- 10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do tří let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí tří let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.
- 10.2 Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.
- 11.2 Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 11.3 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
- 11.4 Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.
- 11.5 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.6 Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.7 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této

- smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.8 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
- 11.9 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.10 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 11.11 Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
- 11.12 Vlastník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.13 Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.
- 11.14 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy:

1. Cenový a technický návrh přeložky
2. Specifikace přeložky
3. Pověření CETIN – Ing. Gazda

V Praze dne 4. 10. 2016

V Českých Budějovicích dne 1. 11. 2016


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
219

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Petr Gazda
Ředitel, Přístupová síť


Stavebník
Mgr. Jiří Zimola
hejtmán Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ
(2)
KRAJ


[Handwritten signature]

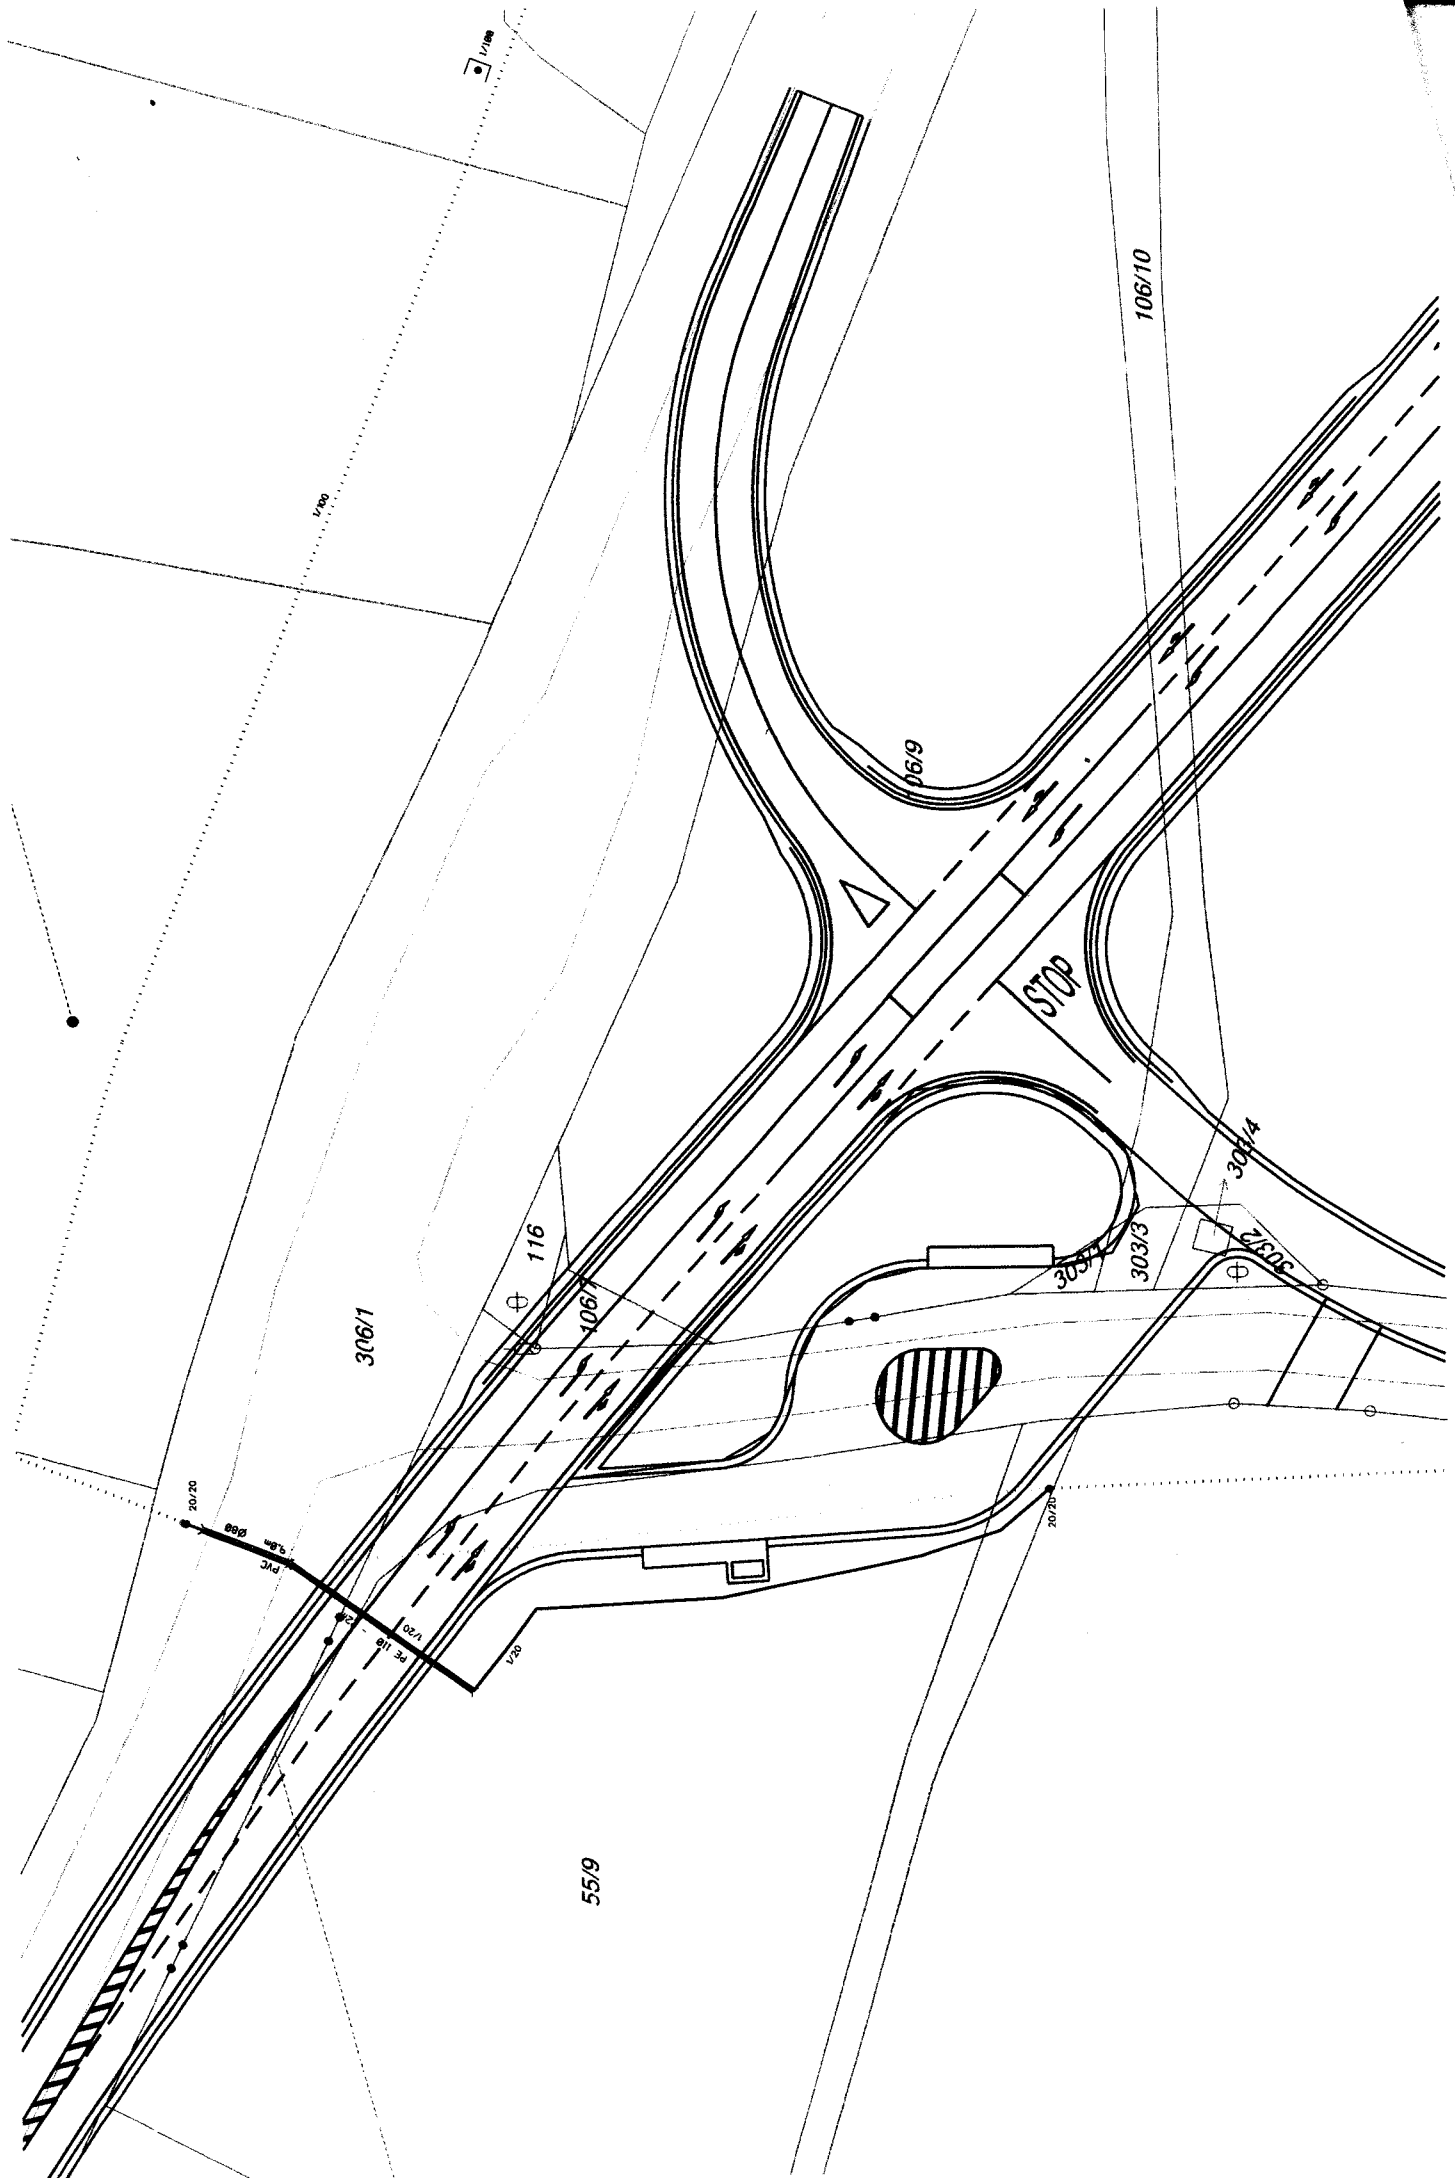



Za humny

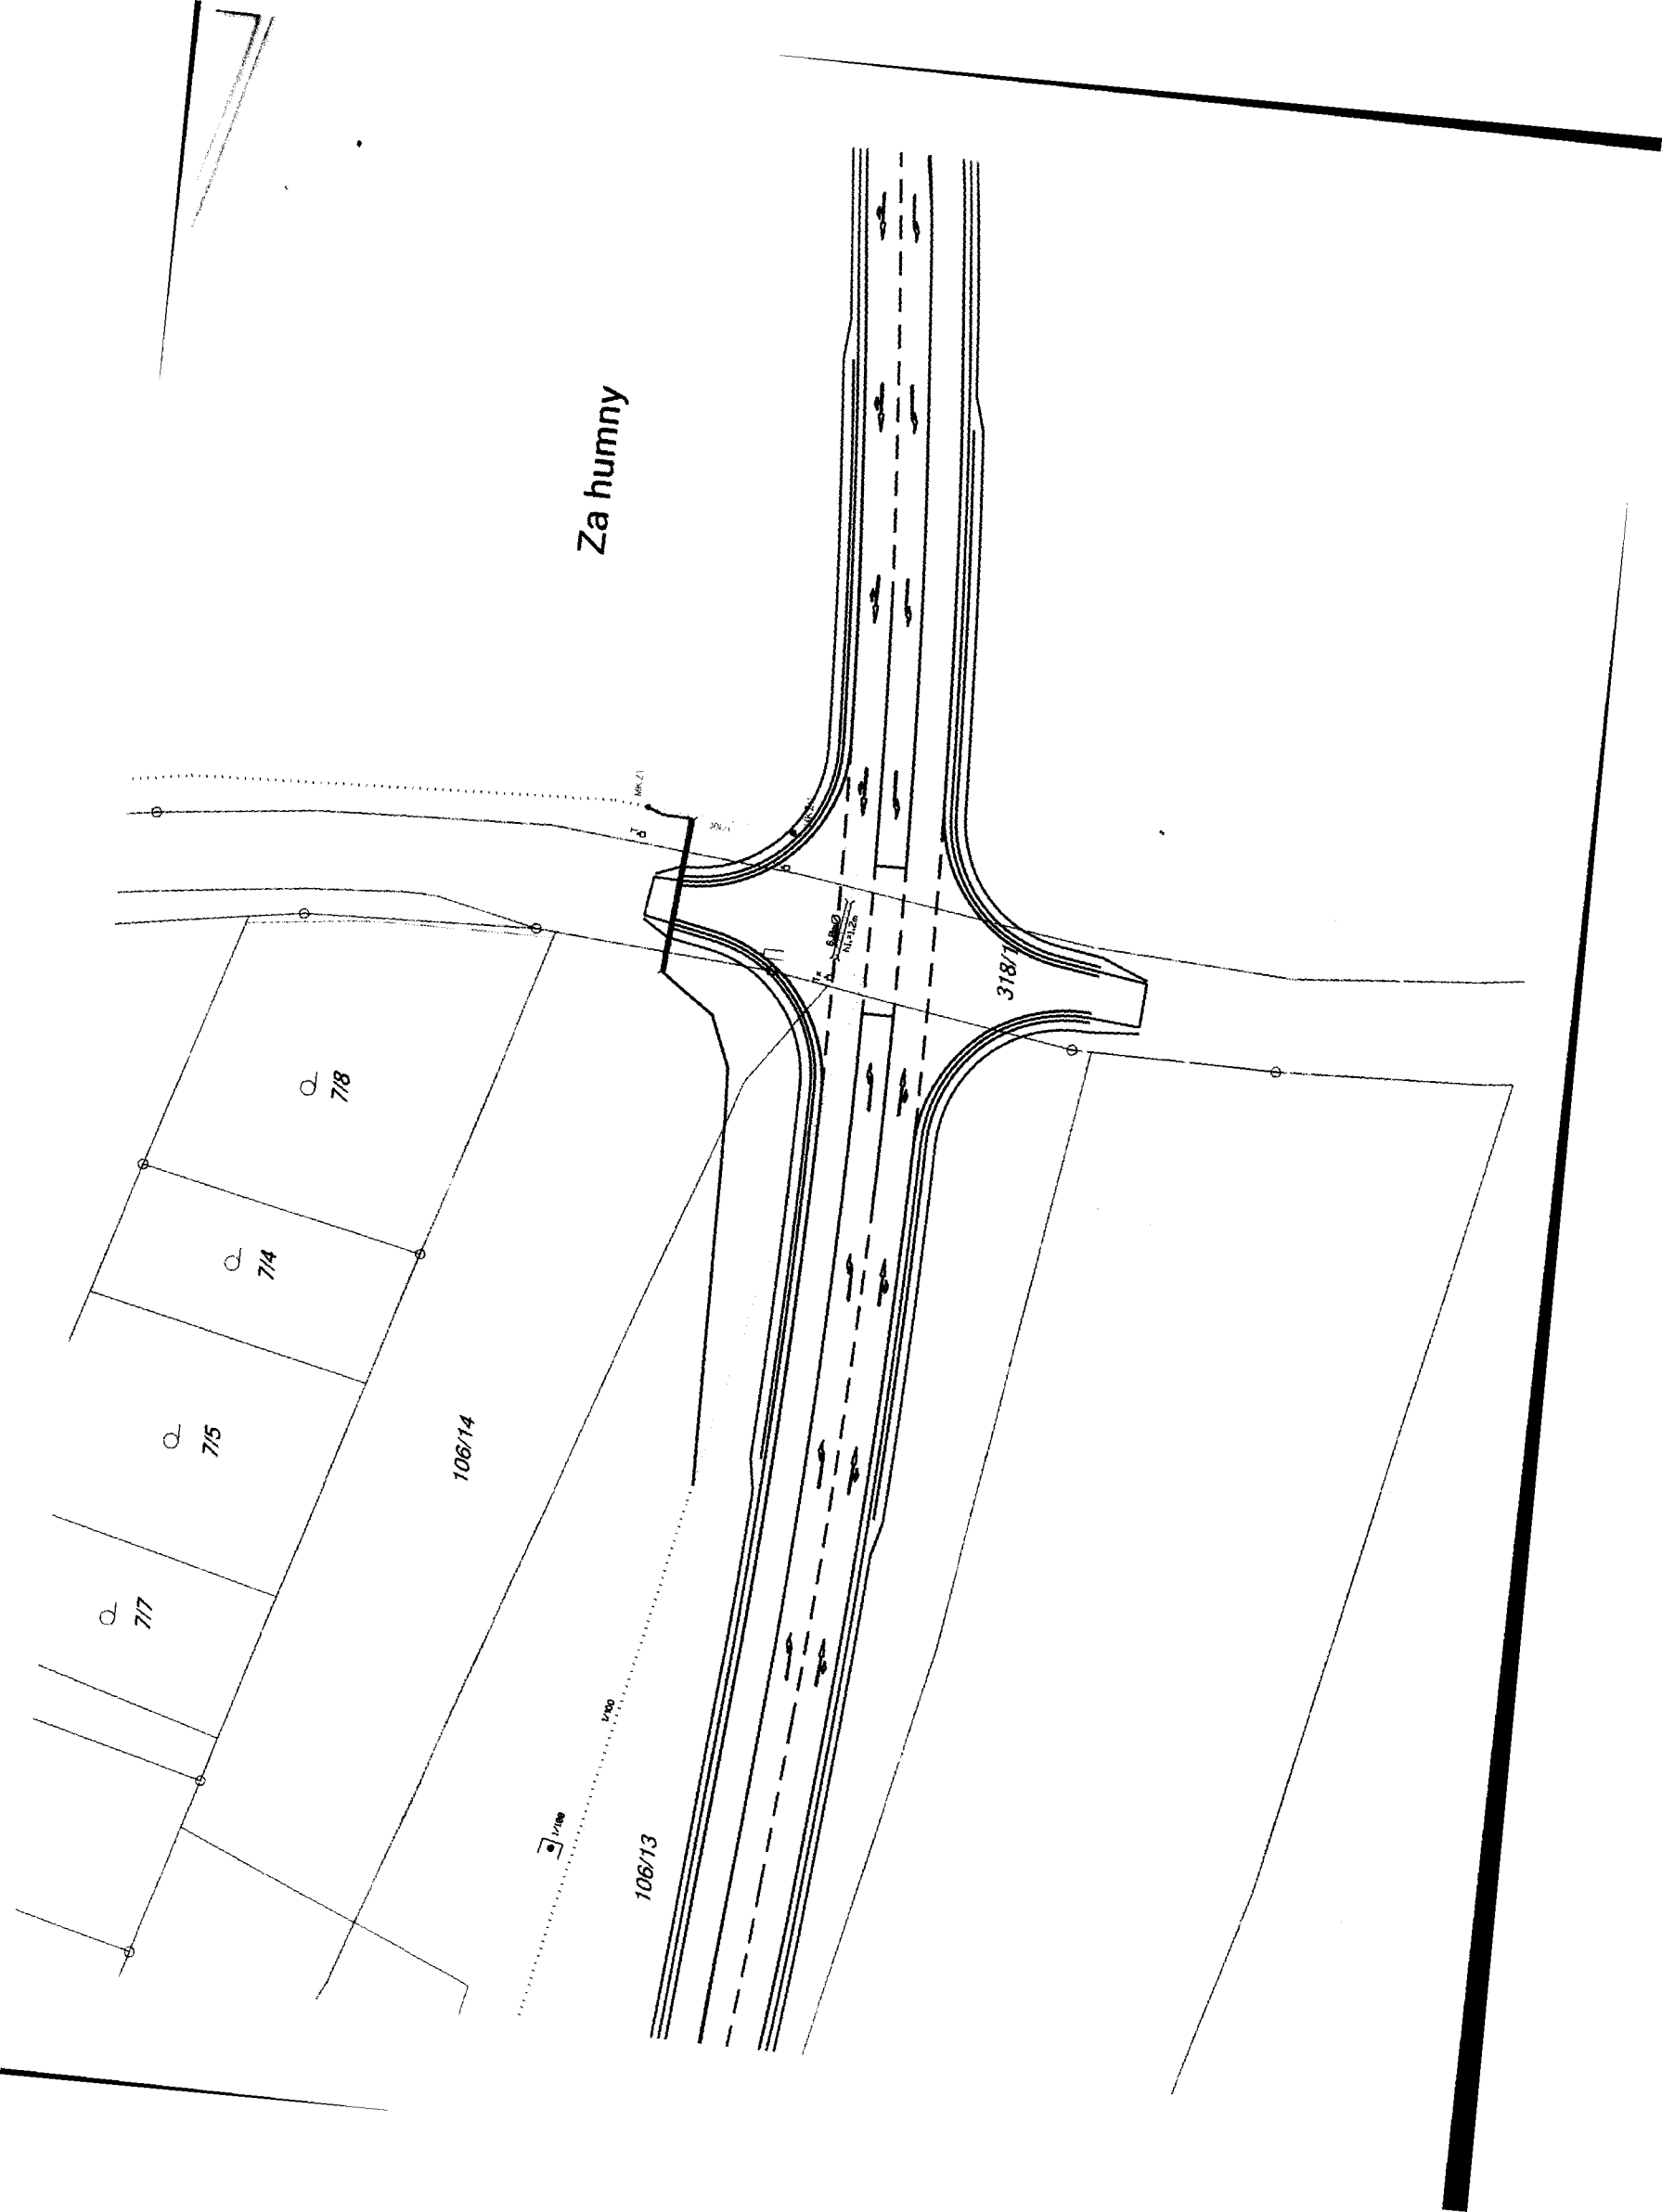

Za humny

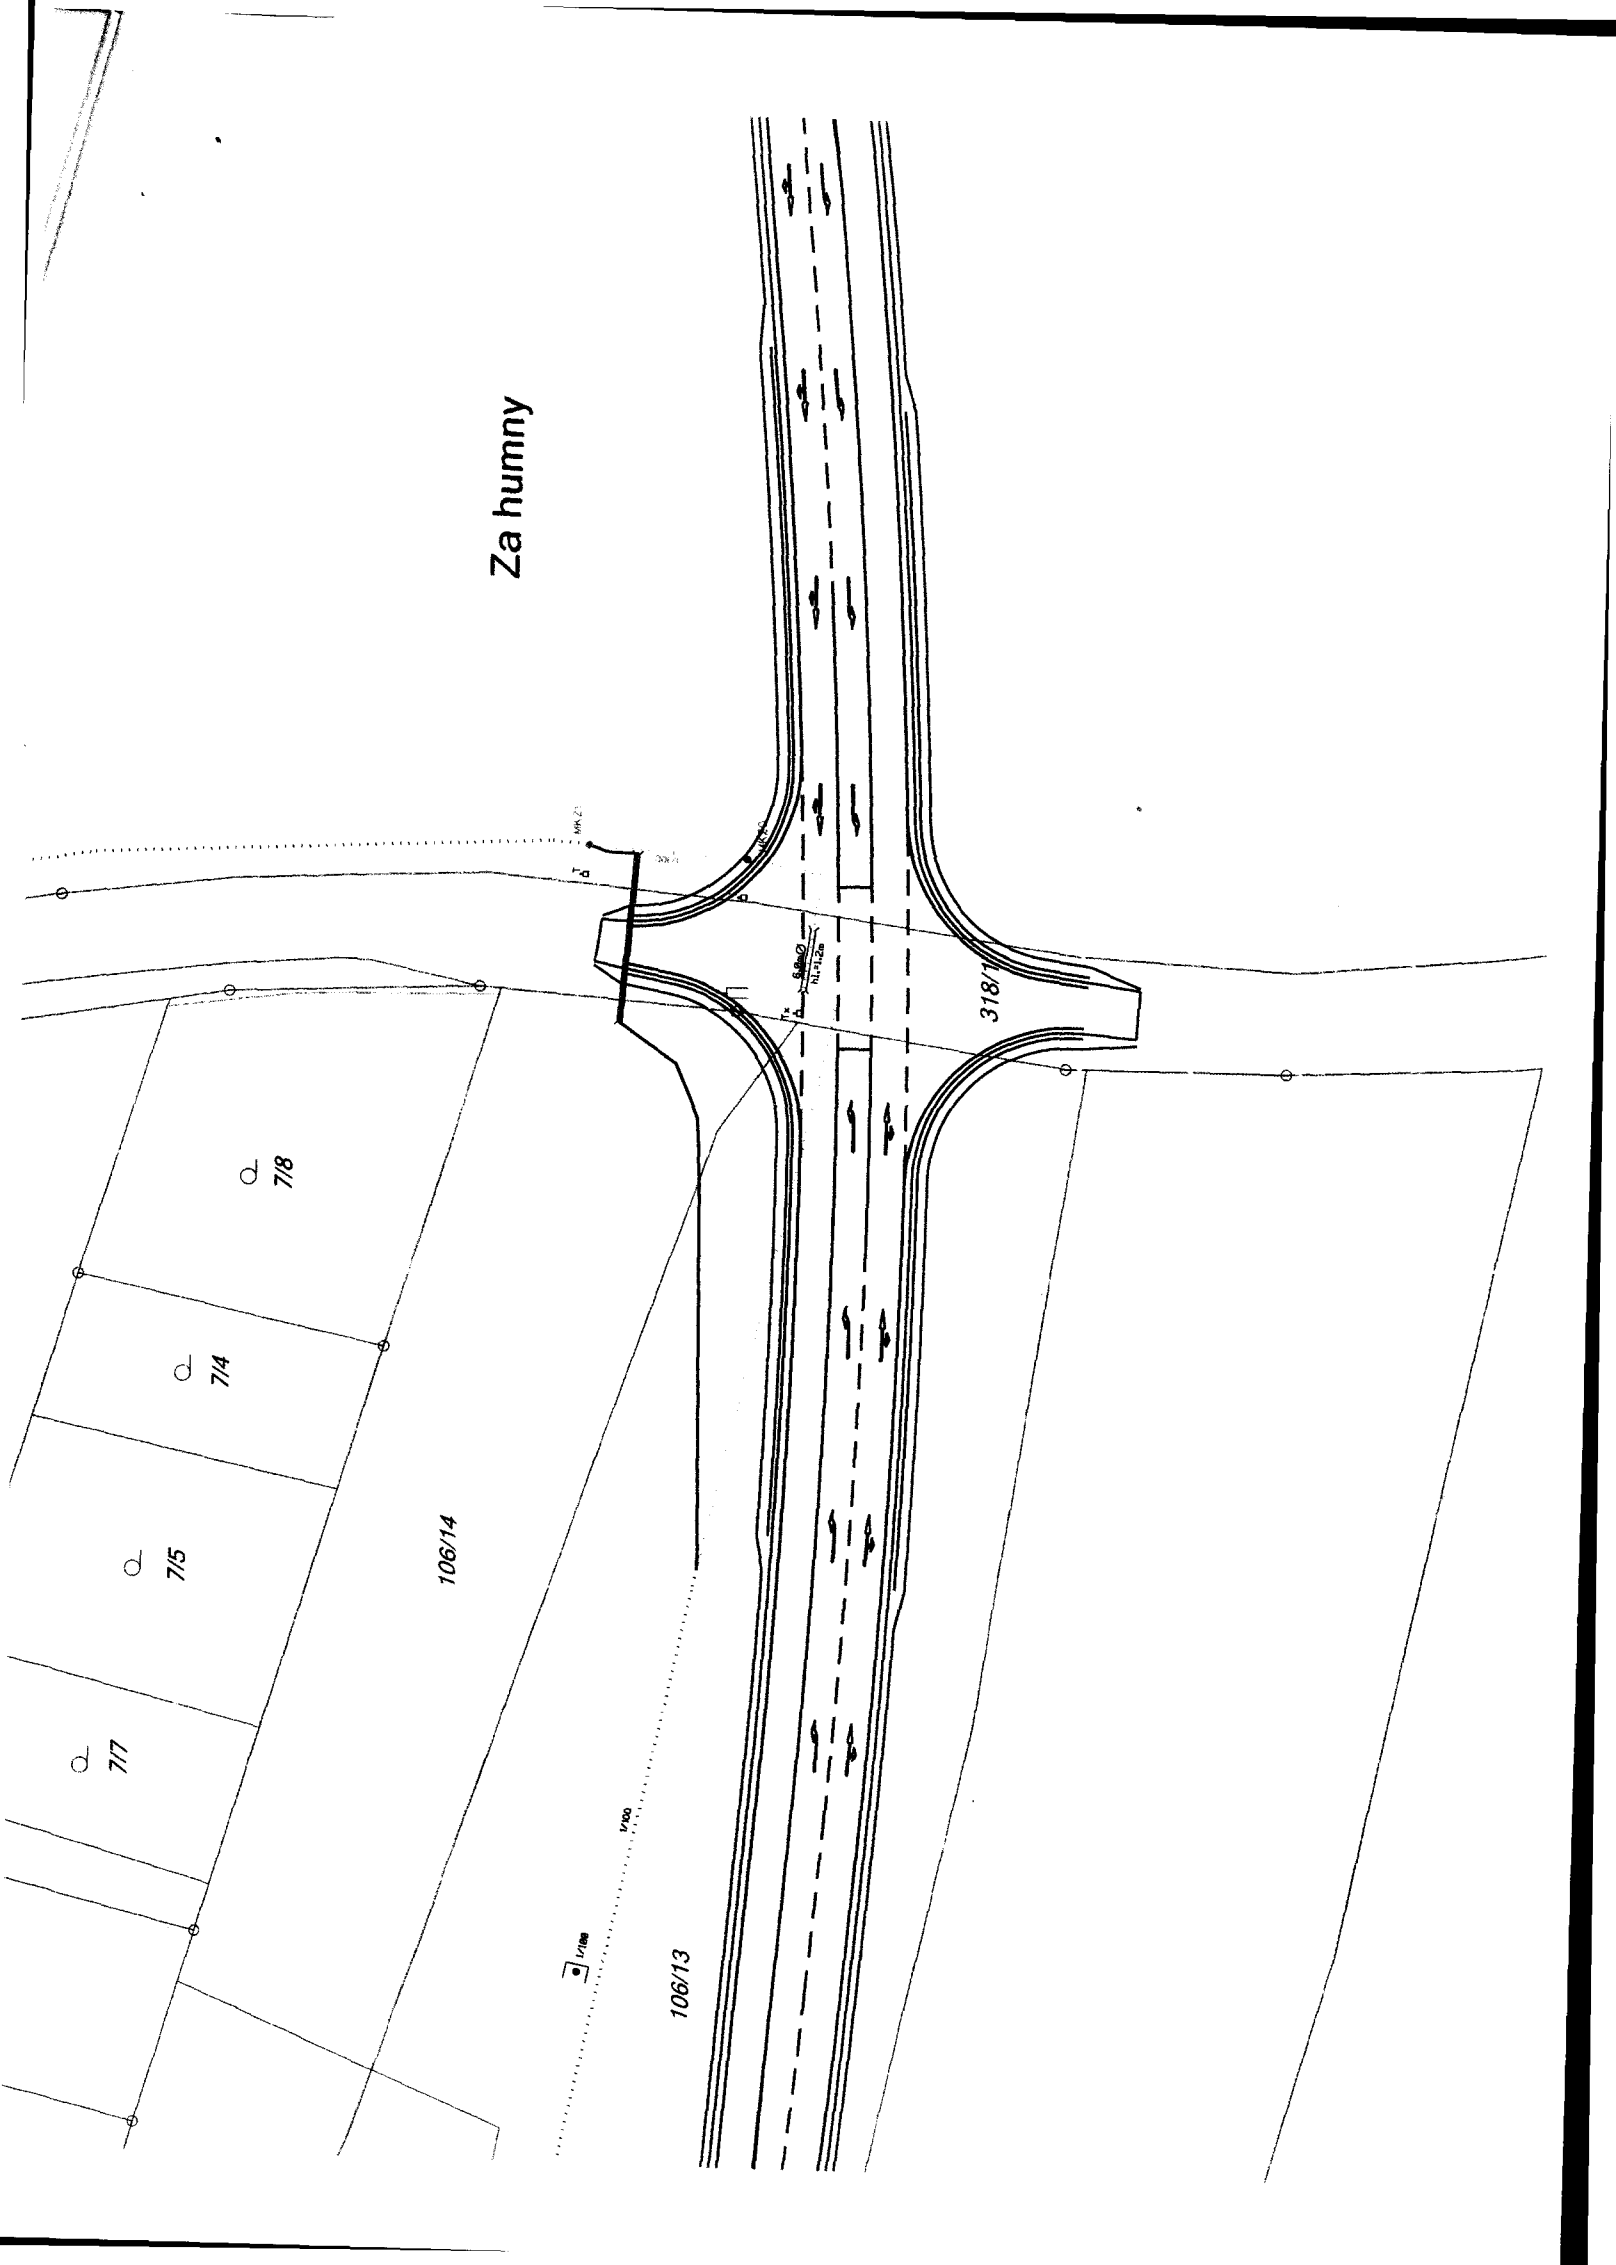

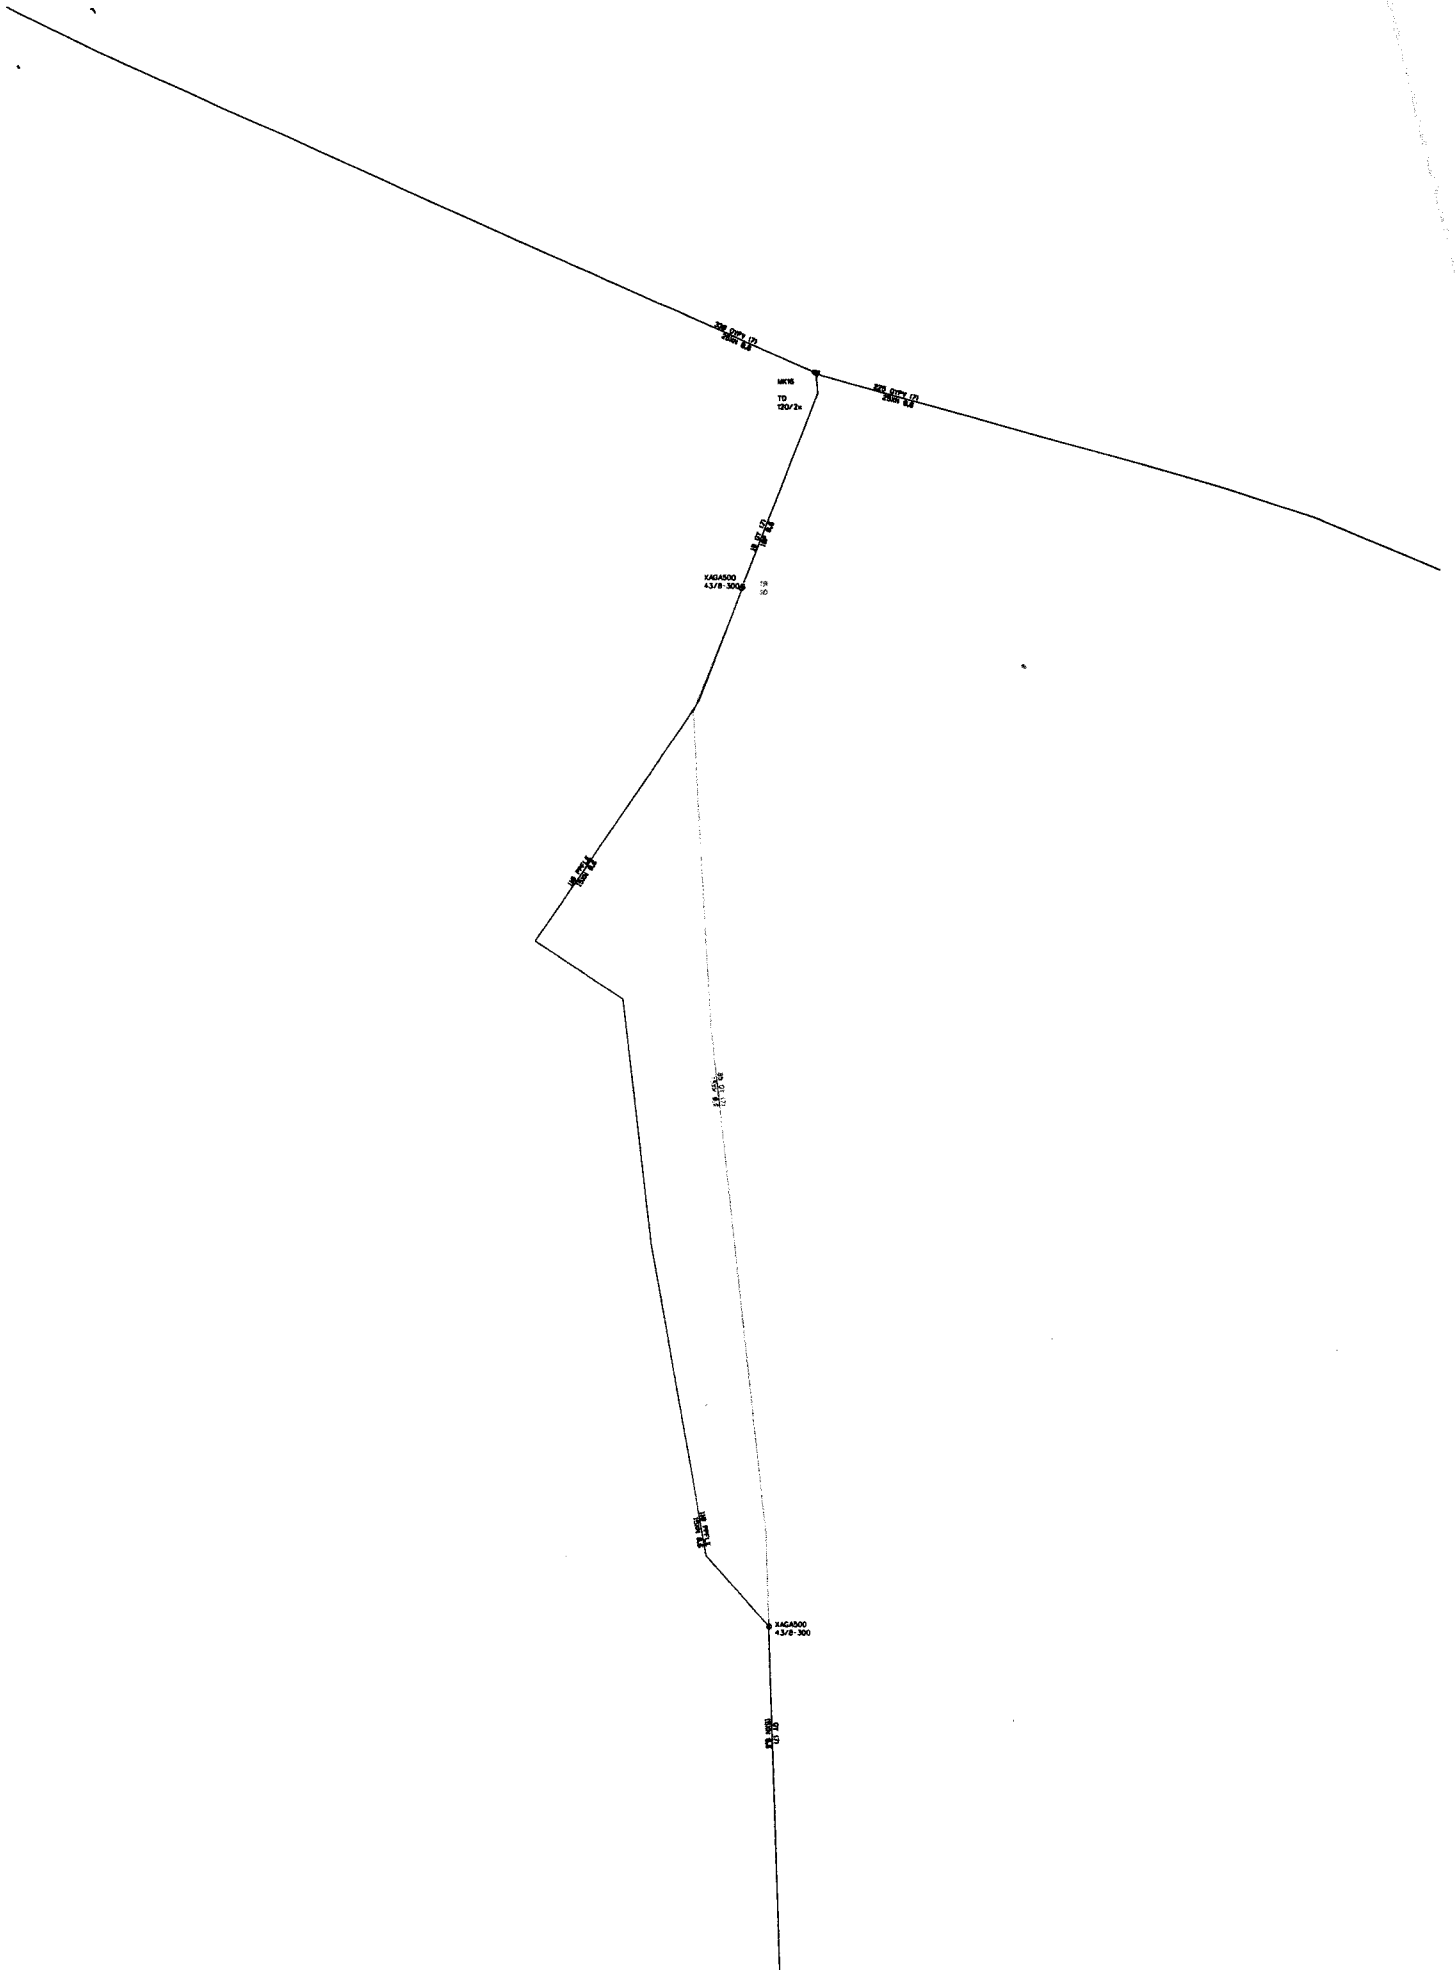

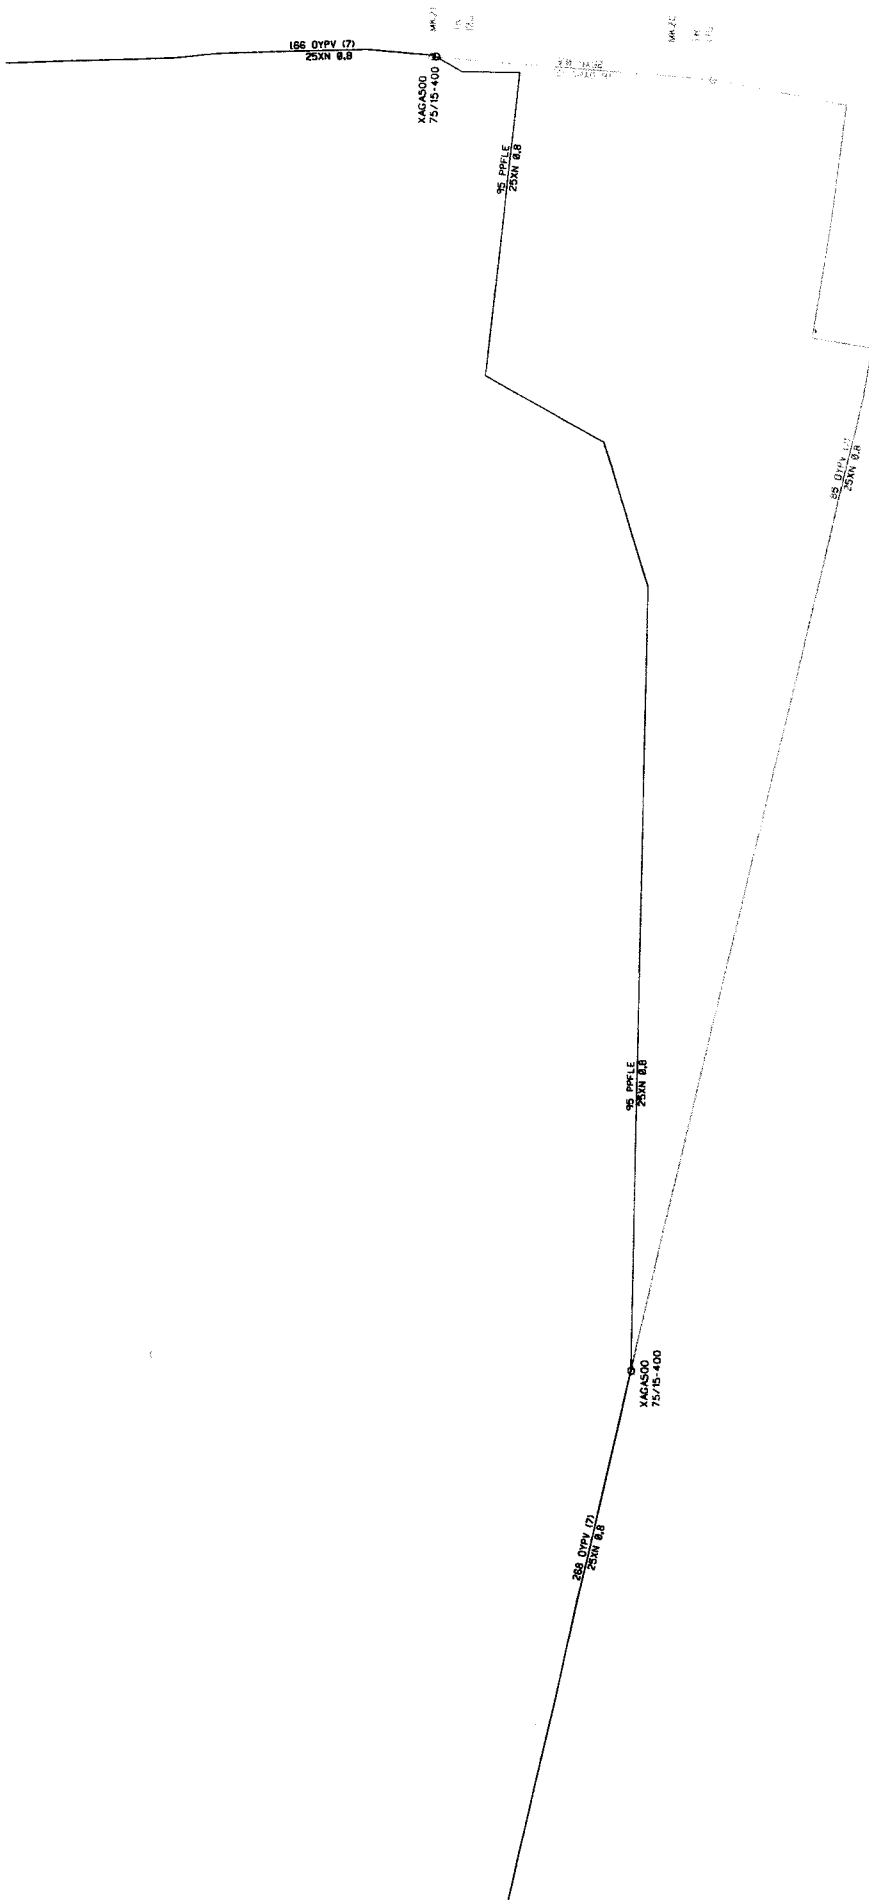

166 DYPV (7)
25XN 8.8

XAGASOO
75/15-400

95 PPFLE
25XN 8.8

3.81
24.14
10.16

MKV1
MKV2
MKV3
MKV4

88 DYPV (7)
25XN 8.8

95 PPFLE
25XN 8.8

XAGASOO
75/15-400

88 DYPV (7)
25XN 8.8

Název stavby: VPI Němčice (PT) obchvat, přeložení SEK

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: ARANEA NETWORK a.s., Jiří Syrový

KPO:

HOST: Prachatice

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.184	KMP:	8.050	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.205	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	24 618 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	94 941 Kč
MONTÁŽ	25 006 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	8 393 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	18 608 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 283 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	35 917 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 212 618 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 174 471 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 38 146 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě trasa 190m vb zóně II	20174.80 JV	20 175 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	17.00 m	42 491 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	22.00 m	331 Kč
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	50.00 m	3 099 Kč
952353 S		Rýha v poli 50/110	25.00 m	8 498 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	142.00 m	39 751 Kč
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	195.00 m	770 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	254 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	28.00 ks	819 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	24.00 ks	468 Kč

Název stavby:	VPI Němčice (PT) obchvat, přeložení SEK		
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	137 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	70.00 ks	1 711 Kč
955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 730 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 853 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	110.00 m	1 819 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	95.00 m	1 947 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč
náklady kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	1 740 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	4 443 Kč
955066 S	Zrušení spojky smršťitelné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 287 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	85.00 m	1 165 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	85.00 m	913 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	2.00 ks	8 393 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	2.00 ks	8 393 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	4 616 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	5598.85 JV	5 599 Kč
vytýčení nové trasy dle souřadnic investora			
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 777 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 506 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	142.00 ks	5 203 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	25.00 m	93 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	167.00 m	711 Kč
300119 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	110.00 m	6 140 Kč
300129 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	95.00 m	13 680 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks	1 895 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	16.00 ks	470 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	987 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 462 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	7.00 ks	5 275 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks	0 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	0 Kč
301613 S		Páska pryž. izolační 25mmx5m Rotunda	2.00 ks	0 Kč

Městský úřad Netolice

odbor stavebně-správní a ÚP
Mírové náměstí č.p.208
384 11 Netolice

Strana 1 (celkem 25)



Vypravěno dne 30. 03. 2016

Netolice, dne 30.03.2016

Č.j. 387/2016/328/017/030

Oprávněná úřední osoba: pí Antónia Podlahová
Telefon: 388324602
Fax: 388323734
E-mail: mu.stavebni.urad@netolice.cz

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Navrhovatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ: 708 90 650 zastoupený Ing. Jiřím Klásou, vedoucím dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje

Zastoupen:

AKIPROJEKT, s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 027 73 961, zastoupen jednatel společnosti Ing. Martinem Jáchymem

Územní rozhodnutí

veřejnou vyhláškou

Navrhovatel Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ: 708 90 650 zastoupený Ing. Jiřím Klásou, vedoucím dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, zastoupen plnou mocí obchodní společnosti AKIPROJEKT, s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 027 73 961, zastoupen jednatel společnosti Ing. Martinem Jáchymem, podal dne 15.02.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Jižní obchvat Němčic, silnice II/145**“, Němčice, která je umístěna na pozemcích parc. č. 55/8, 55/9, 55/10, 55/17 a 216/1 v kat. území Sedlovice a par.č. 116, 106/7, 106/9, 303/1, 303/3, 303/2, 303/4, 106/10, 110/1, 106/11, 104, 106/12, 98, 106/13, 106/14, 318/1, 87, 70/5, 80/2, 82, 306/1, 80/3, 319/1, 319/3, 319/2, 54/1, 73, 80/5, 61, 54/2 a 55 v kat. území Němčice u Netolic.

Městský úřad v Netolicích, odbor stavebně-správní a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') v platném znění, posoudil žádost podle §90 a §91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení:

ČESKÉ BUDĚJOVICE


TUPESY

RADOŠOVICE

SEDLOVICE

MAHOUS

PRACHATICE




SIL. III/14 545

SIL. III/14 543

SIL. III/14 539

SIL. III/14 538

SIL. III/14 5

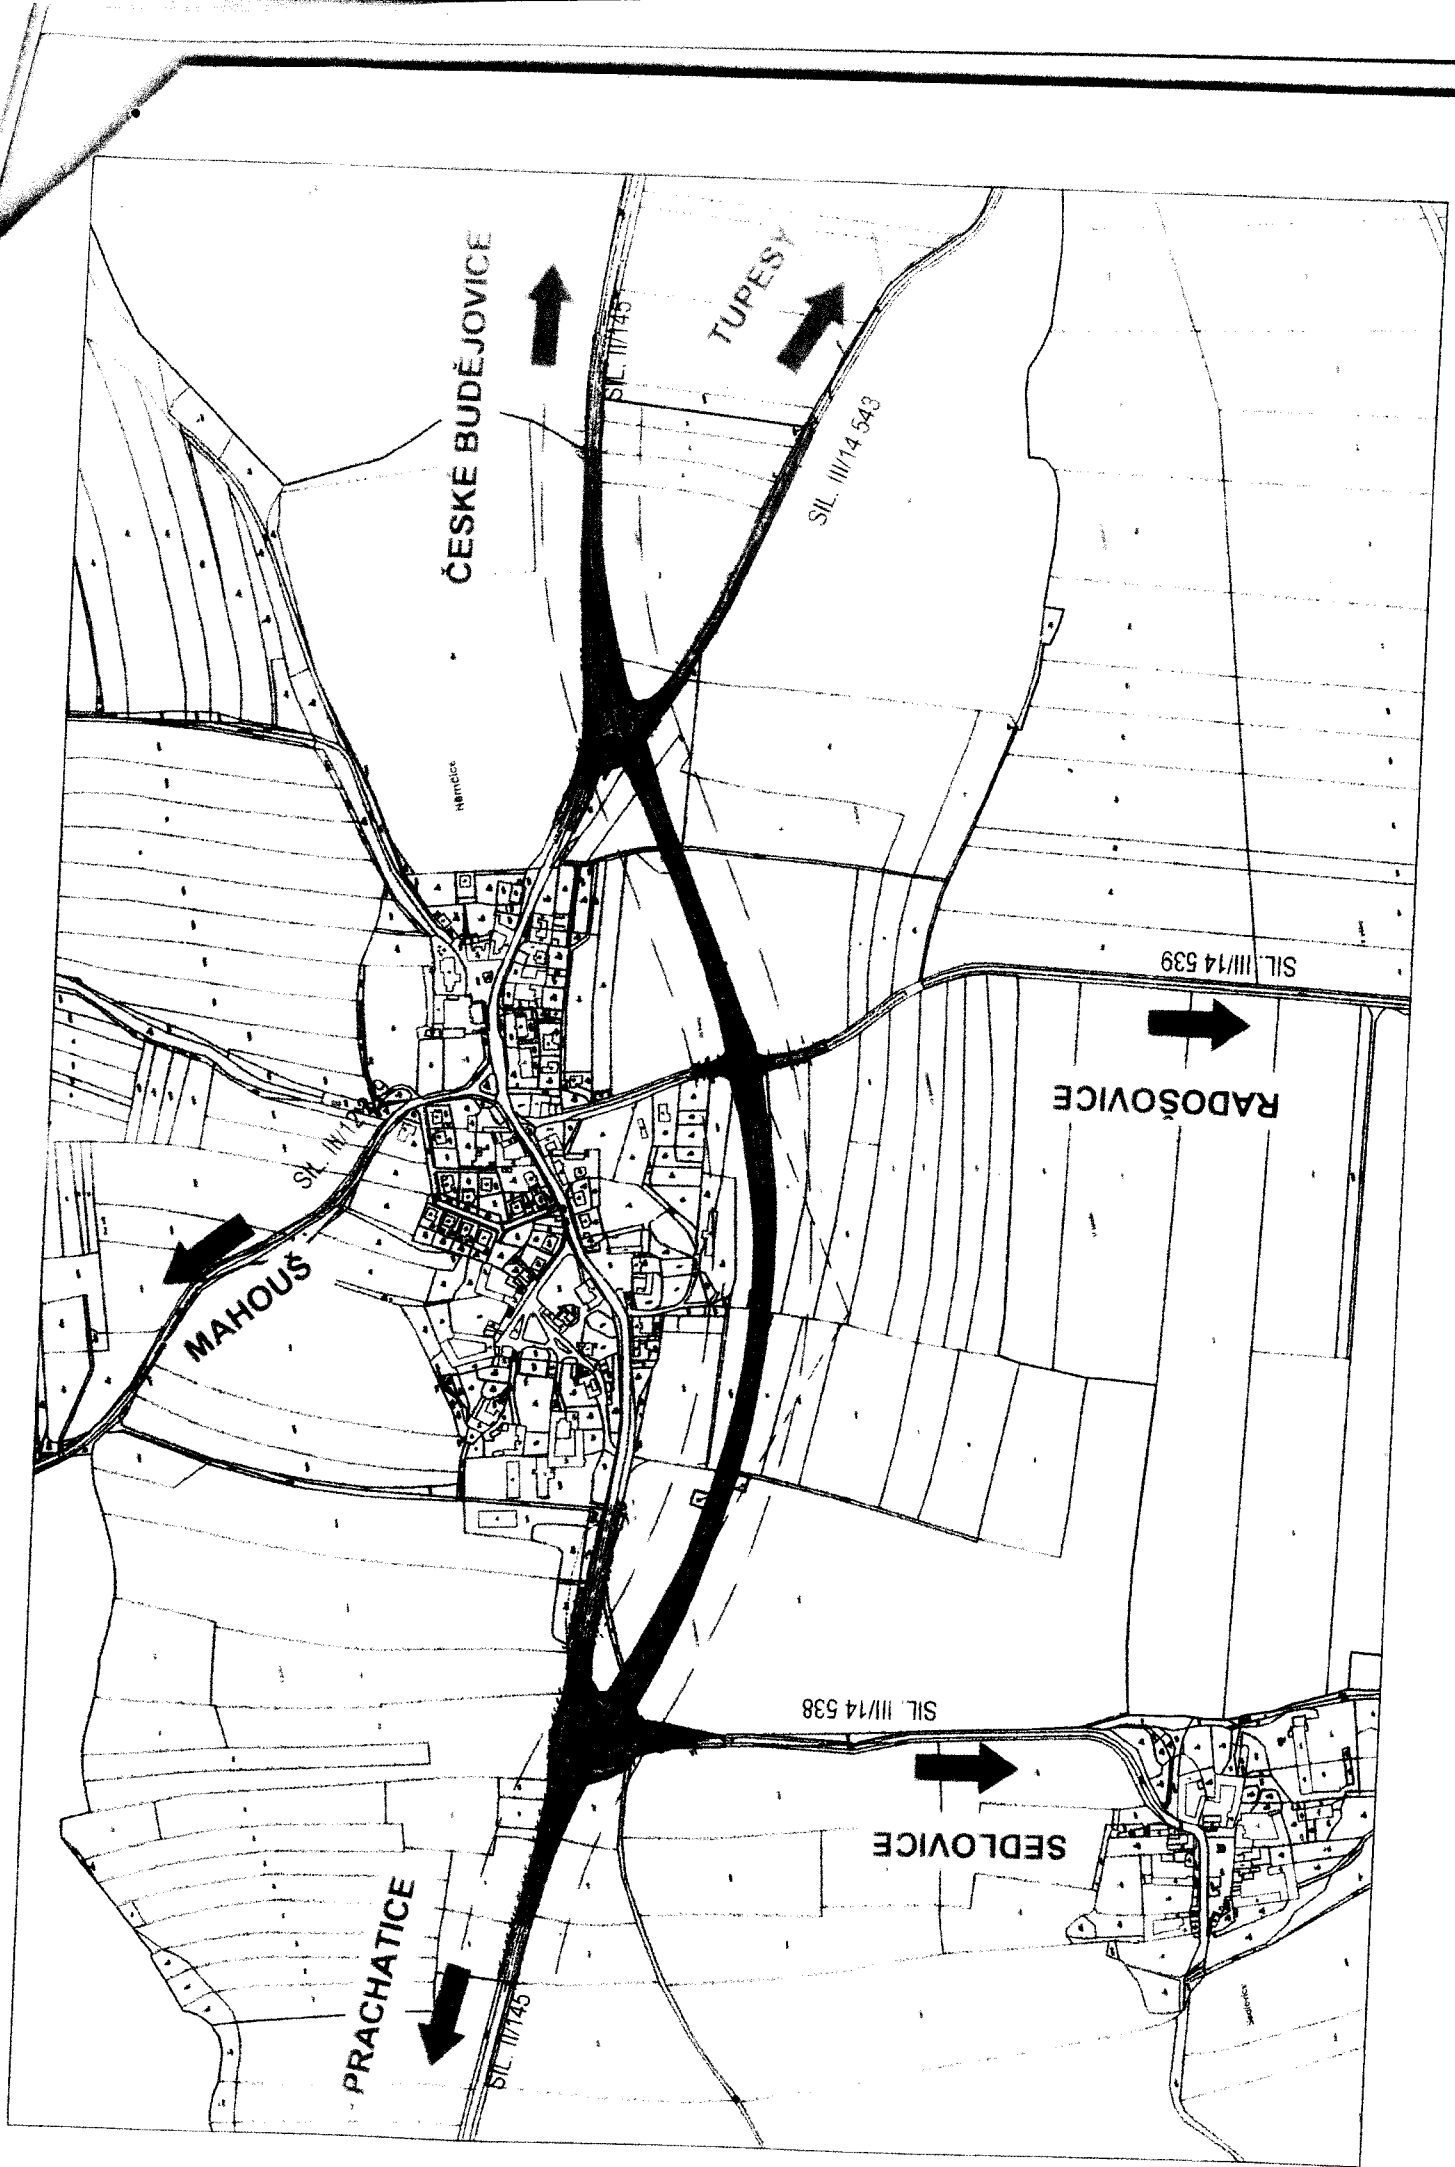



CETIN

Evidenční číslo: PŘ/349/2016

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Ing. Petra Gazdu

bytem Pražská 1430/34, Praha 10, PSČ 102 00, r.č. 650615/0981,

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovny a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

s vystavením souhlasí: Petr Gazda, útvár Přístupová síť

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pan Petr Gazda je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.


Toto pověření je platné do 16.2.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 16.2.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Petr Slováček
místopředseda představenstva



Michal Frankl
člen představenstva
