

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/00075

SRM: 8020010306

Číslo smlouvy stavebníka: ev.č. 0364/2018

Registr smluv: ANO

KS-ČJ/132760-18/VOJ

VPIC ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 130/17
854 01 Šlapanice

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ**
č. VPI/MJ/2018/00075

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

městem Šlapanice

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/00075
Číslo smlouvy stavebníka: ev.č. 0364/2018
KS-ČJ/132760-18/VOJ

SRM: 8020010306
Registr smluv: ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená na základě pověření [REDAKCE], supervizorem pro výstavbu sítě bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále „**CETIN**“)

a

Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO : 00282651

DIČ : CZ00282651

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupené Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou města

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace a specifikace nákladů Překládky, jež je Přílohou číslo 1 této Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 24.4.2018 vydané společností

CETIN pod čj. 596365/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením **VPIČ Šlapanice Čechova polyf. objekt.**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN - a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi
 - a) před realizací Překládky:
 - i) zajistit vyhotovení CTN

- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,
- b) po realizaci Překládky:
 - i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),
 - ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) zajistit geodetické vytyčení hranic pozemků související s Překládkou,
- iii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“),

Stavebník se zavazuje po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, převést na CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 4 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **121.818,- Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoci na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,

- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
 - a) Fakturu č. 1 za CTN ve výši **5.678,-Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zaslány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Pro případ, že společnost CETIN bude v prodlení s realizací Přeložky ve lhůtách podle čl. 4., odst. 4.3. této smlouvy je povinna uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Stavebníka na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení společnosti CETIN.

- 7.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.5 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]
- ve věcech technických: [REDAKCE]
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Trněná, funkce: starostka
e-mail: [REDAKCE]
- ve věcech technických: [REDAKCE] funkce: vedoucí investic
e-mail: [REDAKCE]
- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 S ohledem na ustanovení odst. 9.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/ nebo
 - e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).
- 10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;

- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

10.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

10.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

10.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

10.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

10.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

10.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 – Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Tato smlouva ev. č. 0364/2018 byla schválena na 115. schůzi Rady města Šlapanice,
konané dne 19.9. 2018

CETIN:

- 4 -10- 2018

V Brn

Česká
Ing. M
superv

ruktura a.s.

Stavebník:

Ve Šlapanicích dne 10 -10- 2018

starostka

MĚSTO ŠLAPANICE

11. listopadu náměstí 120/7

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 45038/18/0022

Název

VPIC Šlapanice Čechova polyf. objekt

Budoucí uživatel

GMo-BO [redacted]
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí [redacted]
Manažer [redacted]

Schváleno

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Šlapanice Čechova polyf. objekt
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	
Číslo interní:	45038/18/0022
Prvek SPP:	
ABC:	B
HOST:	
ATÚ:	VÚJ - Šlapanice(Masarykovo náměstí)-RSU

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk	24.865 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0.040 km	kmk mk	2300 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk	9200 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	3.7 km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.010 km	kmo kv	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár		
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks		
Skříně SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks		
Skříně SIS 900 B HD180	0 ks		
Skříně SIS 900 C HD180	0 ks		
Skříně SIS 900 D HD180	0 ks		
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks		
Skříně mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks		
Skříně SIS 1350 D HD 180	0 ks		
Délka HDPE trubek pro OK	0 km		

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	11.05.2018
Plánované ukončení přípravy:	15.07.2018
Plánované zahájení realizace:	15.06.2019
Plánované ukončení realizace:	15.09.2019
Nabídka k přejmce (Plán):	15.08.2019

1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 45038/18/0022 na zpracování CTN: VPIC Šlapanice Čechova polyf. objekt

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu výstavby nového polyfunkčního objektu ve Šlapanicích, ul. Čechova, dojde k přeložení stávajícího TR SAPA241 _ KS II, vč. související zemní kabeláže.

Překládaný rozvaděč KS II bude nahrazen novým rozvaděčem MIS2 QT _ pod omítku. Rozvaděč bude umístěn v průjezdu nového polyfunkčního objektu _ v nově vyzděné obvodové stěně. Překládka bude provedena jednorázově, tzn. není nutné provizorní řešení.

Související zemní kabeláž bude prodloužena pomocí kabelových spojek XAGA a nových tendrovaných kabelů PFLE. Kabely budou vyvedeny do nově umístěného TR.

Stávající rozvaděče SAPA1458 a SAPA7 budou zrušeny (demolice stávajících objektů). Zemní kabely budou opatřeny koncovkami SKH.

Kabelové koncovky budou umístěny v nepojízdných plochách a budou opatřeny detekčními markery miniBall.

Stávající zrušená kabelizace a rezerva pro VTA se překládat nebudou.

SEK z pod rohu pol. objektu se překládat nemusí. Nejedná se o přízemní část objektu, ale o 1.NP zmíněného polyfunkčního objektu.

2.3 Popis tras

viz. příložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Pro SR bude použito nové skříně firmy MICOS, jako vnější _ pod omítku MIS2 QT

Kabel typu PFLE 0,4_0,6

Kabelová spojka XAGA

Mini Markér Ball

AROT110

SKH

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

_____ _ projektant, kontaktní osoba

_____ zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:

PD: NE
ÚR: zajistí investor
VBŘ: ANO
GP: ANO (zakresleno v KM)
GEO: ANO
GEO vytyčení hranic pozemků: zajistí investor (**bude zapsáno do smlouvy**)
SoUZ: NE
PEW: ANO

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušeni metalických kabelů) _ min. 40 dnů předem!

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC [REDACTED] a pracovníky provozní složky spol. CETIN ([REDACTED]).

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------


4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Zadávací podklady.zip	SD
DÚR.zip	SD
Doplňující podmínky POS.pdf	SD
Vyjádření o existenci SEK (596365-18) (1).pdf	SD

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [1658](#)
Obec: [Šlapanice \[583953\]](#)
Katastrální území: [Šlapanice u Brna \[762793\]](#)
Číslo LV: [1000](#)
Výměra [m²]: 2725
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapový list: DKM
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha

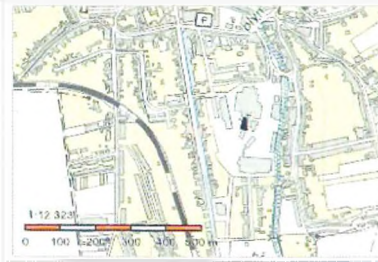

[Sousední parcely](#)

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podl

Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [7724](#)
Obec: [Šlapanice \[583953\]](#)
Katastrální území: [Šlapanice u Brna \[762793\]](#)
Číslo LV: [1000](#)
Výměra [m²]: 166
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapový list: DKM
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: zbojiště
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří



[Sousední parcely](#)

Vlastníci, jiní oprávnění


Vlastnické právo

Podl

Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice



45038/18/0022 VPIC Šlapanice Čechova polyf. objekt

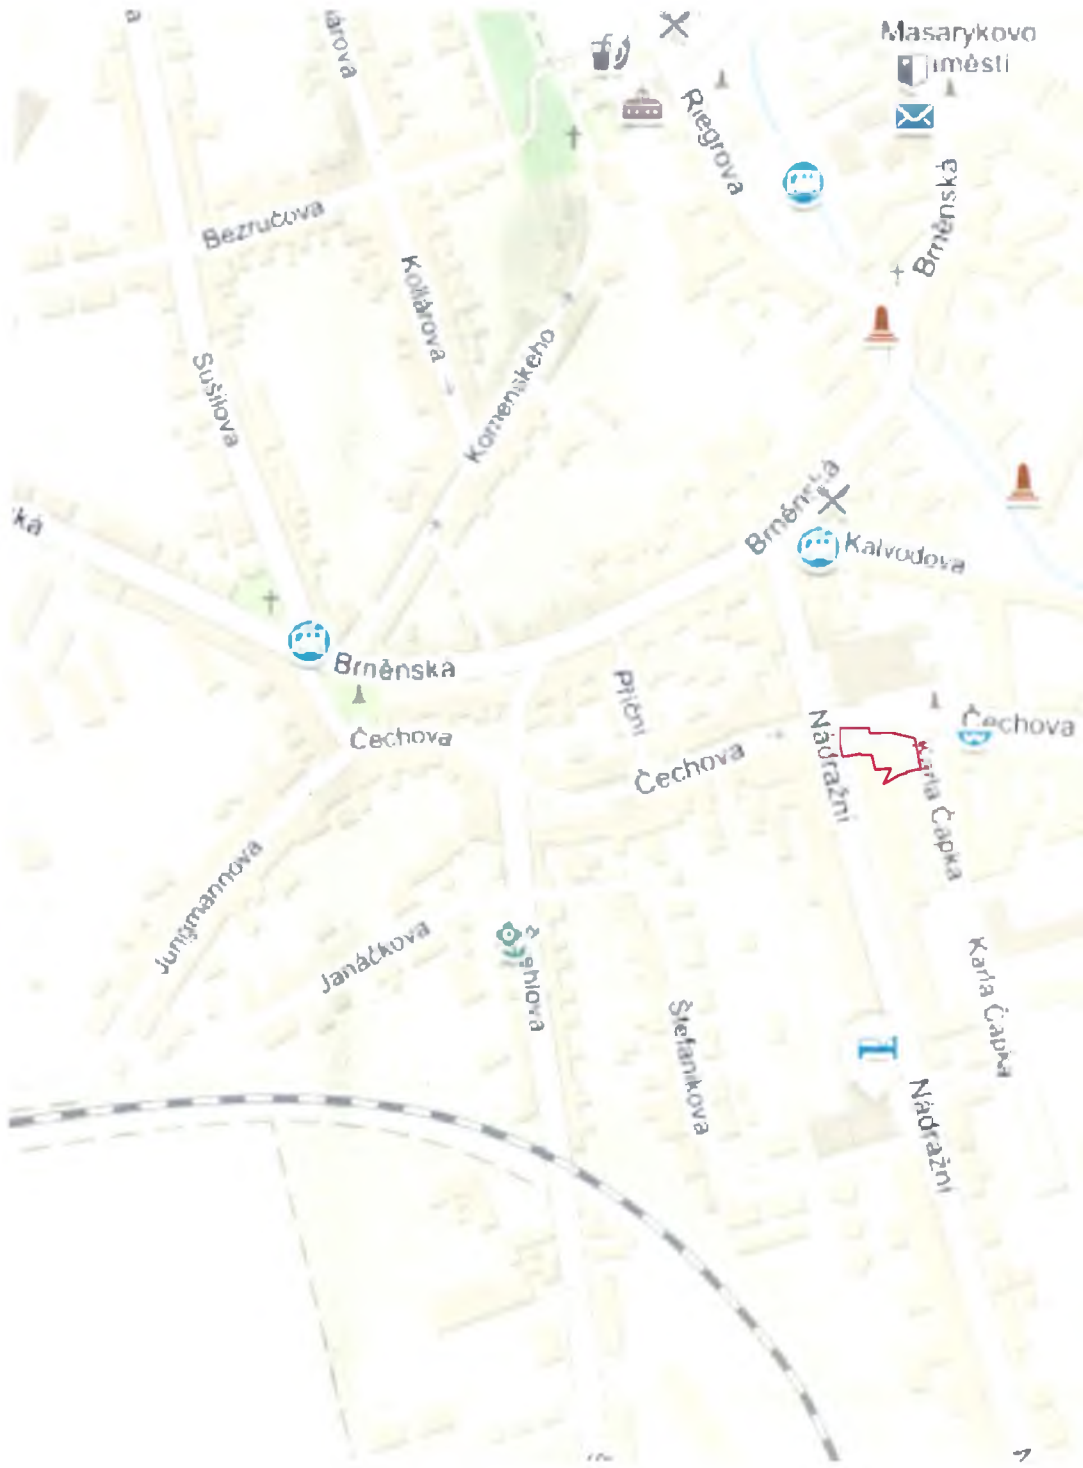

Masarykovo
městí



Brněnská

Riegrova

Bezručova

Sušilova

Kalvábřova

Komenského

Brněnská



Kalvodova

Brněnská

Čechova

Přibití

Čechova

Nádražní

Čechova

Karla Čapka

Jungmannova

Janáčkova


Štálova

Štefánkova

Karla Čapka

Nádražní



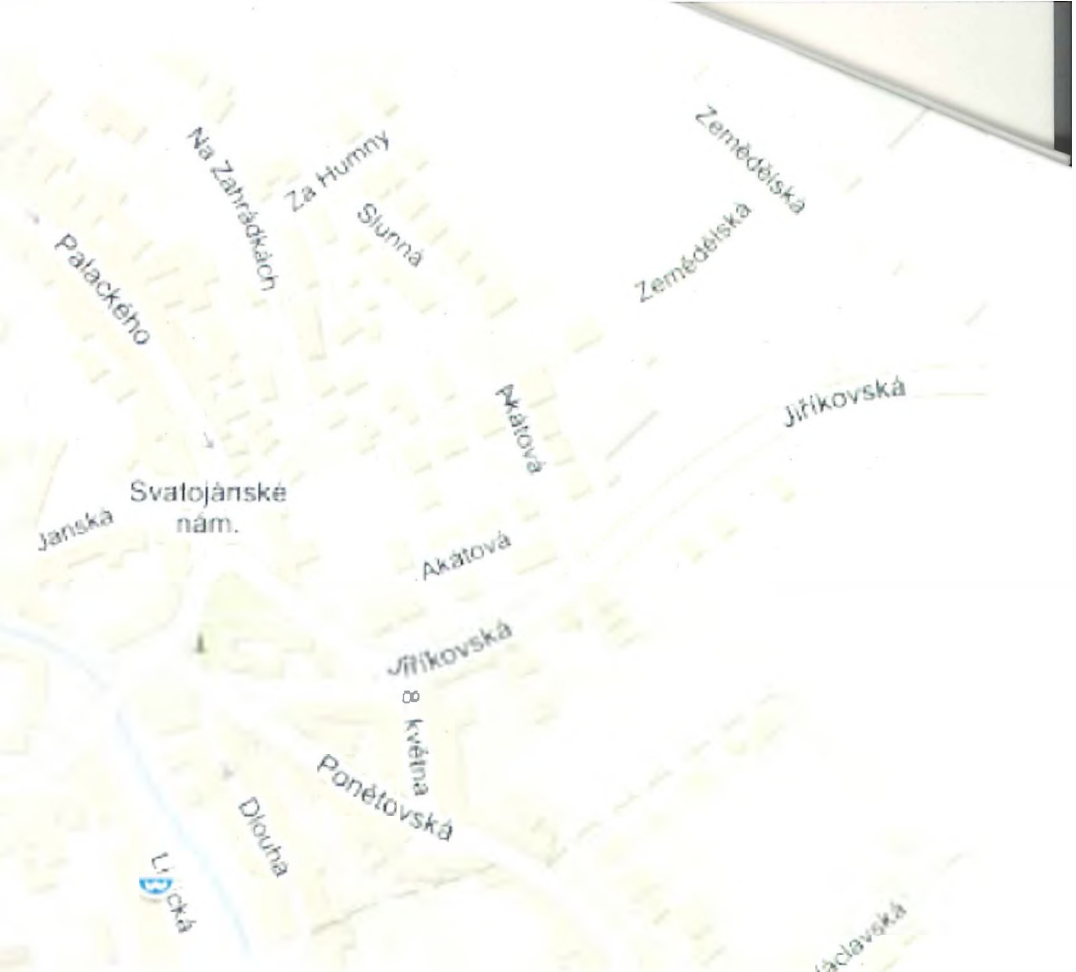


HRANICE DOTČENÝCH POZEMKŮ

±0,000= ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 219,40 m.n.m.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	[REDACTED]	STUDIO-ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
VYPRACOVAL	[REDACTED]	
INVESTOR	MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 664 51 ŠLAPANICE	STUPEŇ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 1 : 4000 DATUM 03/2018
PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746 KAT. ÚZEMÍ ŠLAPANICE U BRNA [762792]		
C. SITUACE	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	



45038/18/0022 VPIC Šlapanice Čechova polyf. objekt

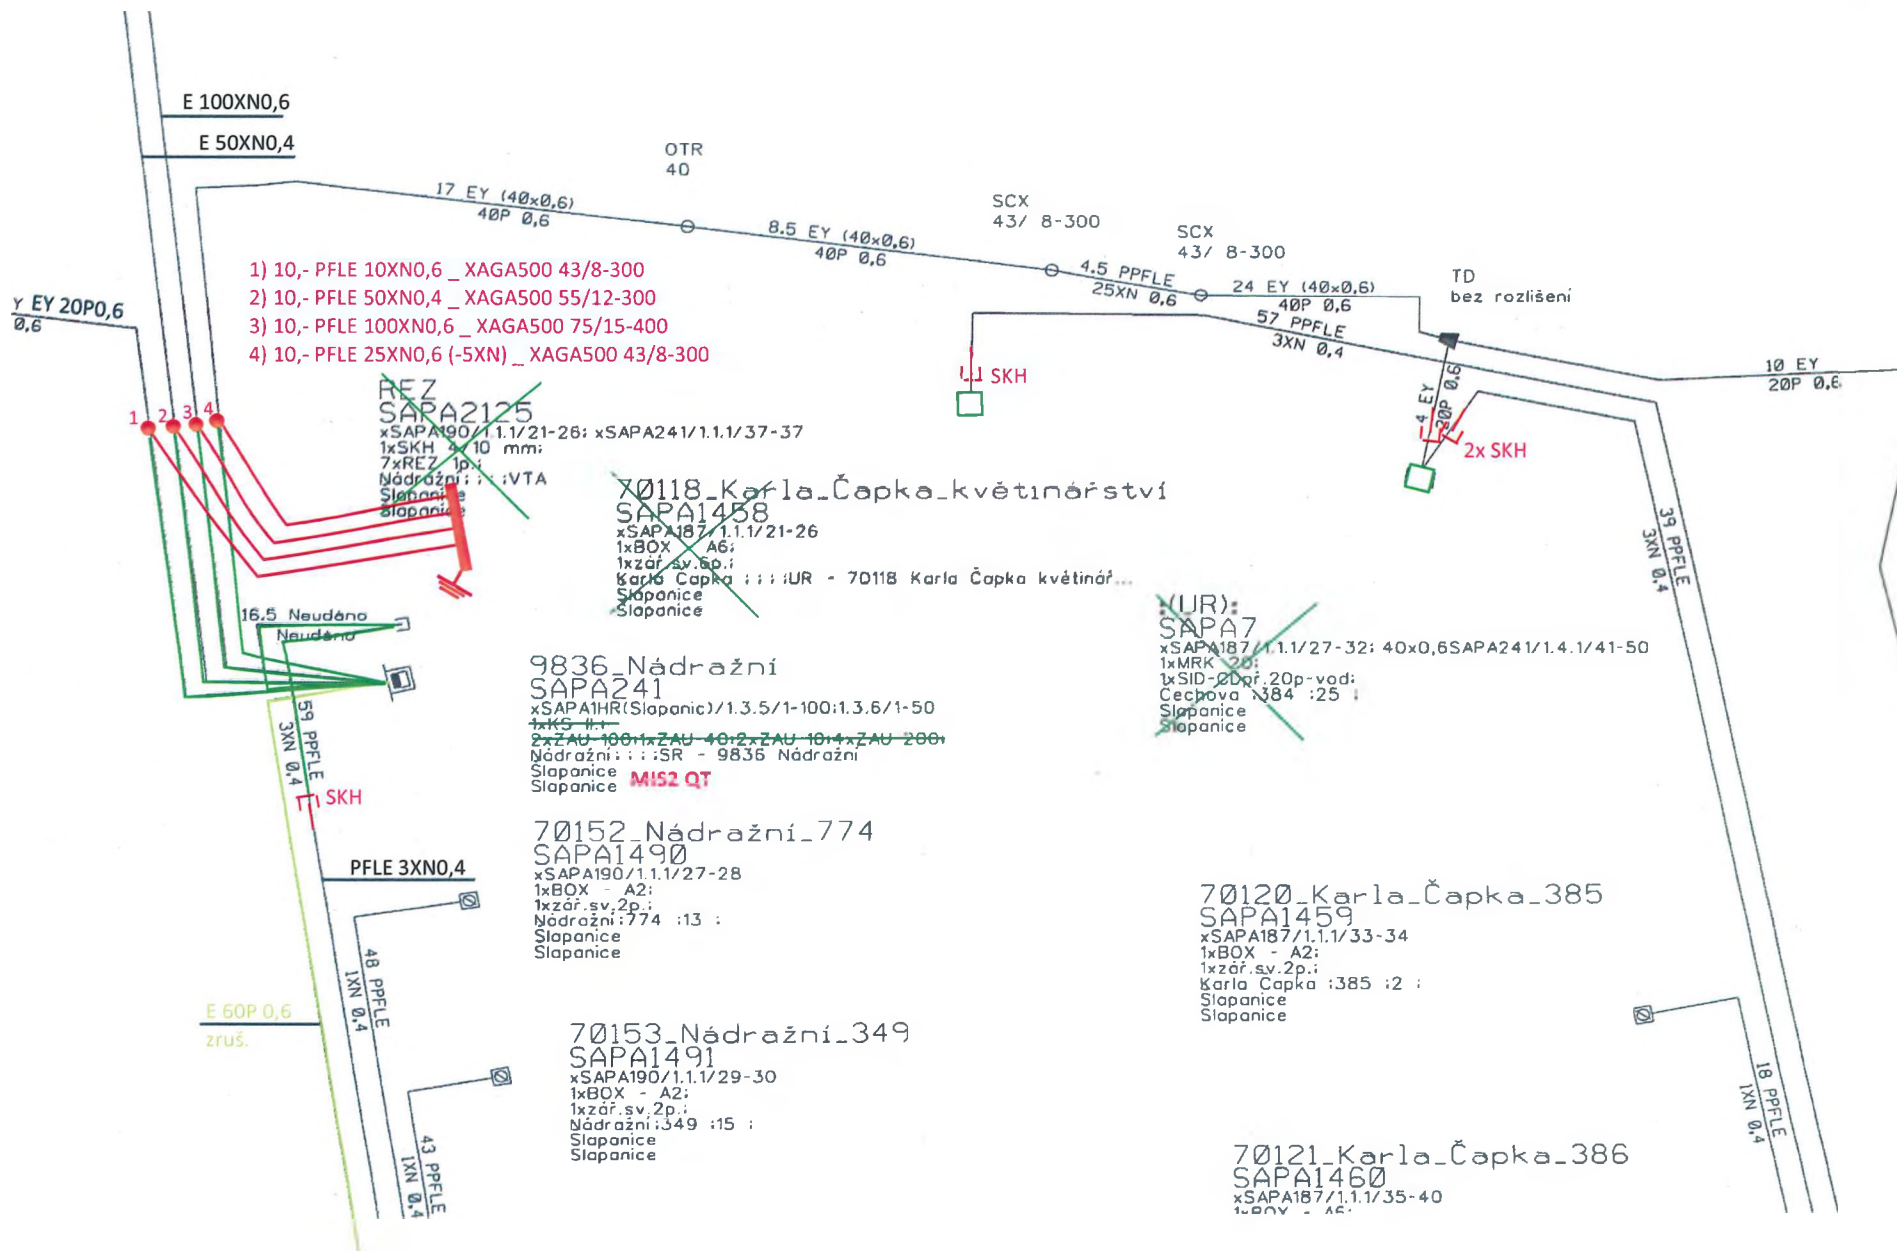

45038/18/0022 VPIC Šlapanice Čechova polyf. objekt

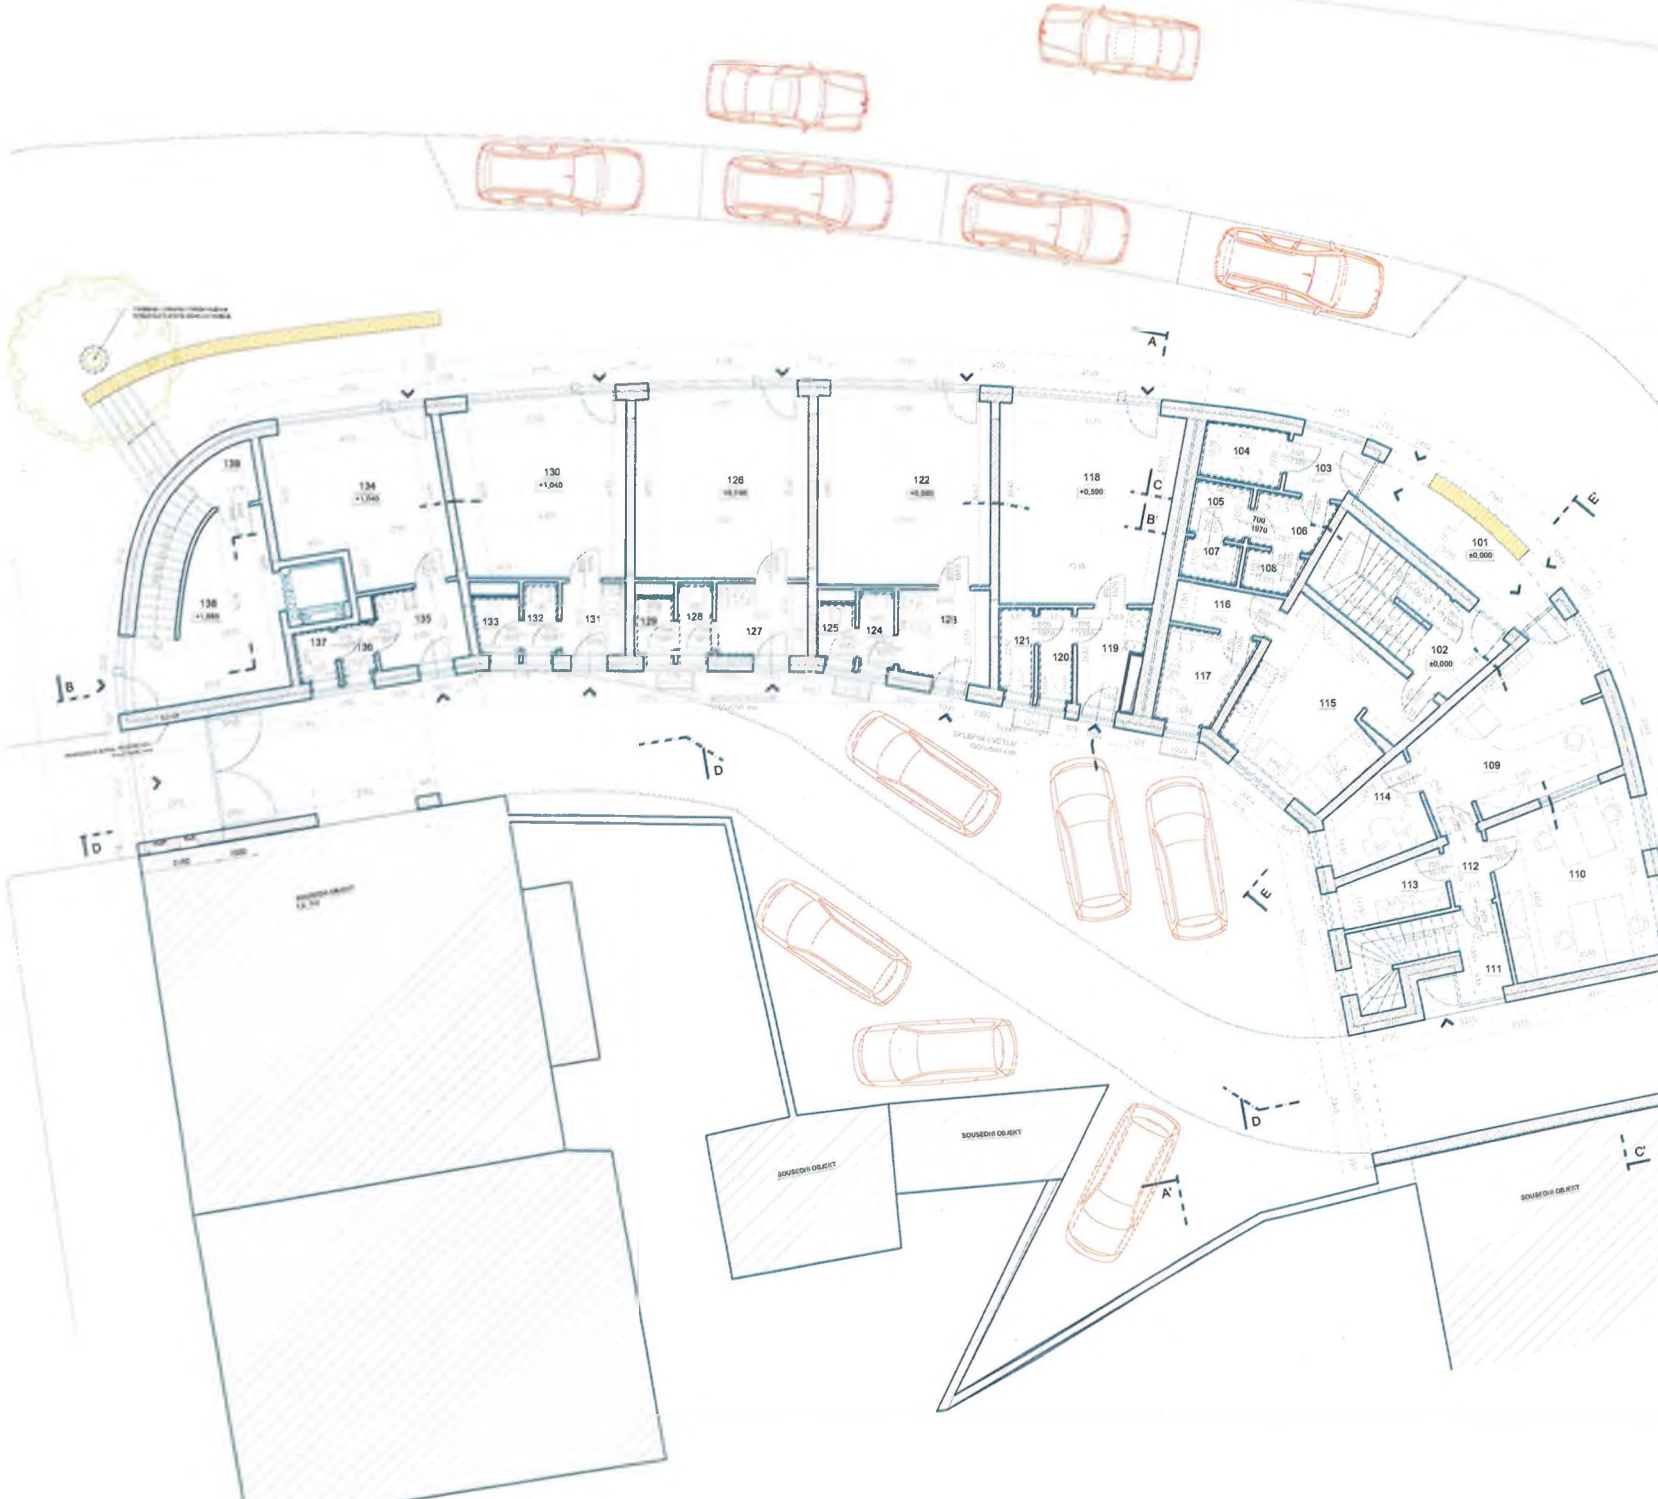

LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHY	STĚNY	STROPY	OKNA	VEŘEJNÉ
101	VSTUPNÍ PROSTOR	15,21	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
102	SCHODIŠTĚOVÁ HALA	13,82	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
103	PŘEDSÍŇ	5,61	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
104	WC KEBANĚROVCE	3,67	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA + KER OBLAD	BOH	KER BOHL	
105	WC HMAI	2,18	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA + KER OBLAD	BOH	KER BOHL	
106	PŘEDSÍŇ	6,14	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
107	WC HLED - KŘÍŽKA	1,80	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA + KER OBLAD	BOH	KER BOHL	
108	KLADENÍ-KOŠOŘKA	1,82	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA + KER OBLAD	BOH	KER BOHL	
109	VSTUPNÍ HALA	18,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
110	VÝSTAVNÍ PŘEVENTIVTU	18,14	VMPL	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
111	CHOŠBA - SCHODIŠTĚ	6,13	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
112	CHOŠBA	2,42	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
113	SULÁRNÍ UMÝVAČKA A ŠOŠ	4,20	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
114	ŠARŽOVKA	4,71	VMPL	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
115	BYT	18,94	VMPL	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
116	CHOŠBA	3,33	VMPL	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
117	KOUPELNA	6,41	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA + KER OBLAD	BOH	KER BOHL	
118	OBCHOD	16,17	VMPL	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
119	CHOŠBA	3,28	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
120	PŘEDSÍŇ	3,36	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
121	WC	3,24	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA + KER OBLAD	BOH	KER BOHL	
122	OBCHOD	19,36	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
123	CHOŠBA	6,39	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
124	PŘEDSÍŇ	3,13	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
125	WC	2,14	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
126	OBCHOD	11,67	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
127	CHOŠBA	1,35	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
128	PŘEDSÍŇ	3,99	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
129	WC	2,23	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA + KER OBLAD	BOH	KER BOHL	
130	OBCHOD	11,17	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
131	CHOŠBA	3,85	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
132	PŘEDSÍŇ	3,09	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
133	WC	2,87	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA + KER OBLAD	BOH	KER BOHL	
134	OBCHOD	19,74	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
135	CHOŠBA	6,41	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
136	PŘEDSÍŇ	1,62	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
137	WC	1,98	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA + KER OBLAD	BOH	KER BOHL	
138	VSTUPNÍ PROSTOR	11,89	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	
139	SCHODIŠTĚ	6,97	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VC OHTVTA	BOH	KER BOHL	

LEGENDA MATERIÁLŮ

	TEPELNÁ IZOLACE
	KERAMICKÉ ZDVO TL 240 mm
	KERAMICKÉ ARTISTICKÉ ZDVO TL 230 mm
	ZELEZOBETON
	PŘÍČKOVÉ KERAMICKÉ ZDVO TL 115 mm
	KERAMICKÉ NOSNÉ ZDVO TL 180 mm
	BRICK PŘÍČKA TL 80 mm
	KERAMICKÉ NOSNÉ ZDVO TL 300 mm

±0,000 = ÚROVEŇ 1 NP (PŘÍLAHA) = 218,40 m n.m.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. BLAŽENA BLAŽEKOVÁ
 ING. LUKÁŠ ROUBEK

VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ RUBEK, ING. PETR DOLEŽAL

INVESTOR: MĚSTO BLAŽANICE, NABÝVÁKOVY MÍSTNOSTI 1881, 1884 B1, BLAŽANICE

PROJEKTANT: STUDIO ZLAMAL

NA PARCELÁCH C 779/1, 779/2, 779/3, 779/4, 779/5, 779/6, 779/7, 779/8, 779/9, 779/10, 779/11, 779/12, 779/13, 779/14, 779/15, 779/16, 779/17, 779/18, 779/19, 779/20, 779/21, 779/22, 779/23, 779/24, 779/25, 779/26, 779/27, 779/28, 779/29, 779/30, 779/31, 779/32, 779/33, 779/34, 779/35, 779/36, 779/37, 779/38, 779/39, 779/40, 779/41, 779/42, 779/43, 779/44, 779/45, 779/46, 779/47, 779/48, 779/49, 779/50, 779/51, 779/52, 779/53, 779/54, 779/55, 779/56, 779/57, 779/58, 779/59, 779/60, 779/61, 779/62, 779/63, 779/64, 779/65, 779/66, 779/67, 779/68, 779/69, 779/70, 779/71, 779/72, 779/73, 779/74, 779/75, 779/76, 779/77, 779/78, 779/79, 779/80, 779/81, 779/82, 779/83, 779/84, 779/85, 779/86, 779/87, 779/88, 779/89, 779/90, 779/91, 779/92, 779/93, 779/94, 779/95, 779/96, 779/97, 779/98, 779/99, 779/100, 779/101, 779/102, 779/103, 779/104, 779/105, 779/106, 779/107, 779/108, 779/109, 779/110, 779/111, 779/112, 779/113, 779/114, 779/115, 779/116, 779/117, 779/118, 779/119, 779/120, 779/121, 779/122, 779/123, 779/124, 779/125, 779/126, 779/127, 779/128, 779/129, 779/130, 779/131, 779/132, 779/133, 779/134, 779/135, 779/136, 779/137, 779/138, 779/139, 779/140, 779/141, 779/142, 779/143, 779/144, 779/145, 779/146, 779/147, 779/148, 779/149, 779/150, 779/151, 779/152, 779/153, 779/154, 779/155, 779/156, 779/157, 779/158, 779/159, 779/160, 779/161, 779/162, 779/163, 779/164, 779/165, 779/166, 779/167, 779/168, 779/169, 779/170, 779/171, 779/172, 779/173, 779/174, 779/175, 779/176, 779/177, 779/178, 779/179, 779/180, 779/181, 779/182, 779/183, 779/184, 779/185, 779/186, 779/187, 779/188, 779/189, 779/190, 779/191, 779/192, 779/193, 779/194, 779/195, 779/196, 779/197, 779/198, 779/199, 779/200, 779/201, 779/202, 779/203, 779/204, 779/205, 779/206, 779/207, 779/208, 779/209, 779/210, 779/211, 779/212, 779/213, 779/214, 779/215, 779/216, 779/217, 779/218, 779/219, 779/220, 779/221, 779/222, 779/223, 779/224, 779/225, 779/226, 779/227, 779/228, 779/229, 779/230, 779/231, 779/232, 779/233, 779/234, 779/235, 779/236, 779/237, 779/238, 779/239, 779/240, 779/241, 779/242, 779/243, 779/244, 779/245, 779/246, 779/247, 779/248, 779/249, 779/250, 779/251, 779/252, 779/253, 779/254, 779/255, 779/256, 779/257, 779/258, 779/259, 779/260, 779/261, 779/262, 779/263, 779/264, 779/265, 779/266, 779/267, 779/268, 779/269, 779/270, 779/271, 779/272, 779/273, 779/274, 779/275, 779/276, 779/277, 779/278, 779/279, 779/280, 779/281, 779/282, 779/283, 779/284, 779/285, 779/286, 779/287, 779/288, 779/289, 779/290, 779/291, 779/292, 779/293, 779/294, 779/295, 779/296, 779/297, 779/298, 779/299, 779/300, 779/301, 779/302, 779/303, 779/304, 779/305, 779/306, 779/307, 779/308, 779/309, 779/310, 779/311, 779/312, 779/313, 779/314, 779/315, 779/316, 779/317, 779/318, 779/319, 779/320, 779/321, 779/322, 779/323, 779/324, 779/325, 779/326, 779/327, 779/328, 779/329, 779/330, 779/331, 779/332, 779/333, 779/334, 779/335, 779/336, 779/337, 779/338, 779/339, 779/340, 779/341, 779/342, 779/343, 779/344, 779/345, 779/346, 779/347, 779/348, 779/349, 779/350, 779/351, 779/352, 779/353, 779/354, 779/355, 779/356, 779/357, 779/358, 779/359, 779/360, 779/361, 779/362, 779/363, 779/364, 779/365, 779/366, 779/367, 779/368, 779/369, 779/370, 779/371, 779/372, 779/373, 779/374, 779/375, 779/376, 779/377, 779/378, 779/379, 779/380, 779/381, 779/382, 779/383, 779/384, 779/385, 779/386, 779/387, 779/388, 779/389, 779/390, 779/391, 779/392, 779/393, 779/394, 779/395, 779/396, 779/397, 779/398, 779/399, 779/400, 779/401, 779/402, 779/403, 779/404, 779/405, 779/406, 779/407, 779/408, 779/409, 779/410, 779/411, 779/412, 779/413, 779/414, 779/415, 779/416, 779/417, 779/418, 779/419, 779/420, 779/421, 779/422, 779/423, 779/424, 779/425, 779/426, 779/427, 779/428, 779/429, 779/430, 779/431, 779/432, 779/433, 779/434, 779/435, 779/436, 779/437, 779/438, 779/439, 779/440, 779/441, 779/442, 779/443, 779/444, 779/445, 779/446, 779/447, 779/448, 779/449, 779/450, 779/451, 779/452, 779/453, 779/454, 779/455, 779/456, 779/457, 779/458, 779/459, 779/460, 779/461, 779/462, 779/463, 779/464, 779/465, 779/466, 779/467, 779/468, 779/469, 779/470, 779/471, 779/472, 779/473, 779/474, 779/475, 779/476, 779/477, 779/478, 779/479, 779/480, 779/481, 779/482, 779/483, 779/484, 779/485, 779/486, 779/487, 779/488, 779/489, 779/490, 779/491, 779/492, 779/493, 779/494, 779/495, 779/496, 779/497, 779/498, 779/499, 779/500, 779/501, 779/502, 779/503, 779/504, 779/505, 779/506, 779/507, 779/508, 779/509, 779/510, 779/511, 779/512, 779/513, 779/514, 779/515, 779/516, 779/517, 779/518, 779/519, 779/520, 779/521, 779/522, 779/523, 779/524, 779/525, 779/526, 779/527, 779/528, 779/529, 779/530, 779/531, 779/532, 779/533, 779/534, 779/535, 779/536, 779/537, 779/538, 779/539, 779/540, 779/541, 779/542, 779/543, 779/544, 779/545, 779/546, 779/547, 779/548, 779/549, 779/550, 779/551, 779/552, 779/553, 779/554, 779/555, 779/556, 779/557, 779/558, 779/559, 779/560, 779/561, 779/562, 779/563, 779/564, 779/565, 779/566, 779/567, 779/568, 779/569, 779/570, 779/571, 779/572, 779/573, 779/574, 779/575, 779/576, 779/577, 779/578, 779/579, 779/580, 779/581, 779/582, 779/583, 779/584, 779/585, 779/586, 779/587, 779/588, 779/589, 779/590, 779/591, 779/592, 779/593, 779/594, 779/595, 779/596, 779/597, 779/598, 779/599, 779/600, 779/601, 779/602, 779/603, 779/604, 779/605, 779/606, 779/607, 779/608, 779/609, 779/610, 779/611, 779/612, 779/613, 779/614, 779/615, 779/616, 779/617, 779/618, 779/619, 779/620, 779/621, 779/622, 779/623, 779/624, 779/625, 779/626, 779/627, 779/628, 779/629, 779/630, 779/631, 779/632, 779/633, 779/634, 779/635, 779/636, 779/637, 779/638, 779/639, 779/640, 779/641, 779/642, 779/643, 779/644, 779/645, 779/646, 779/647, 779/648, 779/649, 779/650, 779/651, 779/652, 779/653, 779/654, 779/655, 779/656, 779/657, 779/658, 779/659, 779/660, 779/661, 779/662, 779/663, 779/664, 779/665, 779/666, 779/667, 779/668, 779/669, 779/670, 779/671, 779/672, 779/673, 779/674, 779/675, 779/676, 779/677, 779/678, 779/679, 779/680, 779/681, 779/682, 779/683, 779/684, 779/685, 779/686, 779/687, 779/688, 779/689, 779/690, 779/691, 779/692, 779/693, 779/694, 779/695, 779/696, 779/697, 779/698, 779/699, 779/700, 779/701, 779/702, 779/703, 779/704, 779/705, 779/706, 779/707, 779/708, 779/709, 779/710, 779/711, 779/712, 779/713, 779/714, 779/715, 779/716, 779/717, 779/718, 779/719, 779/720, 779/721, 779/722, 779/723, 779/724, 779/725, 779/726, 779/727, 779/728, 779/729, 779/730, 779/731, 779/732, 779/733, 779/734, 779/735, 779/736, 779/737, 779/738, 779/739, 779/740, 779/741, 779/742, 779/743, 779/744, 779/745, 779/746, 779/747, 779/748, 779/749, 779/750, 779/751, 779/752, 779/753, 779/754, 779/755, 779/756, 779/757, 779/758, 779/759, 779/760, 779/761, 779/762, 779/763, 779/764, 779/765, 779/766, 779/767, 779/768, 779/769, 779/770, 779/771, 779/772, 779/773, 779/774, 779/775, 779/776, 779/777, 779/778, 779/779, 779/780, 779/781, 779/782, 779/783, 779/784, 779/785, 779/786, 779/787, 779/788, 779/789, 779/790, 779/791, 779/792, 779/793, 779/794, 779/795, 779/796, 779/797, 779/798, 779/799, 779/800, 779/801, 779/802, 779/803, 779/804, 779/805, 779/806, 779/807, 779/808, 779/809, 779/810, 779/811, 779/812, 779/813, 779/814, 779/815, 779/816, 779/817, 779/818, 779/819, 779/820, 779/821, 779/822, 779/823, 779/824, 779/825, 779/826, 779/827, 779/828, 779/829, 779/830, 779/831, 779/832, 779/833, 779/834, 779/835, 779/836, 779/837, 779/838, 779/839, 779/840, 779/841, 779/842, 779/843, 779/844, 779/845, 779/846, 779/847, 779/848, 779/849, 779/850, 779/851, 779/852, 779/853, 779/854, 779/855, 779/856, 779/857, 779/858, 779/859, 779/860, 779/861, 779/862, 779/863, 779/864, 779/865, 779/866, 779/867, 779/868, 779/869, 779/870, 779/871, 779/872, 779/873, 779/874, 779/875, 779/876, 779/877, 779/878, 779/879, 779/880, 779/881, 779/882, 779/883, 779/884, 779/885, 779/886, 779/887, 779/888, 779/889, 779/890, 779/891, 779/892, 779/893, 779/894, 779/895, 779/896, 779/897, 779/898, 779/899, 779/900, 779/901, 779/902, 779/903, 779/904, 779/905, 779/906, 779/907, 779/908, 779/909, 779/910, 779/911, 779/912, 779/913, 779/914, 779/915, 779/916, 779/917, 779/918, 779/919, 779/920, 779/921, 779/922, 779/923, 779/924, 779/925, 779/926, 779/927, 779/928, 779/929, 779/930, 779/931, 779/932, 779/933, 779/934, 779/935, 779/936, 779/937, 779/938, 779/939, 779/940, 779/941, 779/942, 779/943, 779/944, 779/945, 779/946, 779/947, 779/948, 779/949, 779/950, 779/951, 779/952, 779/953, 779/954, 779/955, 779/956, 779/957, 779/958, 779/959, 779/960, 779/961, 779/962, 779/963, 779/964, 779/965, 779/966,

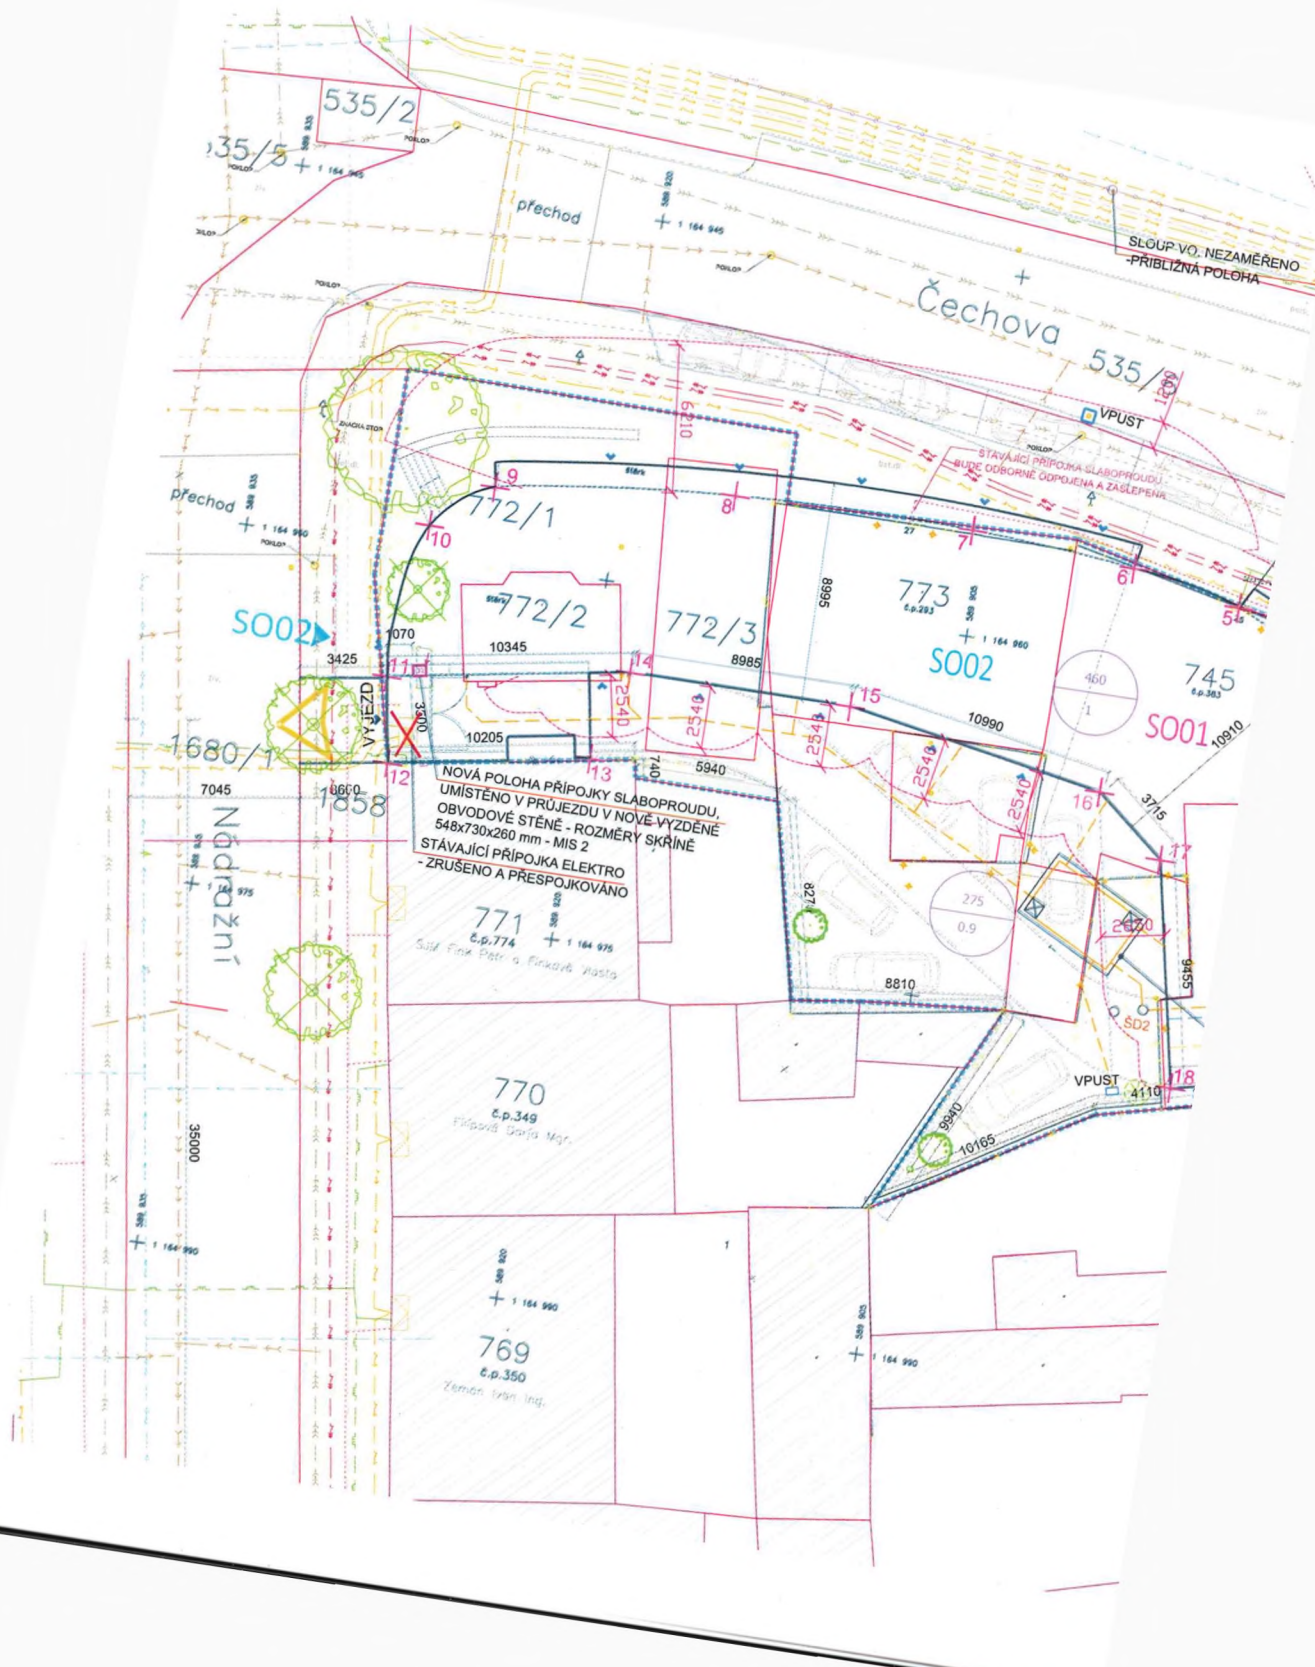

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PLYNU
-ZRUŠENO U NAVRTÁVKY

535/7

SLOUP VO, NEZAMĚŘENO
-PŘIBLIŽNÁ POLOHA

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA ELEKTRO
-PŘELOŽENO DO NOVÉ POLOHY NA FASÁDE

Výč.

1	080001 020	
2	080001 010	116000
3	080001 017	116000
4	080001 010	116000
5	080001 00A	116000 120
6	080001 002	116000 110
7	080001 001	116000 000
8	080001 000	116000 000
9	080001 000	116000 000
10	080001 000	116000 000
11	080001 000	116000 000
12	080001 000	116000 000
13	080001 000	116000 000
14	080001 000	116000 000
15	080001 000	116000 000
16	080001 000	116000 000
17	080001 000	116000 000
18	080001 000	116000 000
19	080001 000	116000 000
20	080001 000	116000 000

- ČLEŇENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY
- BO 00 - DEVELOPAMENT OBJEKT
 - BO 01 - IDENTIFIKACE VEŘEJNÉHO NEBO SOUKAŠNÍHO BYTÍ
 - BO 02 - OCHRANA A REKONSTRUKCE PŘÍRODNÍHO A NEPŘÍRODNÍHO PŮSOBNÍ
 - BO 03 - DOPRAVNÍ SPOJENÍ OBJEKTU S OÍ
 - BO 04 - PŘÍPOJKA VODY
 - BO 05 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - BO 06 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - BO 07 - PŘÍPOJKA PLYNOVODŮ
 - BO 08 - PŘÍPOJKA ELEKTŘINY
 - BO 09 - PŘÍPOJKA TELEFONNÍ KANALIZACE
 - BO 10 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - BO 11 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - BO 12 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - BO 13 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - BO 14 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - BO 15 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - BO 16 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - BO 17 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - BO 18 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - BO 19 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - BO 20 - PŘÍPOJKA KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)

- LEGENDA
- NAVRŽENÝ OBJEKT BO 01
 - NAVRŽENÝ OBJEKT BO 02
 - INTERIÉR EPURENÉ PLOCHY
 - VEŘEJNÉ DŘEVĚNÉ PLOCHY
 - ASFALTOVÁ KOBILIZACE
 - BUDDY
 - KATASTR
 - HRANICE (DOKONČENÝCH FASÁD)
 - ODSTRANĚNÉ ZŠLEŘ
 - POZEMK. NEBEZPEČNÝ PROSTOR

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PLYNOVOD STL (MNOHOV)
 - PLYNOVOD NTL (MNOHOV)
 - ELEKTRO. VÝSOKE NAPĚTÍ, PŘEDZÁHRNÍ (E-ON)
 - ELEKTRO. NÍZKÉ NAPĚTÍ, PŘEDZÁHRNÍ (E-ON)
 - JEDNOTNÁ KANALIZACE, PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - ELEKTRO. SLAŠKOVÁ (CETN)
 - KABEL OK, AOT
 - KABEL ST
 - VODOVOD (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)

- LEGENDA PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- DESTA KANALIZACE
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - VODOVOD
 - PLYNOVOD
 - ELEKTRO. NÍZKÉ NAPĚTÍ
 - KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - SLAŠKOVÁ KANALIZACE, PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)

- LEGENDA AREÁLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - KANALIZACE DESTA
 - VODOVOD
 - REKON. SACHTA KANALIZACE, PP (ER)
 - LIT. POKLOP 600x600
 - SLAŠKOVÁ KANALIZACE PLYNU, KANALIZACE PŮSOBNÍ (OVN, SLAŠKOVÁ)
 - 3 VÝŠŤOVÉ INJEKČNÍ KANALIZACE
 - OVODOVACÍ PLOCHA (M2)
 - KOEFICIENT ODTOKU
 - NOVA PŘÍPOJKA SKRIN SLAŠKOVÁ (TELEFONICA) - BUDDY PŘEPLETENÝ S (OVN) KABELY O PŘÍMĚRU 0,024, 0,03, 0,04, 0,05 mm
 - TYTO KABELY BUDOU V ZÁSEKNE OCHRANĚ VEŘEJNÉ VE ZDÍ - ROZMĚRY (PŘÍMĚRY) 0,024

POZNÁMKA
VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ABOU ZAKRESLENÉ POUZE IHPROJEKTNĚ PODLE PŮDNIKU PROJEKTOVATELŮ
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ PRÁCE JE NUTNO VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI VÝKONU VYTVÝŘIT, RADEJ VYKAZOČI A PO SOBU STAVBY CHRÁNIT PŘI PŮSOBNÍ
VEŠKERÉ KABELY PŘI KRESLENÍ A PROJEKTOVÁNÍM SÍTĚM ULOŽIT DO CHYBNÝCH
KABELŮV VLOŽENÍ KABELU NA POCHE ČÍSLO 52 (MNOHO) PŘI SOUBĚHU A KRESLENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI JE TREBA ODROZIT V SÁDELNOSTI PODLE ČSN 734801

SKLON ÚRČENÍ 1 KP (PODLAHA) = 318,10 m a.s.l.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. BLAŽKA ZLÁMALÁ
ING. LUDMILA ROJAL
VYPRACOVANÝ ING. LUKÁŠ ROJAL, ING. PETR DOLEŽAL
INVESTOR MĚSTO SLAŠKOVÁ, ÚSTAVNÍHO KANALIZ. 1897, 580 21, SLAŠKOVÁ
NA PARCELÁCH Č. 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/22, 77/23, 77/24, 77/25, 77/26, 77/27, 77/28, 77/29, 77/30, 77/31, 77/32, 77/33, 77/34, 77/35, 77/36, 77/37, 77/38, 77/39, 77/40, 77/41, 77/42, 77/43, 77/44, 77/45, 77/46, 77/47, 77/48, 77/49, 77/50, 77/51, 77/52, 77/53, 77/54, 77/55, 77/56, 77/57, 77/58, 77/59, 77/60, 77/61, 77/62, 77/63, 77/64, 77/65, 77/66, 77/67, 77/68, 77/69, 77/70, 77/71, 77/72, 77/73, 77/74, 77/75, 77/76, 77/77, 77/78, 77/79, 77/80, 77/81, 77/82, 77/83, 77/84, 77/85, 77/86, 77/87, 77/88, 77/89, 77/90, 77/91, 77/92, 77/93, 77/94, 77/95, 77/96, 77/97, 77/98, 77/99, 77/100, 77/101, 77/102, 77/103, 77/104, 77/105, 77/106, 77/107, 77/108, 77/109, 77/110, 77/111, 77/112, 77/113, 77/114, 77/115, 77/116, 77/117, 77/118, 77/119, 77/120, 77/121, 77/122, 77/123, 77/124, 77/125, 77/126, 77/127, 77/128, 77/129, 77/130, 77/131, 77/132, 77/133, 77/134, 77/135, 77/136, 77/137, 77/138, 77/139, 77/140, 77/141, 77/142, 77/143, 77/144, 77/145, 77/146, 77/147, 77/148, 77/149, 77/150, 77/151, 77/152, 77/153, 77/154, 77/155, 77/156, 77/157, 77/158, 77/159, 77/160, 77/161, 77/162, 77/163, 77/164, 77/165, 77/166, 77/167, 77/168, 77/169, 77/170, 77/171, 77/172, 77/173, 77/174, 77/175, 77/176, 77/177, 77/178, 77/179, 77/180, 77/181, 77/182, 77/183, 77/184, 77/185, 77/186, 77/187, 77/188, 77/189, 77/190, 77/191, 77/192, 77/193, 77/194, 77/195, 77/196, 77/197, 77/198, 77/199, 77/200, 77/201, 77/202, 77/203, 77/204, 77/205, 77/206, 77/207, 77/208, 77/209, 77/210, 77/211, 77/212, 77/213, 77/214, 77/215, 77/216, 77/217, 77/218, 77/219, 77/220, 77/221, 77/222, 77/223, 77/224, 77/225, 77/226, 77/227, 77/228, 77/229, 77/230, 77/231, 77/232, 77/233, 77/234, 77/235, 77/236, 77/237, 77/238, 77/239, 77/240, 77/241, 77/242, 77/243, 77/244, 77/245, 77/246, 77/247, 77/248, 77/249, 77/250, 77/251, 77/252, 77/253, 77/254, 77/255, 77/256, 77/257, 77/258, 77/259, 77/260, 77/261, 77/262, 77/263, 77/264, 77/265, 77/266, 77/267, 77/268, 77/269, 77/270, 77/271, 77/272, 77/273, 77/274, 77/275, 77/276, 77/277, 77/278, 77/279, 77/280, 77/281, 77/282, 77/283, 77/284, 77/285, 77/286, 77/287, 77/288, 77/289, 77/290, 77/291, 77/292, 77/293, 77/294, 77/295, 77/296, 77/297, 77/298, 77/299, 77/300, 77/301, 77/302, 77/303, 77/304, 77/305, 77/306, 77/307, 77/308, 77/309, 77/310, 77/311, 77/312, 77/313, 77/314, 77/315, 77/316, 77/317, 77/318, 77/319, 77/320, 77/321, 77/322, 77/323, 77/324, 77/325, 77/326, 77/327, 77/328, 77/329, 77/330, 77/331, 77/332, 77/333, 77/334, 77/335, 77/336, 77/337, 77/338, 77/339, 77/340, 77/341, 77/342, 77/343, 77/344, 77/345, 77/346, 77/347, 77/348, 77/349, 77/350, 77/351, 77/352, 77/353, 77/354, 77/355, 77/356, 77/357, 77/358, 77/359, 77/360, 77/361, 77/362, 77/363, 77/364, 77/365, 77/366, 77/367, 77/368, 77/369, 77/370, 77/371, 77/372, 77/373, 77/374, 77/375, 77/376, 77/377, 77/378, 77/379, 77/380, 77/381, 77/382, 77/383, 77/384, 77/385, 77/386, 77/387, 77/388, 77/389, 77/390, 77/391, 77/392, 77/393, 77/394, 77/395, 77/396, 77/397, 77/398, 77/399, 77/400, 77/401, 77/402, 77/403, 77/404, 77/405, 77/406, 77/407, 77/408, 77/409, 77/410, 77/411, 77/412, 77/413, 77/414, 77/415, 77/416, 77/417, 77/418, 77/419, 77/420, 77/421, 77/422, 77/423, 77/424, 77/425, 77/426, 77/427, 77/428, 77/429, 77/430, 77/431, 77/432, 77/433, 77/434, 77/435, 77/436, 77/437, 77/438, 77/439, 77/440, 77/441, 77/442, 77/443, 77/444, 77/445, 77/446, 77/447, 77/448, 77/449, 77/450, 77/451, 77/452, 77/453, 77/454, 77/455, 77/456, 77/457, 77/458, 77/459, 77/460, 77/461, 77/462, 77/463, 77/464, 77/465, 77/466, 77/467, 77/468, 77/469, 77/470, 77/471, 77/472, 77/473, 77/474, 77/475, 77/476, 77/477, 77/478, 77/479, 77/480, 77/481, 77/482, 77/483, 77/484, 77/485, 77/486, 77/487, 77/488, 77/489, 77/490, 77/491, 77/492, 77/493, 77/494, 77/495, 77/496, 77/497, 77/498, 77/499, 77/500, 77/501, 77/502, 77/503, 77/504, 77/505, 77/506, 77/507, 77/508, 77/509, 77/510, 77/511, 77/512, 77/513, 77/514, 77/515, 77/516, 77/517, 77/518, 77/519, 77/520, 77/521, 77/522, 77/523, 77/524, 77/525, 77/526, 77/527, 77/528, 77/529, 77/530, 77/531, 77/532, 77/533, 77/534, 77/535, 77/536, 77/537, 77/538, 77/539, 77/540, 77/541, 77/542, 77/543, 77/544, 77/545, 77/546, 77/547, 77/548, 77/549, 77/550, 77/551, 77/552, 77/553, 77/554, 77/555, 77/556, 77/557, 77/558, 77/559, 77/560, 77/561, 77/562, 77/563, 77/564, 77/565, 77/566, 77/567, 77/568, 77/569, 77/570, 77/571, 77/572, 77/573, 77/574, 77/575, 77/576, 77/577, 77/578, 77/579, 77/580, 77/581, 77/582, 77/583, 77/584, 77/585, 77/586, 77/587, 77/588, 77/589, 77/590, 77/591, 77/592, 77/593, 77/594, 77/595, 77/596, 77/597, 77/598, 77/599, 77/600, 77/601, 77/602, 77/603, 77/604, 77/605, 77/606, 77/607, 77/608, 77/609, 77/610, 77/611, 77/612, 77/613, 77/614, 77/615, 77/616, 77/617, 77/618, 77/619, 77/620, 77/621, 77/622, 77/623, 77/624, 77/625, 77/626, 77/627, 77/628, 77/629, 77/630, 77/631, 77/632, 77/633, 77/634, 77/635, 77/636, 77/637, 77/638, 77/639, 77/640, 77/641, 77/642, 77/643, 77/644, 77/645, 77/646, 77/647, 77/648, 77/649, 77/650, 77/651, 77/652, 77/653, 77/654, 77/655, 77/656, 77/657, 77/658, 77/659, 77/660, 77/661, 77/662, 77/663, 77/664, 77/665, 77/666, 77/667, 77/668, 77/669, 77/670, 77/671, 77/672, 77/673, 77/674, 77/675, 77/676, 77/677, 77/678, 77/679, 77/680, 77/681, 77/682, 77/683, 77/684, 77/685, 77/686, 77/687, 77/688, 77/689, 77/690, 77/691, 77/692, 77/693, 77/694, 77/695, 77/696, 77/697, 77/698, 77/699, 77/700, 77/701, 77/702, 77/703, 77/704, 77/705, 77/706, 77/707, 77/708, 77/709, 77/710, 77/711, 77/712, 77/713, 77/714, 77/715, 77/716, 77/717, 77/718, 77/719, 77/720, 77/721, 77/722, 77/723, 77/724, 77/725, 77/726, 77/727, 77/728, 77/729, 77/730, 77/731, 77/732, 77/733, 77/734, 77/735, 77/736, 77/737, 77/738, 77/739, 77/740, 77/741, 77/742, 77/743, 77/744, 77/745, 77/746, 77/747, 77/748, 77/749, 77/750, 77/751, 77/752, 77/753, 77/754, 77/755, 77/756, 77/757, 77/758, 77/759, 77/760, 77/761, 77/762, 77/763, 77/764, 77/765, 77/766, 77/767, 77/768, 77/769, 77/770, 77/771, 77/772, 77/773, 77/774, 77/775, 77/776, 77/777, 77/778, 77/779, 77/780, 77/781, 77/782, 77/783, 77/784, 77/785, 77/786, 77/787, 77/788, 77/789, 77/790, 77/791, 77/792, 77/793, 77/794, 77/795, 77/796, 77/797, 77/798, 77/799, 77/800, 77/801, 77/802, 77/803, 77/804, 77/805, 77/806, 77/807, 77/808, 77/809, 77/810, 77/811, 77/812, 77/813, 77/814, 77/815, 77/816, 77/817, 77/818, 77/819, 77/820, 77/821, 77/822, 77/823, 77/824, 77/825, 77/826, 77/827, 77/828, 77/829, 77/830, 77/831, 77/832, 77/833, 77/834, 77/835, 77/836, 77/837, 77/838, 77/839, 77/840, 77/841, 77/842, 77/843, 77/844, 77/845, 77/846, 77/847, 77/848, 77/849, 77/850, 77/851, 77/852, 77/853, 77/854, 77/855, 77/856, 77/857, 77/858, 77/859, 77/860, 77/861, 77/862, 77/863, 77/864, 77/865, 77/866, 77/867, 77/868, 77/869, 77/870, 77/871, 77/872, 77/873, 77/874, 77/875, 77/876, 77/877, 77/878, 77/879, 77/880, 77/881, 77/882, 77/883, 77/884, 77/885, 77/886, 77/887, 77/888, 77/889, 77/890, 77/891, 77/892, 77/893, 77/894, 77/895, 77/896, 77/897, 77/898, 77/899, 77/900, 77/901, 77/902, 77/903, 77/904, 77/905, 77/906, 77/907, 77/908, 77/909, 77/910, 77/911, 77/912, 77/913, 77/914, 77/915, 77/916, 77/917, 77/918, 77/919, 77/920, 77/921, 77/922, 77/923, 77/924, 77/925, 77/926, 77/927, 77/928, 77/929, 77/930, 77/931, 77/932, 77/933, 77/934, 77/935, 77/936, 77/937, 77/938, 77/939, 77/940, 77/941, 77/942, 77/943, 77/944, 77/945, 77/946, 77/947, 77/948, 77/949, 77/950, 77/951, 77/952, 77/953, 77/954, 77/955, 77/956, 77/957, 77/958, 77/959, 77/960, 77/961, 77/962, 77/963, 77/964, 77/965, 77/966, 77/967, 77/968, 77/969, 77/970, 77/971, 77/972, 77/973, 77/974, 77/975, 77/976, 77/977, 77/978, 77/979, 77/980, 77/981, 77/982, 77/983, 77/984, 77/985, 77/986, 77/987, 77/988, 77/989, 77/990, 77/991, 77/992, 77/993, 77/994, 77/995, 77/996, 77/997, 77/998, 77/999, 77/1000, 77/1001, 77/1002, 77/1003, 77/1004, 77/1005, 77/1006, 77/1007, 77/1008, 77/1009, 77/1010, 77/1011, 77/1012, 77/1013, 77/1014, 77/1015, 77/1016, 77/1017, 77/1018, 77/1019, 77/1020, 77/1021, 77/1022, 77/1023, 77/1024, 77/1025, 77/1026, 77/1027, 77/1028, 77/1029, 77/1030, 77/1031, 77/1032, 77/1033, 77/1034, 77/1035, 77/1036, 77/1037, 77/1038, 77/1039, 77/1040, 77/1041, 77/1042, 77/1043, 77/1044, 77/1045, 77/1046, 77/1047, 77/1048, 77/1049, 77/1050, 77/1051, 77/1052, 77/1053, 77/1054, 77/1055, 77/1056, 77/1057, 77/1058, 77/1059, 77/1060, 77/1061, 77/1062, 77/1063, 77/1064, 77/1065, 77/1066, 77/1067, 77/1068, 77/1069, 77/1070, 77/1071, 77/1072, 77/1073, 77/1074, 77/1075, 77/1076, 77/1077, 77/1078, 77/1079, 77/1080, 77/1081, 77/1082, 77/1083, 77/1084, 77/1085, 77/1086, 77/1087, 77/1088, 77/1089, 77/1090, 77/1091, 77/1092, 77/1093, 77/1094, 77/1095, 77/1096, 77/1097, 77/1098, 77/1099, 77/1100, 77/1101, 77/1102, 77/1103, 77/1104, 77/1105, 77/1106, 77/1107, 77/1108, 77/1109, 77/1110, 77/1111, 77/1112, 77/1113, 77/11

Dohoda o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o umístění stavby

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená [REDAKCE], specialistou pro výstavbu sítě dle pověření

na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

IČ: DIČ:

se sídlem:

zastoupena

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“, kteréžto bylo vydáno dne, (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí

o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Brně dne

V dne

za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Specialista pro výstavbu sítě
