

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

č. objednatele: 16PU-001789/15  
č. dodavatele/zhotovitele: 92/2015

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390 zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx osoba oprávněná jednat  
ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatelem“) na jedné straně

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno  
IČ: 25317628 DIČ: 25317628  
Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B. vložka 2144 Zastoupená  
xx

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem <sup>1)</sup>") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa, ISPROFIN 327 111 0901 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 38 928 898,41 Kč bez DPH. kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena Stavby</u> <u>Kč bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč DPH
I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa	38 928 898,41 Kč	8 175 068,67 Kč	47 103 967,08 Kč
	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa	3 892 889,84 Kč	81 7 506,87 Kč	4 710 396,71 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/56 Hodoňovice. protihluková opatření I. a II. etapa, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508991.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 0 - Nejsou
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací — výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1 . části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1 , části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1 , části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1 , části 4 . zadávací dokumentace s přílohou)
  - Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.1 1 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 10-06-2015

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 3 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Reditelství silnic a dálnic CR

Stavební práce otevřeném řízení

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod\* který vstupuje v platnost .  
podpisem obou stran.

Datum: 21-08-2015 Datum: \_\_\_\_\_



V Oslravě 10-08-2015 /bpo

Číslo zakázky: Nejvh.nab. I

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a .s.  
 Mlýnská 68 dne: Mlýnská 68  
 602 OO BR NO  
 kontaktní adresa:—  
 Ostrava  
 Palackého 1 05  
 702 OO OSTRAVA

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 – Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa“

žadavací řízení zahájeno dne 02. 06. 2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č.. 508991 / ISPR(FIN / SPROFOND: 327 1 0901 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek. z něhož. je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1., která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno, právní forma: akciová společnost, IČ: 2531 7628.

Celková nabídková cena uchazeče: 38 928 898,41 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3., podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s., sídlo: Národní 138/10, I I O OO Praha I - Nové Město, právní forma: akciová společnost, IČ: 45274924.

Celková nabídková cena uchazeče: 39 799 362,64 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2., podaná uchazečem

SDS EXMOST spol. s r.o., , 602 00 Brno Veveří, právní společnost s ručením omezeným,  
IC: 49454501 .

Celková nabídková cena uchazeče: 46 700 800,00 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4., podaná uchazečem

STRABAG a.s., sídlo: Na Bělidle 198/2, Praha , právní forma: akciová společnost, IČ: 60838744.

Celková nabídková cena uchazeče: 47 250 000,00 Kč (bez DPH)

6, Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5., podaná uchazečem

Skanska a.s., sídlo: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, právní forma: akciová společnost, IČ: 26271303.

Celková nabídková cena uchazeče: 48 694 365,93 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona.

V Ostravě dne 10-08-2015

silnic dálnic CR  
práce v

## DOPIS NABÍDKY

ví silnic a dálnic ČR

práce v řízení

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (l)opisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako .jc jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis a jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

řádně oprávněn podepsat nabídku či v zastoupení: FIRETA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Adresa: Mlýnská 68, 602 00 Brno

Datum: 8.7.2015

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a<sup>II</sup>. etap

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje.
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	FIRF, STA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Název a adresa správce stavby	1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava Mariánské Hory
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	12 měsíců

silnic a dálnic. CR  
práce v řízení

Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	12 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců na I)I-IS, 48 měsíců na asfaltové souvrství a 36 měsíců na VD/. v plastu, ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt jinak
Výše Rezervy		10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby		jednotlivé stavební objekty
Stavba		I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa
Elektronické přenosové systémy	I.3	fax
Použité právo	1.4	právo České republiky- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na		ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1

Ředitelst 1/6( I ková opati•en í l. a II. etaStavební otevřeném

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
staveniště	4.2	obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla		10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Šmluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	1 0.000,- Kč za každý započatý (len prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o



Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	5 1 .000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté ceny stavby bez
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo udržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.00(),- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele		10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
		10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo
	4.29 b)	

silnic a dálnic, práce v

Ředitelství

(R

Stavební

otevírací řízení

lánku s  
vhodných  
odmínek 2

1

s

5 s

<p>Název článku obchodních podmínek</p>	<p>silnic a lnic CR</p>	<p>prot opat práce v</p>	<p>L. a II, eta</p>
	<p>8.7</p>		
<p>Maximální celková výše smluvních pokut</p> <p>Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele</p> <p>Smluvní pokuta</p>	<p>14.2</p> <p>1/56 1 ludoit'lov ic.e, I I ih I k o ol ) a• t i'c I I i</p>		
<p>Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha</p> <p>Měna platby</p> <p>Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za</p> <p>Příslušné, údaje</p>			

ví silnic a dálnic pro luh opal

práce v

Kč za každou započatou hodinu prodlení odstraněním každého jednotlivého případu /nečištění pozemní komunikace z hodnoty milníku

1 0.000,,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání lakového porušení

Kč za každý jednotlivý případ porušení

.30% z přijaté ceny stavby bez DPH I -I

Smluvní pokuta činí (i) Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.

nedodržení Doby pro dokončení stavby:

25.000,- Kč za každý započatý den prodlení

zhotovitel(dokončením díla v době pro dokončení nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dlc

1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu

15% částky z každého Potvrzení platby

koruna česká, podle Dopisu nabídky

nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo		
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnemu nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má obce dnatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Datum: 8.7.2015

FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/56 Hodoňovice, protihluková opatření E. II. etapa

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa, jakož i následky jejich nedodržení. účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze Strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách tímto odstavcem dotčeno.
- 2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce, na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít a to i bez uvedení důvodů,
- 3) Oznáme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů),

jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly . . .  
na staveništi.

- 5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených .  
dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky  
subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše  
uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití  
subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1 Kč (slovy: jeden milión dvě stě tisíc korun  
českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou  
zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních

pokutách nejsou to našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce, Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupil od Smlouvy o dílo.

- 6) Nejpozději do 60 dnů od splnění o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje I do 28. února kalendářního rok u předlozadavateli seznam subdodavatelů, ve, kterém uvedeme subdodavatele, jimž. jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, z části ceny veřejné zakázky uhrazené v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. I léto Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 'Zajistíme, aby smlouvy subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 7) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve 7.nění Zvláštních obchodních podmínek.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace. budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 8.7.2015



DÍL 1, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 4.4.2  
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: FIRESTA Fišer. rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČO: 253 1 7628

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně\_ hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/58 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508991 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše,

byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoli zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoli zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoli nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo povinnostech v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoli smlouvy, aby kdokoli získal podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

- Objednatel (Employer) je osoba označená v příloze k nabídce.

- Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoli jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

- Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Ostravě dne 8.7.2015

**DÍL ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.5**  
**ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Název veřejné zakázky: I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa

Společnost FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavbv a.s., se sídlem: Mlýnská  
388/68, 602 OO Brno, IČ: 253 17 628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508991 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství: cca	Min. reprodukční pořizovací cena
(i) I.etapa dřevní hmota	53 tun	
(ii) II.etapa dřevní hmota množství větví z toho	7,49 tun	
.. palivové dříví		250,- Kč/m3
.. štěpkovaný materiál		400,- Kč/t

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení, Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Ostravě dne 8.7.2015

DÍL 1 , ČÁST 4  
FORM U LÁŘ 4.4.6  
**PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A  
ROZDĚLENÍ PRACÍ**

Společnost FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se , sídlem: Mlýnská  
388/68, 602 00 Brno, IČ: 253 1 7 628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/56 Hodoňovicc, protihluková  
opatření I. a II. etapa, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508991 (dále jen  
„uchazeč“), tímto

uvádí, že při

realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živice), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu které přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

Práce na I. etapě (předpokládaná délka 7 měsíců od předání staveniště) spočívající v:

- kácení zeleně, demontáže billboardů a eklamních panelů;
- budování soustavy odvodnění;
- Vrtání, armování a betonáž pilot;
- betonáž hlav pilot vč. osazování prefí sloupků PHS;
- realizace rigolů, ul. vpustí a skluzů;
- úpravy přemostění Hodoňovického náhonu (sanace říms);
- osazení ocel. sloupů PHS na přemostění;
- usazení ZB soklů a panelů PHS;
- dosypání a zpevnění mezi krajnicí a soklem;
- osazení svodidel a dopravního značení;
- terénní úpravy.

Práce na II. etapě (předpokládaná délka 5 měsíců od předání staveniště) spočívající v:


- budování soustavy odvodnění;
- vrtání, armování a betonáž pilot;
- betonáž hlav pilot vč. osazování prefí sloupků PHS;
- realizace rigolů, ul. vpustí a skluzů;
- osazení ocel. sloupů PI-IS na přemostění;
- usazení ZB soklů a panelů PHS;
- dosypání a zpevnění mezi krajnicí a soklem;
- osazení svodidel a dopravního značení;
- terénní úpravy.

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován



Stavba.            I/56, Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa”

## STRUČNÉ SCHÉMA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

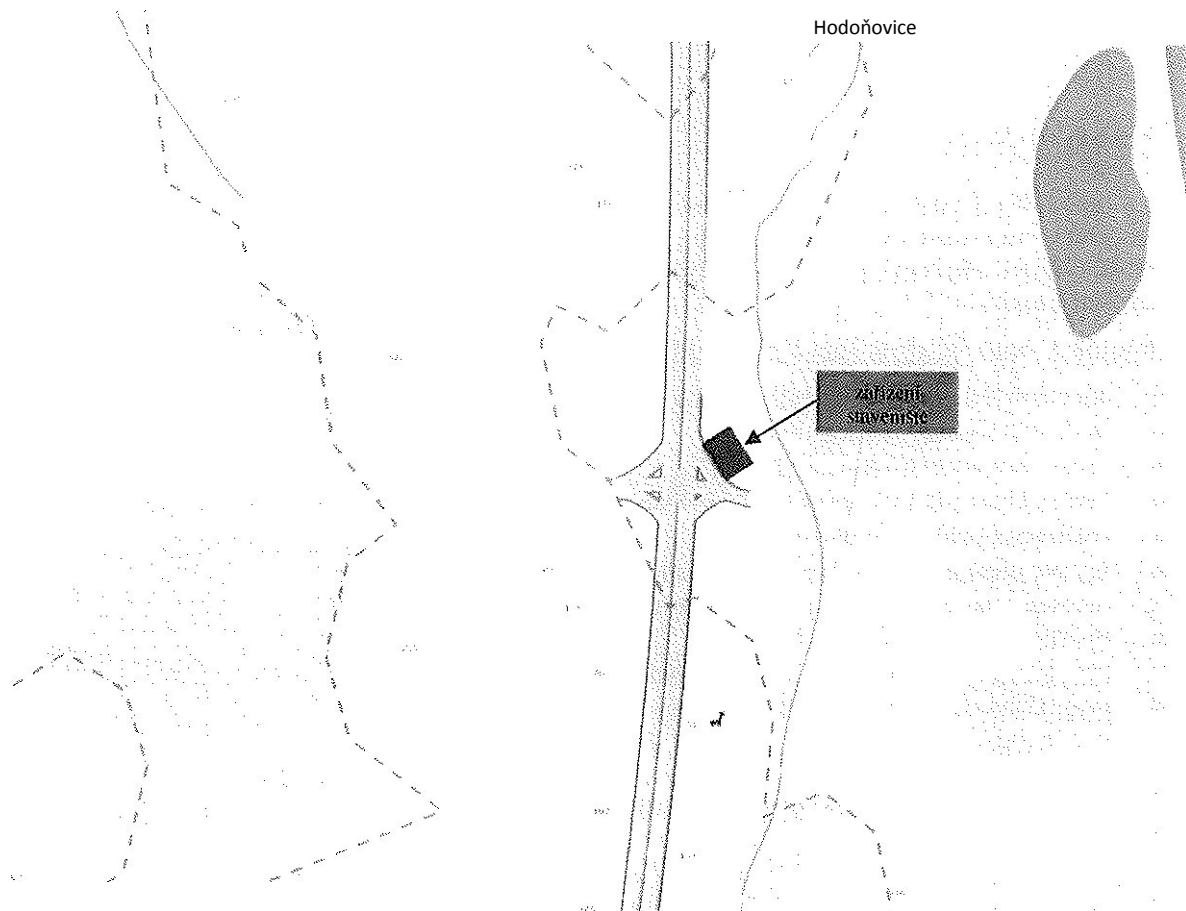

v Ostravě 07.07.2015

## Stavba:

I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I.a II. e

# STRUČNÉ SCHÉMA POSTUPU PŘI REALIZACI

## Postu výstavby

V termínu od podpisu smlouvy do předání staveniště se provedou přípravné práce, které budou spočívat v projednání a vyřízení souhlasu s provizorním dopravním značením (DI Policie t.) MLSK — odbor dopravy), provede se vytýčení inženýrských sítí, nachystá se materiál kc zřízení zařízení staveniště.

Práce na I. etapě předpokládaná délka 7 měsíců od předání staveniště) spočívající v:

- kácení zeleně, demontáže billboardů a rek tamních panelů;
- budování soustavy odvodnění;
- vrtání, armování a betonáž pilot;
- betonáž hlav pilot vč. osazování prefa sloupků PI IS;
- realizace rigolů, ul. vpustí a skluzů;
- úpravy přemostění Hodoňovického náhonu (sanace říms);
- osazení ocel. sloupů PFIS na přemostění;
- usazení ZB soklů a panelů PFIS;
- dosypání a zpevnění mezi krajnicí a soklem;
- osazení svodidel a dopravního značení;
- terénní úpravy.

Osazením dopravního značení bude I. etapa díla připravena k předání a převzetí.

práce na I. etapě (předpokládaná délka 5 měsíců od předání staveniště) spočívající v:

- budování soustavy odvodnění;
- Vrtání, armování a betonáž pilot;
- betonáž hlav pilot vč. osazování prefa sloupků PI-IS;
- realizace rigolů, ul. vpustí a skluzů;
- osazení ocel. sloupů P HS na přemostění;
- usazení ŽB soklů a panelů PBS;
- dosypání a zpevnění mezi krajnicí a soklem;
- osazení svodidel a dopravního značení;
- terénní úpravy.

Osazením dopravního značení bude II. etapa díla připravena k předání a převzetí a může začít likvidace zařízení staveniště.

v Ostravě 07.07.2015



FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Mlýnská 68. 602 00 Brno, tel: 543 532 231, 233, fax: 543 532 232, www.firesta.cz

stavba.. M65 Hodoňovice, protihluková opatření i , a El. etapa

strana 1/1

Ředitelství silnic a dálnic (CR)  
Stavební práce v otevřeném řízení

I/66 Hodoňovice, PI 'OI ih hl k o opal i

I. a II. eta

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.407**

**SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS**

Společnost FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská  
388/68, 602 00 Brno, JČ: 253 17 628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
KS v Brně, oddíl 1 .3. vložka 2144

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/56 Hodoňoprotiluková  
opatření I. a II. etapa, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508991 (dále jen  
„uchazeč”), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou  
výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem



ak0V)'! ČI, v

OP není, a to zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IC / datum narození	Sídlo / bydliště
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Zodpovědná osoba (zaměstnanec):  ..... autorizovaný inženýr 5' oboru dopravní stavby a v oboru mosty a inženýrské konstrukce  ..... autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb	IC: 253 1 7 628  7. 5. 1964  6. 7. 1962	Mlýnská 68, 602 00 Brno  Bydliště: xxxxxxxx  Bydliště: xxxxxx

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Ostravě dne 8.7.2015

## DÍL I, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.1 1 PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost FIR ESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ: 253 17 628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa“, ev. č. dle. Věstníku veřejných zakázek 508991 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

I. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslu), datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či Užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného: vzoru na území České republiky
1,	NETYKA SE	NETYKA SE	NETYKA SE	NETYKA SE
2.	NETYKA SE	NETYKA SE	NETYKA SE	NETYKA SE

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

2.	NIITÝKÁ SE	NETÝKÁ SE	NF,TÝKÁ SE	NETÝKÁ
	NETÝKA _____	NL'TÝKÁ SE	TÝKÁ	NETÝKÁ SF,

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany (Ile zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech I a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Ostravě dne 8.7.2015
