



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

TECH. SPRÁVA
hl. m. Prahy, a.s.
Řánskovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

číslo smlouvy objednatele:

19/3/19/2280/0118

číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řánskovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

[REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [REDAKCE]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE]

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

2. Zhotovitel: [REDAKCE] spol. s r.o.

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany

[REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 146028

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA – jednatelem a ředitelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA
- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Vrána

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Most P 027 Butovice (obj. 0470), Praha 5 – údržbové práce“, dle projektové dokumentace ve stupni DVZ, kterou zpracovala společnost TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, Praha 8.

Předmětem plnění je provedení údržbových prací na mostě P 027 Butovice. Bude provedena sanace betonových konstrukcí, přeizolace, výměna příslušenství, nové vozovkové souvrství a pochozí vrstva v podchodu.

Podrobněji popsáno v projektové dokumentaci a přiloženém soupisu prací.

Součástí plnění je též:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
- zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započatím stavby)
- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů
- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložena do systému BMS)
- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby
- zaměření skutečného provedení stavby
- dodání projektu RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě
- dodání veškerých TP, KZP a všech dokladů stavby
- dodání Referenčního listu.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: ul. Řeporyjská, Praha 5 – Jinonice
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelem o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12. 1. 2017, ve znění jejích dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Termín zahájení díla: | do 14 dnů od výzvy Objednatele, nejdříve však po zveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv |
| 2. Termín zahájení stavebních prací: | dle vydání DIR |
| 3. Termín dokončení stavebních prací: | 140 kal. dní od jejich zahájení |
| 4. Termín dokončení díla: | do 30 kal. dní od dokončení stavebních prací |

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodlení prodlouží.

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle stavebního povolení.
6. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce bude odpovídat i navržený HMG provádění prací.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. Celkem cena za dílo bez DPH: 5 485 034,18 Kč
DPH: 1 151 857,18 Kč
Cena celkem včetně DPH: 6 636 891,00 Kč

Cena je blíže specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.

3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu dle požadavku a vzoru předaného zhotoviteli objednatelem, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizace, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí.
4. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
5. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací, po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušební plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru objednatele.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. [REDAKCE] Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat technický dozor stavebníka (TDS).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstranění vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD

- výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
- atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
- dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
- zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
- doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
- vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
- hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
- vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. [REDAKCE] Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX.

Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

X.

Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,

6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. [redacted] Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. [redacted] Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nespochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu

dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujist'uje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.
Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli úseku speciálních staveb objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele úseku speciálních staveb, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušebním plánu) a před realizací je dodá ke schválení objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů.
15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přejímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
17. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o

materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratorí objednatele.

18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
19. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli pasportizaci.
20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDS dané akce (oznámení o ukončení prací).

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.


9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. [REDAKCE] Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. [REDAKCE] Sb.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Podrobný harmonogram prací
 - Oceněný položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů

V Praze dne 16. 09. 2019

V Praze dne

objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


zhotovitel
[REDAKCE] spol. s r. o.



Akce: „Most P 027 Butovice (obj. 0470), Praha 5 – údržbové práce“

Príloha č. 1 k SoD

Harmonogram praci

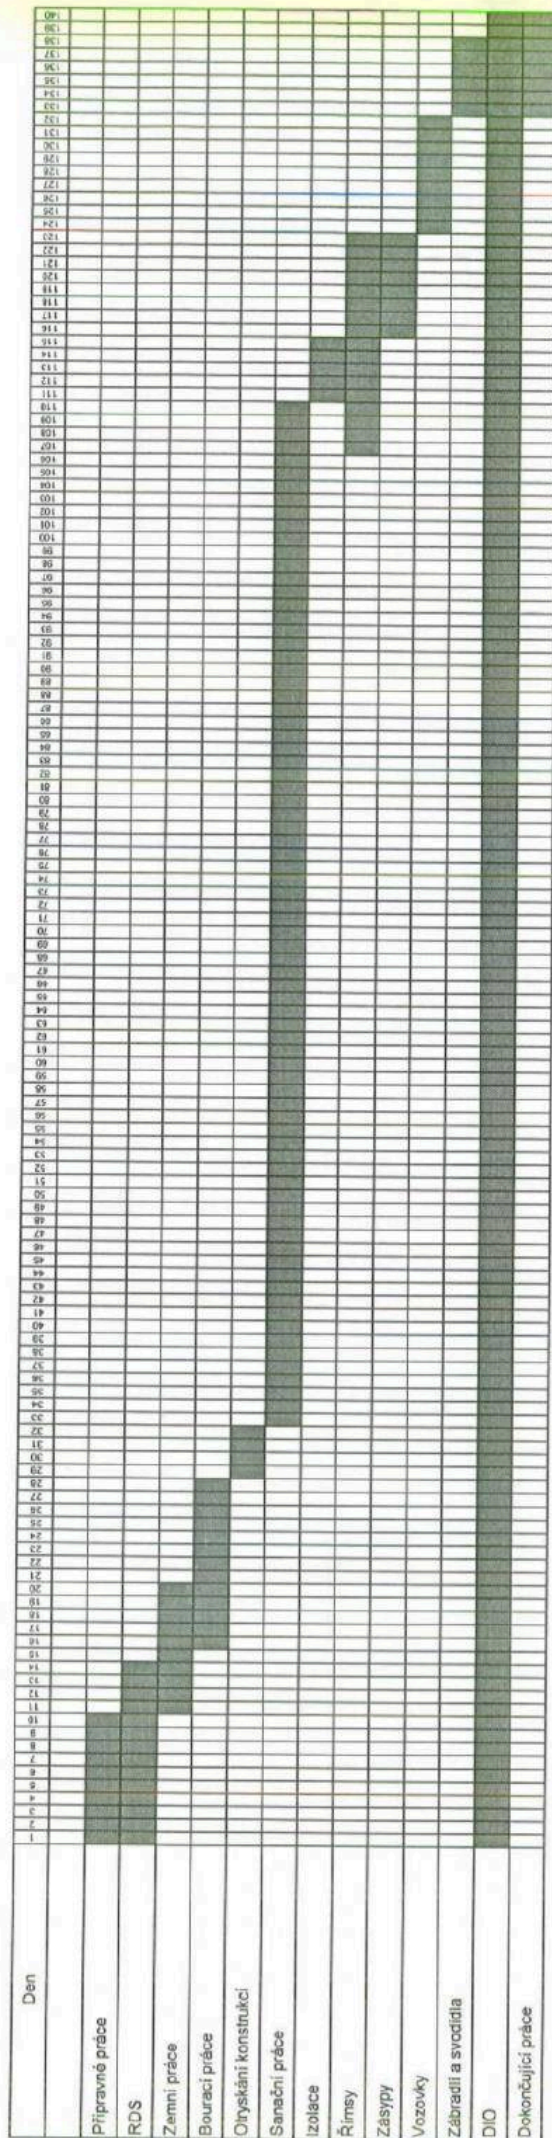

Zahájení stavby:	16.07.2019
Dokončení stavby:	02.12.2019
Celkem kalendářní dnů:	140 dnů


Soupis objektů s DPH

Stavba: 115-18 - P027 Butovice obj. 0470

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 5 485 034,18
OC+DPH: 6 636 891,36

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
DIO	Dopravněinženýrská opatření	266 437,00	55 951,77	322 388,77
Oprava mostu	Oprava mostu	5 218 597,18	1 095 905,41	6 314 502,59



Aspe

Firma: BM Construction, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

115-18

číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

DIO
DIO

P027 Butovice obj. 0470

Dopravněinženýrská opatření
Dopravněinženýrská opatření

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
1	2019_OTSKP	02940	R	Všeobecné konstrukce a práce				
				OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
				Projektování a projednání DIR				
				Všeobecné konstrukce a práce				55 000,00
2	2019_OTSKP	91400		Ostatní konstrukce a práce				
				DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	14,000	20,00	280,00
				škrtačí páska na dopravní značení				
3	2019_OTSKP	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	44,000	280,00	12 320,00
				Dočasné dopravní značky				
4	2019_OTSKP	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	44,000	165,00	7 260,00
				Dočasné dopravní značky				
5	2019_OTSKP	914129		DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 232,000	10,00	12 320,00
				Dočasné dopravní značky				
				Předpoklad výstavby - 28 dní				
				44*28=1 232,000 [A]				
6	2019_OTSKP	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	650,00	7 150,00
				Dočasné dopravní značky - velikostné tabule				
7	2019_OTSKP	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	340,00	3 740,00
				Dočasné dopravní značky - velikostné tabule				
8	2019_OTSKP	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 232,000	25,00	30 800,00
				Dočasné dopravní značky - velikostné tabule				
				Předpoklad výstavby - 28 dní				
				44*28=1 232,000 [A]				
9	2019_OTSKP	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	55,000	260,00	14 300,00
10	2019_OTSKP	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	55,000	170,00	9 350,00
11	2019_OTSKP	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	1 540,000	5,00	7 700,00
				Předpoklad výstavby - 28 dní				
				55*28=1 540,000 [A]				
12	2019_OTSKP	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLADKA	M2	2,500	1 200,00	3 000,00
				VDZ na škrty V9				
13	2019_OTSKP	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	2,500	250,00	625,00
				VDZ na škrty V9				
				20*0,125=2,500 [A]				
14	2019_OTSKP	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	2 300,00	2 300,00
				Výstražná souprava umístěná u zábran Z4				
15	2019_OTSKP	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	990,00	990,00
				Výstražná souprava umístěná u zábran Z4				
16	2019_OTSKP	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	28,000	220,00	6 160,00
				Výstražná souprava umístěná u zábran Z4				
				Předpoklad výstavby - 28 dní				

číslo a název rozpočtu:

DIO

Dopravněinženýrská opatření

Poř. č. pol.	1	cenová soustava	2	Kód položky	3	Variantní položky	4	Název položky	5	jednotka	6	Počet jednotek	7	jednotková	8	CENA celkem	9
								1*28=28,000 [A]									
17	2019_OTSKP			916332				SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		KUS		19,000		180,00		3 420,00	
18	2019_OTSKP			916333				SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ		KUS		19,000		120,00		2 280,00	
19	2019_OTSKP			916339				SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ		KSDEN		532,000		16,00		8 512,00	
								Předpoklad výstavby - 28 dní									
								19*28=532,000 [A]									
20	2019_OTSKP			916712				UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM		KUS		68,000		120,00		8 160,00	
21	2019_OTSKP			916713				UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ		KUS		68,000		70,00		4 760,00	
22	2019_OTSKP			916719				UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ		KSDEN		1 904,000		15,00		28 560,00	
								Předpoklad výstavby - 28 dní									
								68*28=1 904,000 [A]									
23	2019_OTSKP			916812				ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM		M		35,000		220,00		7 700,00	
								Ploty pro oddělení chodců od pracoviště									
24	2019_OTSKP			916813				ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ		M		35,000		150,00		5 250,00	
								Ploty pro oddělení chodců od pracoviště									
25	2019_OTSKP			916819				ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ		MDEN		980,000		25,00		24 500,00	
								Ploty pro oddělení chodců od pracoviště									
								Předpoklad výstavby - 28 dní									
								35*28=980,000 [A]									

9

Ostatní konstrukce a práce

211 437,00

Celkem

266 437,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

266 437,00

Stavba 115-18 P027 Butovice obj. 0470
číslo a název SO Oprava mostu
číslo a název rozpočtu: Oprava mostu

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2019_OTSKP	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOVÝ BETON AB recyklát	T	124,800	350,00	43 680,00
2,4*52,0=124,800 [A]								
2	2019_OTSKP	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - LITÝ ASFALT (BEZ DEHTU), VYBOURANÁ IZOLACE litý asfalt, hydroizolace	T	15,598	450,00	7 019,10
LA: 2,4*4,05=9,720 [A]								
hydroizolace: 2,4*0,010*244,9=5,878 [B]								
Celkem: A+B=15,598 [C]								
3	2019_OTSKP	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON, ŽELEZOBETON, KÁMEN	T	540,788	320,00	173 052,16
cihly: 1,9*34,96=66,424 [A]								
prostý beton: 2,5*15,75=39,375 [B]								
ŽB: 2,5*23,175=57,938 [C]								
obrubníky: 2,5*((27,0*2)*0,05*0,2+(21,0*3+21,2)*0,15*0,25)=9,244 [D]								
mezerovitý beton: 1,5*138,0=207,000 [E]								
KSC: 2,3*69,916=160,807 [F]								
Celkem: A+B+C+D+E+F=540,788 [G]								
4	2019_OTSKP	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	236,570	350,00	82 799,50
zemina: 1,8*131,428=236,570 [A]								
5	2019_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
Vytyčení síti, zaměření skutečného stavu opravy mostu								
6	2019_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00
7	2019_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODŮ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	28 000,00	28 000,00
DPS, mostní list								
8	2019_OTSKP	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	16 000,00	16 000,00
9	2019_OTSKP	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	7 000,00	14 000,00
základní informační tabule o stavbě								
10	2019_OTSKP	03100		ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
zařízení staveníště								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
609 550,76								

1 Zemní práce								
11	2019_OTSKP	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM odstranění vrstvy LA chodníku v podchodu předpoklad tl. 30 mm	M3	4,050	790,00	3 199,50
0,030*27,0*5,0=4,050 [A]								
12	2019_OTSKP	113146		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM vrstva vozovky ŠZC (KSC) tl. 60-240 mm	M3	69,916	1 280,00	89 492,48
na předpoli: 7,0*0,24*(7,6+7,4+8,8+7,4)=52,416 [A]								
na mostě: 1,2*7,0+1,3*7,0=17,500 [B]								
Celkem: A+B=69,916 [C]								

číslo a název rozpočtu: Oprava mostu

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 2019_OTSKP	11352A			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY Vybourání stávajících betonových obrubníků na mostě a v podchodu (21,0+21,2+21,0+21,0)+27,0*2=138,200 [A]	M	138,200	90,00	12 438,00
14 2019_OTSKP	11352B			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA odvoz na skládku do 12 km	tkm	107,136	15,00	1 607,04
obrubníky na mostě podél komunikace: (21,0+21,2+21,0+21,0)*0,036*2,5=7,578 [A] chodník v podchodu: (27,0*2)*0,01*2,5=1,350 [B] Celkem: (A+B)*12=107,136 [C]								
15 2019_OTSKP	113726			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Odstranění stávajících vozovkových souvrství předpoklad tl. 160 mm	M3	52,000	1 410,00	73 320,00
16 2019_OTSKP	131836			HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. II, ODVOZ DO 12KM výkopy	M3	131,428	620,00	81 485,36
násyp komunikace: 2*1,2*23,0=55,200 [A] výkopy v podchodu: 27,0*0,25=6,750 [B] travní pásy: 0,8*19,0+0,6*19,0+1,5*6,0+0,2*6,0+0,65*3,5*6,8+0,65*3,5*5,5=64,783 [C] podél křídla: (0,5*0,3)*(8,0*3+7,3)=4,695 [D] Celkem: A+B+C+D=131,428 [E]								
17 2019_OTSKP	18233	R		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M včetně dodání ornice a osetí travou	M2	98,000	250,00	24 500,00
50+40+4*2=98,000 [A]								
1 Zemní práce								286 042,38
2 Základy								
18 2019_OTSKP	21263			TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Drenážní TR DN150	M	76,600	360,00	27 576,00
12,8*2+13,5*2+8,0*3=76,600 [A]								
19 2019_OTSKP	26164	R		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 200MM jádrové vrtý pro vstup drenáže skrz křídla	M	6,400	4 120,00	26 368,00
4*1,6=6,400 [A]								
20 2019_OTSKP	285393			DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ vlepení kotev (průměr 20 mm) do vrtů, včetně vrtů průměru 24 mm a hloubky 190 mm, vzdálenost vrtů 1,0 m	KUS	56,000	390,00	21 840,00
19*2+6*2+3*2=56,000 [A]								
2 Základy								75 784,00
3 Svislé konstrukce								
21 2019_OTSKP	31717			KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Kotvy římsy á 1,0 m	KG	337,120	156,00	52 590,72
(19*2+6*2+3*2)*6,02=337,120 [A]								
22 2019_OTSKP	317325			ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37-XF4, včetně smršťovacích spár	M3	33,162	9 800,00	324 987,60
(0,221*19,0+12,02*0,55)+(0,221*19,0+11,52*0,55)+(0,258*(1,8*2+4,5*2)+(4,1*0,55+4,1*1,2)+(1,83*0,38*2))=33,162 [A]								

číslo a název rozpočtu: Oprava mostu

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
23 2019_OTSKP	317365			VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 125 kg/m3	T	4,145	28 000,00	116 060,00
3				0,125*33,162=4,145 [A]				
				Svislé konstrukce				493 638,32
4				Vodorovné konstrukce				
24 2019_OTSKP	451312			PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,350	2 780,00	28 773,00
				Podkladní beton C12/15-X0				
				pod drenáží: 0,225*(23,0*2)=10,350 [A]				
25 2019_OTSKP	45131A			PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	11,340	2 920,00	33 112,80
				Betonové lože C20/25-XF3				
				lože obručníků na mostě: 0,08*(21,0+21,2+21,0+7,5*2)+0,08*(1,4*2+2,0*2+6,9+6,2)=7,848 [A]				
				lože obručníků v podchodu: 0,04*(27,0*2)=2,160 [B]				
				lože obručníků podél křidel: 0,04*(8,5*3+7,8)=1,332 [C]				
				Celkem: A+B+C=11,340 [D]				
26 2019_OTSKP	45152			PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	41,062	890,00	36 545,18
				podkladní vrstva ŠD FR 0-32, pod dlažbou podél říms a v podchodu				
				okolo říms: 0,6*19,0+0,5*19,0+1,5*7,1+0,2*3,53*2=32,962 [A]				
				v podchodu: 27,0*0,3=8,100 [B]				
				Celkem: A+B=41,062 [C]				
27 2019_OTSKP	45157			PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,695	820,00	3 849,90
				zásp podél křidel z drobného šterku (kačírku)				
				(8,0*3+7,3)*0,5*0,3=4,695 [A]				
28 2019_OTSKP	45734			VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,018	79 000,00	1 422,00
				Podílí patek zabradlí plastmaltou tl. min. 10 mm				
				30*(0,20*0,20*0,015)=0,018 [A]				
29 2019_OTSKP	45746	R		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALT ZVLÁŠTNÍ (SANAČNÍ)	M3	2,156	62 000,00	133 672,00
				spádování horního povrchu NK ze sanační malty tl. max. 80 mm, rezerva 10 % na vyrovnání				
				(0,03+0,14+0,05+0,06)*7,0*1,1=2,156 [A]				
30 2019_OTSKP	458523			VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	184,000	860,00	158 240,00
				4,0*23,0*2=184,000 [A]				
4				Vodorovné konstrukce				395 614,88
5				Komunikace				
31 2019_OTSKP	56213			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	325,000	299,00	97 175,00
				Podkladní vrstva SC C8/10 tl. 130 mm				
				170,0+155,0=325,000 [A]				
32 2019_OTSKP	56330			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	59,248	730,00	43 251,04
				podkladní vrstva vozovky do 220 mm				
				na předpoli: 7,0*0,22*(7,6+7,4+8,8+7,4)=48,048 [A]				
				na mostě: 0,9*7,0+0,7*7,0=11,200 [B]				
				Celkem: A+B=59,248 [C]				
33 2019_OTSKP	572113			INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	325,000	15,00	4 875,00
				Infiltrační postřik PI, EP 0,5 kg/m2				
				170,0+155,0=325,000 [A]				
34 2019_OTSKP	572212			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	650,000	15,00	9 750,00
				Spojovací postřik PS 0,25 kg/m2 (2 vrstvy)				
				(170,0+155,0)*2=650,000 [A]				

číslo a název rozpočtu: Oprava mostu

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
35	2019_OTSKP	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 40MM	M2	325,000	260,00	84 500,00
				170,0+155,0=325,000 [A]				
36	2019_OTSKP	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 60MM	M2	325,000	310,00	100 750,00
				170,0+155,0=325,000 [A]				
37	2019_OTSKP	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	325,000	280,00	91 000,00
				170,0+155,0=325,000 [A]				
38	2019_OTSKP	5774LB		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 8 nové pochozí vrstvy chodníku v podchodu (tl. 30 mm)	M3	3,240	10 220,00	33 112,80
				0,03*27*0*4,0=3,240 [A]				
39	2019_OTSKP	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba na mostě mezi římsami a komunikací a v podchodu podél stěn včetně lože z kamenné drtě 4/8 tl. 50 mm na mostě: 38,0+25,0+27,0=90,000 [A] v podchodu: 26,0*0,5*2=26,000 [B] Celkem: A+B=116,000 [C]	M2	116,000	430,00	49 880,00
				Celkem: A+B=116,000 [C]				
				Komunikace				514 293,84
				5				
				6				
40	2019_OTSKP	626111		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM předpoklad 50% ploch vnitřní plochy objektu: 0,5*(5,0*(13,4+10,8)+(2,9+3,4)/2*26,1*2+11,7*0,45)=145,348 [A] portálové stěny: 0,5*(27,5+30,2)=28,850 [B] ruby objektu: 0,5*(7,0*(8,6+6,7)+1,9*2*23,0+5,0*4+4*6*1,55)=125,850 [C] Celkem: A+B+C=300,048 [D]	M2	300,048	860,00	258 041,28
				Celkem: A+B+C=300,048 [D]				
41	2019_OTSKP	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM předpoklad 20% ploch vnitřní plochy objektu: 0,2*(5,0*(13,4+10,8)+(2,9+3,4)/2*26,1*2+11,7*0,45)=58,139 [A] portálové stěny: 0,2*(27,5+30,2)=11,540 [B] ruby objektu: 0,2*(7,0*(8,6+6,7)+1,9*2*23,0+5,0*4+4*6*1,55)=50,340 [C] Celkem: A+B+C=120,019 [D]	M2	120,019	2 150,00	258 040,85
				Celkem: A+B+C=120,019 [D]				
42	2019_OTSKP	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM předpoklad 10% ploch vnitřní plochy objektu: 0,1*(5,0*(13,4+10,8)+(2,9+3,4)/2*26,1*2+11,7*0,45)=29,070 [A] portálové stěny: 0,1*(27,5+30,2)=5,770 [B] ruby objektu: 0,1*(7,0*(8,6+6,7)+1,9*2*23,0+5,0*4+4*6*1,55)=25,170 [C] Celkem: A+B+C=60,010 [D]	M2	60,010	3 600,00	216 036,00
				Celkem: A+B+C=60,010 [D]				
43	2019_OTSKP	62631		SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 80% sanovaných ploch vnitřní plochy objektu: 5,0*(13,4+10,8)+(2,9+3,4)/2*26,1*2+11,7*0,45=290,695 [A] portálové stěny: 27,5+30,2=57,700 [B] ruby objektu: 7,0*(13,4+10,8)+1,9*2*23,0+5,0*4+4*6*1,55=314,000 [C] Celkem: A+B+C=662,395 [D]	M2	662,395	180,00	119 231,10
				Celkem: A+B+C=662,395 [D]				
44	2019_OTSKP	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEJMNOU MALTOU TL CCA 2MM Sanace typu A - viz příloha C1.5 Sanace vnitřní plochy objektu: 5,0*(13,4+10,8)+(2,9+3,4)/2*26,1*2+11,7*0,45=290,695 [A] portálové stěny: 27,5+30,2=57,700 [B] Celkem: A+B=348,395 [C]	M2	348,395	270,00	94 066,65
				Celkem: A+B=348,395 [C]				

číslo a název rozpočtu: Oprava mostu

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	2019_OTSKP	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr odhalené betonářské výztuže vnitřní plochy objektu: $0,1 \cdot (5,0 \cdot (13,4+10,8) + (2,9+3,4) / 2 \cdot 26,1 \cdot 2 + 11,7 \cdot 0,45) = 29,070$ [A] portálové stěny: $0,1 \cdot (27,5+30,2) = 5,770$ [B] ruby objektu: $0,1 \cdot (7,0 \cdot (8,6+6,7) + 1,9 \cdot 2 \cdot 23,0 + 5,0 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 1,55) = 25,170$ [C] Celkem: A+B+C=60,010 [D]	M2	60,010	350,00	21 003,50
				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
				6				
				966 419,38				
				Přidružená stavební výroba				
46	2019_OTSKP	709612		DEMONTÁŽ CHRÁNICÍKY/TRUBKY plastové chráničky podél říms, 5 ks	M	100,000	110,00	11 000,00
47	2019_OTSKP	711312	a	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY volně ložená - plovoucí pod drenážemi: $1,7 \cdot 23,0 \cdot 2 = 78,200$ [A]	M2	78,200	280,00	21 896,00
48	2019_OTSKP	711312	b	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY celoplošně natavená - svislé plochy ruby opěr: $1,5 \cdot 23,0 \cdot 2 = 69,000$ [A] ruby křidel: $5,0 \cdot 4 = 20,000$ [B] Celkem: A+B=89,000 [C]	M2	89,000	320,00	28 480,00
49	2019_OTSKP	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU celoplošně natavená s přesahy na opěry NK - mostovka: $8,3 \cdot 26,01 - (5,0 \cdot 1,83) = 206,733$ [A] křídla shora: $1,7 \cdot 6,0 \cdot 4 = 40,800$ [B] Celkem: A+B=247,533 [C]	M2	247,533	680,00	168 322,44
50	2019_OTSKP	71150		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU s hliníkovou vložkou, zdvojení pod novou římsou $0,75 \cdot 19,0 \cdot 2 + 0,75 \cdot (6,1 + 1,85 + 1,85) + 1,35 \cdot 6,1 = 44,085$ [A]	M2	44,085	290,00	12 784,65
51	2019_OTSKP	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochrana izolace z geotextilie 800 g/m ² NK - mostovka: $(9,0 + 12,3) \cdot 8,3 = 176,790$ [A] křídla shora: $1,0 \cdot 6,0 \cdot 4 = 24,000$ [B] pod drenáží: $1,7 \cdot 23,0 \cdot 2 = 78,200$ [C] ruby opěr - svislé plochy: $1,5 \cdot 23,0 \cdot 2 = 69,000$ [D] ruby křidel - svislé plochy: $5,0 \cdot 4 = 20,000$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=367,990 [F]	M2	367,990	120,00	44 158,80
52	2019_OTSKP	743554	R	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W Demontáž 2 ks, montáž nových svítidel (2 ks)	KUS	2,000	48 000,00	96 000,00
53	2019_OTSKP	78382		NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) ochranný a sjednocující dvojnásobný nátěr s odolností proti UV záření - sanované pohledové plochy betonu vnitřní plochy objektu: $5,0 \cdot (13,4+10,8) + (2,9+3,4) / 2 \cdot 26,1 \cdot 2 + 11,7 \cdot 0,45 = 290,695$ [A] portálové stěny: $27,5+30,2 = 57,700$ [B] Celkem: A+B=348,395 [C]	M2	348,395	335,00	116 712,33
54	2019_OTSKP	78383		NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr obrušniku (římsy), rozvinutá šířka 300 mm $6,1 \cdot 0,3 = 1,830$ [A]	M2	1,830	390,00	713,70
				Přidružená stavební výroba				
				7				
				500 067,92				

číslo a název rozpočtu: Oprava mostu

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8								
				Potrubi				
55	2019_OTSKP	87727		CHRÁNICÍ PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM Přeložení stávajících sítí do nových půlených chrániček 21,0*5+2*27,0=159,000 [A]	M	159,000	290,00	46 110,00
56	2019_OTSKP	89414	R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ úprava kanalizační šachty včetně případné dodávky skruží a rámu s mříží	KUS	2,000	36 000,00	72 000,00
				Potrubi	118 110,00			
9								
				Ostatní konstrukce a práce				
57	2019_OTSKP	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní, včetně kotvení a protikorozní ochrany, ocel S235 JR	M	51,220	3 900,00	199 758,00
				2*19,0+2*4,78+2*1,83=51,220 [A]				
58	2019_OTSKP	9113B3		SVODIDLO OCELI SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla a odvoz na skládku	M	91,000	220,00	20 020,00
				23,0+23,0+23,0+22,0=91,000 [A]				
59	2019_OTSKP	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM obrubníky v podchodu a podél křidel v podchodu: 2*27,0=54,000 [A] podél křidel: 8,5*3+7,8=33,300 [B] Celkem: A+B=87,300 [C]	M	87,300	280,00	24 444,00
				21,0+21,2+2*7,5+21,0=78,200 [A]				
60	2019_OTSKP	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubníky podél komunikace	M	78,200	380,00	29 716,00
				21,0+21,2+2*7,5+21,0=78,200 [A]				
61	2019_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM profizitní vozovky pro provedení zálevky vozovka: 7,5+9,5+7,6+7,3=31,900 [A] chodník v podchodu: 2*4,0=8,000 [B] Celkem: A+B=39,900 [C]	M	39,900	120,00	4 788,00
				21,0+21,2+2*7,5+21,0=78,200 [A]				
62	2019_OTSKP	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASFALTOVÝM MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 zálevky podél obrubníků, napojení starého a nového asfaltu zálevky ve vozovce: 7,5+9,5+7,6+7,3=31,900 [A] zálevky podél obrubníků: 21,0*3+21,2=84,200 [B] Celkem: A+B=116,100 [C]	M	116,100	130,00	15 093,00
				21,0+21,2+2*7,5+21,0=78,200 [A]				
63	2019_OTSKP	931335		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 dilační spára v operách podchodu (při kraji zrcadla), spára na rubu i lici na styku NK a opěr (2,9*2+2,0*2)+(26,1*2+23,0*2)=108,000 [A]	M	108,000	210,00	22 680,00
				2,9*2+2,0*2+(26,1*2+23,0*2)=108,000 [A]				
64	2019_OTSKP	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM dilační spára v operách podchodu (při kraji zrcadla), spára na rubu i lici na styku NK a opěr (2,9*2+2,0*2)+(26,1*2+23,0*2)=108,000 [A]	M	108,000	140,00	15 120,00
				2,9*2+2,0*2+(26,1*2+23,0*2)=108,000 [A]				
65	2019_OTSKP	93137		PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR PLAST FÓLIÍ překrytí dilační spáry separační vložkou 2,0*2=4,000 [A]	M2	4,000	190,00	760,00
				2,0*2=4,000 [A]				
66	2019_OTSKP	93261		POCHOZÍ ROST Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU 4,5*1,33=5,985 [A]	M2	5,985	3 900,00	23 341,50
				4,5*1,33=5,985 [A]				

číslo a název rozpočtu: Oprava mostu

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	2019_OTSKP	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ				
68	2019_OTSKP	938544		Dodávka a montáž tabulky zhotovitele opravy	KG	6,500	280,00	1 820,00
				OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	662,395	380,00	251 710,10
				vnitřní plochy objektu: 5,0*(13,4+10,8)+(2,9+3,4)/2*26,1*2+11,7*0,45=290,695 [A]				
				portálové stěny: 27,5+30,2=57,700 [B]				
				ruby objektu: 7,0*(13,4+10,8)+1,9*2*23,0+5,0*4+4*6*1,55=314,000 [C]				
				Celkem: A+B+C=662,395 [D]				
69	2019_OTSKP	966186		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	0,948	3 600,00	3 412,80
				demontáž stávajícího zábradlí (odhad 20 kg/m) a ocelové mříže (odhad 20 kg/m2)				
				odvoz k recyklaci				
				zábradlí: (20/1000)*18,5*2=0,740 [A]				
				ocelová mříž: (20/1000)*5,2*2,0=0,208 [B]				
				Celkem: A+B=0,948 [C]				
70	2019_OTSKP	967146		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM	M3	34,960	1 900,00	66 424,00
				vybourání ochrany opěr - cementových tvárnic				
				1,9*23,0*0,40*2=34,960 [A]				
71	2019_OTSKP	967156	R	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM	M3	138,000	1 900,00	262 200,00
				vybourání mezerovitého betonu za opěrami				
				3,0*23,0*2=138,000 [A]				
72	2019_OTSKP	967166		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM	M3	23,175	5 400,00	125 145,00
				ubourání stávajících řím na předepsanou úroveň a odvoz na skládku				
				16,4*0,5+15,4*0,5+5,7*(0,5+0,47)+1,8*(0,5+0,47)=23,175 [A]				
73	2019_OTSKP	97811		OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	662,395	140,00	92 735,30
				ruční dočištění betonových ploch malou mechanizací				
				vnitřní plochy objektu: 5,0*(13,4+10,8)+(2,9+3,4)/2*26,1*2+11,7*0,45=290,695 [A]				
				portálové stěny: 27,5+30,2=57,700 [B]				
				ruby objektu: 7,0*(13,4+10,8)+1,9*2*23,0+5,0*4+4*6*1,55=314,000 [C]				
				Celkem: A+B+C=662,395 [D]				
74	2019_OTSKP	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	15,750	3 700,00	58 275,00
				ochrana izolace na NK: 0,1*(12,5+10,0)*7,0=15,750 [A]				
75	2019_OTSKP	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	244,900	170,00	41 633,00
				včetně odvozu na skládku do 12 km				
				2*((12,5+10,0)*3,5+(23,0*1,9))=244,900 [A]				
				Ostatní konstrukce a práce				
				9				
				1 259 075,70				
				5 218 597,18				
				Celkem				
				Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
				Vícepráce				
				Vícepráce celkem				
				Méněpráce				
				Méněpráce celkem				
				Celkem				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				Celkem				
				5 218 597,18				




Akce: „Most P 027 Butovice (obj. 0470), Praha 5 – údržbové práce“

Podrobný subdodavatelský systém

Komunikace	
objemové % zakázky	Společnost:
9%	Šlehofer stavební společnost, Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

DIO a DIR	
objemové % zakázky	Společnost:
4%	Proznak s.r.o., Modřanská 244, 147 00 Praha 4

Práce společnosti ■■■■■ spol. s r.o. činí 87 %





Akce: „Most P 027 Butovice (obj. 0470), Praha 5 – údržbové práce“

Podrobný subdodavatelský systém

Komunikace	
objemové % zakázky	Společnost:
9%	Šlehofer stavební společnost, Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

DIO a DIR	
objemové % zakázky	Společnost:
4%	Proznak s.r.o., Modřanská 244, 147 00 Praha 4

Práce společnosti BM Construction, spol. s r.o. činí 87 %

