

MHMPXPGCIAH5



**DÍLČÍ SMLOUVA
K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI
PŘI MODERNIZACI SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. **INO/35/04/012012/2021**

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Hlavní město Praha**
se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
(dále též jen „HMP“)

a

- (2) **PREdistribuce, a.s.**
se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
zastoupená [redacted] vedoucím sekce S 24 000 Příprava staveb
IČO: 27376516
DIČ: CZ27376516
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 10158
(dále též jen „PREdi“)

(HMP a PREdi společně „Strany“ a každá z nich samostatně „Strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 V návaznosti na Rámcovou smlouvu o spolupráci při modernizaci veřejného osvětlení ze dne 21.8.2020, č. INO/35/04/009795/2020 (dále jen „**Rámcová smlouva**“), kterou mezi sebou Strany uzavřely, a kterou se ujednávají rámcové podmínky, uzavírají Strany tuto **Dílčí smlouvu č. (HMP) INO/35/04/012012/2021, č. (PREdi) PS/S24/2154613** (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 1.2 Veškerá práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto **Dílčí smlouvou** se řídí úpravou obsaženou v **Rámcové smlouvě**. **Dílčí smlouva** se však nesmí od úpravy **Rámcové smlouvy** odchýlit, ledaže to **Rámcová smlouva** výslovně připouští.
- 1.3 Veškeré definice obsažené v **Rámcové smlouvě** se použijí i v případě **Dílčí smlouvy**.

2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

- 2.1 *Vzhledem k tomu, že předmětem této Dílčí smlouvy není převod vlastnického práva, byl původní text vzorové Dílčí smlouvy v této části vypuštěn.* Předmětem této Dílčí smlouvy je v souladu s Rámcovou smlouvou stanovení podmínek, za kterých PŘEĎI provede pro HMP v rámci Obnovy sítě VO Koordinaci (viz dále Článek 6 této Dílčí smlouvy). Dílo se dle této Dílčí smlouvy neprovádí.
- 2.2 Předmětem této Dílčí smlouvy je v souladu s Rámcovou smlouvou souhlas PŘEĎI se vstupem HMP do ochranného pásma Distribuční soustavy. Písemný souhlas se vstupem do ochranného pásma ve prospěch HMP tvoří **Přílohu č. 6** této Dílčí smlouvy.

3. PROJEKT

- 3.1 HMP a PŘEĎI se dohodly na projektu synergické obnovy Distribuční soustavy a Obnovy sítě VO („**Projekt**“), který je v souladu s Rámcovou smlouvou nezbytnou podmínkou uzavření každé Dílčí smlouvy. Projekt tvoří **Přílohu č. 1** této Dílčí smlouvy.
- 3.2 Součástí Projektu je rovněž jeho technické schéma Tras.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Současně se schválením Projektu Strany dohodly harmonogram realizace Projektu („**Harmonogram realizace**“), který je v souladu s Rámcovou smlouvou nezbytnou podmínkou uzavření každé Dílčí smlouvy. Harmonogram realizace tvoří **Přílohu č. 2** této Dílčí smlouvy.

5. PŘEDMĚT PRODEJE

Vzhledem k tomu, že převod vlastnického práva dle této Dílčí smlouvy nedochází (viz čl. 2. odst. 2.1 této Dílčí smlouvy), byl původní text vzorové Dílčí smlouvy v této části vypuštěn.

6. PŘEDMĚT KOORDINACE

- 6.1 PŘEĎI se v této Dílčí smlouvě, zavazuje provést pro HMP koordinační činnosti, jejichž podrobná specifikace bude obsažena v **Příloze č. 3 („Specifikace Koordinace“)** a HMP se je zavazuje na základě této Dílčí smlouvy převzít a zaplatit PŘEĎI cenu v souladu s podmínkami této Dílčí smlouvy.
- 6.2 Místem plnění koordinační činnosti bude hlavní město Praha – **lokality Vinohrady 2**.
- 6.3 Dílo se dle této Dílčí smlouvy neprovádí. Dílo proto nebude HMP předáno PŘEĎI na základě písemného protokolu („**Písemný protokol o předání Díla**“), který jinak tvoří **Přílohu č. 4** této Dílčí smlouvy.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 HMP se zavazuje zaplatit za provedení Koordinace cenu („**Cena Koordinace**“) určenou v souladu s Rámcovou smlouvou, k níž bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni zdanitelného plnění.

Cena Koordinace činí **24 750,- Kč** bez DPH.

Vzhledem k tomu, že převod vlastnického práva (viz čl. 2. odst. 2.1 této Dílčí smlouvy) ani Dílo (viz čl. 2. odst. 2.2 této Dílčí smlouvy) se dle této Dílčí smlouvy nerealizuje, byl původní text vzorové Dílčí smlouvy v této části (tj. původní odst. 7.1 a 7.2) vypuštěn.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Tato Díleční smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
- 8.2 Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Díleční smlouvy v registru smluv dle Zákona o registru smluv zajistí HMP.
- 8.3 Strany výslovně souhlasí, aby tato Díleční smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této Díleční smlouvy, číselné označení této Díleční smlouvy, datum jejího podpisu a plný text této Díleční smlouvy. Strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Díleční smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 8.4 Tato Díleční smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Stranami. Písemnou formu vyžaduje i dohoda o vzdání se požadavku písemné formy.
- 8.5 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Díleční smlouvy zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Díleční smlouvy. Strany se zavazují bezodkladně nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Díleční smlouvou, respektive Rámcovou smlouvou jako celkem.
- 8.6 Pro případ uzavírání této Díleční smlouvy Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, podle něhož jsou smlouva či dodatek uzavřeny i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran.
- 8.7 Uzavření Rámcové smlouvy bylo schváleno v rámci Usnesení HMP ze dne 13. 7. 2020, č. 1460.
- 8.8 Tato Díleční smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopísech v českém jazyce, z nichž HMP obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních, TIIMP a PRĚdí po jednom (1) vyhotovení.
- 8.9 Nedílnou součástí této Díleční smlouvy jsou následující Přílohy:
- a) Příloha č. 1: Projekt včetně technického schématu
 - b) Příloha č. 2: Harmonogram
 - c) Příloha č. 3: Specifikace Koordinace
 - d) *Příloha č. 4: Písemný protokol o předání Díla – Dílo se dle této Díleční smlouvy nerealizuje. Písemný protokol proto není vyhotoven*
 - e) *Příloha č. 5: Písemný protokol o předání Předmětu prodeje – Dle této Díleční smlouvy nedochází k převodu vlastnického práva. Písemný protokol o předání Předmětu prodeje proto není vyhotoven*
 - f) Příloha č. 6: Písemný souhlas PRĚdí se vstupem do ochranného pásma

9. PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Dílčí smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Hlavní město Praha

PREdistribuce, a.s.,

Místo: V Praze

Místo: V Praze

Datum:

09.07.2021

Datum:

30-06-2021

Funkec: ředitel odboru hospodaření s majetkem
Magistrátu hlavního města Prahy

Funkec: vedoucí sekce S 24 000 Příprava staveb

PREdistribuce, a. s.
Svornost 3199/19a
150 00 Praha 5
14

PŘÍLOHA Č. I: PROJEKT VČETNĚ TECHNICKÉHO SCHÉMATU ÚVOD


V souladu s Rámcovou smlouvou o spolupráci při modernizaci sítě veřejného osvětlení ze dne 21.8.2020, č. INO/35/04/009785/2020, schválenou Radou HMP usnesením č. 1460 ze dne 13.7.2020, je v tomto dokumentu definován **Projekt pro lokalitu Vinohrady 2** a jeho harmonogram.

I. TECHNICKÁ SCHÉMATATA TRAS

Lokalita se nachází v MČ Praha 3 na pomezí katastrálních území Vinohrady a Žižkov. Navrhovaná lokalita je vymezena ulicemi Jičínská, Lucemburská, Bořivojova, Ondříčková a Táborská.

I.1 Vyznačení sítě VO

Dotčená síť VO je napájena ze dvou zapinacích míst č. 0098, 0111.

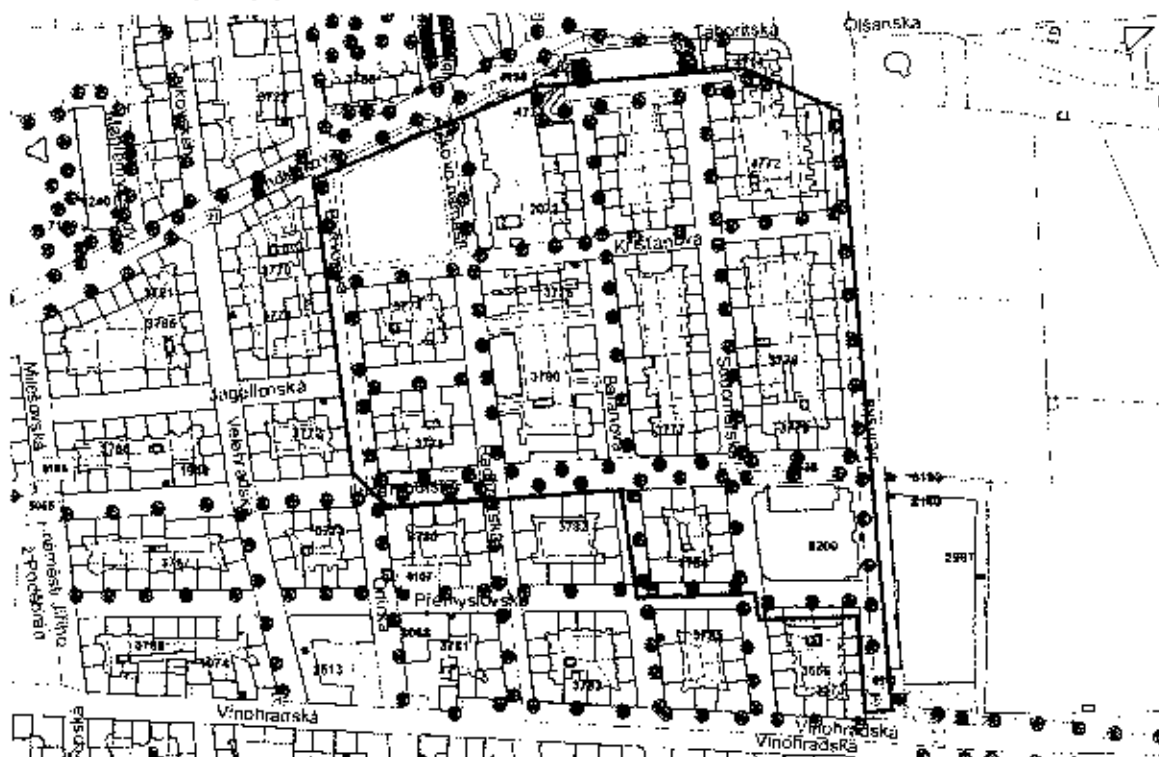

Legenda

Světelné místo



Trasa VO


Zapínací místo



PR
PR
PR
PR



1.2 Vyznačení distribuční a VD sítě

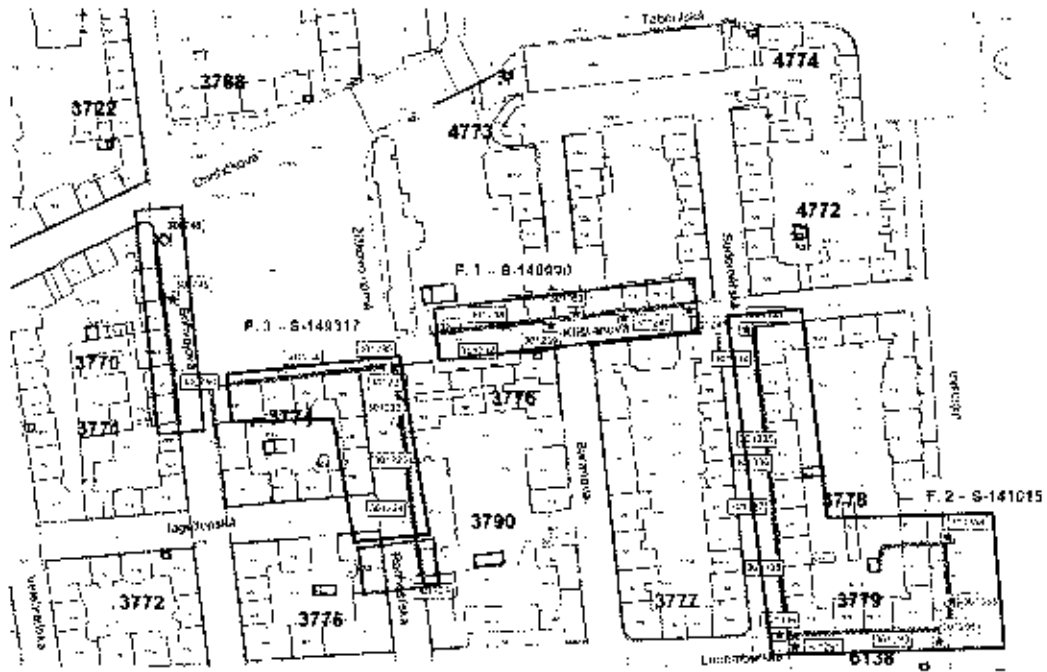



Legenda:	
Trasa synergické obnovy:	-----
Umístění EVR lampy:	☆ ☆
Lampa non EVR (v synergii):	⊕ ⊗

Trasa synergické obnovy v sobě zahrnuje:

- Siť VO, kde bude Nový kabel,
- Část DS, kde bude mít THMP přístup do ochranného pásma PŘEdi,
- Část DS, kde bude Optický kabel.

Projekt bude realizován v několika fázích, jejich dělení je vidět na obrázku výše. Každá z těchto fází odpovídá jedné stavbě PŘEdi:

- F.1 – S-140990,
- F.2 – S-141015,
- F.3 – S-149317.

Jednotlivé fáze budou realizovány postupně podle níže popsaného harmonogramu. Projektová příprava těchto fází bude probíhat ve stejném období. Začátek realizační části se však může lišit podle rychlosti získání potřebných povolení k jednotlivým fázím.

2. STATISTIKA LAMP A TRAS

2.1 Navrhované EVR lampy

č.	Sériové číslo	Zapínací místo	Ulice	Fáze
1	300750	98	Bořivojova	F.1
2	301225	98	Radhoštská	F.1
3	301237	98	Křišťanova	F.1
4	301238	98	Křišťanova	F.1
5	301293	111	Lucemburská	F.2
6	301334	111	Sudoměřská	F.2
7	301335	111	Sudoměřská	F.2
8	301336	111	Sudoměřská	F.2
9	301337	111	Sudoměřská	F.2
10	301338	111	Sudoměřská	F.2
11	301221	98	Radhoštská	F.3
12	301222	98	Radhoštská	F.3
13	301223	98	Radhoštská	F.3
14	301224	98	Radhoštská	F.3
15	301234	98	Žižkovo nám.	F.3
16	301235	98	Žižkovo nám.	F.3

Předpokládaný požadovaný příkon pro nabíjení v těchto EVR lampách je 352 kW.

2.2 Lamy v synergii

č.	Sériové číslo	Zapínací místo	Ulice	Fáze
1	300749	98	Bořivojova	F.1
2	301163	98	Baranova	F.1
3	301241	98	Křišťanova	F.1
4	300748	98	Bořivojova	F.1
5	301239	98	Křišťanova	F.1
6	301240	98	Křišťanova	F.1
7	301339	111	Sudoměřská	F.2
8	301291	111	Lucemburská	F.2
9	301333	111	Sudoměřská	F.2
10	301354	111	Jičínská	F.2
11	301295	111	Lucemburská	F.2
12	301355	111	Jičínská	F.2

2.3 Smluvní poměr

Celkem EVR lamp	16	
Celkem non - EVR lamp	12	
Celkem lamp synergii	28	
Poměr EVR / VO	EVR	VO
	57 %	43 %

2.4 Délka synergických tras

Synergické trasy jsou v návrhu v jednotlivých etapách o délce přibližně:

- F.1 - 0,22 km,
- F.2 - 0,32 km,
- F.3 - 0,21 km.

PŘÍLOHA Č. 2: HARMONOGRAM

I. OBECNÝ POPIS

Harmonogram se skládá ze dvou částí, Přípravné a Realizační.

Projekty se mohou obecně skládat z několika fází určených podle dělení staveb PŘEdí. U těchto fází dochází paralelně k plnění Přípravné části. Realizační část je však zahájena u jednotlivých fází nezávisle a je závislá na ukončení přípravné části jednotlivé fáze.

(a) Přípravná část - PŘEdí

Začátek přípravné části

Začíná momentem Shody na lokalitě, resp. Podpisem smlouvy na Dílčí projekt, dále označováno jako T_p .

Technicko-ekonomický návrh stavby

Jedná se o přípravu zadání na komplexní obnovu sítě PŘEdí a VO v dané lokalitě a podklad pro přípravu projektové dokumentace. Časový odhad je jeden měsíc, ukončena je tedy $T_p + 1$.

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace

Probíhá paralelně s Technicko-ekonomickým návrhem stavby, ukončen tedy v $T_p + 1$.

Projektová dokumentace a získání povolení

Jedná se o nejdelší etapu přípravné části. Zahrnuje kompletní vyprojektování obou sítí PŘEdí, vzájemnou koordinaci PD s obnovou VO a je ukončena získáním potřebných povolení. Časový odhad je deset měsíců, tj. konec je $T_p + 11$.

Výběrové řízení realizační firmy

Poslední etapu přípravné části je výběrové řízení na realizační firmu. Časový odhad je jeden měsíc, tj. konec je $T_p + 12$.

(b) Přípravná část – THMP

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace

Na základě zadání (viz výše) dojde k výběru projektanta pro daný Projekt. Časový odhad jsou dva měsíce po dokončení Technicko-ekonomického návrhu stavby PŘEdí, tj. konec je $T_p + 3$. Pokud dojde k vytvoření rámcové smlouvy na realizační firmy, je možné tuto část přípravné etapy zkrátit.

Projektová dokumentace a získání povolení

Jedná se o nejdelší etapu přípravné části. Zahrnuje kompletní vyprojektování sítě VO, vzájemnou koordinaci PD a je ukončena získáním potřebných povolení, dle §103 zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Časový odhad je devět měsíců, tj. konec je $T_p + 12$.

Výběrové řízení realizační firmy

Poslední etapu přípravné části je výběrové řízení na realizační firmu. Časový odhad jsou dva měsíce, tj. konec je $T_p + 14$. Pokud dojde k vytvoření rámcové smlouvy na realizační firmy, je možné tuto část přípravné etapy vypustit a celý proces tím zkrátit.

(c) Realizace

Začíná zahájením staveb a trvá typicky podle složitosti od 3 do 6 měsíců. Zahájení staveb závisí na ukončení přípravné etapy. Pokud konec přípravné části spadá do zimního období, je termín zahájení staveb odložen do začátku stavební sezony.

Zimní období, přibližně 4 měsíce, je třeba započítat v případě, že zasahuje do realizační části.

V případě, že Projekt zahrnuje lokalitu velkých rozměrů, může být nutné realizaci jednotlivých fází rozdělit do více stavebních sezon.

2. PROJEKT VINOHRADY 2 – HARMONOGRAM

Níže je harmonogram Projektu Vinohrady 2, pokud budou dodrženy všechny předpokládané doby (viz podkapitola výše). V případě zkrácení nebo prodloužení jednotlivých etap se harmonogram může změnit podle výše zmíněných omezení.

(a) Fáze I

Fáze odpovídá stavbě PŘEdi S-140990 a její rozsah je definován v kapitolách výše.

Harmonogram PŘEdi

Začátek přípravné části (Tp) = 15. 6. 2021.

Etapa	Termín ukončení
Technicko-ekonomický návrh stavby - VŘ zpracovatele PD	07/2021
Projektová dokumentace a získání povolení	08/2021
VŘ realizační firmy	09/2021
Realizační část	12/2021

Harmonogram THMP

Začátek přípravné části (Tp) = 15. 6. 2021

Etapa	Termín ukončení
VŘ zpracovatele projektové dokumentace	08/2021
Projektová dokumentace a získání povolení	09/2021
VŘ realizační firmy	10/2021
Realizační část	12/2021

(b) Fáze 2

Fáze odpovídá stavbě PREdi S-140015 a její rozsah je definován v kapitolách výše.

Harmonogram PREdi

Začátek přípravné části (Tp) = 15. 6. 2021.

Etapa	Termín ukončení
Technicko-ekonomický návrh stavby - VR zpracovatele PD	07/2021
Projektová dokumentace a získání povolení	08/2021
VR realizační firmy	09/2021
Realizační část	12/2021

Harmonogram TUMP

Začátek přípravné části (Tp) = 15. 6. 2021

Etapa	Termín ukončení
VR zpracovatele projektové dokumentace	08/2021
Projektová dokumentace a získání povolení	09/2021
VR realizační firmy	10/2021
Realizační část	12/2021

(c) Fáze 3

Fáze odpovídá stavbě PREDi S-149317 a její rozsah je definován v kapitolách výše.

Harmonogram PREDi

Začátek přípravné části (Tp) = 15. 6. 2021.

Etapa	Termín ukončení
Technicko-ekonomický návrh stavby - VŘ zpracovatele PD	07/2021
Projektová dokumentace a získání povolení	03/2022
VŘ realizační firmy	04/2022
Realizační část	08/2022

Harmonogram EHMP

Začátek přípravné části (Tp) = 15. 6. 2021

Etapa	Termín ukončení
VŘ zpracovatele projektové dokumentace	08/2021
Projektová dokumentace a získání povolení	03/2022
VŘ realizační firmy	05/2022
Realizační část	08/2022

PŘÍLOHA Č. 3: SPECIFIKACE KOORDINACE

Dílo se dle této Díleí smlouvy v Projektu Vinohrady 2 neprovádí.

Rozsah Koordinace je stanoven dle kapitoly 1.2 Přílohy č. 1 této Díleí smlouvy. Obsahem Koordinace je koordinace plnění dodavatelů v souvislosti i s obnovou VO, spočívající zejména v koordinaci zadání a uzavření smluv s dodavateli, čerpání z těchto smluv vě, pokládky a zapojení nového kabelu VO, demolice stávajících základů a stavby nových základů a souvisejících činností s činnostmi v rámci obnovy distribuční soustavy.

Cena Koordinace je na základě nacenění v Rámcové smlouvě rovna 33 Kč/m, tj. pro Projekt Vinohrady 2 je celkem 24 750,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíce sedm set padesát korun českých) bez DPH za všechny fáze. Rozpad na jednotlivé fáze je pak následující:

- F. 1 - S-140990 - 7 260,- Kč,
- F. 2 - S-141015 - 10 560,- Kč,
- F. 3 - S-149317 - 6 930,- Kč.

PŘÍLOHA Č. 4: PÍSEMNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA

Díla se dle této Dílčí smlouvy v Projektu Vinohrady 2 neprovádí. Písemný protokol o předání Díla není vzhledem k uvedenému vyhotoven.

PŘÍLOHA Č. 5: PÍSEMNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PRODEJE

V rámci projektu Vinohrady 2 nedochází k převodu vlastnického práva ke Kabelu VO. Písemný protokol o předání předmětu prodeje není vzhledem k uvedenému vyhotoven.

PŘÍLOHA Č. 6: PÍSEMNÝ SOUHLAS PŘEDÍ SE VSTUPEM DO OCHRANNÉHO PÁSMU

Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Žadatel:

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

Společnost PRÉdistribuce, a.s., držitel licence na distribuci elektřiny na území hlavního města Prahy a provozovatel zařízení distribuční soustavy na území vymezeném licenční úmíto v souladu s § 46 odst. 11 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), uděluje žadateli **souhlas** s níže popsanou činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy umístěném v jeho trase, jak je znázorněno na situačním plánu, který je přílohou tohoto souhlasu, a stanovuje podmínky jeho udělení.

Činnost v ochranném pásmu:

Opravy a údržba sítě veřejného osvětlení

Podmínky souhlasu

Při práci či provádění jakýchkoliv jiných činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení, které činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy je nutné splnění níže uvedených podmínek:

- respektování zákazu zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu, vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní kabelové vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun bez patřičného ochráníení kabelového vedení.

- b) **výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení případných pokynů PŘEdistribuce, a.s.**
- c) **při snižování terénu v prostoru našich sítí je nutné zjištění případného krytí kabelů formou kopaných sond. V případě nedodržení platných norem požadujeme zahloubení nebo přeložku našich sítí. Při změně nivelety terénu (např. snížení) v prostoru našich sítí je nutné dodržení hodnot minimálního krytí dle platných technických norem. Stávající krytí před započatím prací lze zjistit ručně kopanými sondami. Nebude-li možno dodržet hodnoty minimálního krytí, je nutno provést zahloubení nebo eventuálně přeložku našich sítí.**
- d) **Před prací či jakýchkoliv činností v ochranném pásmu elektrizační soustavy PŘEdistribuce, a. s. je nezbytné si opatřit aktuální zakres polohy sítí PŘEdistribuce, a.s. Ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to nejpozději 3 dny před plánovaným zahájením stavby. Návštěvní hodiny: Po a St 8:00-15:00, Út 8:00-12:00, Čt - po tel. objednávce (26705 2169/2353).**
- e) **Před záhozem kabelové trasy musí být PŘEdistribuce, a.s. vyzvána ke kontrole uložení na e-mail: inspektorii@pre.cz nebo na tel.: 26705 2894. Pokud PŘEdistribuce, a.s. nebude ke kontrole vyzvána, vyhrazuje si právo nechat předmětné místo znovu odkryt. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně zhutněna, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.**

Případné škody na zařízení PŘEdistribuce, a.s. budou řešeny dle platné legislativy.

POVĚŘENÍ

PRÉDistribuce, a.s., se sídlem Svoboda 3190/19a, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 27376516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 10158, zastoupená Ing. Milanem Hamplem, předsedou představenstva a Mgr. Petrem Dražilem, místopředsedou představenstva, **zmocňuje** tímto svého zaměstnance **Ing. Milana Válka**, vedoucího sekce Příprava staveb, nar. 26.1.1972, číslo OP 207766696,

k zastupování společnosti před správními orgány, zejména stavebními úřady a jinými odbory úřadů městských částí a vůči třetím osobám ve věcech výstavby a provozování zařízení distribuční soustavy na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu, a aby při tom činil za společnost všechna potřebná jednání, zejména posílání a vyzvedávání písemností, vzdám se práva udělení v rámci územního a stavebního řízení, ve kterém je PRÉ distribuce, a.s. účastníkem řízení; a k projednávání níže uvedených smluv s touto činností spojených. Pověřený zaměstnanec je oprávněn k podepisování těchto smluv a jednostranných právních jednání **zamosťatně**:

- smlouvy o dílo, nepojmenované smlouvy a objednávky na dodávky, práce a služby do 50 000,- Kč
- příkazní smlouvy do 50 000,- Kč
- vypsání poptávky a výběrového řízení do 10 000 000,- Kč
- smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy na koupi movitých věcí investiční povahy do 50 000,- Kč
- smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi nemovitých věcí investiční povahy do 2 000 000,- Kč
- smlouvy o smlouvě budoucí a připojení a smlouvy o připojení žadatele k distribuční soustavě dle vyhlášky č.16/2016 Sb., do 5 000 000,- Kč
- smlouvy o smlouvě budoucí o zařízení vědního břemene - služebnosti do 1 000 000,- Kč
- smlouvy o přelozce zařízení distribuční soustavy dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., do 5 000 000,- Kč
- smlouvy o nájmu nemovitých věcí po dobu výstavby do 300 000,- Kč
- smlouvy o budoucí nájemní smlouvě nemovitých věcí do 1 500,- Kč/rok
- smlouvy o smlouvě budoucí o zařízení vědního břemene - služebnosti a smlouvy o trvalém umístění inženýrských sítí uzavřené s Hlavňák m. městem Praha zastoupeným Technickou správou kanalizací hl. m. Prahy
- plně moci
- nepojmenované smlouvy o podmínkách realizace výstavby zařízení distribuční soustavy
- dohody o převodu práv a závazků týkající se výstavby zařízení distribuční soustavy

Níže uvedené smlouvy je pověřený zaměstnanec oprávněn podepisovat **pouze spolu s vedoucím oddělení sekce Příprava staveb**:

- smlouvy o dílo, nepojmenované smlouvy a objednávky na dodávky, práce a služby do 2 000 000,- Kč
- příkazní smlouvy do 2 000 000,- Kč
- smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy na koupi movitých věcí investiční povahy do 2 000 000,- Kč

Platnost pověření: Toto pověření se vztahuje na dobu neurčitou od 2.1.2019 do odvolání

V Praze dne 12.6.2019

Za PRÉ distribuce, a.s.
Ing. Milan Hámpl
předseda představenstva

Zmocněním přijímá:
Ing. [redacted]

Toto pověření vzniklo pomocí počítače ze dne 11.6.2019

Za PRÉ distribuce, a.s.
Mgr. Petr Dražil
místopředseda představenstva
