

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 7

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004874

Ze dne: 8. 11. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR –
Úsek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: předání výstupu služeb je do 6 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 145 600,- / 176 176,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy: Příloha č. 1 - TS bod 1.1 - Kalendář staveb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.11.08
15:04:46 +01'00'



RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 – „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB“

Název požadavku:


Bod 1.1 – Kalendář staveb – widget pro Dashboard 2.0

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
projektových manažer	4 800 Kč	3	14 400 Kč
konzultant/ analytik	5 600 Kč	5	28 000 Kč
architekt/ návrhář	5 600 Kč	3	16 800 Kč
programátor/ kodér	4 800 Kč	18	86 400 Kč
Celková hodnota v Kč bez DPH			145 600 Kč

Popis funkcionality:

Kalendář staveb bude interaktivní widget v Dashboardu 2.0. Bude každému uživateli aplikace PPS dle nastavení nebo jeho osobních preferencí zobrazovat nadcházející nebo uplynulé činnosti z vybraných harmonogramů. Dle grafického návrhu bude kalendář umístěn ve sloupci v pravé části Dashboardu.

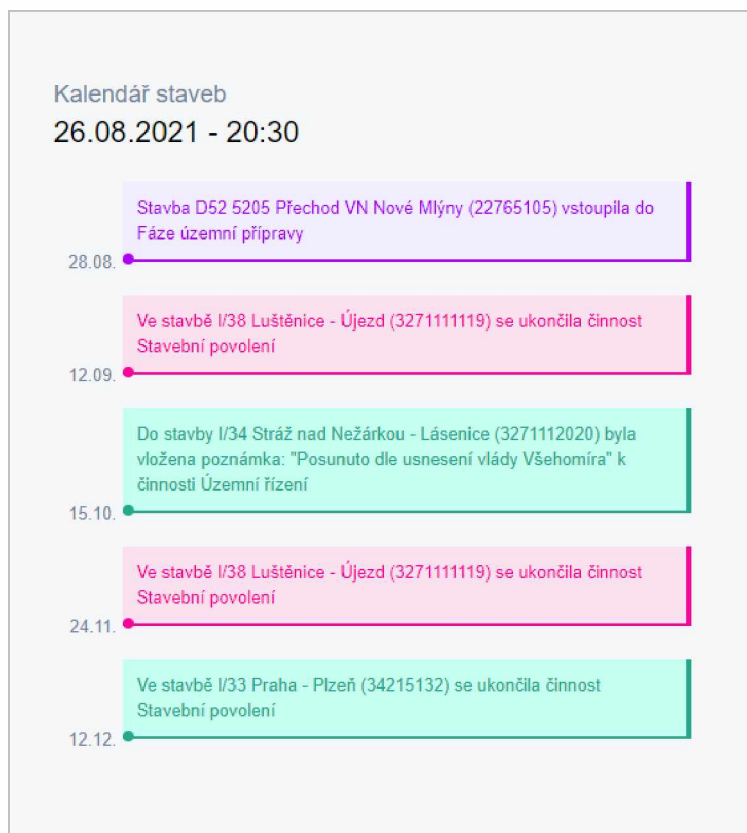



Technická specifikace:

Úprava přiřazení staveb v sekci „Manažeri staveb“:

- V editaci manažera, v seznamu "přiřazené stavby" přibude sloupec s checkboxem "viditelnost v kalendáři".
- Bude se tím definovat, který uživatel bude vidět jakou stavbu / proces v kalendáři.
- Pro náhledové role bude možnost checkbox zaškrtnout, defaultně bude odškrtnutý - neuvidí projekt / proces.
- Editační role má oprávnění pro Stavby -> Úprava v Ganttu nebo Procesy -> Úprava v Ganttu.
- Podle typu manažera stavby (interní nebo externí) se bude kontrolovat oprávnění na stavbu nebo proces (interní = stavba, externí = proces).
- Pro editační role bude checkbox zaškrtnut a nepůjde odškrtnout.
- V kalendáři budou vždy vidět stavby/procesy, ke kterým má uživatel editační oprávnění.

Návrh kalendáře staveb

- Do kalendáře se budou načítat stavby, kde:
 - uživatel je manažer stavby,
 - uživatel má editační práva v menu Manažeri staveb -> přiřazené stavby,
 - uživatel má náhledovou roli a zaškrtnuto "viditelnost v kalendáři".
- Budou zobrazovány jednotlivé události (i činnosti) ze stavby.
- Události, které budou v budoucnosti i v minulosti jsou:
 - plán začátku činnosti,
 - plánovaný konec činnosti,
 - plánovaný začátek/konec přerušení,
 - konec platnosti činnosti, pokud bude zadána.
- **Do minulosti** se budou v kalendáři zobrazovat i tyto události - barva bude šedá:
 - Přidána poznámka (kdy, kdo, zdroj poznámky (stavba, činnost, vazba) a text poznámky),
 - vytvořena stavba,
 - stavba byla přiřazena uživateli jako "manažer stavby" - bude se zachytávat odkdy je aktuální manažer manažerem.
- **Do budoucnosti** se budou v kalendáři zobrazovat i tyto události:
 - Stavba je už 14 dnů ve stavu "neautorizovaná". Existuje na to notifikace, popis nastavení je v PPS v sekci Dokumentace -> Emailové notifikace, nadpis Upozornění - stavba je 14 dní ve stavu Neautorizovaná.
- Události budou barevně odlišené dle barvy fáze, ve které se činnosti nalézají.
- U termínů určených pro přenos do JSIVV nebo do MR budou zobrazeny zelené nebo žluté šipky, podle typu termínu.
- V buňce zkusíme zobrazit i všechny ostatní ikonky, co jsou v manažerském reportu, pokud budou dávat smysl.
- V buňce činnosti / stavby bude ikonka poznámky a text samotné poznámky bude v tooltipu.
- Pro procesy:
 - Zobrazovat ikonku procesu v názvu činnosti (Projednáni s dotčenými orgány Státní správy), ale ne jednotlivé činnosti z procesu (Proces obvykle obsahuje mnoho činností začínajících a končících v ten samý den).
 - Bude se zobrazovat začátek a konec procesu.
 - Činnosti z procesu budou seskupeny podle dnů a začátku / konce. V kalendáři budou pole "V den A končí X činností v procesu <název stavby - název procesu>. V den B začíná Y činností v procesu <název stavby - název procesu> atd.
- Kalendář se bude stránkovat.
- Možnost vložení akce do kalendáře - bude se k události generovat .ics soubor nebo vcalendar (zatím nepotvrzeno).
- Řazení událostí bude: minulost dolů, budoucnost nahoru.
- Bude se načítat 6 měsíců do budoucnosti a 1 měsíc do minulosti. Když uživatel naskroluje nakonec, tak zobrazeno tlačítko "načíst další" a načte se další měsíc. Podobně, jako je načítání dalších produktů v e-shopech.
- U každé položky v kalendáři bude také proklik do náhledu / editace stavby nebo procesu. Jestli to bude náhled nebo editace se bude řídit rolí uživatele ke stavbě / procesu (editační nebo náhledová).

Technická specifikace – vývoj funkcionality

Kalendář staveb – widget pro Dashboard 2.0



Testovací scénáře:

V kalendáři staveb se bude testovat, zda fungují akce, zobrazení, správné rozřazení dle oprávnění / rolí apod.

Digitálně podepsal:

Datum: 08.11.2021 13:13:29 +01:00



MOVISIO s.r.o., Michelská 29/6,
140 00, Praha 4, Česká Republika

+420 261 215 644
info@movisio.com

Bank Account: 31644060/5500
IČ: 26494183, DIČ: CZ26494183
