

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 10

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002849** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 07. 12. 2022

Číslo dílčí objednávky: **08PU-004153**

Název související veřejné zakázky:

Obnova VZDZ - komunikace I/15 v okr. LT, Podsedice - hr. okr. LN - DO č. 10

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

**„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice,
Litoměřice“**

vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.

Sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,
oddíl A, vložka 80478

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/15 v okrese Litoměřice od křižovatky v Obci Podsedice po hranice okr. LN.

Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).

Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8, včetně její přílohy č. 1.

Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4 Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávací a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

Místo plnění: Silnice I. třídy I/15 Podsedice v okrese Litoměřice v km 16,600 – 21,400

Termín plnění: Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 10 do 4 - 5 týdnů (v návaznosti na vhodné klimatické podmínky)

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002849.

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): odsouhlasený a potvrzený soupis prací TDS vč. dokumentace, předávací protokol, LVV (DMD) a dokumentace dle bodu 2.7. RD.

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 211 520,93 / 255 940,33

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice, Litoměřice“ Vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s. Sousedovice44, 386 01 Sousedovice
Doba pro dokončení	1.1.9	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č10 do 4 - 5 týdnů (v návaznosti na vhodné klimatické podmínky)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatel	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 10 jsou:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla – výkaz výměr

Příloha č. 2 – Rozpis VDZ

Příloha č. 3 – Report_763956

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*



Firma: ZNAKON, a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 211 520,93

Celková cena s DPH: 255 940,32

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení - po indexaci			
2	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - po indexaci			



Firma: ZNAKON, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

1

Rozpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem - indexováno
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Obnova vodorovného dopravního značení				
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ	M2	3 200,000		
2	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	M2	0,000		
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU	M2	0,000		
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ	M2	50,000		
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ	M2	0,000		
6	915221R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	M2	0,000		
7	91552R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU	M2	0,000		
8	91552R.3		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU	M2	120,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
9	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	0,000		
10	915612		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000		
11	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	0,000		
12	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000		
13	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	0,000		
14	915642		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000		



Firma: ZNAKON, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

2

Rozpoč

2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem - indexováno
1	2	3	4	5	6	9	10
2		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy					
1	02720.1		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN	5,000		
2	02720.10		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	DEN			
3	02720.11		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	DEN			
4	02720.3		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN			
5	02720.4		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN			
6	02720.5		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNIČE	DEN			
7	02720.6		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN			
8	02720.8		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	DEN			
9	02720.9		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE	DEN			

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - okres Litoměřice, Dílčí objednávka č. 10


RD 08PU-002844 Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Pozn.
délky v km
plochy v m²
staničení v km

Okres Litoměřice

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	ID závad v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní								
I/15	I/15 křižovatka Podsedice - hr. okr. LN (V1a, V2b, V4, BUS V11a, V7) barvou 3 250 m2 plast 120 m2	I/15		16,600			21,400			4,800	3370,00				763956
										4,800					

Detail závady 763956

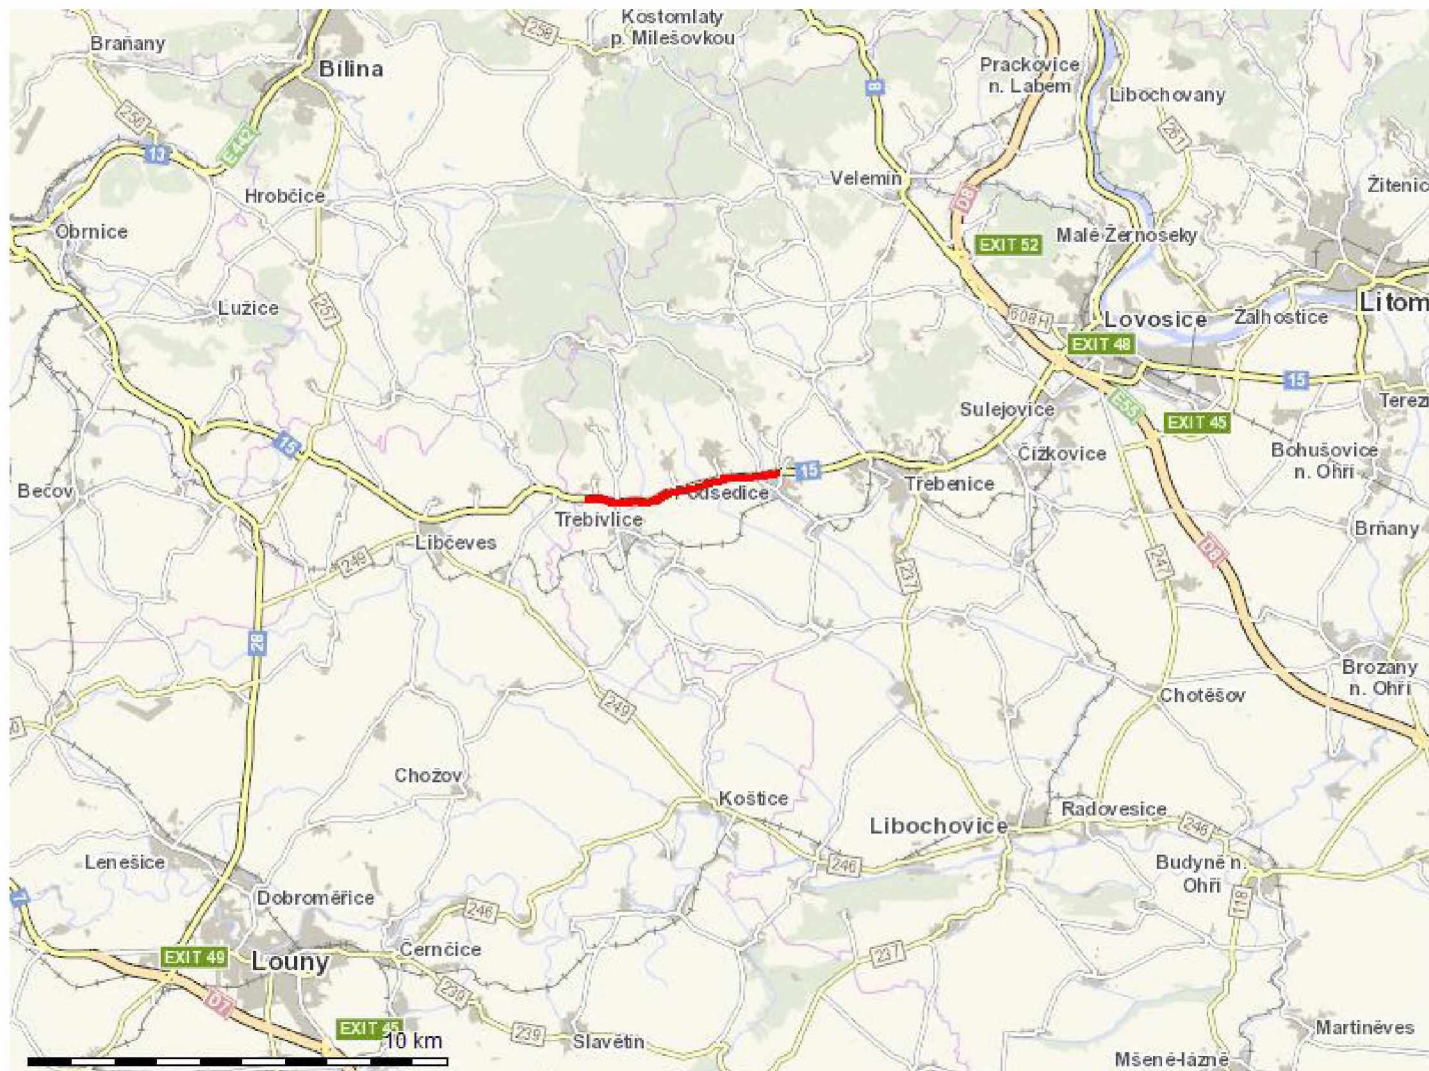

Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Inspektor:

Nalezeno:

14.08.2025 9:40:07

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Značení

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Vada odložena?

☐

Podtyp vady:

VDZ - poškozené/chybějící

Závažnost:

1 - vysoká

Jednotky:

3370 m2

Poloha od

Č.kom: Od.část:

15 0

Prov.

staničení:

16,6 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0234B006 0234A026

Staničení:

0,033

Poloha začátku:

50°27'50.54"N,13°53'9.49"E

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 14.8.2025

Velikost: 162,1 kB

Název souboru: cc407799-833c-4ac8-b4a7-bd70f2c5f913.jpg



Vytvořeno: 14.8.2025

Velikost: 188,3 kB

Název souboru: 230d43e3-6371-48ab-acab-7ead650f3a5b.jpg



Vytvořeno: 14.8.2025

Velikost: 243,4 kB

Název souboru: 58d48779-a597-4e54-a8b7-e5b9ee6a2a3d.jpg



Vytvořeno: 14.8.2025

Velikost: 142,7 kB

Název souboru: a6bcad54-f409-49d0-b117-9d6e828e7f6f.jpg



Vytvořeno: 14.8.2025

Velikost: 176,2 kB

Název souboru: 360f3a72-d4c0-410d-93df-bd2d419bfbea.jpg

Digitálně podepsal: I [REDACTED]
Datum: 09.10.2025 8:54:36 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 16. října 2025 6:42
Komu: Pošta
Kopie: [REDACTED] a
Předmět: akceptace objednávky
Přílohy: 08PU-004153_Dílčí objednávka č. 10 vč. příloh-sgn.pdf

Dobrý den,

v příloze zasíláme potvrzenou objednávku.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 10

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002849** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 07. 12. 2022

Číslo dílčí objednávky: **08PU-004153**

Název související veřejné zakázky:

Obnova VZDZ - komunikace I/15 v okr. LT, Podsedice - hr. okr. LN - DO č. 10

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

**„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice,
Litoměřice“**

vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.

Sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,
oddíl A, vložka 80478

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/15 v okrese Litoměřice od křižovatky v Obci Podsedice po hranice okr. LN.

Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).

Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8, včetně její přílohy č. 1.

Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4 Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

Místo plnění: Silnice I. třídy I/15 Podsedice v okrese Litoměřice v km 16,600 – 21,400

Termín plnění: Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 10 do 4 - 5 týdnů (v návaznosti na vhodné klimatické podmínky)

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002849.

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): odsouhlasený a potvrzený soupis prací TDS vč. dokumentace, předávací protokol, LVV (DMD) a dokumentace dle bodu 2.7. RD.

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 211 520,93 / 255 940,33

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice, Litoměřice“ Vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s. Sousedovice44, 386 01 Sousedovice
Doba pro dokončení	1.1.9	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č10 do 4 - 5 týdnů (v návaznosti na vhodné klimatické podmínky)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatel	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 10 jsou:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla – výkaz výměr

Příloha č. 2 – Rozpis VDZ

Příloha č. 3 – Report_763956

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2025.10.15
15:36:49 +02'00'

[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2025.10.15
13:57:19 +02'00'



Firma: ZNAKON, a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 211 520,93

Celková cena s DPH: 255 940,32

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení - po indexaci			
2	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - po indexaci			



Firma: ZNAKON, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

1

Rozpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem - indexováno
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Obnova vodorovného dopravního značení				
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ	M2	3 200,000		
2	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	M2	0,000		
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU	M2	0,000		
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ	M2	50,000		
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ	M2	0,000		
6	915221R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	M2	0,000		
7	91552R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU	M2	0,000		
8	91552R.3		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU	M2	120,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
9	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	0,000		
10	915612		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000		
11	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	0,000		
12	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000		
13	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	0,000		
14	915642		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000		



Firma: ZNAKON, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

2

Rozpoč

2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem - indexováno
1	2	3	4	5	6	9	10
2		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy					
1	02720.1		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN			
2	02720.10		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	DEN			
3	02720.11		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	DEN			
4	02720.3		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN			
5	02720.4		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN			
6	02720.5		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNICE	DEN			
7	02720.6		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN			
8	02720.8		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	DEN			
9	02720.9		POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE	DEN			

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - okres Litoměřice, Dílčí objednávka č. 10


RD 08PU-002844 Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Pozn.
délky v km
plochy v m²
staničení v km

Okres Litoměřice

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	ID závad v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní								
I/15	I/15 křižovatka Podsedice - hr. okr. LN (V1a, V2b, V4, BUS V11a, V7) barvou 3 250 m2 plast 120 m2	I/15		16,600			21,400			4,800	3370,00				763956
										4,800					

Detail závady 763956

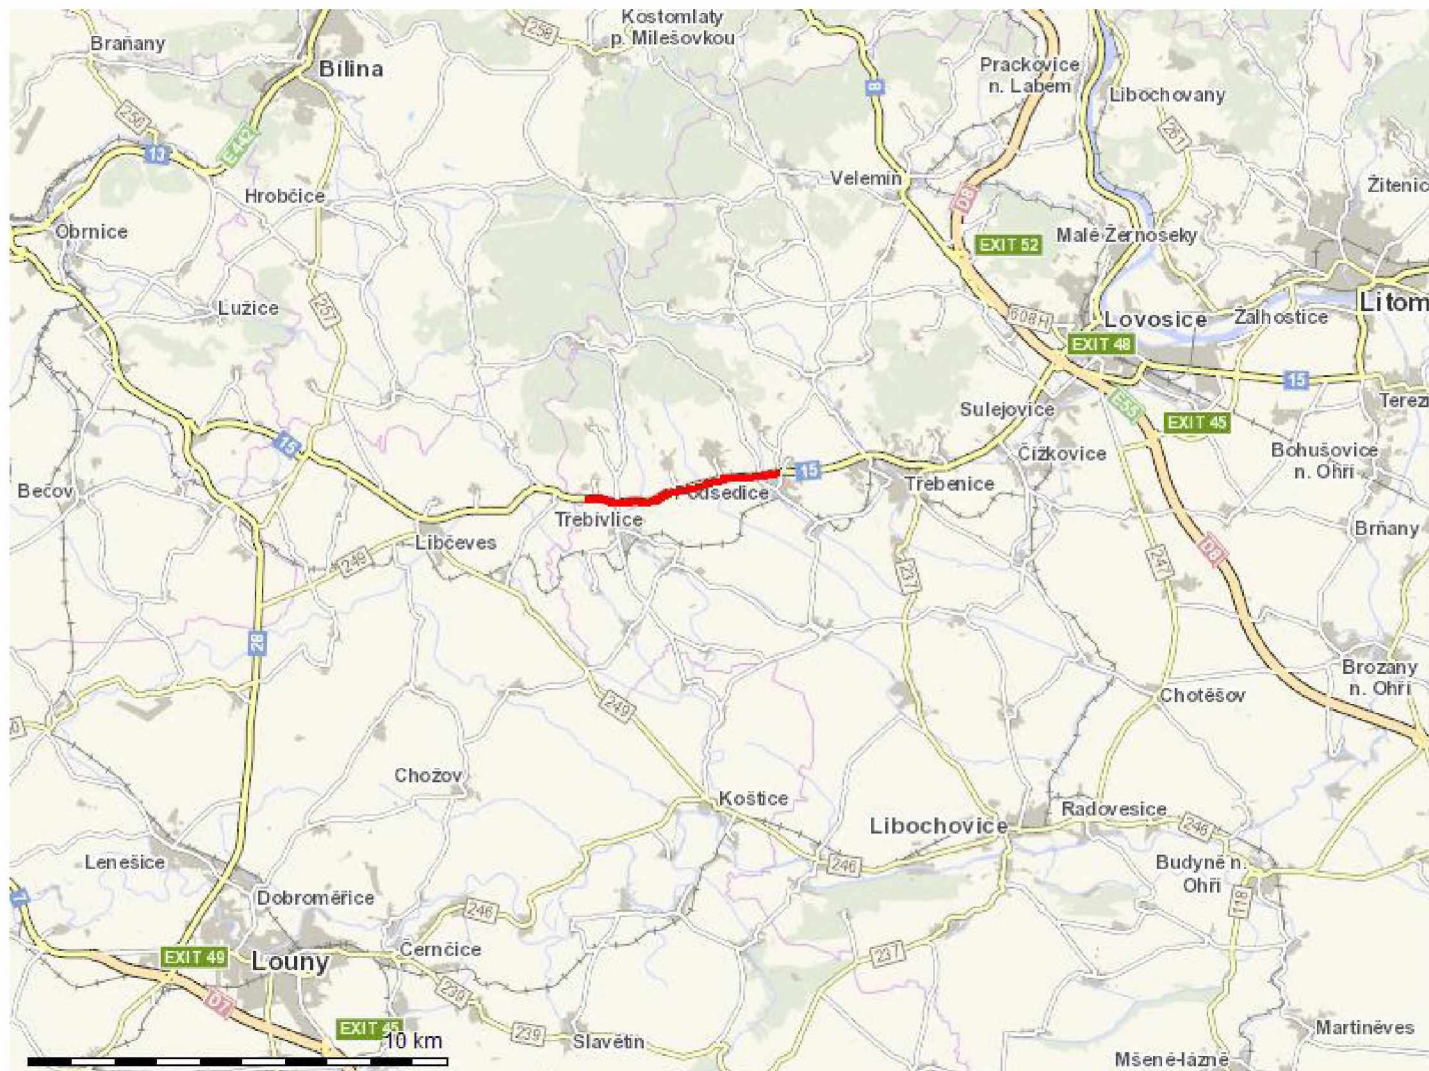

Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

Nalezeno:
14.08.2025 9:40:07

Nalezeno při:
Běžná prohlídka
Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Značení

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Vada odložena?

☐

Podtyp vady:

VDZ - poškozené/chybějící

Závažnost:

1 - vysoká

Jednotky:

3370 m2

Poloha od

Č.kom: Od.část:

15 0

Prov.

staničení:

16,6 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0234B006 0234A026

Staničení:

0,033

Poloha začátku:

50°27'50.54"N, 13°53'9.49"E

[illegible]

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 14.8.2025

Velikost: 162,1 kB

Název souboru: cc407799-833c-4ac8-b4a7-bd70f2c5f913.jpg



Vytvořeno: 14.8.2025

Velikost: 188,3 kB

Název souboru: 230d43e3-6371-48ab-acab-7ead650f3a5b.jpg



Vytvořeno: 14.8.2025

Velikost: 243,4 kB

Název souboru: 58d48779-a597-4e54-a8b7-e5b9ee6a2a3d.jpg



Vytvořeno: 14.8.2025

Velikost: 142,7 kB

Název souboru: a6bcad54-f409-49d0-b117-9d6e828e7f6f.jpg



Vytvořeno: 14.8.2025

Velikost: 176,2 kB

Název souboru: 360f3a72-d4c0-410d-93df-bd2d419bfbea.jpg

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 09.10.2025 8:54:36 +02:00
